MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3023 DE 2023

ACTA No. 3 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, DICIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 23
5.1. Correspondencia Enviada 23
5.2. Correspondencia Recibida 24
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
7. ANEXOS 24

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2023. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro principalmente entre las abscisas PR25+0900 al PR27+0000, PR29+0000 – PR30+0000, PR35+0000 – PR36+0000, y PR37+0000 – PR38+0000, por baches continuos y de severidad alta, así como perdida de material de afirmado, y formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, por lo cual se procedió a realizar bacheo manual con material de las zonas laterales para la atención inicial. De igual forma, se identifica regular estado por perdida de material en los accesos de los puentes y pontones: Dedoyaco (PR30+0060), Naboyaco (PR32+0000), Cañoseco (PR36+0400), Dantayaco (PR36+0940).

En referencia a las estructuras que presentan daños, se tiene: puente Guascayaco, Puente Tambor y Puente Congor, los cuales se intervienen en la ejecución del contrato de obra No.985 de 2022.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3023 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 7).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$208.938.177,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.938.177
	Valor Básico: $205.390.522
	Valor IVA: $ 3.547.655
Modificación No.2 de 2023	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.584.013
	Valor Básico: $205.042.372
	Valor IVA: $ 3.541.641
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $ 12.188.060.
Valor total:	$220.772.073 M/Cte. incluido IVA.
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22

Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Limpieza manual de cunetas en tierra.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
3/11/2023	30+250	30+350		X	200	5	SECO
	31+120	31+200		X	160	13	SECO
10/11/2023	24+800	25+000		X	400	6	SECO
15/11/2023	50+080	50+170		X	180	6	SECO
16/11/2023	49+000	49+680		X	1.360	5	SECO
17/11/2023	25+100	25+200		X	200	6	SECO
18/11/2023	46+700	46+900		X	400	12	SECO
21/11/2023	38+950	40+050		X	2.200	6	LLUVIA
TOTAL					**5.100**	**59**	

Registro fotográfico 03/11/2023.













Registro fotográfico 10/11/2023.





Registro fotográfico 15/11/2023.





Registro fotográfico 16/11/2023.





Registro fotográfico 17/11/2023.





Registro fotográfico 18/11/2023.













Registro fotográfico 21/11/2023.





- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
1/11/2023	32+200	32+450	150	8	SECO
2/11/2023	31+400	32+450	588	7	SECO
3/11/2023	30+500	31+400	504	8	SECO
7/11/2023	25+600	27+150	806	13	SECO
8/11/2023	40+860	42+000	627	13	SECO
9/11/2023	42+000	43+200	684	5	SECO
10/11/2023	24+600	25+000	220	7	SECO
14/11/2023	51+800	52+700	504	9	SECO
15/11/2023	50+170	51+800	913	7	SECO
16/11/2023	47+000	49+500	1.500	8	SECO
17/11/2023	25+000	25+400	200	7	SECO
20/11/2023	44+350	46+700	1.293	13	SECO
21/11/2023	38+950	40+050	550	7	LLUVIA
TOTAL			**8.538,30**	**112**	

Registro fotográfico 01/11/2023.





Registro fotográfico 02/11/2023.









Registro fotográfico 03/11/2023.









Registro fotográfico 07/11/2023.





Registro fotográfico 08/11/2023.





Registro fotográfico 09/11/2023.





Registro fotográfico 10/11/2023.





Registro fotográfico 14/11/2023.





Registro fotográfico 15/11/2023.





Registro fotográfico 16/11/2023.





Registro fotográfico 17/11/2023.





Registro fotográfico 20/11/2023.





Registro fotográfico 21/11/2023.





- Rocería y desmonte manual.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO	AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ			
22/11/2023	24+500	25+500	1.000	2,50	5.700,00	10	SECO
24/11/2023	25+500	27+000	1.500	2,50	8.100,00	10	SECO
25/11/2023	27+000	28+600	1.600	2,90	9.280,00	13	SECO
27/11/2023	28+000	30+300	2.300	1,50	8.050,00	10	SECO
28/11/2023	30+300	31+800	1.500	2,00	4.950,00	10	SECO
29/11/2023	31+800	33+300	1.500	2,50	8.100,00	10	SECO

Registro fotográfico 22/11/2023





Registro fotográfico 24/11/2023





Registro fotográfico 25/11/2023





Registro fotográfico 27/11/2023





Registro fotográfico 28/11/2023





Registro fotográfico 29/11/2023





- Limpieza de puentes y pontones.

FECHA	ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
22/11/2023	27+0195 al 27+0203,33	Pontón Guascayaquito	8,33	3	SECO
	32+0320 al 32+0327,7	Pontón Guascayaco	7,70	3	SECO
24/11/2023	29+0100 al 29+0154	Puente Guayuyaco	53,80	3	SECO
27/11/2023	29+0100 al 29+0154	Puente Guayuyaco	53,80	3	SECO
27/11/2023	30+0060 al 30+0070	Puente Dedoyaco	10,00	3	SECO
28/11/2023	30+0060 al 30+0070	Puente Dedoyaco	10,00	3	SECO
	31+0700 al 31+0711	Puente San Pablo	10,80	3	SECO
29/11/2023	32+0450 al 32+0486	Puente Nabueno	35,60	3	SECO
30/11/2023	33+0560 al 33+0569	Pontón Tufán	9,00	3	SECO
	35+0390 al 35+0399,2	Pontón Platanilla	9,20	3	SECO
TOTAL			**208,23**	**30**	

Registro fotográfico 22/11/2023





Limpieza de puente Guascayaquito PR27+0100 y puente Guascayaco PR27+0350.

Registro fotográfico 24/11/2023





Limpieza puente Guayuyaco PR29+0100.

Registro fotográfico 27/11/2023





Limpieza puente Guayuyaco PR29+0100 y puente Dedoyaco PR30+0060.

Registro fotográfico 28/11/2023





Limpieza puente Dedoyaco PR30+0060.y puente San Pablo PR31+0700.

- Limpieza de señales verticales y defensas metálicas.

FECHA	PR		LONG (ML)	CANT (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
11/11/2023	27+000	37+000	N/A	30	8	SECO
TOTAL				**30**	**8**	

Registro fotográfico 11/11/2023













- Limpieza de postes de referencia.

FECHA	PR		LONG (ML)	CANT (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
9/11/2023	25+000	55+000	30.000	30	4	SECO

Registro fotográfico 09/11/2023









- Jardinería.


FECHA	PR		LONG (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
30/11/2023	37+080	37+550	470,00	10	SECO

Registro fotográfico 30/11/2023





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

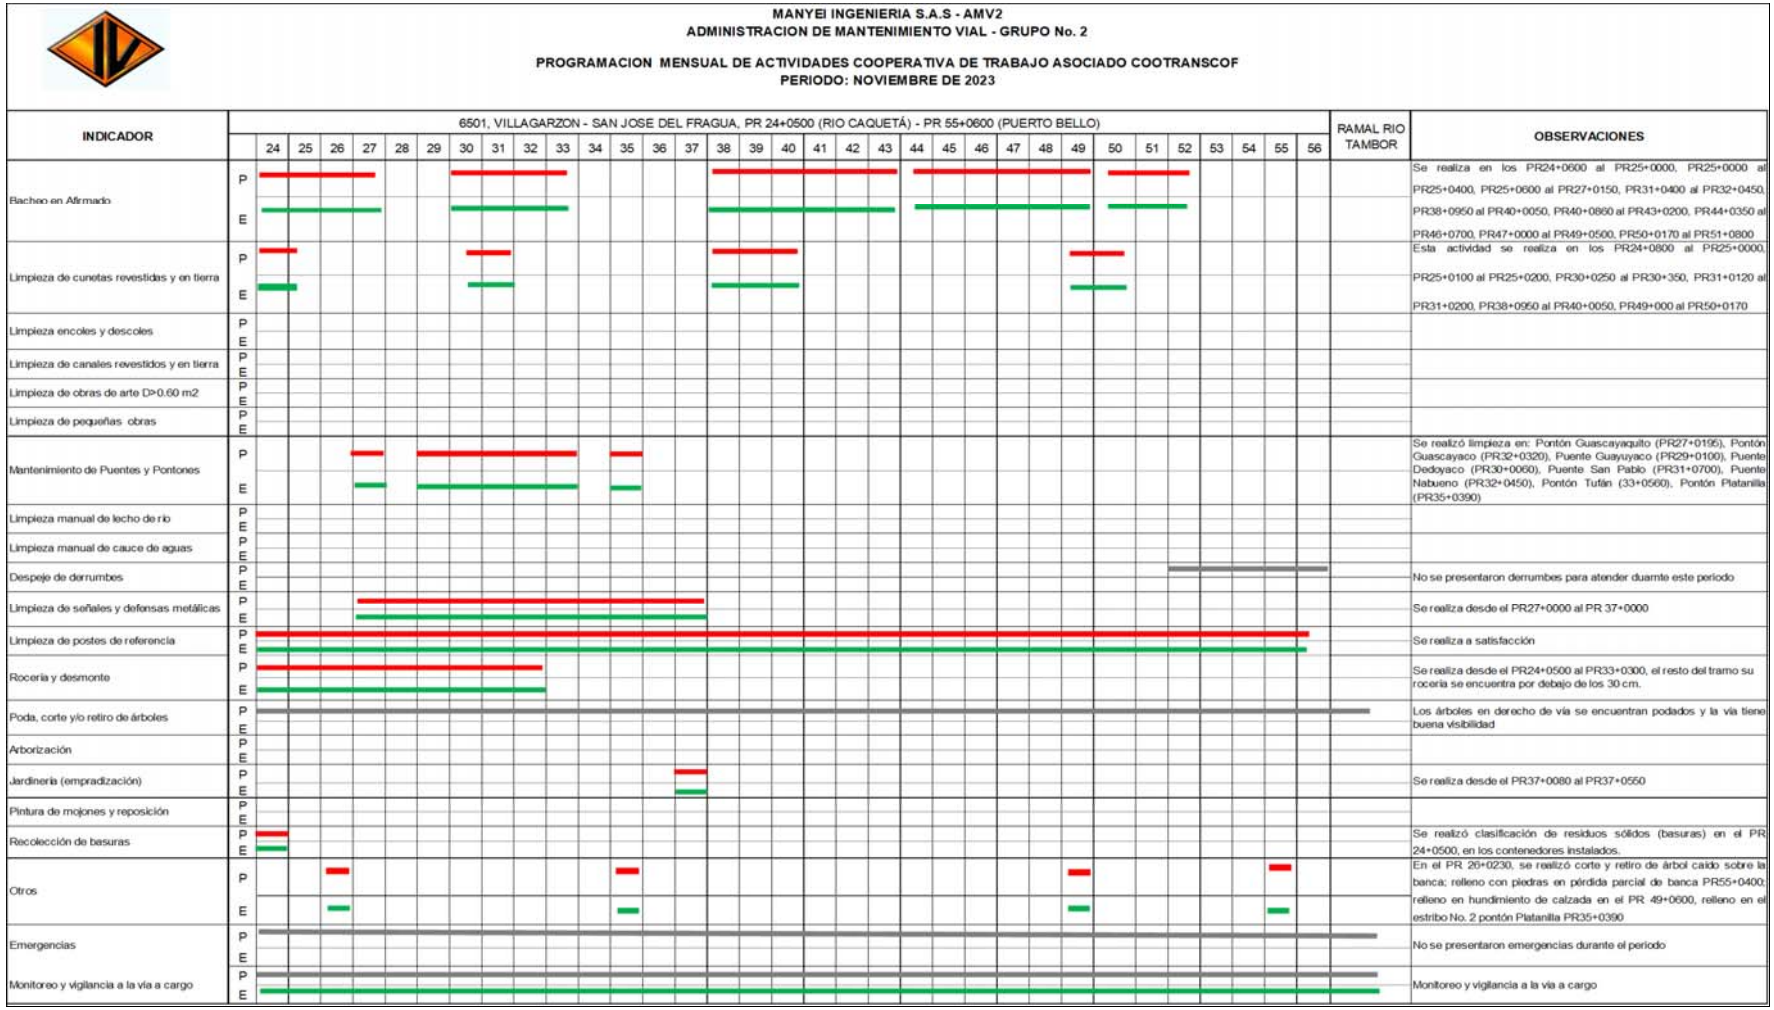

MANYEI INGENIERIA S.A.S - AMV2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2023

6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)

INDICADOR		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
Bacheo en Afirmado	P																																			
	E																																			Se realiza en los PR24+0600 al PR25+0000, PR25+0000 al PR25+0400, PR25+0600 al PR27+0150, PR31+0400 al PR32+0450, PR38+0950 al PR40+0050, PR40+0860 al PR43+0200, PR44+0350 al PR46+0700, PR47+0000 al PR49+0500, PR50+0170 al PR51+0800
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																			
	E																																			Esta actividad se realiza en los PR24+0800 al PR25+0000, PR25+0100 al PR25+0200, PR30+0250 al PR30+350, PR31+0120 al PR31+0200, PR38+0950 al PR40+0050, PR49+000 al PR50+0170
Limpieza encoles y descoles	P																																			
	E																																			
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																			
	E																																			
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																			
	E																																			
Limpieza de pequeñas obras	P																																			
	E																																			
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																			
	E																																			Se realizó limpieza en: Pontón Guascayaquito (PR27+0195), Pontón Guascayaco (PR32+0320), Puente Guayuyaco (PR29+0100), Puente Dedoyaco (PR30+0060), Puente San Pablo (PR31+0700), Puente Nabueno (PR32+0450), Pontón Tufán (33+0560), Pontón Platanilla (PR35+0390)
Limpieza manual de lecho de rio	P																																			
	E																																			
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																			
	E																																			
Despeje de derrumbes	P																																			
	E																																			No se presentaron derrumbes para atender duamte este periodo
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																			
	E																																			Se realiza desde el PR27+0000 al PR 37+0000
Limpieza de postes de referencia	P																																			
	E																																			Se realiza a satisfacción
Roceria y desmonte	P																																			
	E																																			Se realiza desde el PR24+0500 al PR33+0300, el resto del tramo su roceria se encuentra por debajo de los 30 cm.
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																			
	E																																			Los árboles en derecho de vía se encuentran podados y la vía tiene buena visibilidad
Arborización	P																																			
	E																																			
Jardineria (empradización)	P																																			
	E																																			Se realiza desde el PR37+0080 al PR37+0550
Pintura de mojones y reposición	P																																			
	E																																			
Recolección de basuras	P																																			
	E																																			Se realizó clasificación de residuos sólidos (basuras) en el PR 24+0500, en los contenedores instalados.
Otros	P																																			
	E																																			En el PR 26+0230, se realizó corte y retiro de árbol caido sobre la banca; relleno con piedras en pérdida parcial de banca PR55+0400; relleno en hundimiento de calzada en el PR 49+0600, relleno en el estribo No. 2 pontón Platanilla PR35+0390
Emergencias	P																																			
	E																																			No se presentaron emergencias durante el periodo
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																			
	E																																			Monitoreo y vigilancia a la via a cargo

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (18/12/2023)
Valor Contractual Final:	$469.804.749 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
11/11/2023	CTO 2585-2023-062	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF RL Anderson Devia	Observaciones a informe de sistema de gestión SST
09/11/2023	CTO 2585-2023-063	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Solicitud Requisito de elementos de trabajo en alturas

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
Sin oficios recibidos en el periodo de la cooperativa Cootranscof.			

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, ya que se presentan baches continuos de severidad alta y perdida de material, por lo cual es necesario la atención de este tramo con actividad de mayor duración, tal como, la conformación de calzada con adición de material, recarga de grava o perfilado, para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto seguridad, comodidad y costos para los usuarios.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 18 de diciembre de 2023.

MANYEI INGENIERIA SAS

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 2971 DE 2023

ACTA No. 3 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ). LOTE 6.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A. NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARÁ. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, DICIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 20
5.1. Correspondencia Enviada 20
5.2. Correspondencia Recibida 21
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22
7. ANEXOS 22

1. INTRODUCCIÓN

En el presente se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento Corazón del Putumayo C.T.A. tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 2+0750 (EL PORVENIR) y el PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

En el presente periodo el contrato de mejoramiento y mantenimiento No.985 de 2022, que se ejecuta en la vía 6501 por el consorcio Vías Colombia, realizaron actividades de conformación de calzada y adición de material para recuperar las adecuadas condiciones de la carretera, por lo cual mejora el estado de la superficie de rodadura atendiendo las fallas existentes en los sitios críticos, tales como: erosiones, ondulaciones, depresiones, y demás irregularidades.

De igual forma, con el personal de la cooperativa se realizó las actividades de mantenimiento rutinario para la conservación de la infraestructura vial, desarrollando actividades tales como: bacheo en afirmado, conformación manual de cunetas, recolección de basuras, limpieza de obras de drenaje, limpieza de señalización vertical.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	2971 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicios de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. Sectores 6501, Villagarzón - San José del Fragua, PR 2+0750 (El Porvenir) - PR 24+0000 (Río Caquetá). Lote 6.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado de Mantenimiento y Conservación de Vías Corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1.
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandará. C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$126.814.310 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.814.310
	Valor Básico: $124.661.073
	Valor IVA: $ 2.153.237
Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.599.351
	Valor Básico: $124.449.764
	Valor IVA: $ 2.149.587
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $7.397.501.
Valor total:	$133.996.852 M/Cte valor incluido IVA
Prórrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320-451 06 44
Domicilio Contratista:	Sector urbano, Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
11/11/2023	20+020	20+021	1	8	SOL
14/11/2023	6+780	6+900	70	4	LLUVIA
20/11/2023	19+600	19+601	1	8	SOL
21/11/2023	18+500	19+600	605	8	LLUVIA
22/11/2023	18+100	18+500	240	8	SOL
27/11/2023	17+100	17+300	120	6	SOL
	16+700	16+800	59	6	SOL
28/11/2023	16+000	16+500	275	6	LLUVIA
29/11/2023	15+300	16+000	385	8	LLUVIA
TOTAL			**1.754,75**	**62**	

Registro fotográfico 11/11/2023





Registro fotográfico 14/11/2023





Registro fotográfico 20/11/2023





Registro fotográfico 21/11/2023





Registro fotográfico 22/11/2023





Registro fotográfico 27/11/2023





Registro fotográfico 28/11/2023





Registro fotográfico 29/11/2023









- Limpieza manual de cunetas en tierra.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
9/11/2023	19+830	19+900		X	140	3	LLUVIA
	17+900	18+050		X	300	3	LLUVIA
10/11/2023	17+870	18+000		X	260	8	LLUVIA
11/11/2023	16+800	17+870		X	1.070	8	SOL
14/11/2023	17+650	17+720		X	140	4	LLUVIA
	16+700	16+770		X	140	4	LLUVIA
15/11/2023	13+450	13+550		X	200	4	SOL
	13+600	14+000		X	800	4	SOL
16/11/2023	14+050	14+650		X	1.200	8	SOL
17/11/2023	18+950	19+300		x	700	8	SOL
20/11/2023	19+600	20+600		X	2.000	8	SOL
21/11/2023	18+500	19+600		X	2.200	8	LLUVIA
22/11/2023	18+100	18+500		X	800	6	SOL
24/11/2023	17+600	18+220		X	1.240	6	LLUVIA
25/11/2023	17+350	17+700		X	700	6	SOL
27/11/2023	16+600	17+900		X	2.600	8	SOL
28/11/2023	16+130	16+200		X	140	6	LLUVIA
29/11/2023	14+900	15+850		X	1.900	8	LLUVIA
30/11/2023	8+750	8+751		X	2	8	SOL

Registro fotográfico 09/11/2023





Registro fotográfico 10/11/2023









Registro fotográfico 14/11/2023





Registro fotográfico 15/11/2023





Registro fotográfico 16/11/2023





Registro fotográfico 17/11/2023





Registro fotográfico 22/11/2023





Registro fotográfico 25/11/2023





Registro fotográfico 27/11/2023





Registro fotográfico 30/11/2023





- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
1/11/2023	10+000	11+400	1.400	5180	8	SECO
2/11/2023	8+000	10+000	2.000	7000	8	SECO
3/11/2023	6+200	8+000	1.800	5400	8	SECO
7/11/2023	5+700	6+200	500	3250	8	SECO
8/11/2023	5+000	5+700	700	4760	8	SECO
9/11/2023	4+500	5+000	500	2400	4	LLUVIA
14/11/2023	3+900	4+500	600	1800	4	LLUVIA
15/11/2023	2+750	3+900	1.150	3105	4	SECO

Registro fotográfico 1/11/2023





Registro fotográfico 2/11/2023





Registro fotográfico 3/11/2023





Registro fotográfico 7/11/2023





Registro fotográfico 14/11/2023





Registro fotográfico 15/11/2023









- Limpieza de obras de arte (alcantarillas >0.60m).

FECHA	PR		CANT (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
10/11/2023	17+950		1	8	LLUVIA
16/11/2023	14+100		1	8	SECO
17/11/2023	19+300		1	8	SECO
20/11/2023	20+600		1	8	SECO

Registro fotográfico 10/11/2023





Registro fotográfico 17/11/2023





Registro fotográfico 20/11/2023





- Limpieza de señales y postes de referencia.

FECHA	PR		CANT (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
20/11/2023	20+000	24+000	5	8	SECO
	20+000	24+000	13		SECO
22/11/2023	18+100	20+000	3	2	SECO
	18+100	20+000	21		SECO
24/11/2023	15+000	18+100	3	2	LLUVIA
	15+000	18+100	11		LLUVIA
25/11/2023	12+400	15+000	3	2	SECO
	12+400	15+000	18		SECO
27/11/2023	9+300	12+400	3	2	SECO
	9+300	12+400	16		SECO
28/11/2023	2+750	12+400	10	2	LLUVIA
	2+750	12+400	33		LLUVIA

Registro fotográfico 20/11/2023









Registro fotográfico 22/11/2023





Registro fotográfico 24/11/2023





Registro fotográfico 27/11/2023






Registro fotográfico 28/11/2023





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

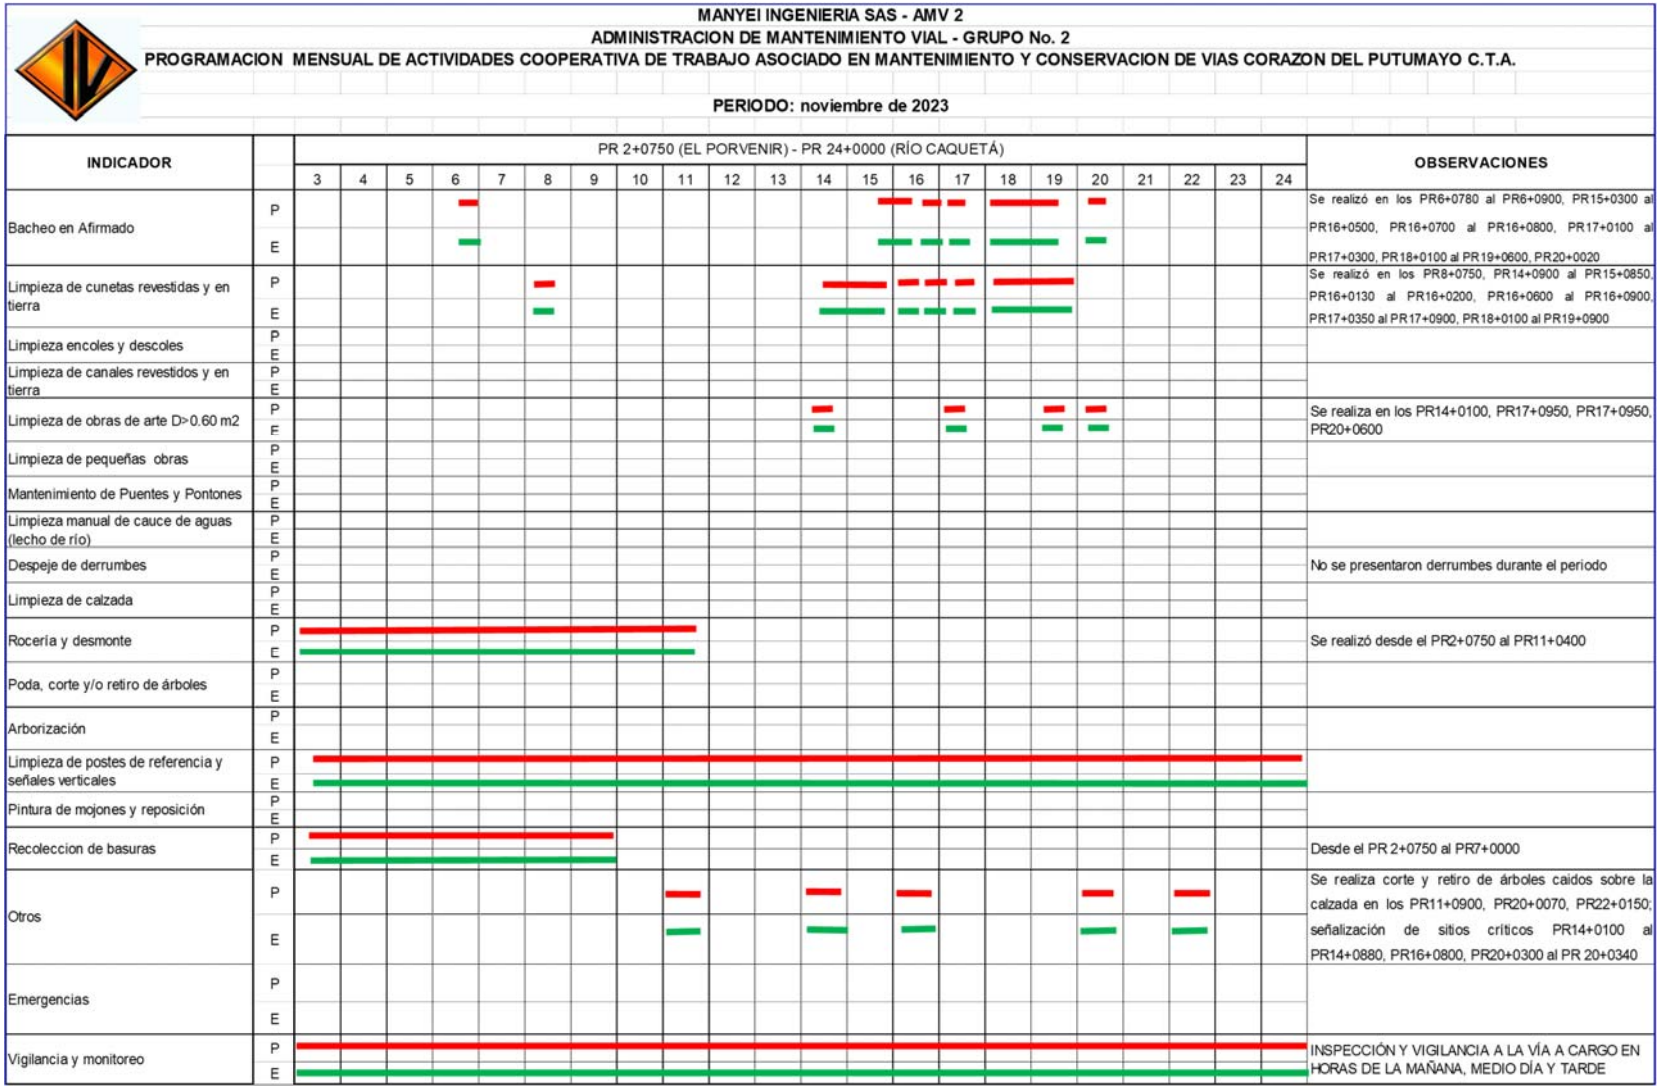

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: noviembre de 2023

PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)

INDICADOR		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	OBSERVACIONES
Bacheo en Afirmado	P																							Se realizó en los PR6+0780 al PR6+0900, PR15+0300 al PR16+0500, PR16+0700 al PR16+0800, PR17+0100 al PR17+0300, PR18+0100 al PR19+0600, PR20+0020
	E																							
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																							Se realizó en los PR8+0750, PR14+0900 al PR15+0850, PR16+0130 al PR16+0200, PR16+0600 al PR16+0900, PR17+0350 al PR17+0900, PR18+0100 al PR19+0900
	E																							
Limpieza encoles y descoles	P																							
	E																							
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																							
	E																							
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																							Se realiza en los PR14+0100, PR17+0950, PR17+0950, PR20+0600
	E																							
Limpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																							
	E																							
Limpieza manual de cauce de aguas (lecho de río)	P																							
	E																							
Despeje de derrumbes	P																							No se presentaron derrumbes durante el periodo
	E																							
Limpieza de calzada	P																							
	E																							
Rocería y desmonte	P																							Se realizó desde el PR2+0750 al PR11+0400
	E																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																							
	E																							
Arborización	P																							
	E																							
Limpieza de postes de referencia y señales verticales	P																							
	E																							
Pintura de mojones y reposición	P																							
	E																							
Recoleccion de basuras	P																							Desde el PR 2+0750 al PR7+0000
	E																							
Otros	P																							Se realiza corte y retiro de árboles caidos sobre la calzada en los PR11+0900, PR20+0070, PR22+0150; señalización de sitios críticos PR14+0100 al PR14+0880, PR16+0800, PR20+0300 al PR 20+0340
	E																							
Emergencias	P																							
	E																							
Vigilancia y monitoreo	P																							INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VÍA A CARGO EN HORAS DE LA MAÑANA, MEDIO DÍA Y TARDE
	E																							

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA; (18/12/2023)
Valor Contractual Final:	$469.804.749 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 17 de enero de 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
09/11/2023	CTO 2585-2023-058	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A Atte. Sr. Servio Tulio David Inzandará Representante Legal	Reiteración solicitud de seguros de vida de los asociados de la cooperativa.

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
11/11/2023	CTO 2585-2023-059	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A Atte. Sr. Servio Tulio David Inzandará Representante Legal	Observaciones de acuerdo a recorrido de fecha 02 de noviembre de 2023 de actividades en la via desarrolladas por el personal de la cooperativa.
11/11/2023	CTO 2585-2023-060	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A Atte. Sr. Servio Tulio David Inzandará Representante Legal	Observaciones a informe mensual de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
09/11/2023	CTO 2585-2023-063	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales	Solicitud Requisito de elementos de trabajo en alturas
16/11/2023	CTO 2585-2023-069	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A Atte. Sr. Servio Tulio David Inzandará Representante Legal	Reiteración solicitud de seguros de vida de los asociados de la cooperativa.
17/11/2023	CTO 2585-2023-073	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A Atte. Sr. Servio Tulio David Inzandará Representante Legal	Observaciones a certificados de trabajo en alturas presentados por la cooperativa en el marco del SG-SST.

5.2. Correspondencia Recibida:

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
16/11/2023	OCE -19	PROFESIONAL SST COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A	Respuesta cumplimiento de utilización de señalización requerida para el desarrollo de actividades de mantenimiento rutinario en la via.
17/11/2023	OCE -20	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A	Respuesta cumplimiento de seguros de vida de asociados de la cooperativa.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y según lo establecido en el manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 18 de diciembre de 2023.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3002 DE 2023

ACTA No. 3 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) /4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 5.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA. NIT. 800.102.361-4. R/L MAIRA LEONELA BURBANO CHICANGANA. CC. No. 1.064.676.650 DE SOTARÁ - CAUCA**

MOCOA, DICIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 23
5.1. Correspondencia Enviada 23
5.2. Correspondencia Recibida 23
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
7. ANEXOS 24

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía tiene a cargo los sectores comprendidos entre el PR 60+0300 (Ye Urcusique) y el PR 77+1000 (Mocoa) de la Carretera 4502 Santana – Mocoa; el sector entre el PR 0+0000 y el PR 1+0600 (paso nacional por Mocoa) de la Carretera 4503 Mocoa – Pitalito; y la vía Perimetral a Mocoa, con longitud total a atender de 21.83Km.

2.2. Estado de la vía

La carretera 4502, Santa Ana – Mocoa, sector La Ye de Urcusique - El Pepino – Mocoa, se encuentra en buen estado en general como resultado de las actividades de mantenimiento rutinario y la ejecución de mantenimiento periódico, tal como, el contrato de suministro de mezcla No.1903 de 2023, por el cual se realizó la atención de tramos críticos de la vía con presencia de baches, fisuras, deformaciones, pulimento, y la intervención de la superficie de rodadura en el puente Rumiyaco 1 (PR74+0150), recuperando en estos sitios las adecuadas condiciones.

La vía cuenta con sitios críticos que requieren atención por perdida parcial de banca e inestabilidad de taludes, tales como: PR61+0400 y PR65+0300 (instabilidad talud), PR70+0020 y PR70+0242 (perdida parcial de banca). De igual forma es necesario

demarcación de señalización horizontal e instalación de señales verticales para complementar la existente o en tramos de alta accidentalidad.

La carretera 4503, Mocoa – Pitalito, sector Paso Nacional por Mocoa, la superficie de rodadura consiste en estructura de pavimento en concreto rígido el cual presenta alto desgaste por alcanzar su vida útil, presentando deterioros tipo fisuras, grietas, baches, pulimento, cabezas duras, perdida de sello en juntas, parcheo, descascaramiento, entre otros, los cuales requieren atención por medio de intervención de actividades de mantenimiento periódico, rehabilitación o reconstrucción. El instituto cuenta con el contrato de mantenimiento No. 3821 de 2023 para la recuperación de la estructura y superficie de rodadura del tramo vial a cargo de INVIAS, sin embargo, a al fecha no se inician actividades.

En la carretera Perimetral de Mocoa, el tramo vial cuenta con longitud 2.3Km en pavimento de concreto rígido, en general buen estado, con presencia de fisuras puntuales y algunas losas fracturadas. En el presente periodo se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento rutinario, tal como, rocería, limpieza de obras de drenaje, recolección de basuras, entre otras para mantener la operatividad del tramo.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3002 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. sectores 4502, Santa Ana - Mocoa, Ye Urcusique - Mocoa, PR 60+0300 - PR 77+1000 (Mocoa) /4503, Mocoa - Pitalito, Paso nacional por Mocoa, PR 0+0000 - PR 1+0600/carretera perimetral de Mocoa. lote 5.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía. NIT. 800.102.361-4
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Maira Leonela Burbano Chicangana. C.C. No. 1.064.676.650 de Sotará – Cauca.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	27 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$112.576.454 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.

Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.576.454
	Valor Básico: $110.664.968
	Valor IVA: $ 1.911.486
Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.385.630
	Valor Básico: $110.477.384
	Valor IVA: $ 1.908.246
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $ 4.690.686.
Valor total:	$117.076.316 M/Cte. incluido IVA.
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor de Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	312-658 13 50
Domicilio Contratista:	Vereda San José del Pepino, Mocoa, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Parcheo en carretera en pavimento en la vía 4502 y 4503 (contrato de suministro de mezcla No.1903 de 2023).

Vía 4502 Santa Ana – Mocoa

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO VÍA	AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL					
23/11/2023	67+800	67+825	25	5	125	7	SECO
23/11/2023	67+300	75+000	10	1	10	7	SECO
24/11/2023	73+200	73+220	20	7	140	7	SECO
25/11/2023	74+145	74+167	24	6,6	158,4	7	SECO
TOTAL					**433,4**	**21**	

Vía 4503 Mocoa – Pitalito (paso Nacional por Mocoa)

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO VÍA	AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL					
22/11/2023	1+530	1+555	20	0,75	15	7	SECO
22/11/2023	1+588	1+600	12	6	72	7	SECO
TOTAL					**87**	**14**	

Registro fotográfico 22/11/2023









Registro fotográfico 23/11/2023

















Registro fotográfico 24/11/2023









Registro fotográfico 25/11/2023













- Bacheo en carretera en afirmado en la vía 4502: Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
18/11/2023	60+700	63+700	1.950	2	SECO
TOTAL			**1.950,00**	**2**	

Registro fotográfico 18/11/2023









- Limpieza manual de cunetas en revestidas y en tierra en la vía 4502.

FECHA	PR		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
14/11/2023	63+600	64+600	2.000,00	7	SECO
15/11/2023	64+600	65+600	2.000,00	7	SECO
16/11/2023	65+600	66+600	2.000,00	7	SECO
17/11/2023	66+600	66+900	600,00	7	SECO
18/11/2023	67+000	67+700	1.400,00	2	SECO
23/11/2023	68+300	68+700	800,00	7	SECO
29/11/2023	60+900	60+950	100,00	7	LLUVIA
	65+400	66+100	1.400,00	7	LLUVIA
30/11/2023	60+300	62+000	3.400,00	7	SECO
TOTAL			**13.700,00**	**58**	

Registro fotográfico 14/11/2023





Registro fotográfico 15/11/2023





Registro fotográfico 23/11/2023





Registro fotográfico 29/11/2023





- Limpieza manual de cunetas en revestidas y en tierra en la vía Perimetral Mocoa.

FECHA	PR		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
21/11/2023	0+	2+300	4.600,00	1	SECO
TOTAL			**4.600,00**	**1**	

Registro fotográfico 21/11/2023





- Rocería en la vía 4502, Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
8/11/2023	60+300	61+000	3.150,00	7	SECO
9/11/2023	61+000	62+000	4.000,00	7	SECO
10/11/2023	62+000	63+000	2.100,00	7	LLUVIA
11/11/2023	63+000	63+600	2.040,00	7	SECO
14/11/2023	63+600	64+600	4.200,00	7	SECO
15/11/2023	64+600	65+600	3.000,00	7	SECO
16/11/2023	65+600	66+600	2.200,00	7	SECO
17/11/2023	66+600	67+700	3.080,00	7	SECO
30/11/2023	68+000	69+000	4.000,00	7	SECO
TOTALES			**27.770,00**	**63**	

Registro fotográfico 08/11/2023





Registro fotográfico 10/11/2023





Registro fotográfico 14/11/2023





Registro fotográfico 15/11/2023





Registro fotográfico 17/11/2023





Registro fotográfico 30/11/2023





- Rocería en la vía Perimetral Mocoa

FECHA	PR		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
20/11/2023	0+	1+300	2.730,00	7	SECO
21/11/2023	1+300	2+300	2.700,00	6	SECO
TOTALES			**5.430,00**	**13**	

Registro fotográfico 20/11/2023





Registro fotográfico 21/11/2023





- Mantenimiento rutinarion de puentes y pontones en la via 4502.

FECHA	PR		CLIMA
	INICIAL	FINAL	
18/11/2023	74+150	74+168	SECO

Registro fotográfico 18/11/2023





- Limpieza de calzadas en la via 4502.

FECHA	PR		LONG (ML)	ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
7/11/2023	77+700	77+703	3,00	15	7	SECO
28/11/2023	68+000	68+020	20,00	132	7	SECO
TOTALES				**147**	**14**	

Registro fotográfico 28/11/2023





- Limpieza de calzadas en la via 4503.

FECHA	PR		LONG (ML)	ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
7/11/2023	0+120	0+123	3,00	12	7	SECO
	0+400	0+415	15,00	63	7	SECO
	0+600	0+605	5,00	21	7	SECO
TOTALES				**96**	**21**	

Registro fotográfico 07/11/2023









- Recolección de residuos sólidos via Perimetral Mocoa.

FECHA	PR		LONG. TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
1/11/2023	0+	1+300	2600	7	SECO
2/11/2023	1+300	2+300	2000	7	SECO
TOTAL			**4600**	**14**	

Registro fotográfico 01/11/2023









Registro fotográfico 02/11/2023





- Limpieza de obras de drenaje (>0.60m) via Perimetral Mocoa.

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
3/11/2023	1+200		1,00	7	SECO

Registro fotográfico 03/11/2023






3 nov. 2023 2:33:44 p. m.
gran via
1.1576N 76.6483W


3 nov 2023 11:48:25.6
1.1532N 76.6462W
la gran via


3 nov 2023 09:21:16.0
1.1532N 76.6462W
la gran via


3 nov 2023 11:48:52.5
1.1532N 76.6462W
la gran via


3 nov 2023 11:52:11.8
1.1532N 76.6462W
la gran via


3 nov 2023 13:53:34.1
1.1532N 76.6462W
la gran via

Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA
PERIODO: 1 al 30 de noviembre de 2023

INDICADOR		4502, SANTA ANA - MOCOA (PR 60+0300 - PR 77+1000)																	4503			PERIMETRAL MOCOA	OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	0	1	2	
Bacheo Carreteras Pavimentadas	P																						
	E																						
Parcheo Carreteras Pavimentadas	P																						Se realizó en los PR67+0600 al PR67+0700, PR74+0150 al PR74+0168, vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR1+0550 al PR1+0600, vía 4503 Mocoa - Pitalito. Esta actividad se desarrolló como apoyo al contrato No. 1903 de 2023 suministro de mezcla asfáltica en caliente
	E																						
Bacheo en Afirmado	P																						Se realizó desde el PR60+0700 al PR63+0700, vía 4502 Santa Ana - Mocoa
	E																						
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																						Se realizó esta actividad en los sitios más críticos entre los PR60+0300 al PR62+000, PR63+0600 al PR66+0900, PR67+0000 al PR67+0700, PR68+0300 al PR68+0700, vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR2+0300, vía Perimetral Mocoa, sin código.
	E																						
Limpieza encoles y descoles	P																						
	E																						
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																						
	E																						
Limpieza de obras	P																						Se realizó limpieza de alcantarilla en el PR1+0200 vía Perimetral Mocoa sin código
	E																						
Limpieza de pequeñas obras	P																						
	E																						
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																						Se realiza en el PR74+0150 puente Rumiyaco 1, vía 4502 Santa Ana - Mocoa
	E																						
Limpieza manual de cauce de aguas (Lecho de rio)	P																						
	E																						
Despeje de derrumbes	P																						Se despeja derrumbe de 40 m3 aprox, en el PR60+0900, PR 65+0300 de 50 m3 aprox (con apoyo de maquinaria amarilla), vía 4502 Santa Ana - Mocoa
	E																						
Limpieza de calzada	P																						Se realiza limpieza de calzada desde el PR68+0000 al PR68+0020, PR77+0700 al PR77+0703 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR 0+0120 al PR0+0123 y PR0+0400 al PR0+0415, PR0+0600 al PR0+0605 vía 4503 Mocoa - Pitalito.
	E																						
Rocería y desmonte	P																						Se realizó desde el PR60+0300 al PR69+000, vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR2+0300, vía Perimetral Mocoa, sin código.
	E																						
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																						Los árboles en derecho de vía nacional se encuentran podados y sin obstaculizar la visibilidad de los usuarios
	E																						
Recolección de Basuras	P																						Se realizó desde el PR0+0000 al PR2+0300, vía Perimetral Mocoa sin código
	E																						
Limpieza de señales, defensas metálicas y mojones	P																						Se realiza desde el PR60+0300 al PR77+000 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+000 al PR2+0500 carretera Perimetral Mocoa
	E																						
Pintura de resaltos (reductores de velocidad)	P																						
	E																						
Emergencias	P																						Derrumbes en el PR60+0900 y PR65+0300, vía totalmente cerrada el día 28-11-2023, se hace la remoción con apoyo de maquinaria amarilla
	E																						
Otros																							
Inspección y vigilancia	P																						INSPECCIÓN DE LAS VÍAS A CARGO 4502 Y 4503, Y CARRETERA PERIMETRAL MOCOA SE REALIZA EN JORNADA MAÑANA Y TARDE
	E																						

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (18/12/2023)
Valor Contractual Final:	$469.804.749 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
09/11/2023	CTO 2585-2023-063	**COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO** Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Solicitud requisitos elementos trabajos en alturas para las actividades que desarrolla el personal de la cooperativa en las vias a cargo.
11/11/2023	CTO 2585-2023-061	**Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía.** Ath. Sr Maira Burbano.	Remisión de observaciones al informe mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado en las actividades de la cooperativa.

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
10/11/2023	Sin número	**Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía.** Ath. Sr Maira Burbano.	Respuesta a oficio CTO-2585-2023-063 en referencia a los elementos para el desarrollo de trabajo en alturas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y de acuerdo al manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 18 de diciembre de 2023.

MANYEI INGENIERIA SAS

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Via
