	LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN -REINICIO	Código: F - 262
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de

PROYECTO:	" ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"

Fecha: 28/12/2023

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio (Descripcion detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)		
INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		
REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (V°B° interventoria aplica para prórroga y reinicio)		
FLUJO DE CAJA EN PROJECT (V°B° interventoria) Porcentajes y costos planeados.		
INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		
ACTA COMITÉ (Particip. RL.Contratista, RL. Interventoria, Director Operativo de Ejecucion y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)		
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.		
MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando modifica la vigencia de un proyecto y esta al alcance de la vigencia del contrato, esta sera perfeccionada mediante el acta de comité.		
UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente tramite:		
ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)		
Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoría deberá asegurarse que la ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la interventoria debera comunicar		
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)		

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: YADY JOHANNA HERRERA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA:
M.P.

Firma
Nombre: N/A
APOYO A LA SUPERVISION
M.P.

Firma
Nombre: N/A
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Firma
Nombre: IVAN DURLEY BRICEÑO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P.

Firma
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR
M.P.

V°B°
Nombre: N/A
APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
gerencia@idm-meta.gov.co

Puerto López, Meta, 28 diciembre 2023

SI-150.35-811-12-2023

Doctor
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina Contratación
Alcaldía Municipal
Ciudad

REFERENCIA: ENTREGA DE DOCUMENTOS PRORROGA (1) OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, viabiliza la prórroga uno (1) para el contrato de obra No. **100-103-13-09-0004-2023** cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"**, se hace entrega de los documentos pertinentes para este proceso.

Sin otro en particular,

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía Municipal

OFICINA ... ACIÓN
Fecha 28/12/23
Recibi ...

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 28/12/2023	Fecha: 28/12/2023	Fecha: 28/12/2023

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Consorcio espacios puerto
NIT. 901781193-1

Villavicencio, 28 de diciembre de 2023

Ingeniera
MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

REFERENCIA:
Objeto: ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META

ASUNTO: Solicitud de prorroga No 1. Contrato de obra No 100-103-13-09-0004-2023.

Cordial saludo,

Conforme a la recopilación de información del suscrito, revisión de los documentos aportados por el consorcio espacios puerto, solicitamos prórroga del contrato por las siguientes apreciaciones:

Durante el desarrollo del proceso constructivo, se efectuó una inspección por parte de los profesionales vinculados al proyecto. En dicha visita, se elaboró un pormenorizado plan de trabajo. las primeras tareas identificadas en este plan incluyeron la ubicación y reorganización de la cubierta, el descapote mecánico, y la identificación de otros elementos a ser construidos o suministrados conforme a lo establecido en el proyecto.

una vez establecida la línea de acción, se iniciaron los trabajos de ubicación, facilitando así la realización del descapote en la zona de intervención y la entrega de algunos metros cúbicos de material. no obstante, durante la adquisición de materiales, surgió un inconveniente significativo: dos de los proveedores no comunicaron el cierre de sus operaciones antes de recibir las consignaciones respectivas.

Este problema se manifestó tras la fecha de consignación, que fue el 18 de diciembre de 2023, mientras que los avisos de cierre de operaciones de los proveedores llegaron los días 20 y 21 de diciembre. ante esta inesperada contingencia, resulta imperativo gestionar una prórroga del contrato para facilitar la ejecución de las partidas que requieren los insumos proporcionados por estos proveedores. No todas las actividades se verán interrumpidas en el transcurso del cierre de los proveedores, ya que la gran mayoria de actividades se pueden ejecutar sin ningún contratiempo.

Adicionalmente a la situación de los materiales también se desea indicar que del 100% del tiempo del contrato llovió el 33.00% del tiempo, presentándose lluvias los días 19, 20, 21, 27 y 28 de diciembre del presente año

Por los temas anteriormente sustentados y teniendo en cuenta los tiempos y tramites con las entidades el tiempo solicitado es de treinta (30) días.

Atentamente,

IVANA DURLEY BRICEÑO
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO Nº:	100-103-13-09-0004-2023
OBJETO:	ADECUACION DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 314,786,287.82
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
RGO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA Nº	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 29/12/2023

B. SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA Nº	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 29/12/2023

MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA Nº	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($): $ 314,786,287.82

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nº	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($): 29/12/2023

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 314,786,287.82			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	14	DIAS	0	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	29 DE DICIEMBRE DEL 2023			

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL**	**Código: F-098** Version: 002 FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de

PRORROGA ☑ al contrato anteriormente citado de

	TIEMPO	
	MES	**DIAS**
	0	30

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia VEINTIOCHO (28) del mes de Diciembre de 2023 . El Contrato referenciado, presenta un avance fisico ejecutado del ___15__% contra un avance programado del _95_%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 314.786.287,82
Valor facturado ($)	N/A
Valor facturado reajustes ($)	N/A
Valor anticipo amortizado ($)	N/A
Valor anticipo por amortizar ($)	N/A

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

Durante el desarrollo del proceso constructivo, se efectuo una inspeccion por parte de los profesionales vinculados al proyecto. En dicha visita, se elaboró un pormenorizado plan de trabajo, las primeras tareas identificadas en este plan incluyeron la ubicacion y reorganizacion de la cubierta, el descapote mecanico, y la identificacion de otro elementos a ser construidos o suministrados conforme a lo establecido en el proyecto.

Una vez establecida la linea de accion, se iniciaron los trabajos de ubicacion, facilitando asi la realizacion del descapote de la zona de intervencion y la entrega de algunos metros cubicos de material, no obstante, durandte la adquisicion de materiales, surgio un incoveniente significativo: dos de los proveedores no comunicaros el cierre de sus operaciones antes de recibir las consignaciones respectivas.

Este problema se manifesto tras la fecha de consignaciones, que fue el 18 de diciembre de 2023, mientras que los avisos de cierre de operaciones de los proveedores llegaron los dias 20 y 21 de diciembre ante esta inesperada contingencia, resulta imperativo gestionar una prorroga del contrato para facilitar la ejecucion de las partidas que requieren los insumos proporcionados por estos proveedores. No todas las actividades se veran interrumpidas en el transcurso del cierre de los proveedores, ya que la gran mayoria de actividades se pueden ejecutar sin ningun contratiempo.

Adicionalmente a la situcion de los materiales tambien se desea indicar que del 100% del tiempo del contrato llovio el 33.00% del tiempo, presentandose lluvias los dias 19, 20, 21, 27 y 28 de diciembre del presente año.

por los temas anteriormente sustentados y teniendo en cuenta los tiempos y tramites con las entidades el tiempo solicitado es de treinta (30) dias.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, SE APRUEBA LA PRORROGA No 01 DEL CONTRATO No. 100-103-13-09-0004-2023, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 314.786.287,82			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	1	**DIAS**	N/A	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30/01/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los ___veintiocho__ (28) días del mes de ____DICIEMBRE_____ del año ____2023_____

Nombre del Contratista : CONSORCIO ESPACIOS PUERTO **Representante Legal Contratista: IVANA DURLEY BRICEÑO** **Firma**	**Nombre de la Interventoria : N/A** **Representante Legal Interventoria: N/A** **Firma: N/A**
Nombre del Supervisor Asignado: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ **Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0004-2023

"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"

INFORME PRORROGA N°1



DICIEMBRE 2023

Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3
OBJETIVO DEL INFORME 3
1. GENERALIDADES Y CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA 4
2. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 5
3. ADMINISTRATIVO Y LEGALES 6
3.1. ACTAS GENERADAS 6
3.2. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO 6
3.3. CONTROL DE PÓLIZAS 6
4. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS 8
5. JUSTIFICACION PRORROGA 12
6. CONCLUSIONES 13

INTRODUCCION

El municipio de Puerto López, Meta mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, con el fin de satisfacer las necesidades demandadas en el proyecto en concordancia con las metas establecidas dentro del plan de desarrollo y con el fin de ejecutar el componente de obra del proyecto, adjudico al **CONSORCIO ESPACIOS PUERTO** con Representante Legal **IVANA DURLEY BRICEÑO**, identificada con CC 1.122.137.612 de Acacias la **" ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META".** En el presente informe se describen todos los aspectos preliminares, administrativos, técnicos y jurídicos que se han presentado hasta la fecha en la ejecución del contrato, además se justifica la solicitud de la prórroga No. 1.

OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto describir todos los aspectos del proyecto que describen y muestran el estado real de ejecución del proyecto como todos los procesos logísticos y constructivos que se realizan para ejecutar cada una de las actividades contractuales a los trabajos propios del proyecto.

1. GENERALIDADES Y CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	" ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"
CONTRATO N°	100-103-13-09-0004-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO NIT. 901781193-1 IVANA DURLEY BRICEÑO C.C. No. 1.122.137.612
SUPERVISOR:	ING. MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($314.786.287,82)
FECHA DEL CONTRATO:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ANTICIPO	NA

2. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Puerto López - Meta, se encuentra ubicado a una distancia de 85 Km. de Villavicencio. Los límites geográficos del Municipio de Puerto López están definidos de la siguiente manera:

Por el Norte: con el municipio de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare
Por el Oriente: con el municipio de Puerto Gaitán
Por el Sur: con el municipio de San Martin
Por el Occidente: con el municipio de San Carlos de Guaroa y Villavicencio

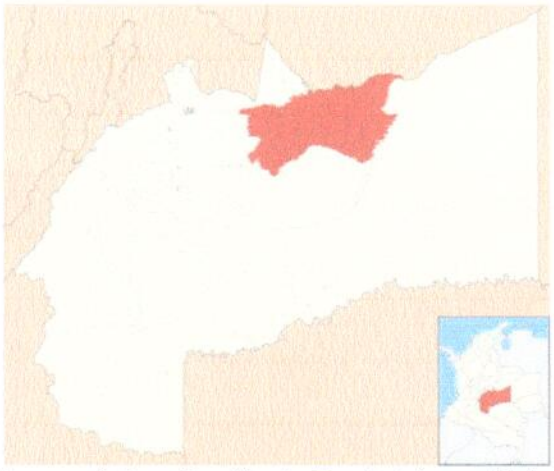


Imagen 1. Localización de Puerto López - Meta

Las actividades propias del proyecto se desarrollarán en un punto específico descrito a continuación:

Las siguientes coordenadas señalan el punto donde se construirá la estructura de la concha acústica 4°05'35.3"N 72°57'18.6"W, ubicado la dirección Cra. 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta



Imagen 2. Ubicación puerto López

3. ADMINISTRATIVO Y LEGALES

3.1. ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la presente fecha se han generado por parte del contratista y supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
INICIO	15/12/2023

3.2. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO

N° CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR ANTICIPO	ACTAS PARCIALES
CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-0004-2023	$ 314.786.287,82	NA	NA

3.3. CONTROL DE PÓLIZAS

INICIALES			
Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales	CV-100038209		
Fecha de expedición.	14 DE DICIEMBRE DE 2023		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	CV-100010178		
Fecha de expedición.	14 DE DICIEMBRE DE 2023		
Expedidas por:	MUNDIAL DE SEGUROS SA		
Aprobación de pólizas por entidad	15 DE DICIEMBRE DE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	14/12/2023	29/04/2024	$ 31.478.628,80
Salarios y Prestaciones Sociales	14/12/2023	29/12/2026	$ 15.739.314,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/2023	29/12/2023	$ 232.000.000,00
Estabilidad y calidad de obra	29/12/2023	29/12/2028	$ 62.957.257,60
			$ 342.175.201,80

ACTUALIZACION ACTA DE INICIO			
Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales	CV-100038209		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	CV-100010178		
Expedida por:	MUNDIAL DE SEGUROS SA		
Fecha de expedición.	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
Aprobación de pólizas por entidad	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	14/12/2023	29/04/2024	$ 31.478.628,80
Salarios y Prestaciones Sociales	14/12/2023	29/12/2026	$ 15.739.314,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/2023	29/12/2023	$ 232.000.000,00
Estabilidad y calidad de obra	29/12/2023	29/12/2028	$ 62.957.257,60
			$ 342.175.201,80

4. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Las actividades realizadas se indican a continuación:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PARQUE LA LAGUNA				
1,1	MÁSTIL CON TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE ARO Y MALLA				
1.1.1	MÁSTIL METÁLICO CON TABLERO DE 1,20 x 1,80MTS INCLUYE ARO Y MALLA PARA BALONCESTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 3.613.026,00	$ 3.613.026,00
	COSTO SUBTOTAL				**$ 3.613.026,00**
1,2	PLACAS EN HEXÁGONOS Y BANCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN				
1.2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	161,29	$ 37.420,00	$ 6.035.471,80
1.2.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	62,28	$ 831.653,00	$ 51.795.348,84
1.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3902,88	$ 9.156,00	$ 35.734.769,28
1.2.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	3,24	$ 133.272,00	$ 431.801,28
1.2.5	RELLENO CON GRAVILLA	M3	10,96	$ 97.506,00	$ 1.068.665,76
1.2.6	BANCOS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN	UND	9,00	$ 1.348.231,00	$ 12.134.079,00
1.2.7	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO	ML	10,00	$ 282.096,00	$ 2.820.960,00
1.2.8	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5,60	$ 87.080,00	$ 487.648,00
1.2.9	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,04	$ 115.622,00	$ 4.624,88
1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25,00	$ 138.493,00	$ 3.462.325,00
			COSTO SUBTOTAL		**$ 113.975.693,84**
2	CONCHA ACÚSTICA				
2,1	TARIMA				
2.1.1	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	10,76	$ 13.932,00	$ 149.908,32

2.1.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,76	$ 34.438,00	$ 370.552,88
2.1.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,44	$ 778.836,00	$ 2.679.195,84
2.1.4	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	137,72	$ 9.156,00	$ 1.260.964,32
2.1.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	34,43	$ 96.054,00	$ 3.307.139,22
			COSTO SUBTOTAL		**$ 7.767.760,58**
2,2	MUROS				
2.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	51,35	$ 7.023,00	$ 360.631,05
2.2.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	19,92	$ 34.438,00	$ 686.004,96
2.2.3	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,95	$ 19.893,00	$ 78.577,35
2.2.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	51,20	$ 13.931,00	$ 713.267,20
2.2.5	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1CM	ML	13,15	$ 1.709,00	$ 22.473,35
			COSTO SUBTOTAL		**$ 1.860.953,91**
2,3	ESCALERAS				
2.3.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,97	$ 87.080,00	$ 171.547,60
2.3.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,51	$ 359.979,00	$ 183.589,29
2.3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	34,67	$ 8.508,00	$ 294.972,36
2.3.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,67	$ 555.667,00	$ 927.963,89
2.3.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	5,00	$ 96.054,00	$ 480.270,00
2.3.6	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1,40	$ 195.971,00	$ 274.359,40
			COSTO SUBTOTAL		**$ 2.332.702,54**
2,4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2.4.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 112.745,00	$ 450.980,00
2.4.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$ 104.281,00	$ 625.686,00

2.4.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2,00	$ 253.004,00	$ 506.008,00
2.4.4	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 431.504,00	$ 431.504,00
2.4.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	35,00	$ 48.450,00	$ 1.695.750,00
2.4.6	ACOMETIDA PARCIAL AL 2No2+1 No10 DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 38.630,00	$ 1.545.200,00
2.4.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	3,00	$ 373.832,00	$ 1.121.496,00
2.4.8	POSTE METALICO 4MTS 180X180MM	UND	3,00	$ 2.595.356,00	$ 7.786.068,00
2.4.9	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	3,00	$ 1.543.134,00	$ 4.629.402,00
2.4.10	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	3,00	$ 67.698,00	$ 203.094,00
2.4.11	AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO DE 1½"	UND	3,00	$ 164.546,00	$ 493.638,00
2.4.12	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 # 14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	13,50	$ 41.192,00	$ 556.092,00
			COSTO SUBTOTAL		$ 20.044.918,00
2,5	CUBIERTA METALICA				
2.5.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	9,04	$ 5.065,00	$ 45.787,60
2.5.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	4,07	$ 87.080,00	$ 354.415,60
2.5.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	440,08	$ 8.508,00	$ 3.744.200,64
2.5.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	5,40	$ 555.667,00	$ 3.000.601,80
2.5.5	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,38	$ 889.938,00	$ 3.007.990,44
2.5.6	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,69	$ 955.493,00	$ 659.290,17
2.5.7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3127,07	$ 23.012,00	$ 71.960.134,84
2.5.8	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	159,58	$ 21.035,00	$ 3.356.765,30
2.5.9	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	UND	24,00	$ 8.839,00	$ 212.136,00
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	71,59	$ 42.494,00	$ 3.042.145,46

2.5.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	9,78	$ 106.066,00	$ 1.037.325,48
2.5.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	$ 24.458,00	$ 146.748,00
2.5.13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	$ 33.070,00	$ 132.280,00
			COSTO SUBTOTAL		**$ 90.699.821,33**
	COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)				**$ 240.294.876,20**
				ADMINISTRACIÓN 26%	$ 62.476.667,81
				IMPREVISTOS 1%	$ 2.402.948,76
				UTILIDAD 4%	$ 9.611.795,05
				AIU 31%	$ 74.491.411,62
				TOTAL COSTO PRESUPUESTO	**$ 314.786.287,82**

5. JUSTIFICACION PRORROGA

Durante el proceso constructivo que se estaba llevando a cabo, se llevó realizo una visita de inspección de los profesionales asociados al proyecto, durante la cual se definió un detallado plan de trabajo. en este plan, las primeras tareas identificadas incluyeron la localización y replanteo de la cubierta, el descapote mecánico y la identificación de los otros elementos a ser construidos o suministrados según lo establecido en el proyecto.

Una vez que la línea de trabajo estuvo definida, se iniciaron las labores de localización, logrando así realizar el descapote de la zona de intervención y suministrar algunos metros cúbicos de material. sin embargo, en el proceso de adquisición de materiales, se enfrentó un imprevisto importante: dos de los proveedores no informaron del cierre de sus actividades antes de realizar las consignaciones correspondientes.

Este problema surgió luego de que las consignaciones se efectuaran el 18 de diciembre de 2023, mientras que los comunicados de cierre de actividades por parte de los proveedores llegaron los días 20 y 21 de diciembre. dada esta inesperada situación, se torna imperativo gestionar una prórroga del contrato, a fin de permitir la ejecución de las partidas que requieren los insumos suministrados por estos proveedores.

Cabe recalcar que las actividades no se verán interrumpidas en el tiempo que se encuentre la obra en prorroga, ya que el material que se presenta en obra alcanza para realizar algunas de ellas, no obstante, la solicitud de prorroga se realiza para obtener un plazo de tiempo mientras los proveedores retoman actividades y así mismo se pueda cumplimiento al contrato.

Adicionalmente a la situación de los materiales también se desea indicar que del 100% del tiempo del contrato llovió el 33.00% del tiempo, presentándose lluvias los días 19, 20, 21, 27 y 28 de diciembre del presente año

6. CONCLUSIONES

En resumen, la solicitud de prórroga presentada se basa en circunstancias fuera del control del CONSORCIO ESPACIOS PUERTO, específicamente, la falta de disponibilidad inmediata de materiales esenciales por parte del proveedor, que ha sido notificada para el período hasta los días 20 y 21 de diciembre del año actual. A pesar de que el consorcio realizó una consignación de fondos anticipada para asegurar el suministro oportuno, las demoras en la entrega de los materiales son inevitables y están debidamente respaldadas por un comunicado oficial emitido por el proveedor.

En vista de estas circunstancias, la solicitud de prórroga de un mes se justifica plenamente. La extensión del contrato por este período adicional es necesaria para garantizar que el consorcio pueda adquirir y recibir los materiales esenciales de manera oportuna. Esto, a su vez, es crucial para cumplir con los términos y objetivos estipulados en el contrato y asegurar la ejecución satisfactoria de las actividades programadas.

En conclusión, la solicitud de prórroga se basa en hechos justificables y tiene como objetivo principal salvaguardar el cumplimiento exitoso de las obligaciones contractuales del consorcio ante las circunstancias imprevistas y ajenas a su control.

Las actividades de ejecución de obra no se verán interrumpidas en el tiempo de prórroga, se realizarán actividades que no requieren los insumos de los dos proveedores que no suministraran materiales por el tiempo ya mencionado.

Se necesita recuperar el 33.00 % del tiempo perdido debido a las condiciones climáticas presentadas durante el periodo de ejecución de actividades (los días 19, 20, 21, 27 y 28 de diciembre del presente año)

IVANA DURLEY BRICEÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESPACIOS PUERTO

- ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRESENTE PERIODO



DESTACOPE Y DESMONTE



DESCAPOTE Y DESMONTE



LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.



LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.



Relleno con material mixto de rio sin procesar max 3", suministro extendido y nivelación.



Relleno con material mixto de rio sin procesar max 3", suministro extendido y nivelación.

Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta

Consorcio espacios puerto
NIT 901.781.193

Teléfono:
-

(Comprobantes de egreso) Comprobante contable No. **CC-10-101**

Fecha de elaboración 2023-12-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LA ESMERALDA MINA RIO GUATIQUIA		PAGO CONCRETO MATERIAL MODULAR	10,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LA ESMERALDA MINA RIO GUATIQUIA		PAGO CONCRETO MATERIAL MODULAR,Caja general	0.00	10,000,000.00
				Total	10,000,000.00	10,000,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

Arcoe S.A.S.
N.I.T. 900.783.521-1

www.arcoe.co 313 - 629 8651
info@ferremetalicascolombia.com
@arcoeig @arcoefb @arcoetw

arcoe
Hechos de Acero

Villavicencio, 20 diciembre de 2023

CIRCULAR

A NUESTROS CLIENTES

Se les informa a nuestros clientes que se realizara cierre al público desde el día 23 de diciembre y retomamos labores el día 15 de enero en el horario habitual, ARCOE SAS les desea una feliz navidad y un feliz año.

Cordialmente,

DIOGENES PARRADO PARRADO
Gerente

SAS
CANCELADO
DIR - CLL
PORVENIR

Powered by CamScanner

LA ESMERALDA
MINA RIO GUATIQUIA

NIT.:17.321.114-0 REGIMEN COMUN

Puerto López – Meta – 21 de diciembre de 2023

Cordial Saludo;

A QUIEN INTERESE


Mina la esmeralda se permite informar a todos nuestros estimados clientes y proveedores, que por motivo de las festividades de fin de año se encuentra programado el cierre de atención al público y labores administrativas para el día 23 de diciembre de 2023 y se retomaran labores el día 9 de enero de 2024.

Por favor, tener en cuenta la información anterior, en la programación de sus actividades o requerimientos. Cualquier información adicional o inquietud por favor no dude en contactarnos.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la oportunidad y confianza depositada en nosotros durante el año 2023

LUIS BELTRAN SUA VELANDIA
Gerente

CALLE 6 Nº 7-38 SEGUNDO PISO CENTRO FAX:(8) 645 17 65 CELULAR: 311 477 70 82 -313 499 40 60 lbsinversiones@hotmail.com. PUERTO LOPEZ (META)

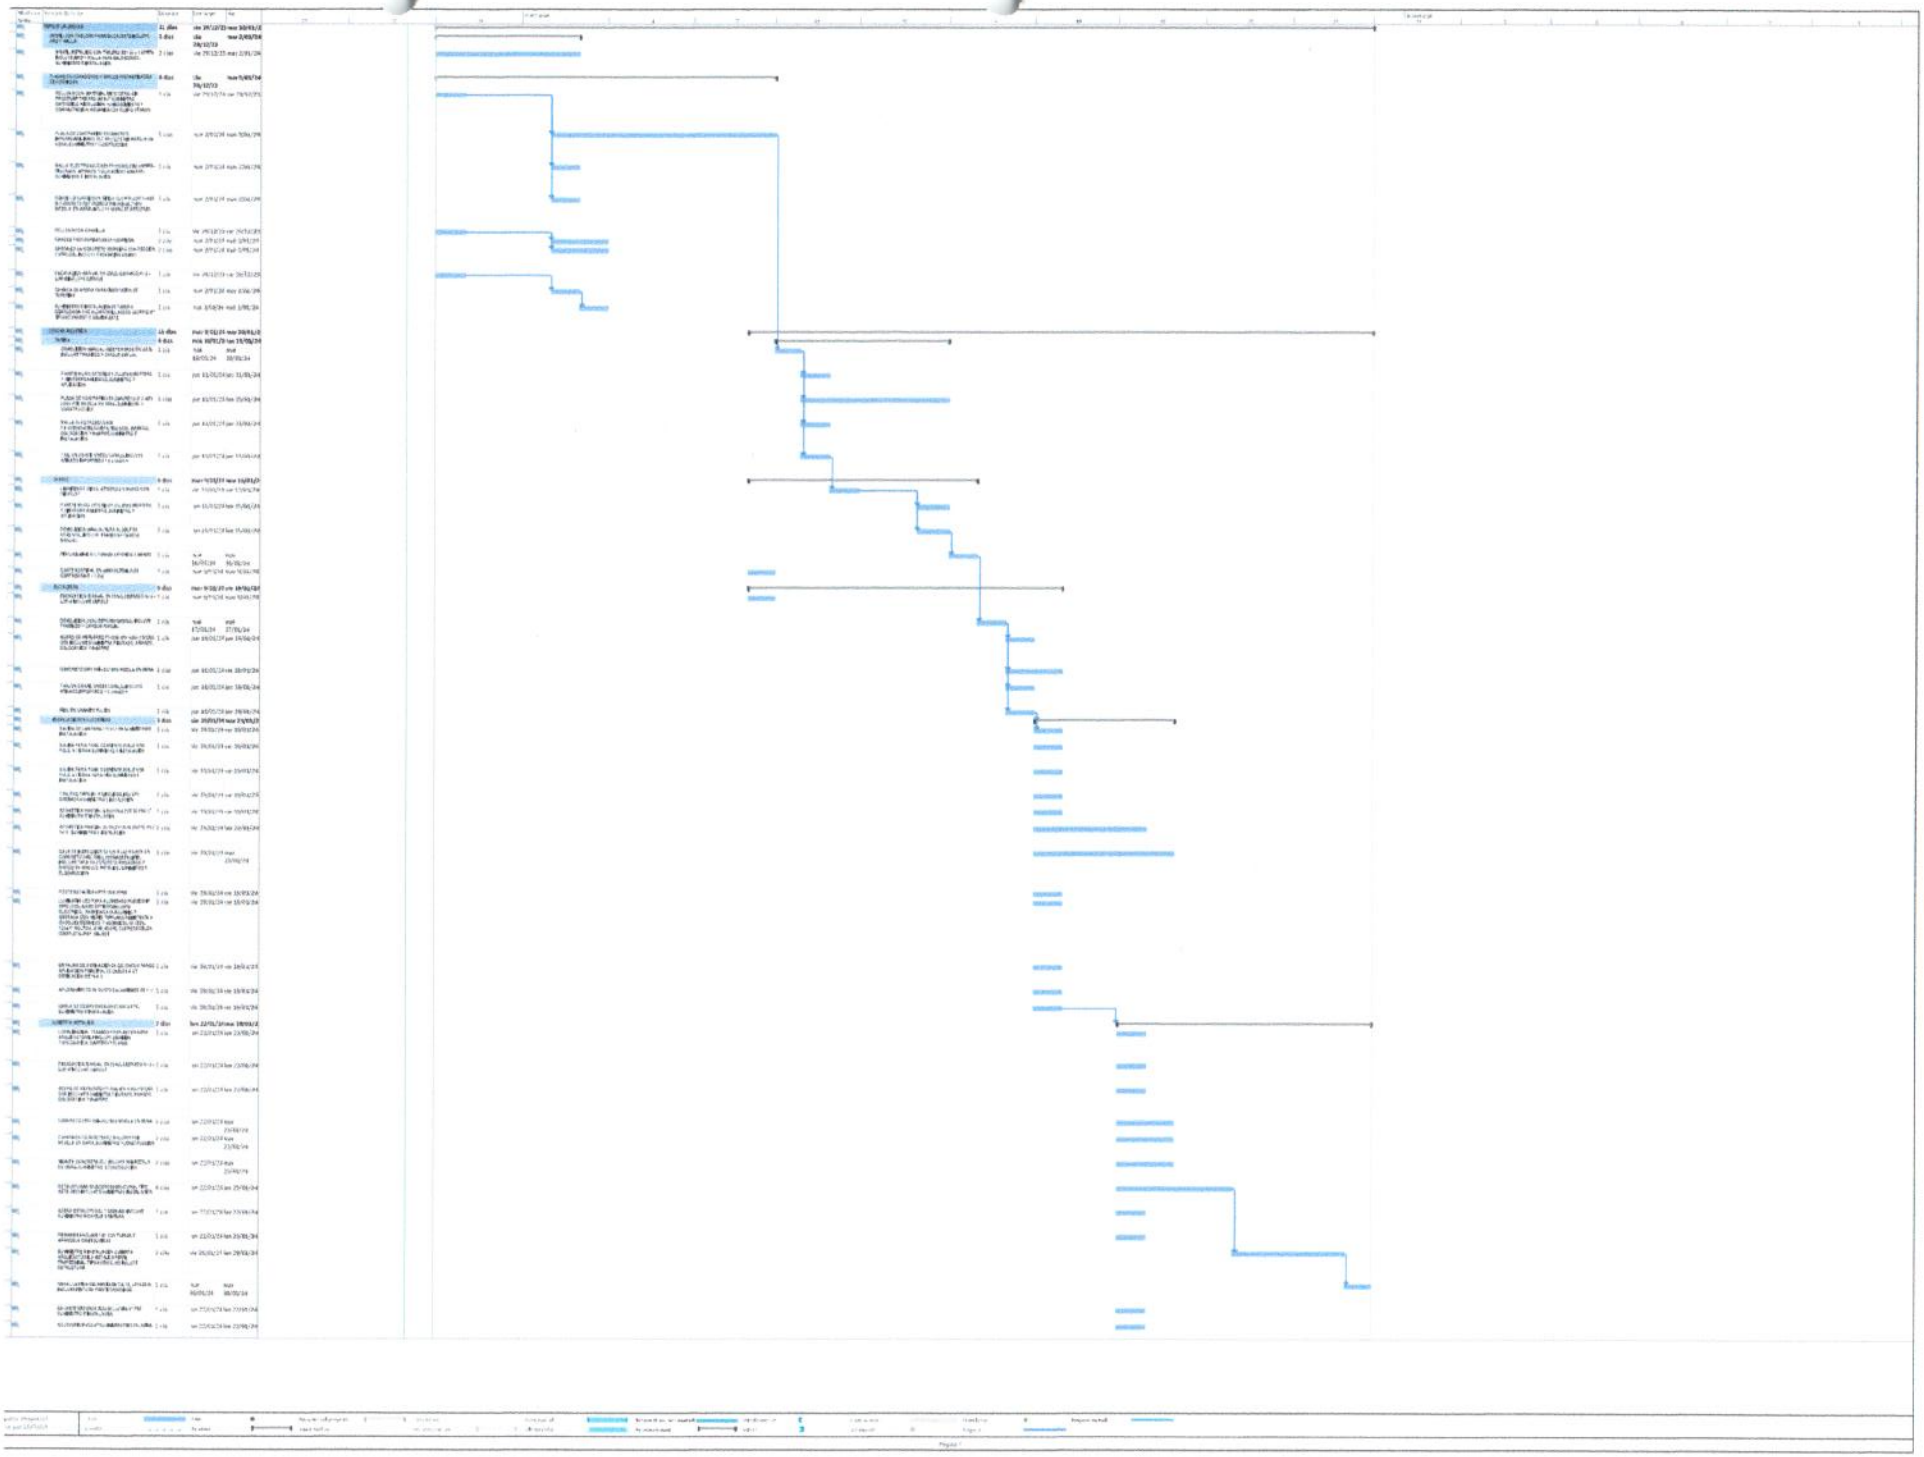

PARQUE LA LAGUNA	15-24 de diciembre 2023	24-31 de diciembre 2023	1-7 de enero de 2023	8-14 enero 2023	15-21 enero 2023	22-30 de enero 2023
	$ 12,311,771	$ 128,159,072	$ 23,302,826	$ 30,204,310	$ 117,456,811	$ 3,351,502
MÁSTIL CON TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE ARO Y MALLA	$ 2,366,532	$ 2,366,532				
MÁSTIL METÁLICO CON TABLERO DE 1,20 x 1,80MTS INCLUYE ARO Y MALLA PARA BALONCESTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 2,366,532	$ 2,366,532				
PLACAS EN HEXÁGONOS Y BANCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN	$ 9,945,239	$ 125,792,540	$ 13,570,381			
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	$ 7,906,468					
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 54,281,526	$ 13,570,381			
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 46,812,548				
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO		$ 565,660				
RELLENO CON GRAVILLA	$ 1,399,952					
BANCOS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN		$ 15,895,643				
CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO		$ 3,695,458				
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	$ 638,819					
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		$ 6,059				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 4,535,646				
CONCHA ACÚSTICA			$ 9,732,444	$ 30,204,310	$ 117,456,811	$ 3,351,502
TARIMA			$ 9,005,850	$ 1,169,916		
DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL			$ 196,380			
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN			$ 485,424			
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN			$ 2,339,831	$ 1,169,916		
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN			$ 1,651,863			
TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m			$ 4,332,352			
MUROS			$ 501,867	$ 1,935,982		
LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET			$ 472,427			
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				$ 898,666		
DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL				$ 102,936		

PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				$ 934,380		
CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM			$ 29,440			
ESCALERAS			$ 224,727	$ 2,831,114		
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE			$ 224,727			
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL				$ 240,502		
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE				$ 386,414		
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA				$ 1,215,633		
TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m				$ 629,154		
PISO EN GRANITO PULIDO				$ 359,411		
INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 24,267,298	$ 1,991,546	
SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN				$ 590,784		
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN				$ 819,649		
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN				$ 662,870		
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN				$ 565,270		
ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				$ 2,221,433		
ACOMETIDA PARCIAL AL 2No2+1 No10 DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				$ 1,012,106	$ 1,012,106	
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN				$ 489,720	$ 979,440	
POSTE METALICO 4MTS 180X180MM				$ 10,199,749		
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I				$ 6,064,517		
EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8				$ 266,053		

AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO DE 1½"				$ 646,666		
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 # 14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				$ 728,481		
CUBIERTA METALICA					$ 115,465,265	$3,351,502
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS					$ 59,982	
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE					$ 464,284	
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE					$ 4,904,903	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA					$ 3,930,788	
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					$ 3,940,467	
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					$ 863,670	
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN					$ 94,267,777	
ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)					$ 4,397,363	
PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD					$ 277,898	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA					$ 1,992,606	$ 1,992,606
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS						$ 1,358,896
BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN					$ 192,240	
ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					$ 173,287	

INFORME N° 01
PERIODO DEL 15, 12, 23 AL 29, 12, 23
FECHA DE PRESETANCION: 28, 12, 23
INFORME No.1 PRORROGA

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	*CONTRATO DE OBRA*			
CONTRATO N° :	*100-103-13-09-0004-2023*			
OBJETO CONTRATO :	*"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"*			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($314.786.287,82)*			
CONTRATISTA:	*CONSORCIO ESPACIOS PUERTO*			
CORREO ELECTRONICO:				
FECHA DE INICIACIÓN:	*15 DE DICIEMBRE DEL 2023*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		***Meses***	*15*	***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*29 DE DICIEMBRE DEL 2023*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*N/A*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*N/A*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ*			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*15 DE DICIEMBRE DEL 2023*			
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*			

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	***PUERTO LOPEZ***	***VEREDA:***	***N/A***
CORREGIMIENTO:	***N/A***	***BARRIO:***	***LA LAGUNA***
COORDENADAS:	***4°05'35.3"N 72°57'18.6"W***		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co


A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico

AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
100%	15%

Grafica Avance Físico

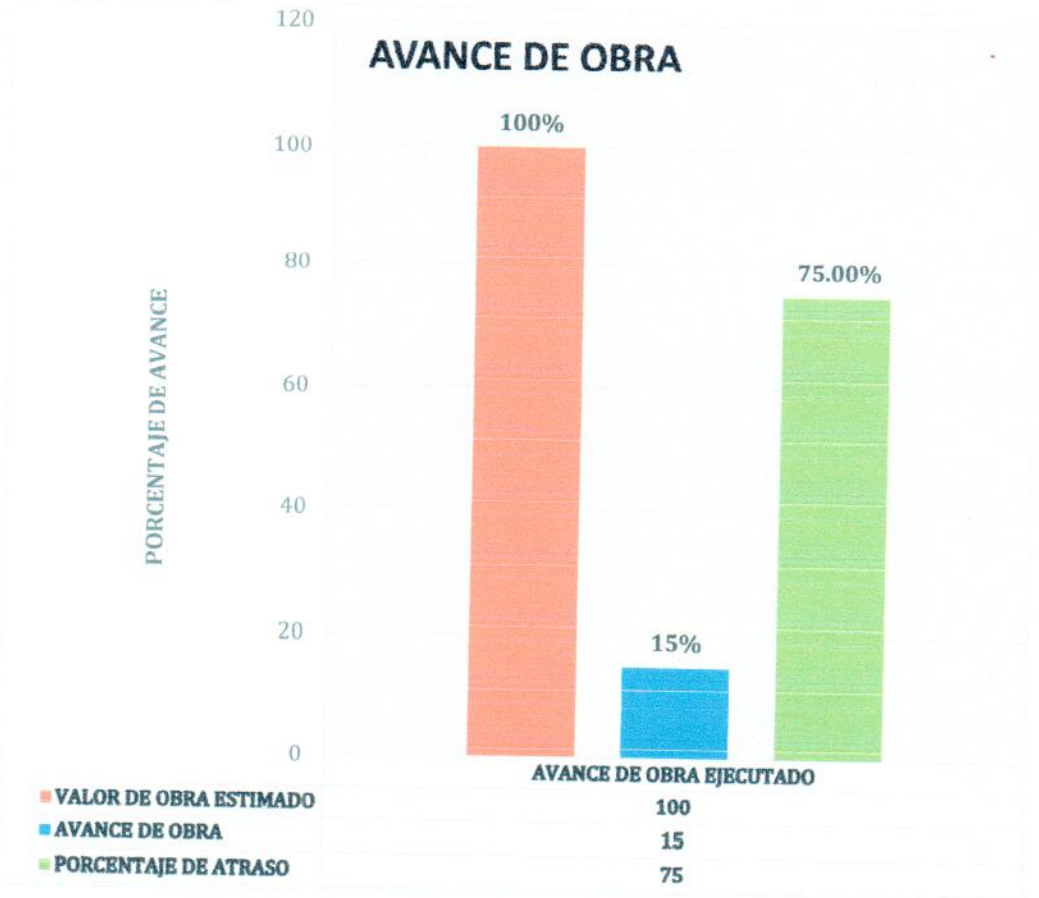

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

En el transcurso del avance del proyecto se realizó la siguiente acta:

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
15/12/2023	001	ACTA DE INICIO	IVANA DURLEY BRICEÑO	

B. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
YADY JOHANNA HERRERA DIAZ	INGENIERA RESIDENTE	100%

C. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. GARANTIAS:

POLIZA ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100038209
ANEXO N°	N/A
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100010178
ANEXO N°	N/A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	15/12/2023
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14/12/2023	29/04/2024	$ 31.478.628,80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/12/2023	29/12/2026	$ 15.739.314,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/12/2023	29/12/2023	$ 232.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	29/12/2023	29/12/2028	$ 62.957.257,60
			$ 342.175.201,80

POLIZA ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100038209**
ANEXO N°	**N/A**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100010178**
ANEXO N°	**N/A**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**22/12/2023**
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14/12/2023	29/04/2024	$ 31.478.628,80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/12/2023	29/12/2026	$ 15.739.314,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/12/2023	29/12/2023	$ 232.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	29/12/2023	29/12/2028	$ 62.957.257,60
			$ 342.175.201,80

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

D. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

- *SE REALIZA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR PARTE DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EL RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DE LOS PUNTOS AL ÁREA A EJECUTAR DE LA OBRA.*

- *SE RECIBE MATERIAL DE RELLENO MIXTO DE RÍO EN OBRA PROCESADO, AL CUAL SE LE REALIZA EL PROCESO DE EXTENSIÓN Y SUMINISTRO AL ÁREA DONDE SERÁ EJECUTADA LA OBRA*

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA .

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.2.1	PLACAS EN HEXÁGONOS Y BANCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN	EJECUTADO	%
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	80,65 m3	50



OBSERVACIONES
Se realiza suministro y descargue de material mixto de río, en el área a ejecutar la obra.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.5.1	CUBIERTA METALICA	EJECUTADO	%
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	9,04 m2	100



OBSERVACIONES
Localización y replanteo por parte de la comisión topográfica, en el sector donde se llevara a cabo la obra.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

F. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA – SUSPENSIÓN - REINICIO

Como supervisor, puedo confirmar que durante el proceso constructivo en curso, se llevó a cabo una visita de inspección por parte de los profesionales asociados al proyecto. Durante esta inspección, se delineó un plan de trabajo detallado que incluía las primeras actividades a realizar, como la localización y replanteo de la cubierta, el descapote mecánico y la identificación de otros elementos necesarios según lo establecido en el proyecto.

Una vez establecida la secuencia de trabajo, se iniciaron las labores de localización, permitiendo realizar el descapote en la zona de intervención y suministrando cierta cantidad de material. Sin embargo, se enfrentó un imprevisto relevante durante la adquisición de materiales, ya que dos proveedores no informarán sobre el cese de sus actividades antes de recibir las consignaciones correspondientes.

Este problema surgió después de realizar las consignaciones el 18 de diciembre de 2023, mientras que los avisos de cierre de actividades por parte de los proveedores se recibieron los días 20 y 21 de diciembre. Dada esta situación inesperada, considera esencial gestionar una prórroga del contrato para permitir la ejecución de las partidas que requieren los insumos suministrados por estos proveedores.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La supervisión reviso, avalo y aprobó la solicitud de prórroga por parte del Consorcio Espacios Puerto en calidad de contratista de obra, para el contrato No. 100-103-13-09-0004-2023.

El contratista manifiesta que continuaran labores de actividades que no se ven afectadas por el cierre de los proveedores



Firma

Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ

SUPERVISOR ASIGNADO

N° Matrícula Profesional:

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE COMITE	Código: F – 166
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

Acta N°:	01	Fecha (dd/mm/aa):	26 - 12 - 2023
Ubicación:	barrio la laguna Pto lopez	Hora Inicio:	8:00 am
		Hora Final:	10:00 am
Responsable:		Contrato:	100-103-13-09-0034-2023
Objetivo de la reunión:	Solicitud prorroga N.1 Por parte del contratista		
Dirige la Reunión:		Diligencia la presenta acta:	

1. **Asistentes**

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Nana Dulley Bikem	representante legal	Consorcio espacios puerto	
Maverly espinosa S	supervisora	Alcaldia Pto lopez	
Yady Herrera	residente de obra	Consorcio espacios puerto	Yady Herrera

2. **Agenda de la reunión (Temas)**

1.	Socialización de problematica presentada con proveedores
2.	Solicitud de prorroga por parte del contratista
3.	
4.	

3. **Seguimiento a compromisos de Comités anteriores**

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación
–	–	–	–

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

1	Se realizaron consignaciones a dos proveedores (Material granular
2	y aceros) manifestando ellos a los 2 días que cerraban actividades
3	hasta el 15 de enero, debido a esto es necesario realizar una
4	Prorroga de 1 mes para poder las actividades correspondientes a estos insumos

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Ejecutar las actividades que no dependen de estos insumos	Contratista de obra	—	—
Entregar la prorroga antes del 29 de diciembre	Contratista de obra	28/12/23	—

6. Información de la próxima Reunión

Fecha:	
Hora:	
Lugar:	

Convocados:
—

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	—
2	—
3	
4	

ACTA DE PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 100-103-13-09-0004 DE 2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META Y CONSORCIO ESPACIOS PUERTO

CONTRATO DE OBRA N°	100-103-13-09-0004-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
CONTRATISTA	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO IDENTIFICADO CON NIT No. 901781193-1 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR IVANA DURLEY BRICEÑO IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N 1.122.137.612
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"
VALOR:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($314.786.287,82)
PLAZO:	HASTA EL 29 DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE CONTRATO:	14 DICIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO DE CONTRATO:	19 DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	29 DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No. 1	28 DICIEMBRE DE 2023
PLAZO PRORROGA No. 1	30 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	**28 ENERO DE 2024**

Entre los suscritos a saber **RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.876.446 de Villavicencio, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**, en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designado mediante Decreto No. 103 del 15 de octubre de 2021, y acta de posesión No. 071 del 19 de octubre de 2021, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 035 de 2 de febrero de 2016, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por otra CONSORCIO ESPACIOS PUERTO identificado con el NIT No. 901781193-1 y representado legalmente por IVANA DURLEY BRICEÑO identificada con la cedula de ciudadanía N 1.122.137.612 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente Acta de prorroga N 2 al presente Contrato que se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes:

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

CONSIDERACIONES:

a) Que las partes celebraron el contrato el día catorce (14) diciembre de dos mil veintitrés.

b) Que el contrato fue iniciado el diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés.

c) Que la fecha de terminación inicial del contrato es el día veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintitrés.

d) Que mediante oficio de fecha 28 de diciembre de dos mil veintitrés, la representante legal del contrato de obra IVANA DURLEY BRICEÑO, solicita a la supervisora del contrato la viabilidad para realizar la prórroga N 1 del contrato indicando lo siguiente: *"Durante el desarrollo del proceso constructivo, se efectuó una inspección por parte de los profesionales vinculados al proyecto. En dicha visita, se elaboró un pormenorizado plan de trabajo, las primeras tareas identificadas en este plan incluyeron la ubicación y reorganización de la cubierta, el descapote mecánico, y la identificación de otro elementos a ser construidos o suministrados conforme a lo establecido en el proyecto. Una vez establecida la línea de acción, se iniciaron los trabajos de ubicación, facilitando así la realización del descapote de la zona de intervención y la entrega de algunos metros cúbicos de material, no obstante, durante la adquisición de materiales, surgió un inconveniente significativo: dos de los proveedores no comunicaros el cierre de sus operaciones antes de recibir las consignaciones respectivas. Este problema se manifestó tras la fecha de consignaciones, que fue el 18 de diciembre de 2023, mientras que los avisos de cierre de operaciones de los proveedores llegaron los días 20 y 21 de diciembre ante esta inesperada contingencia, resulta imperativo gestionar una prórroga del contrato para facilitar la ejecución de las partidas que requieren los insumos proporcionados por estos proveedores. No todas las actividades se verán interrumpidas en el transcurso del cierre de los proveedores, ya que la gran mayoría de actividades se pueden ejecutar sin ningún contratiempo. Adicionalmente a la situación de los materiales también se desea indicar que del 100% del tiempo del contrato llovió el 33.00% del tiempo. Presentándose lluvias los días 19, 20, 21, 27 y 28 de diciembre del presente año. Por los temas anteriormente sustentados y teniendo en cuenta los tiempos y tramites con las entidades el tiempo solicitado es de treinta (30) días.*

e) Que el día 28 de diciembre de dos mil veintitrés, las partes (obra e supervisión) suscriben el acta de solicitud de prórroga formato F-098.

f) Que el día veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintitrés, la secretaria de infraestructura municipal allego a la oficina de contratación para el respectivo tramite y

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

publicación en SECOP II de los documentos necesarios que justifican la prorroga No. 1, la cual consta de los siguientes documentos: solicitud y aprobación por parte del supervisor, oficio de radicación, informe de contratista, informe de supervisión, acta de comité.

g) Que la presente modificación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA – PRORROGAR; El término del contrato en referencia por un término de TREINTA (30) DIAS MÁS, contados a partir del 30 de Diciembre de 2023, teniendo como nueva fecha de terminación el día **28 ENERO DE 2024.**

CLAUSULA SEGUNDA – GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, adicionándola proporcionalmente de acuerdo al tiempo pactado en la presente acta, respecto de los riesgos amparados inicialmente.

CLAUSULA TERCERA – PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION - La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

Para su legalización se requiere la aprobación de las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA CUARTA – Las demás clausulas continuarán incólumes.

En constancia de lo anterior, se suscribe por las partes en Puerto López Meta, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de dos mil veintitrés (2023).

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
EL CONTRATANTE

CONSORCIO ESPACIOS PUERTO
R.L. IVANA DURLEY BRICEÑO
EL CONTRATISTA

Proyectó: Leidy Lorena Esquivel Murcia
Profesional universitario

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 - 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co
