SGC-CP-16309-24
Neiva, enero 16 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No.437 de 2023
Asunto: Informe de interventoría No.2

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.2
2. Informes semanales
3. Actas de comité técnico
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	2	Periodo comprendido entre el :	1 de diciembre de 2023	y el:	31 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Objeto:**	"ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	437 DE 2023	**Contrato Nº:**	423 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	SOFOR INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	**Plazo Inicial:**	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	**Fecha de Inicio:**	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	**Fecha de Terminación:**	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 152.573.345,00	**Valor Inicial:**	$ 1.505.964.466,00
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	
Valor total:	$ 152.573.345,00	**Valor total:**	$ 1.505.964.466,00
Valor pagado:	$ -	**Valor pagado:**	
Valor por pagar:	$ 152.573.345,00	**Valor por pagar:**	$ 1.505.964.466,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOZO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/10/2023	22/03/2025	$ 45.772.020,00
Prestaciones sociales	30/10/2023	9/09/2027	$ 15.257.340,00
Calidad del servicio	30/10/2023	12/03/2025	$ 15.257.340,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	8/09/2027	$ 150.596.446,60
Calidad y correcto func. bienes y equipos	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Estabilidad y calidad de la obra	8/11/2023	8/09/2029	$ 301.192.893,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	8/09/2024	$ 348.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta 1		$ 19.229.353,00
		$ -

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
		$ -
		$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	5,92%	5,92%
% Ejecutado	0,00%	1,84%	1,84%
Diferencia	0,00%	-4,08%	-4,08%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ -	$ 89.102,84	$ 89.102,84	5,92%
% Ejecutado	$ -	$ 27.660,75	$ 27.660,75	1,84%
Diferencia	$ -	$ (61.442,09)	$ (61.442,09)	-4,08%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este periodo se iniciaron actividades de obra en los predios de los siguientes municipios:

Pitalito: Vereda El Carmen 150m de aislamiento en RNSC El Cedro y Vereda El Cedro 500m en RNSC El Cedro; **Palestina:** Vereda Jericó 200m de aislamiento en RNSC Miranda y vereda Mensura 212m en RNSC La reserva; **Rivera:** Vereda Termopilas se realizó limpieza y trazado del aislamiento en el predio Villa Estefany; **Acevedo:** Vereda Tocora 200m de aislamiento en el predio Rovira; **El Pital:** Vereda Mirador 400m de aislamiento en el predio humedal Laguna Natural y en el municipio de **Iquira** se adelantó la construcción del aislamiento para la posterior siembra de especies correspondientes a la restauración activa.

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	3		100,00%	0,00%	3
TÉCNICO			0,00%	0,00%	0
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	3	0	100,00%	0,00%	3
TOTALES	3		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		3	0,00%	75,00%	3
TÉCNICO	1		25,00%	0,00%	1
M.O.N.C.			0,00%	0,00%	0
TOTAL	1	3	25,00%	75,00%	4
TOTALES	4		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**2**	CQ Ingenieria & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

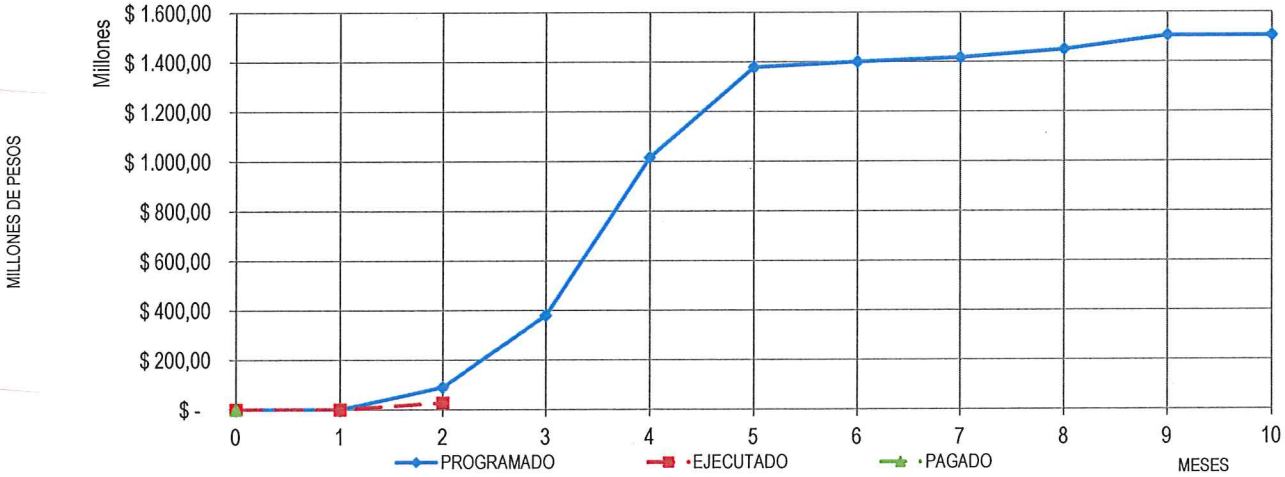

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomendó al contratista aumentar mano de obra y entrega de materiales, para mejorar el avance de obra.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Federico Pérez Charry **Cargo:** Inspector de interventoría	**Nombre:** Hermencia Zambrano Serrato **Cargo:** Coordinador de interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Representante legal

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

2

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	423 DE 2023	**Contratista:**	SOFOR INGENIERIA SAS
Periodo:	1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador contratista de obra	ANDRES FELIPE SAAVEDRA	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	PRELIMINARES				$ 1.197.967.119,00				$ -	$ 22.003.620,00	$ 22.003.620,00		$ 1.175.963.498,98
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrigrafica del rio Las Ceibas	ML	35.467,00	$ 23.408	$ 830.215.310,00		940,00	940,00		$ 22.003.620,00	$ 22.003.620,00	34.527,00	$ 808.211.689,98
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predioos adquiridos y otros) en la cuenca hodrografica del rio Las Ceibas	HA	10,00	$ 7.896.838	$ 78.968.375,00			0,00				10,00	$ 78.968.375,00
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30,00	$ 9.626.114	$ 288.783.434,00			0,00				30,00	$ 288.783.434,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 1.197.967.119,00				$ -	$ 22.003.620,00	$ 22.003.620,00		$ 1.175.963.498,98
	ADMINISTRACION		10,00%		$ 119.796.712,00				$ -	$ 2.200.362,00	$ 2.200.362,00		$ 117.596.350,00
	IMPREVISTOS		5,00%		$ 59.898.356,00				$ -	$ 1.100.181,00	$ 1.100.181,00		$ 58.798.175,00
	UTILIDAD		9,00%		$ 107.817.041,00				$ -	$ 1.980.326,00	$ 1.980.326,00		$ 105.836.715,00
	IVA		19,00%		$ 20.485.238,00				$ -	$ 376.262,00	$ 376.262,00		$ 20.108.976,00
	COSTO AIU (24.00%)				$ 307.997.347,00				$ -	$ 5.657.131,00	$ 5.657.131,00		$ 302.340.216,00
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 1.505.964.466,00				$ -	$ 27.660.751,00	$ 27.660.751,00		$ 1.478.303.714,98

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 1.505.964.466,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 1.505.964.466,00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: 0,00%
% RETEGARANTIA: 0,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00		0,00%
2					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00		0,00%
	TOTAL				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 152.573.345,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 152.573.345,00


V/R ANTICIPO: NA
% ANTICIPO: NA
% RETEGARANTIA: 10,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FVE 59	En trámite	$ 19.229.353,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 19.229.353,00	$ 133.343.992,00	12,60%
					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00	$ 133.343.992,00	12,60%
	TOTAL			$ 19.229.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.343.992,00	

cam ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	2	CQ Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS	Coordinador de obra:	ANDRES FELIPE SAAVEDRA
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de diciembre de 2023	al	31 de diciembre de 2023

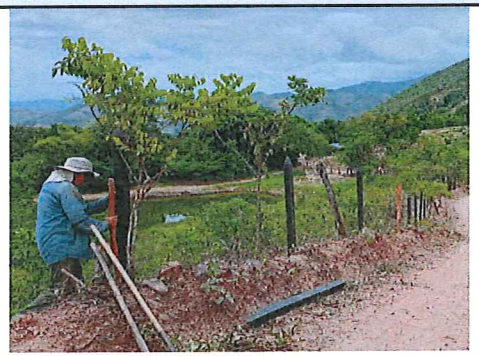FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		
AHOYADO PREDIO - MIRANDA - PALESTINA	RESGUARDO RIO NEGRO - IQUIRA	HINCADO DE POSTES - PREDIO EL CEDRO - PITALITO
FOTOGRAFÍA No.4	**FOTOGRAFÍA No.5**	**FOTOGRAFÍA No.6**
		
HUMEDAL - LAGUNA NATURAL- EL PITAL	TEMPLADO DE ALAMBRE - RNSC LA RESERVA - PALESTINA	AISLAMIENTO TERMINADO - PREDIO ROVIRA - ACEVEDO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	4-dic-23	PERIODO No.	3	DEL	27/11/2023	AL	3/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	423 DE 2023	CONTRATO No.:	437 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	279	DÍAS POR EJECUTAR	279
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	25 EQUIVALE AL 8,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	25 EQUIVALE AL 8,2%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/06/2023		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	11/06/2023		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	2/07/2023		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	75,0%	3
	TECNICO	1	0	25,0%	0,0%	1
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**1**	**3**	**25,0%**	**75,0%**	**4**
	TOTAL	**4**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se realizaron visitas en los predios del municipio de Neiva en la vereda La Plata en los predios: La Colonia, Himalaya, Lote 4 de la colonia, La Urraca y La Carolina; en la vereda Pueblo Nuevo en los predios: Barcelona y El Cedral; en la vereda Santa Lucia en el predio Veraguas, los cuales se realizaron en conjunto con el contratista de obra, Interventoría y personal de la CAM. Se evidenció que todos predios no cuentan con acceso en vehículo hasta el sitio de obra, por lo cual se requiere también transportar los materiales en acarreo de mula.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se le informó al contratista de obra, la importancia de contar con la presencia del personal que realizarán la mano de obra, con el fin de establecer y socializar las actividades a desarrollar con dicho personal.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



VISITA INICIAL PREDIO HIMALAYA - VDA LA PLATA - NEIVA



VISITA INICIAL PREDIO LA URRACA - VDA LA PLATA - NEIVA



VISITA INICIAL PREDIO VERAGUAS - VDA SANTA LUCIA - NEIVA



VISITA INICIAL PREDIO EL CEDRAL - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	11-dic-23	PERIODO No.	4	DEL	4/12/2023	AL	10/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	423 DE 2023	CONTRATO No.:	437 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	272	DÍAS POR EJECUTAR	272
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	32 EQUIVALE AL 10,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	32 EQUIVALE AL 10,5%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/06/2023		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	11/06/2023		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	2/07/2023		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	75,0%	3
	TECNICO	1	0	25,0%	0,0%	1
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**1**	**3**	**25,0%**	**75,0%**	**4**
	TOTAL	**4**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se realizaron visitas en los predios del municipio de Neiva en la vereda San Bartolo en los predios: Armenia, Villa Claudia, La Esperanza y San Andres La Rosa; Vereda Tuquila en los predios: Buena Vista, La Cabaña y Versalles y en la vereda San Miguel en el predio Buena Vista, los cuales se realizaron en conjunto con el contratista de obra, Interventoría y personal de la CAM. Se evidenció que todos predios no cuentan con acceso en vehículo hasta el sitio de obra, por lo cual se requiere también transportar los materiales en acarreo de mula. El contratista tiene previsto entrega de materiales para aislamientos.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se programó reunión para la próxima semana con la Entidad para socializar las situaciones encontradas en la visitas, con el fin de un posterior comité en la misma semana con el contratista de obra para definir y solucionar cada caso.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



VISITA INICIAL PREDIO ARMENIA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA



VISITA INICIAL PREDIO VILLA CLAUDIA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA



VISITA INICIAL PREDIO LA CABAÑA - VDA TUQUILA - NEIVA



VISITA INICIAL PREDIO BUENA VISTA - VDA SAN MIGUEL - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	18-dic-23	PERIODO No.	5	DEL	11/12/2023	AL	17/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	423 DE 2023			CONTRATO No.:	437 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	265			DÍAS POR EJECUTAR	265		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	39	EQUIVALE AL	12,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	39	EQUIVALE AL	12,8%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/06/2023		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	11/06/2023		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	2/07/2023		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	75,0%	3
	TECNICO	1	0	25,0%	0,0%	1
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**1**	**3**	**25,0%**	**75,0%**	**4**
	TOTAL	**4**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista inició la actividad de ahoyado en el predio El cedro de la vereda El Cedro en el municipio de Pitalito y en el predio Humedal Laguna Natural de la vereda Mirador en el municipio de El Pital y se inició la logística para entrega de materiales para aislamientos en los municipios de Pitalito, Rivera, La Plata, Palestina y Acevedo para la actividad de aislamiento y también entrega para restauración activa en el municipio de Iquira.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizó reunión con la Entidad y el contratista de obra, planteando las situaciones encontradas en algunos predios, a los cuales se les definió la solución en cada caso, quedando establecidas en el acta de comité del día 13 de diciembre de 2023. Además, se solicitó presentar la programación de obra detallada por semana con los ítems del contrato con el flujo de inversión.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>AHOYADO PREDIO EL CEDRO VDA EL CEDRO - PITALITO</td><td>ENTREGA DE MATERIALES VILLA ESTEFANY - RIVERA</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENTREGA DE MATERIALES</td><td>ENTREGA DE MATERIALES</td></tr>
</table>

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	26-dic-23	PERIODO No.	6	DEL	18/12/2023	AL	24/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	423 DE 2023	CONTRATO No.:	437 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	258	DÍAS POR EJECUTAR	258
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	46 EQUIVALE AL 15,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	46 EQUIVALE AL 15,1%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/06/2023		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	11/06/2023		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	2/07/2023		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	75,0%	3
	TECNICO	1	0	25,0%	0,0%	1
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**1**	**3**	**25,0%**	**75,0%**	**4**
	TOTAL	**4**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuó la actividad de ahoyado en el predio El cedro de la vereda El Cedro en el municipio de Pitalito y en el predio Humedal Laguna Natural de la vereda Mirador en el municipio de El Pital. Igualmente se dispuso a transportar materiales a los sitios de intervención a lomo de mula en los predios anteriormente mencionados.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR
Se recomienda avanzar en la entrega de materiales en los diferentes municipios para mejorar el avance contractual.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



AHOYADO PREDIO LAGUNA NATURAL - EL PITAL



HINCADO DE POSTES PREDIO LAGUNA NATURAL - EL PITAL



ENTREGA DE MATERIALES



TRANSPORTE DE MATERIALES

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	2-ene-24	PERIODO No.	7	DEL	25/12/2023	AL	31/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	423 DE 2023	CONTRATO No.:	437 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	251	DÍAS POR EJECUTAR	251
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	53 EQUIVALE AL 17,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	53 EQUIVALE AL 17,4%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/06/2023		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	11/06/2023		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	2/07/2023		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 89.102.839,92	5,92%	-4,08%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 27.660.751,02	1,84%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	75,0%	3
	TECNICO	1	0	25,0%	0,0%	1
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**1**	**3**	**25,0%**	**75,0%**	**4**
	TOTAL	4		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuó la actividad de trazado y limpieza en los predios de Villa Estefany en Rivera, se realizó ahoyado e hincado de postes en el predio Rovira de Acevedo, en el predio RNSC Miranda y el predio RNSC La Reserva de Palestina. Se inició trabajo de ahoyado en el resguardo indígena Rio Negro en el municipio de Iquira.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se insiste al contratista agilizar la entrega de materiales en los diferentes municipios para mejorar el avance contractual.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LAGUNA NATURAL - EL PITAL



RESGUARDO RIO NEGRO - IQUIRA



PREDIO ROVIRA - MUNICIPIO DE ACEVEDO



PREDIO RNSC LA RESERVA - MUNICIPIO DE PALESTINA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

ACTA No.2	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	Firma listado de asistencia adjunto
KATHERINE ARENAS (KA) - Profesional SGA CAM	Firma listado de asistencia adjunto
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
ANDERSON SUAREZ M (AS) - Apoyo Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
MARIA FERNANDA ALVAREZ (MF) - Apoyo Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No habían compromisos pendientes.

V. TEMAS TRATADOS

CQ hace la presentación de la reunión como actividad previa al comité que se tendrá el próximo miércoles 13 de diciembre a las 2:30 pm con el contratista de obra. Considera importante definir situaciones y criterios de la Corporación y la interventoría para presentar al contratista unidad de criterio al tratamiento de cada situación encontrada en campo. Informa que a la fecha se han realizado visitas iniciales en 47 de 50 predios involucrados en el proyecto, en los 3 faltantes se tuvo comunicación personal con los propietarios de los predios para informar sobre el alcance del mismo, con la aceptación por parte de ellos. Igualmente señala que se autorizó al contratista iniciar trabajos en los predios y/o municipios que no presentan ninguna observación, para ir avanzando en la ejecución del proyecto y garantizar el cumplimieto del plazo contractual. Manifiesta que ha sido oportuno el acompañamiento de los profesionales y/o técnicos de la CAM.

JC confirma la disponibilidad de la Corporación y que encuentra conformidad en el avance hasta ahora logrado en visitas. Solicita a la interventoría dar inicio a la lectura y consideraciones del informe preparado por interventoría.

CQ informa que basicamente se han encontrado las siguientes situaciones a resolver: 1) Modificaciones en el trazado de aislamientos. 2) Decisiones de propietarios de predios sobre aceptación de las actividades contractuales. 3) Situaciones de áreas disponibles para la reforestación. Procede a dar lectura predio por predio sobre actividad a realizar y observaciones o conformidad encontradas.

JC considera que los cambios de alineamiento y ubicación de los aislamiento mientras se encuentren dentro del mismo predio y conserven la cantidad contratada, es posible sin requerir trámites administrativos y/o contractuales. Referente a las decisiones de propietarios sobre aceptación de las actividades y por tener que respetar la decisión se debe buscar un tratamiento dentro de la misma zona y/o municipio. En el tema de Santa Maria, interviene KA para señalar que estas son actividades previstas en el convenio marco con la gobernación y que desde allí se deben originar los cambios respectivos, situación que de manera inmediata comunica al responsable de la gobernación en el proyecto.

Se confirma la reunión del día miercoles 13 de diciembre de 2023 con contratista de obra, para comunicar decisiones y resolver las inquietudes que presenten.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Cambios en predios de convenio CAM - Gobernación	Katherine Arenas	15/12/2023

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	____ de _____ de 2022

TEMA: Comité técnico contrato 423-de 2023 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Javier Cardoso Gutierrez.

SITIO DEL EVENTO: Oficina proyecto Ceibas. | MUNICIPIO: Neiva. | FECHA: 11-Diciembre-23 | HORA: 9: AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Lindsay Daza Salgado		X	49.609.707	Interv.437	Prof. Apoyo	Neiva	3183826935	cquizac@gmail.com	SI	LindsayDazaS
2	Maria Fda Alvarez		X	1075263752	Interventt.	Inspector	Neiva	3143479991	mafe.rodri.2392@gmail.com	SI	
3	Anderson Suarez	X		1080291745	Interventt	Inspector	Neiva	3142546444	ansumi21@hotmail.	Si	Anderson S.
4	Katherine Arenas		X	1110504696	CAM	P.U. 564	Neiva	3115613395	larenas@cam.gov.co	Si	
5	Jasiel Mejia Tovar	X		1075242023	CAM.	Tecnico	Neiva	3138022462	alextovarrios19@outlook	Si	
6	CARLOS A QUIZA	X		7042300	Interv.	Técnico	Neiva	3103214229	cquiza@gmail.com	Si	
7	Alvaro Romero	X		12108273	CAM	Tecnico	Neiva	3115343298	—	Si	
8	Jaime Cardoso C	X		7694707	CAM	PUBSA	Neiva	3107547040		Si	

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/2

ACTA No.3	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	Firma listado de asistencia adjunto
KATHERINE ARENAS (KA) - Profesional SGA CAM	Firma listado de asistencia adjunto
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
ISABEL CHAVES (IS) - Profesional Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
NICOLÁS CARDOZO BARRETO (NC) - Ingeniero campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
ARIEL ALBEIRO ARIAS (AA) - Técnico campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
RAMIRO DEVIA GALINDO (RD) - Ingeniero campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No habían compromisos pendientes.

V. TEMAS TRATADOS

JC informa que el propósito de la reunión es que con base a las visitas realizadas por personal del contratista, la interventoría y la Corporación, se presente el diagnóstico de la situación real de las actividades a ejecutar en cada uno de los predios conforme al alcance de los ítems del contrato y así definir o resolver cada caso, y que pueda el contratista programar y desarrollar la logística para el inicio de las actividades contractuales y de ser necesario balancear dichas actividades y metas previstas. Invita a la empresa contratista que presente el informe correspondiente, teniendo en cuenta que como Supervisor tiene conocimiento, a través, de la interventoría de algunas situaciones encontradas.

CQ toma la palabra para informar que con base a las visitas realizadas y al informe que han rendido los inspectores de interventoría, y para buscar soluciones integrales y generalizadas para la debida programación de la logística de materiales, mano de obra y demás aspectos relevantes. Igualmente estas definiciones permitirán a futuro, de encontrarse nuevas situaciones, se puedan tomar decisiones en campo conforme a estas definiciones. Considera que para efecto de buscar soluciones integrales, las situaciones que se han encontrado se pueden agrupar de la siguiente manera: 1) Modificaciones en el trazado de aislamientos. 2) Decisiones de propietarios de predios sobre aceptación de las actividades contractuales. 3) Situaciones de áreas disponibles para la reforestación.

IS encuentra acertada la agrupación de situaciones presentada por la interventoría y considera que los lineamientos que se den hoy, servirán para resolver cada situación. En general refleja lo encontrado en las visitas, salvo algunos casos puntuales, especialmente lo referente a cambios de predios por las razones que se han expuesto. Insiste en la confirmación de la propuesta de instalar postes de madera y pie de amigo en sectores de cambio de dirección y cada 30 metros para garantizar la vida útil del aislamiento construido, el contratista de la ejecución de la obra renuncia a cualquier reclamo o consideración adicional a lo contractual. Expone el caso de que en las especificaciones se señala que se deben hacer cortes al alambre cada 60 metros, considera que no es conveniente técnicamente estos cortes, además que puede generar un mayor desperdicio para el contratista y que con la instalación de postes en madera estos tendidos pueden y deben ser más largos. Insiste SOFOR sobre la definición de especies para cada zona de acuerdo a la altura o zona de vida de cada predio.

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/2

ACTA No.3	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

JC toma la palabra para precisar la solución para cada una de las situaciones encontradas en los informes de visitas presentados por interventoría y confirmados por el contratista de obra. Para el primer caso (Modificaciones en el trazado de aislamientos), considera no hay inconvenientes siempre y cuando los cambios de alineamientos y/o ubicación se den dentro del mismo predio y conserven las cantidades contractuales, y correspondan a razón que deben quedar reflejadas en los informes de obra e interventoría. Se debe en ese caso volver a hacer la georreferenciación del nuevo trazado. Para el segundo grupo (Decisiones de propietarios de predios sobre aceptación de las actividades contractuales) señala que siendo voluntad del propietario su participación en el proyecto, esto debe ser consignado en los informes y proceder a informar a la Entidad para la toma de decisiones de cambios o sustitución, de ser posible, puesto que deben ser analizados algunos aspectos sobre el alcance del programa que dio origen al proyecto y contrato. Sobre el punto o grupo tercero (Situaciones de áreas disponibles para la reforestación) toma la palabra KA para informar que exactamente el tema de Santa María, corresponde al proyecto que se desarrolla en convenio con la Gobernación, ya se encuentran adelantadas reuniones para las modificaciones correspondiente las cuales seguramente serán en el mismo municipio en predios que recientemente ha adquirido la Gobernación y que esto será comunicado posteriormente, como también los cambios que desde un inicio se plantearon.

JC y KA proponen al contratista que sobre el tema de especies para reforestación según la altitud, envíen un oficio con una propuesta de especies a utilizar y esta se pondrá a disposición de los técnicos de la entidad para las definiciones correspondientes en el menor tiempo posible.

LD recuerda al contratista SOFOR sobre la presentación de informes, el informe 1 debe ir hasta el 30 de noviembre y ya debió ser entregado. Igualmente, SOFOR debe entregar el cronograma de ejecución del total del proyecto, este cronograma debe tener un flujo de inversión. Recuerda que en el clausulado del contrato está como compromiso contractual presentar el plan de vacunación completado de los integrante del equipo de trabajo con vigencia máxima de dos años.

Se confirma al contratista que realice la programación de ejecución de actividades con los predios que no tienen novedad en el alcance de la actividad a ejecutar, se ponga en conocimiento de la interventoría la programación para el respectivo seguimiento, control y acompañamiento.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Informes, cronograma de trabajo e inversión, esquemas de vacunación.	SOFOR	18/12/2023
Programación detallado de inicio coherente con programación general	SOFOR	18/12/2023
Nuevos beneficiarios	CAM - KA	16/01/2024

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2023.

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	_____de _____ de 2022

TEMA: Comité resultado visitas predios Cto. 423-2023 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

SITIO DEL EVENTO: Sala de Juntas Archivo - CAM. MUNICIPIO: Neiva FECHA: 13-12-2023 HORA: 2:30 pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1.	Katherine Arenas		x	1110504646	CAM	Prof Biod.	Neiva	3115613355	katarenteam.gov.co	si	
2	Lindsay Daza S.		x	49.609.707	Intervent.	Apoyo Profes.	Neiva	3183826935	cgarzac@gmail.com	SI	Lindsay Daza S.
3	Isabel Chaves S.		x	1.002.363[illegible]	sofor	Ing proyecto	Ibagué	3163490[illegible]	ifchsa@gmail.com	SI	
4	Nicolás Cardozo B.	x		1.110.582.681	sofor	Ing Campo	Ibagué	3167[illegible]94	soforingo@gmail.com	S.	Nicolás Cardozo
5	Ariel Albeiro Arias	x		93382399	Sofor	Técnico	Ibagué	31[illegible]9378	" "	SI	
6	Ramiro Devia Galindo	x		93359580	sofor ing.	ingeniero	Ibagué	31722900 05	" "	si	
7	Carlos A. Quiza	x		79.142.300	Interven	Directo del	Neiva	3103214229	cquizac@gmail.com	si	
8	Javier Cardozo Gutierrez	x		7694587	CAM	PUSCA	Neiva	3107557070	proyectos@camsurco	si	

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES:_____ MUJERES:_____

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28432877	I	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.300	4.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	28432877	2024-01-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28432877	I	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.300	4.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	28432877		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	2.700	0	226.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	2.700	0	226.700
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	2.100	0	177.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	2.100	0	177.100
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	4.900	0	411.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28776096	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.510.200	17.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28776096	2024-01-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28776096	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.510.200	17.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28776096		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	771.200	0	9.100	0	780.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	585.600	0	6.900	0	592.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	2.200	0	187.800
EPS(Administradoras: 2)				3	192.800	0	2.400	0	195.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.400	0	600	0	47.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	146.400	0	1.800	0	148.200
ARP(Administradoras: 1)				3	335.600	0	4.000	0	339.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	335.600	0	4.000	0	339.600
CCF(Administradoras: 1)				3	192.800	0	2.300	0	195.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	192.800	0	2.300	0	195.100
Gran Total					1.492.400	0	17.800	0	1.510.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28567297	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.706.800	77.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	28567297	2024-01-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7704482	MANCHOLA PERDOMO JORGE HUMBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
2	CC 12277033	BENITEZ RAMIREZ JAIBER	1.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5711001
3	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.160.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	173.600	S	5711001
4	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1006794608	URREGO AGUILERA JUAN STEVEN	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
6	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
7	CC 1075304691	PLAZA PINZON ANGIE DANIELA	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
8	CC 1077865950	BARRERA PALENCIA FABIAN LEONARDO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
9	CC 1077867784	HERNANDEZ VALENCIA PAOLA ANDREA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
10	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000	F																0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	450.000	72.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	450.000	18.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	450.000	18.000	450.000	31.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	139.400	S	5711001
11	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000	F											X					0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	812.001	130.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	812.001	32.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	812.001	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	162.500	S	5711001
12	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.575.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.575.000	252.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.575.000	63.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.575.000	63.000	1.575.000	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	487.700	S	5711001
13	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28567297	E	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.706.800	77.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	28567297		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.137.001	22.297.001	22.297.001	21.485.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	3.382.000	0	39.700	0	3.421.700
PROTECCION	230201	800229739	0	3	732.000	0	8.600	0	740.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.962.000	0	23.000	0	1.985.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	688.000	0	8.100	0	696.100
EPS(Administradoras: 3)				12	891.900	0	10.500	0	902.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	1.900	0	161.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	485.500	0	5.700	0	491.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	246.400	0	2.900	0	249.300
ARP(Administradoras: 1)				12	1.495.600	0	17.600	0	1.513.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	12	1.495.600	0	17.600	0	1.513.200
CCF(Administradoras: 1)				12	859.400	0	10.100	0	869.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	12	859.400	0	10.100	0	869.500
Gran Total					6.628.900	0	77.900	0	6.706.800
