	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	4
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	23/12/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:** 1/12/2023	**AL:** 22/12/2023
CONTRATO Nº	141-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	R&M - ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE.		
FECHA DE INICIO	27/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22/12/2023

VALOR INICIAL	$ 37.737.224,35	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 26.313.116,13	**VALOR TOTAL**	$ 11.424.108,22

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

SE REALIZA INFORME DE SUPERVISIOR A CORTE 22 DE DICIEMBRE DICIEMBRE DEL 2023, DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO, NO SE REALIZA ADICIONA NI PRORROGA EL CONTRATO DEBIDO A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE SU EJECUCIÓN.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PALACIÓS ARBOLEDA YIMMY JAVIER	1	**40**	**0**	NO	NO SE HACE PRESENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZA REDUCCION
						ANGELICA MARIA MANES HERNANDEZ	1	**100**	**100**	SI	CUMPLE DE ACUERDO CON LO EXIGIDO EN EL ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS
						MOSQUERA IBARGUEN FREDY	1	**50**	**0**	NO	NO SE HACE PRESENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZA REDUCCION
						ROJAS POTES JULIO ANDRÉS	1	**15**	**0**	NO	NO SE HACE PRESENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZA REDUCCION
						TRONCOSO FLOREZ LUZ MARINA	1	**15**	**0**	NO	NO SE HACE PRESENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZA REDUCCION
						PACHON FAJARDO ADRIANA	1	**15**	**0**	NO	NO SE HACE PRESENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZA REDUCCION
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN


PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	8,22%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	5,01%	**29,80%**	**100,00%**	**-70,20%**
Semana 2	3,61%			
Semana 3	12,96%			
Semana 4	0,00%			
Semana 5	0,00%			

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS POR INTERVENTORIA. (REPORTADO POR RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y VALIDADO POR LA SUPERVISION)

Se presentan retrasosde vidrio y cubierta por parde del el proveedor, que el contratista propone subsanar en la siguiente semana. Se solicita un plan de contingencia para subsanar los tiempos retrasados

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**29,80%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA ADELANTADO EN AVANCE DE OBRA EN UN 4.54% EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN POR LO QUE SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA SEGUIR CON EL EXTRICTO CUMPLIMIENTO DEL ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE OBRA.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	26	26	0
Proyección	44,252	26	18,252

NOTA GENERAL: INTERVENTORIA NO SE REALIZA ADICION DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR REDUCCIONES, DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS A LA FECHA DE CORTE 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, Y SE CULMINA EL CONTRATO.

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACIÓN DE PLAN DE CALIDAD	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL- OBRA	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN DE PLAN SST- OBRA	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN BALANCE INICIAL OBRA	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN DESGLOSE DE APUS	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN INFORME 2 AMBIENTAL- OBRA CORTE 22 DIC 2023	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN INFORME 2 SST- OBRA CORTE 22 DIC 2023	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN INFORME 2 OBRA CORTE 22 DIC 2023	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
CORTE PARCIAL DE OBRA N° 1	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO
PRESENTACIÓN ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA- OBRA	SI	SI	SI	SE RADICAN PARA ESTUDIO DE SEGURIDAD
PRESENTACION DESGLOSE A.I.U OBRA	SI	SI	SI	APROBADO POR INTERVENTORIA, CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1) SEGUIMIENTO A LA OBRA CORTE 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
2) ELABOBORACIÓN DE INFORME DE OBRA A CORTE 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE EL FORMATO DE-DEAJU-FR-019 (SE ANEXA INFORME)
3) SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO.
4. REVISION Y APROBACIÓN INFORMES SST A CORTE 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
5. REVISION Y APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL A CORTE 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.
6. REVISION Y APROBACIÓN CORTE DE OBRA N° 1 DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO
7. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SUPERVISION PARA EL PAGO N1 DE INTERVENTORIA APROBACIÓN CAPITULO 3 DE ACUERDO CON LA OFERTA ECONOMICA.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

SE SUBSANA LA TOTALIDAD DE LOS PENDIENTES, NO OBSTANTEN SE TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DEL BALANCE A LA FECHA.

ANOTACIÓN GENERAL: SE ANEXAN INFORMES DE LA OBRA

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 37.737.224,35	$ 37.737.224,35	$ 11.424.108,22	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 26.313.116,13				
TOTAL	$ 37.737.224,35	$ 11.424.108,22				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 37.737.224,35	VALOR ADJUDICADO, DE ACUERDO CON EL ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO.
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO	**$ 26.313.116,13**	REDUCCIONES DE ACUERDO CON EL MODIFICATORIO N° 1 Y N° 2
VALOR TOTAL	$ 11.424.108,22	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	1) A LA FECHA SE REALIZA TRAMITE DEL PAGO N° 1 DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO, APROBACIÓN DEL CAPITULO 3 DOCUMENTOS DESCRITOS EN LA OFERTA ECONOMICA, CARGO AL PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024. ***(TRAMITADO)***

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INTERVENTORIA, SE PROCEDE A CULMINAR LA INTERVENTORIA DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LOS MODIFICATORIO N° 1 Y N° 2 DEL PRESENTE CONTRATO.

PENDIENTE TRAMITE DE PAGO FINAL, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRESENTA PENDIENTE EL BALANCE DEL CONTRATO CON EL CONJETO DE CONOCER EL ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

LAS CONDICIONES CLIMATICAS EN EL PRESENTE LAPSO DEL INFORME ESTUVIERON SOLEADAS EN LA ZONA DE COVEÑAS SUCRE, NO OBSTANTE SE PRESENTAN PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO EN LA ZONA.



Supervisor Contrato de Interventoria No. 141-00-B-COFAC-BACOF-2023
ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S.
Creando y Construyendo Sueños

CONSECUTIVO NUMERO 099-016

FECHA 20-12-2023

SEÑOR
Subteniente, Nixon Guillermo Duran Siachoque
Bogotá

Ref. pago de corte numero 1 contrato 099-00-B-COFAC-BACOF- 2023. Contratista INGEBLAR

Me permito remitir los documentos para pago del primer corte de la referencia. A corte 30 de noviembre.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS PARA PAGO DEL PRIMER CORTE DE OBRA A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. Factura E- 42
2. Acta de recibo a satisfacción
3. Formato de imputación
4. Certificado porte parafiscales
5. Planilla de parafiscales
6. Corte parcial no 1 a corte 30 de noviembre

Lo anterior cumple con las especificaciones técnicas del contrato.

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal

310 468 5285
311 767 3290
RyMarquitectura.sub
gerencia@gmail.com
R&M Arquitectura y estudio

ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S.
Creando y Construyendo Sueños

CONSECUTIVO NUMERO 099-016
FECHA 20-12-2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO:
141-00-B-COFAC-BACOF-2023

SEÑOR
Subteniente, Nixon Guillermo Duran Siachoque
Bogotá

Ref. Aprobación documentos técnicos Interventoría, contrato 141-00-B-COFAC-BACOF-2023

En atención al contrato no 141-00-B-COFAC-BACOF-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE. me permito relacionar los documentos técnicos aprobados por esta interventoría así:

Entrega de la documentación previo para el inicio de la obra con los siguientes aspectos:

*Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría.

*Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APUs, especificaciones técnicas).

*Firma del acta de inicio de obra.

*Demas documentación previa requerida para el inicio de obra descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.

Emisión de informe previo para el inicio de la obra que contenga:

* Aprobación del Cronograma de obra en Project.

* Aprobación del A.I.U

* Aprobación manual de seguridad industrial y salud ocupacional.

* Aprobación plan de manejo Ambiental

* Aprobación del organigrama técnico y administrativo.

La documentación anteriormente descrita, se entrega al supervisor de la interventoría, para publicación en el SECOP ll apartado, contrato numero 099-00-B-COFAC-BACOF- 2023

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	11/12/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	4/122023	**AL:**	10/12/2023
CONTRATO Nº	099-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA OBRA**	INGEBLAR SAS		
CONTRATO Nº	141-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA INTERVENTORIA**	R&M - ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE				
FECHA DE INICIO	27/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	28/12/2023		
VALOR INICIAL	$ 809.722.682,97	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 809.722.682,97				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS A LA OBRA.

Se realizaron labores de desmonte - retiro de rebaba entre muro y teja - casas 3 y 6 y parte de 1 y 2, instalacion de perfileria para cieloraso en pvc, terminacion retiro y escarificacion de enchapes de muros y pisos, desmonte de muebles de cocina, elaboracion de marcos para ventaneria en aluminio para las ventanas de casas 1,2,3 y 6. .Mamposterias y pañetes de cierre de cabañas 2 y 3, adecuaciòn de columnade acceso para puerta ventana (corte,pañetes). Regatas verticales para tuberia hidraulica y electrica.Resanes gewnerales y estucso, pañetes Serealiza estudio de niveles para definir el trazadode la tuberia sanitaria externa para intervenir en menor medida atravesarlasvigasd cimentacion existentes.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Aluminio para carpintería metálica		Rotomartillo	2	Ingenira Residente	1	**100**	**100**	SI	RESIDENTE PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.
		Arena		Pulidoras	2	Auxiliar de ingenieria	1	**100**	**100**	SI,	PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO
		Cemento		Taladros	1	Profesional Siso	1	**100**	**100**	SI	PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO
		Plástico		Cortadora de aluminio	1						
						TOTAL	3				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	8,22%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	5,01%	**13,23%**	**20,00%**	**-6,77%**
Semana 2	0,00%			
Semana 3	0,00%	**Se presentan retrasos de suministro de vidrio y cubierta por parde del el proveedor, que el contratista propone subsanar en la siguiente semana.**		
Semana 4	0,00%			
Semana 5	0,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA






AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**20,00%**
EJECUTADO		**13,23%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**82,00%**
	EJECUTADO		**90,00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**30,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
10. PAÑETES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**36,00%**
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**15,00%**
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO /PARED	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
13. ACABADOS DE MUROS, ESTUCO /PINTURA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**13,00%**

14. CARPINTRIA EN MADERA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
15. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
17. CARPINTERIA EN ACERO INOXDABLE	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**33,00%**
	EJECUTADO		**20,00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**20,00%**
	EJECUTADO		**3,50%**
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
21. CERRADURAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
24. ASEO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**10,00%**
	EJECUTADO		**11,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	32	14	18
Proyección	34	14	20

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
14	-3	31/12/2023

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL






8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1.Regatasdetuberíaeléctrica,2.Limpiezaderebabasdeconcretoenlacubierta,3.Mantenimientodeestructuradetechos,4.Resanesgeneralesyestuco,5.Pañete,6.Mampostería,7.Fabricacióneinstalacióndecarpinteríaenaceroinsoxidable,8.InstalaciódeestructuraparaPVC,9.Aseogeneral.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Instalacion Cubierta	SI	X	NO	
Instalacion de VIdrios en Ventanas	SI	X	NO	
Instalaciones Electricas	SI		NO	X
	SI		NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos A.I.U + IVA	$ 809.722.682,97	$ 809.722.682,97	$ 107.126.310,96	13,23%	$ 702.596.372,01	87%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 809.722.682,97	$ 809.722.682,97				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 809.722.682,97	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 809.722.682,97	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	$ 0,00	A LA FECHA ESTA EN ELABORACIÓN EL CORTE DE OBRA A CORTE 30 DE NOVIEMBRE.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO PAGOS DEL PRESENTE CONTRATO

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
INFORME DE OBRA SEMANA 1	SI	SI	SI	CONTRATISTA CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO, SE APRUEBA POR INTERVENTORIA
INFORME SST SEMANA A CORTE 3 DE Diciembre	SI	SI	SI	CONTRATISTA CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO, SE APRUEBA POR INTERVENTORIA
INFORME AMBIENTAL A CORTE 3 DE DICIEMBRE	SI	SI	SI	CONTRATISTA CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO, SE APRUEBA POR INTERVENTORIA
SUBSANACION PLAN DECALIDAD	SI	SI	SI	CONTRATISTA CUMPLE CON EL ANEXO TECNICO, SE APRUEBA POR INTERVENTORIA

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA MEJORE EL MISMO RENDIMIENTO EN LA EJECUCÍON DE LAS OBRAS EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL. ELABORE UN PLAN DE CONTINGENCIA POR ELRETRASO QUE SE PRESNTA EN PROGTRAMACION..



14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):


LAS CONDICIONES CLIMATICAS EN EL PRESENTE LAPSO DEL INFORME ESTUVIERON SOLEADAS EN LA ZONA DE COVEÑAS SUCRE

REALIZO:	REVISO Y APROBO:
C.C. No.51.822.455 de Bogota. RESIDENTE DE INTERVENTORIA Angelica Maria Manes Hernandez	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA Cindy Paola Mosquera Mosquera

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO



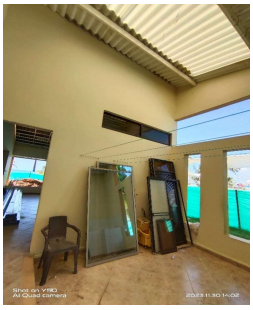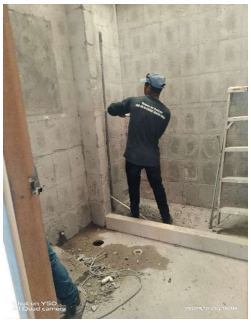


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	18/12/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	11/122023	**AL:**	17/12/2023
CONTRATO Nº	099-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA OBRA**	INGEBLAR SAS		
CONTRATO Nº	141-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA INTERVENTORIA**	R&M - ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE				
FECHA DE INICIO	27/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	28/12/2023		
VALOR INICIAL	$ 809,722,682.97	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 809,722,682.97				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se realizan actividades en casas 6, 1,2 y 3.retiros de mortero de pega de cubierta a muro. Inicio pintura de vigas metálicas (SEREALIZACORRECCION Y REMATEDE LAACTIVIDAD UTILIZANDO COMPRESOR), resanes de ventanera y fachadas en estucos. Remate de fachada con humedades en baño de casa 2. Regatas e inicio de instalación tubería de casas 3 y 6, regatas 1 y 2. Se realiza revisión de niveles hidrosanitarios en compañía de la Ing. residente de Obra, Sandra murillo, el asesor Ing. Fabián molina, asesor, CLOFA y quien escribe, Angelica Manes, residente de interventoría .Se define recorrido de la tubería hidro sanitaria y pendientes mínimas de 1% de acuerdo a un nivel freático muy elevado del terreno.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Aluminio para carpintería metálica		Rotomartillo	2	Ingenira Residente	1	**100**	**100**	SI	RESIDENTE PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.
		Arena		Pulidoras	2	Auxiliar de ingenieria	1	**100**	**100**	SI,	PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO
		Cemento		Taladros	1	Profesional Siso	1	**100**	**100**	SI	PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO
		Plástico		Cortadora de aluminio	1		16				
		Plástico		Cortadora de aluminio	1	MAESTROS: OBRA GRIS, ELECTRICISTA,VENTANERIA, CUBIERTAS,	4	**75%**	**75%**	SI	
						OFICIALES AYUDANTES	10	**100**	**100**	**100**	
											SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA DELDIRECTOR DE OBRA, ELSUPERVISOR Y EL REPRESENTANTELEGAL A UN 50%
						TOTAL	33				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	8.22%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	5.01%	**16.84%**	**51.30%**	**-34.46%**
Semana 2	3.61%	Se presentan atrasos en instalación de vidrio y cubierta por parde del el proveedor, que el contratista propone subsanar en la siguiente semana. Se solicita un plan de contingencia para solucionar los tiempos retrasados.		
Semana 3	0.00%			
Semana 4	0.00%			
Semana 5	0.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA














AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**51.30%**
EJECUTADO		**16.84%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**90.00%**
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**65.00%**
	EJECUTADO		**40.00%**
10. PAÑETES	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**36.00%**
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**30.00%**
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO/PARED	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**

13. ACABADOS DE MUROS, ESTUCOS/PINTURA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**19.00%**
14. CARPINTERÍA EN MADERA	PROGRAMADO		**20.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
17. CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**80.00%**
	EJECUTADO		**60.00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**7.00%**
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
21. CERRADURAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
24. ASEO	PROGRAMADO		**43.00%**
	EJECUTADO		**70.00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	32	21	11
Proyección	43	21	22

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
21	-12	9/1/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

instalacion ventaneria, regatas hidraulicas y sanitarias,Resanes de muros Estucosy pintutas, Instalaciones electricas (regatas e instalacion cajas)

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Instalacion Cubierta	SI	x	NO	
Instalacion de VIdrios en Ventanas	SI	x	NO	
Instalaciones Electricas	SI		NO	X
CERRADURAS	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos A.I.U + IVA	$ 809,722,682.97	$ 809,722,682.97	$ 136,357,299.81	16.84%	$ 673,365,383.16	83%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 809,722,682.97	$ 809,722,682.97				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 809,722,682.97	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 809,722,682.97	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0.00	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	$ 0.00	A LA FECHA ESTA EN ELABORACIÓN EL CORTE DE OBRA A CORTE 30 DE NOVIEMBRE.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO PAGOS DEL PRESENTE CONTRATO

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
INFORME TÉCNICO N°2	SI	SI	SI	CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE OBRA
INFORME AMBIENTAL N°2	SI	SI	SI	CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE OBRA
INFORME SST N°2	SI	SI	SI	CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE OBRA

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista de obra mejore el mismo rendimiento en la ejecución de las obras en pro del cumplimiento del presente objeto contractual. El contratista informa que los retrasos presentados se han debido a la dificultad para hacer llegar los materiales a la obra y las entregas tardías del proveedor, debido a problemas de logística (distancia muy largas, de transporte del material, desde el punto de origen) y **situaciones de orden público.**

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

LAS CONDICIONES CLIMATICAS EN EL PRESENTE LAPSO DEL INFORME ESTUVIERON SOLEADAS EN LA ZONA DE COVEÑAS SUCRE

REALIZO:	REVISO Y APROBO:
C.C. No.51.822.455 de Bogota.	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Angelica Maria Manes Hernandez	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA Cindy Paola Mosquera Mosquera

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	23/12/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:** 18/122023	**AL:** 22/12/2023
CONTRATO Nº	099-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA OBRA**	INGEBLAR SAS
CONTRATO Nº	141-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA INTERVENTORIA**	R&M - ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE		
FECHA DE INICIO	27/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	28/12/2023

VALOR INICIAL	$ 809,722,682.97	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR TOTAL**	$ 809,722,682.97

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se realizaron labores de regatas con pulidora hidrosanitarias. Se encuentran pendientes APUs de cortes de placa con pulidora y excavación manual, se realizan labores corrección a la aplicación de inmunizante y pintura de las vigas aplicando la última mano con compresor, quedando pendiente el arreglo de la estructura para PVC, que se afectó con el desmonte de la cubierta. Se solicita resanar en el lineal que quedo desprotegido en el desmonte del cielo raso, ante de la instalación del cielo raso en PVC. Continúan las labores de instalación cajas y tuberías eléctricas y sus resanes, no terminadas en su totalidad al día 22.
Se presentan atrasos de ejecución en actividades tales como: 1. Instalación de cubierta: debido a que hasta la fecha el proveedor ha incumplido con el envío del material, este fue comprado en la ciudad de Medellín. 2. Vidrios para ventanas: el día lunes 18 de noviembre se recibe el material en la obra enchape,19de Noviembres,3 .instalaciones hidrosanitarias: el material llego el día 21 y se inició la obra el 22,
El Ing Nixon duran, Subteniente Representante de la entidad contratante deja sus observaciones sobre los atrasos y las acciones de calidad a subsanar en la obra. Y se realizan de forma conjunta, con la obra e interventoría, las acciones correctivas a los informes de acuerdo a un reajuste de la programación.
Como recomendación a la instalación de enchape: humedecer el material, previo a su instalación y en la instalación seguir la secuencia de la figura, para que no se vea cortado.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Aluminio para carpintería metálica		Rotomartillo	2	Ingenira Residente	1	**100**	**100**	SI	RESIDENTE PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.
		Arena		Pulidoras	2	Auxiliar de ingenieria	1	**100**	**100**	SI,	PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO
		Cemento		Taladros	1	Profesional Siso	1	**100**	**100**	SI	PERMANECE AL 100% PARA EL SEGUIMIENTO
		Plástico		Cortadora de aluminio	1	MAESTROS: OBRA GRIS, ELECTRICISTA,VENTANERIA, CUBIERTAS, cielo raso pvc. Carpintero	6	**100%**	**100%**	SI	
						OFICIALES AYUDANTES	10	**100**	**100**	**100**	
											sepresenta el Ing Nixon duran por parte de la entidad contratante
						TOTAL	19				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	8.22%			
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	5.01%	**29.80%**	**51.30%**	**-21.50%**
Semana 2	3.61%			
Semana 3	12.96%	**Se presentan retrasosde vidrio y cubierta por parde del el proveedor, que el contratista propone subsanar en la siguiente semana. Se solicita un plan de contingencia para subsanar los tiempos retrasados**		
Semana 4	0.00%			
Semana 5	0.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA










AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**51.30%**
EJECUTADO		**29.80%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**95.00%**
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**15.00%**
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**90.00%**
	EJECUTADO		**50.00%**
10. PAÑETES	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**36.00%**
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**30.00%**
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO/PARED	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
13. ACABADOS DE MUROS,	PROGRAMADO		**0.00%**

ESTUCOS/PINTURA	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**19.00%**
14. CARPINTERÍA EN MADERA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**53.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0.00%**
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**0.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0.00%**
17. CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**100.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**60.00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**100.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**7.00%**
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**0.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0.00%**
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**0.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0.00%**
21. CERRADURAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**100.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**0.00%**
24. ASEO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	**67.00%**
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	**70.00%**


ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	32	26	6
Proyección	39	26	13

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



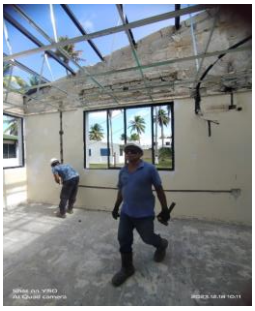


7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
26	-7	4/1/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. Localización y replanteo, 2. Cerramiento con lona verde, 3. Desmonte de aparatos sanitarios, 4. Remoción de enchapes, 5. Remoción de guardaescobas, 6. Desmonte de muebles de cocina, 7. Desmonte de muebles de baño, 8. Desmonte de cielo existente, 9. Aseo y limpieza, 10. Fabricación de carpintería metálica, 11. Instalación de estructura para PVC, 12. Desinstalación de Cubierta.
17.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRANSPARENTE EN SISTEMA CORREDIZO SERIE 80-25, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (se instalaron marcosde ventanas y parte de corredizas

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Instalacion Cubierta	SI	x	NO	
Instalacion de VIdrios en Ventanas	SI	x	NO	
Instalaciones Electricas,instalaciones hidrosanitarias	SI		NO	x
Carpinteriaen madera, carpinteria en acero inoxidable, cubiertas, cerraduras	SI	x	NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos A.I.U + IVA	$ 809,722,682.97	$ 809,722,682.97	$ 241,297,359.53	29.80%	$ 568,425,323.44	70%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 809,722,682.97	$ 809,722,682.97				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 809,722,682.97	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 809,722,682.97	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0.00	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	$ 0.00	A LA FECHA ESTA EN ELABORACIÓN EL CORTE DE OBRA A CORTE 30 DE NOVIEMBRE.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO PAGOS DEL PRESENTE CONTRATO

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
INFORME TÉCNICO N°3	SI	SI	SI	CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE OBRA
INFORME AMBIENTAL N°3	SI	SI	SI	CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE OBRA
INFORME SST N°3	SI	SI	SI	CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE OBRA
PROGRAMACION	SI	SI	SI	CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE OBRA

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


DURANTE EL PRESENTE LAPSO, SE SIGUEN PRESENTANDO PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO, COMO FUE MANIFESTADO EN EL INFORME ANTERIOR POR LO QUE, IMPACTA DE MANERA NEGATIVA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA GENERAR PLAN DE CONTINGENCIA, HASTA LA FECHA LA INTERVENTORIA ESTARA PRESENTE EL PROYECTO POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR ENTREGA AL SEÑOR SUBTENIENTE NIXON DURAN DE LA FAC.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

LAS CONDICIONES CLIMATICAS EN EL PRESENTE LAPSO DEL INFORME ESTUVIERON SOLEADAS EN LA ZONA DE COVEÑAS SUCRE

REALIZO:	REVISO Y APROBO:
C.C. No.51.822.455 de Bogota.	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Angelica Maria Manes Hernandez	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA Cindy Paola Mosquera Mosquera

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO














































HATAJEN




INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

I. GENERALIDADES

La Empresa **INGEBLAR SAS** viene realizando las actividades de obras civiles, carpintería metálica, mantenimiento de perfiles para cubiertas, instalación de estructura metálica para PVC, elaboración de regatas para puntos eléctricos.

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de mitigar al máximo los accidentes laborales y daños al medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

II. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 04 de diciembre al 10 de diciembre de 2023, se vienen desarrollandoen el proyecto las siguientes actividades:

- **Fabricación de carpintería metálica.**
- **Mantenimiento de perfiles para cubiertas.**
- **Elaboración de regatas para puntos eléctricos.**
- **Resane generales en cabañas.**
- **Instalación de estructuras para PVC**
- **Mampostería y pañete.**
- **Aseo.**

III. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y el personal se distribuye de la siguiente manera:

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

N°	CARGOS	N° DE TRABAJADORES EN OBRA
1	**INGENIEROS** ▪ Residente Civil ▪ Auxiliar civil ▪ Ing. hidrosanitario ▪ Ing. ambiental ▪ Ing. Eléctrico	5
2	**RESIDENTE SST**	1
3	**SUPERVISOR DE OBRAS**	1
4	**CONTRATISTAS**	7
5	**OFICIAL CIVIL**	2
6	**AYUDANTE CIVIL**	4
7	**AYUDANTE ELECTRICO**	3
8	**OFICIAL ELECTRICO**	1
9	**OFICIAL DE CUBIERTA**	1
10	**AYUDANTE DE CUBIERTA**	6
11	**AYUDANTE CARPINTERIA**	3
12		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
TOTAL		**34**

VI. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE SEMANA.

Durante la presente semana se ha utilizado en obra los siguientes equipos:

Cortadora	
Atornillador inalámbrico	
pulidora	
Taladro percutor	

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

También se utilizaron las siguientes herramientas menores:

Martillo.	Picas
mazo	Alicates
cincel	Lima
Carreta	Barra
escaleras	Palas
llanas	espátula

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

V. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE LA PRESENTE SEMANA.

Durante el periodo del 04 diciembre al 10 de diciembre de 2023, se han desarrollado las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el proyecto, tratando en todo momento de cumplir con los estándares planteados en la semana**.**

- **Programa de capacitación personal**

  Durante la semana del 04 de diciembre al 10 de diciembre de 2023, no se realizó Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, puesto que no ingresó personal nuevo a la obra.

- **Charlas diarias de 5 minutos**

  Las charlas de seguridad de 15 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

  Las charlas de seguridad se dictan al grupo de trabajo antes de iniciar labores de obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

  En la semana se realizaron siguientes charlas cuyos temas fueron:

N	FECHA	TEMA
1	04-12-2023	Clasificación de residuos
2	05-12-2023	Inspección de áreas y su importancia
3	06-12-2023	Importantica del orden y aseo
4	07-12-2023	Auto cuidado
5	08-12-2023	Que es un incidente y cuáles son sus consecuencias
6	09-12-2023	Peligro de ingerir sustancias alucinógenas y alcohol en la obra

VER ANEXO DE CHARLAS

INFORME SEMANAL SST

- **Inspección reposición, entrega de EPP y Dotación.**

Los elementos de protección personal (EPP) y dotación son equipos de seguridad de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

VER ANEXO DE ENTREGA DE EPP

- **Las inspecciones de seguridad herramientas.**

Son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros.

En esta semana se hicieron inspecciones a:

1. **Inspección Herramientas Menores**
2. **Inspección de equipos de protección contra caída.**
3. **Inspección de máquinas.**

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

- **Análisis de trabajo seguro.**

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en una forma eliminen o minimicen estos riesgos.

En esta semana se hicieron los siguientes análisis de trabajo.

- **Fabricación de carpintería metálica.**
- **Mantenimiento de perfiles para cubiertas.**
- **Elaboración de regatas para puntos eléctricos.**
- **Resane generales en cabañas.**
- **Instalación de estructuras para PVC**
- **Mampostería y pañete.**
- **Aseo.**

VER ANEXOS DE ATS

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

- **Índices de accidentalidad**

INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*	INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*
N° de trabajadores.	34	N/A	N° Días Perdidos Por AT.	0	0
N° Horas Hombre Trabajadas	882	N/A	N° de días cargados.	0	0
N° Accidentes de Trabajo (Total mes).	0	0	N° de investigaciones de AT e incidentes realizadas.	0	0
N° Accidentes de Trabajo - AT Incapacitantes.	0	0	Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de Trabajo.	0	0
N° Accidentes Trabajo-AT NO Incapacitantes.	0	0	Índice de Severidad (IS) AT Incapacitantes.	0	0
N° Accidentes de trabajo graves.	0	0	N° de trabajadores Ausentes por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes de trabajo mortales.	0	0	N° de Días Perdidos por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes reportados a la ARL.	0	0	N° de Casos nuevos de enfermedad Laboral.	0	0
N° Incidents de trabajo	0	0	N° Trabajadores retirados durante el mes.	0	0

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Registro Fotográfico

CHARLAS DIARIAS		
		
		


INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

PAUSAS ACTIVAS		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

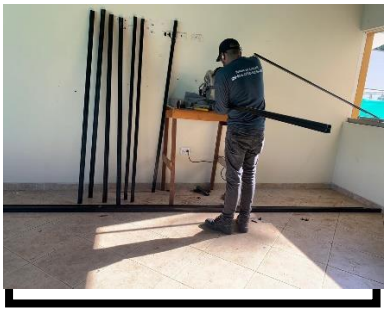Actividades realizadas		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

EVIDENCIAS DE INSPECCIONES	
	
	

Firma:

FEDERICO MONTEALEGRE
PROFESIONAL SISO
CC 79.318.096 de Popayán
Responsable SG-SST

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoría

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

I. GENERALIDADES

La Empresa **INGEBLAR SAS** viene realizando las actividades de obras civiles, carpintería metálica, mantenimiento de perfiles de cubiertas, elaboración de regatas para puntos eléctricos en el proyecto

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de mitigar al máximo los accidentes laborales y daños al medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

II. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 11 de diciembre al 17 de diciembre de 2023, se vienen desarrollandoen el proyecto las siguientes actividades:

- **Elaboración de carpintería metálica.**
- **Mantenimiento de perfiles para cubiertas.**
- **Elaboración de regatas para puntos eléctricos e instalación de tubería**
- **Resane en cabañas.**

III. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y el personal se distribuye de la siguiente manera:

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoria & Construcción

INFORME SEMANAL SST

N°	CARGOS	N° DE TRABAJADORES EN OBRA
1	**INGENIEROS** ▪ Residente Civil ▪ Auxiliar civil ▪ Ing. hidrosanitario ▪ Ing. ambiental ▪ Ing. Eléctrico	5
2	**RESIDENTE SST**	1
3	**SUPERVISOR DE OBRAS**	1
4	**CONTRATISTAS**	7
5	**OFICIAL CIVIL**	2
6	**AYUDANTE CIVIL**	4
7	**AYUDANTE ELECTRICO**	3
8	**OFICIAL ELECTRICO**	1
9	**OFICIAL DE CUBIERTA**	1
10	**AYUDANTE DE CUBIERTA**	6
11	**AYUDANTE CARPINTERIA**	3
12		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
TOTAL		**34**

VI. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE SEMANA.

Durante la presente semana se ha utilizado en obra los siguientes equipos:

Cortadora	
Atornillador inalámbrico	
Pulidora	
Taladro percutor	

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

También se utilizaron las siguientes herramientas menores:

Martillo.	Picas
Mazo	Alicates
Cincel	Lima
Carreta	Barra
Porras	Palas
Llanas	espátula

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

V. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE LA PRESENTE SEMANA.

Durante el periodo del 11 diciembre al 17 de diciembre de 2023, se han desarrollado las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el proyecto, tratando en todomomento de cumplir con los estándares planteados en la semana**.**

- **Programa de capacitación personal**

Durante la semana del 11 de diciembre al 17 de diciembre de 2023, no se realizó Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, puesto que no ingresó personal nuevo a la obra.

- **Charlas diarias de 5 minutos**

Las charlas de seguridad de 15 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Las charlas de seguridad se dictan al grupo de trabajo antes de iniciar labores de obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

En la semana se realizaron siguientes charlas cuyos temas fueron:

N	FECHA	TEMA
1	11-12-2023	Orden y aseo (jornada de limpieza)
2	12-12-2023	Identificación de señalizaciones
3	13-12-2023	Protección de la piel
4	14-12-2023	Manejo de estrés laboral
5	15-12-2023	Cuidado del recurso hídrico
6	16-12-2023	Que es el riesgo locativo

VER ANEXO DE CHARLAS

- **Inspección reposición, entrega de EPP y Dotación.**

Los elementos de protección personal (EPP) y dotación son equipos de seguridad de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

VER ANEXO DE ENTREGA DE EPP

- **Las inspecciones de seguridad herramientas.**

Son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadascon el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros.

En esta semana se hicieron inspecciones a:

1. **Inspección Herramientas Menores**
2. **Inspección de equipos de protección contra caída.**
3. **Inspección de máquinas.**

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

- **Análisis de trabajo seguro.**

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos.

En esta semana se hicieron los siguientes análisis de trabajo.

- **Mantenimiento de perfiles.**
- **Elaboración de regatas para puntos eléctricos.**
- **Corte y armado de carpintería metálica**
- **Instalación de tubería para puntos eléctricos**
- **aseo**

VER ANEXOS DE ATS

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

- **Índices de accidentalidad**

INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*	INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*
N° de trabajadores.	18	N/A	N° Días Perdidos Por AT.	0	0
N° Horas Hombre Trabajadas	882	N/A	N° de días cargados.	0	0
N° Accidentes de Trabajo (Total mes).	0	0	N° de investigaciones de AT e incidentes realizadas.	0	0
N° Accidentes de Trabajo - AT Incapacitantes.	0	0	Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de Trabajo.	0	0
N° Accidentes Trabajo-AT NO Incapacitantes.	0	0	Índice de Severidad (IS) AT Incapacitantes.	0	0
N° Accidentes de trabajo graves.	0	0	N° de trabajadores Ausentes por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes de trabajo mortales.	0	0	N° de Días Perdidos por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes reportados a la ARL.	0	0	N° de Casos nuevos de enfermedad Laboral.	0	0
N° Incidents de trabajo	0	0	N° Trabajadores retirados durante el mes.	0	0

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoria & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Registro Fotográfico

CHARLAS DIARIAS		
		
		

PAUSAS ACTIVAS		
		

Actividades realizadas		
		
		

EVIDENCIAS DE INSPECCIONES		
		
		

Firma:
FEDERICO MONTEALEGRE SANCHEZ
Profesional SISO

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoría

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: MAMPOSTERIA. Y PAÑETE Fecha: 11 DIC. HASTA 17 DIC

Herramientas usadas: PALA, LLANA, MARTILLO, CARRETILLA.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
• Charla de Seguridad. pre-laboral. • Inspeccion de herramientas	• Caidas a mismo. Nivel. • Golpe por manipolacion de herrametas.	Golpes y fracturas.	Almacenaje y disposicion adecuada de materiales y herramientas.
• Inspeccion de areas. y frentes de trabajo. • Toma de medidas y niveles.	• Riesgo ergonomicos por movimiento repetitivos	lesiones osteomusculares	Implementar los pausas activas.
• preparacion de Mezcla • levantamiento de Muros.	Heridas y ponzones por Clavos y residuos de Madera	Corte y laseraciones. enfermedades (tetano).	Uso adecuado de epp...
• relleno de addoses. • empañete de Muros • Orden y Aseo.	Golpe de Calor.	Golpe de Calor, (Deshidratacion).	hidratacion constante.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Hernan Rodriguez	72209106	ayudante	
Fuerzas AT	15614714	ayudante	Fuerzas
Peterson arbey	1149685251	ayudante	Peterson
Robert Villalobos	15619479	O&G	
Diego Popó V	16830805	Maestro de obra	
Ever Alvis	1131104841	ayudante	Ever

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: MANTENIMIENTO DE PERFILES PARA CUBIERTA Fecha: DEL 11 DIC. HASTA 13 DIC

Herramientas usadas: ANDAMIO; BROCA, RODILLO, ARNES, ESLINGA - LINEA DE VIDA.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
CHARLA DE SEGURIDAD PRE-LABORAL INSPECCION DE	CAIDA A DISTINTO NIVEL. MOVIMIENTO	FRACTURAS TRANSTURNO OSTEO	ANCLAJE EN LINEA DE VIDA
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. INSPECCION DE AREA	REPETITIVOS. GOLPE DE CALOR	MUSCULARES. DESHIDRATACION.	PAUSAS ACTIVAS.
PREPARACION DE DE PINTURA E IMUNIZANTE.	PICADURA DE INSECTOS.	DENGUE, FIEBRE	HIDRATACION CONSTANTE
APLICACION DE PRODUCTO. FIN DE LA LABOR			USO DE REPELENTE
ORDEN Y ASEO-			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
[illegible]	CC 1561837[illegible]	[illegible]	[illegible]
CESAR DIAZ	1004492814	OP	[illegible]
LUIS OLASCUAGA	3811806	AYUDANTE	[illegible]
ANDRES ARRIETA	1005720694	OP	[illegible]
ALBERTO PINTO	79769823	CARPINTERO	[illegible]
KEVIN SUAREZ	1007732265	OP	[illegible]
JHONATHAN SUAREZ	1012933947	AYUDANTE	[illegible]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: CORTE Y ARMADO DE CARPINTERIA METALICA. Fecha: del 11 DE DIC. HASTA el 17 D

Herramientas usadas: TALADRO, CORTADORA, ALICATE, MARTILLO.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-laboral. Inspeccion de equipo y Herramientas. Inspeccion de area	Proyeccion de Material Particulado. Ruidos Sesibeles (ruido). Movimiento repetitivo. Cortes y laseraciones.	Afeccion en los pulmones: perdida de la audicion. perdida de la vista. lesiones osteomusculares. perdida de Miembros.	Uso de Mascarilla y lentes de Seguridad. Uso de Proteccion auditiva. Implementacion de pausas activas.
Toma de Medidas. Corte de Material.	Golpe de Calor.	Deshidratacion.	Uso de guantes de Seguridad para equipos.
Armado de estructura. Adecuacion de estructura en Ventanas. Orden y Aseo. Fulverizacion de Sorda	Picadura de insectos.	en Enfermedades. (Dengue, fiebre).	Hidratacion cada tanto durante la jornada. Uso de repelente.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres Garcia	80768089	oficial	
Alexis PLAZA	1075828310	instalador	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: ELABORACION DE REGATAS EN DUCTOS ELECTRI Fecha: DEL 11 DE DIC HASTA 17 DIC

Herramientas usadas: PULIDORA, SINCEL, MARTILLO

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-laboral.	Caidas a mismo nivel.	Fracturas.	Orden y aseo
Inspeccion de herramientas	Cortes y laseraciones	Perdida de miembros	usar guarda de seguridad y elementos de proteccion personal.
Inspeccion de areas y frentes de trabajo.	Golpes en las manos.	Contusiones.	
Toma de medidas. Localizacion de Puntos para Regatas	Golpe de Calor.	Deshidratacion.	hidratacion constante..
Elaboracion de regatas.	Picadura de insectos	Dengue y fiebre.	Uso de repelente.
Señalizacion.			
Orden y aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Javier Guzmán	1.003.192.133	Tecnico. ELECT	Javier Guzmán
Hilario Jose M.	1131106727	Ayudante	Hilario
ERICK OROZCO R	1193 583 200	Ayudante	ERICK OROZCO

Powered by CamScanner

NGEBLAR S.A.S erencia, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓD: SG-SST-FOR-81
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA

BRA / LUGAR: Jde FECHA: Desde 11 Dic Hasta 17 Dic

rque con una (x) el estado de la herramienta: (B) Bueno, (M) Malo, NA (No Aplica)

CLASE	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO	¿Las herramientas manuales tienen sus agarradores/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			¿Las puntas de las herramientas no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras ?			¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente?			¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección?			¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?			¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o materia que pueda dañarlas?			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA		
SUJECIÓN	Tornillo de banco																										
	Gatos																										
	Mordaza																										
	Entenallas																										
	Tenazas																										
	Alicates																										
	Sargento																										
FIJACIÓN	Destornillador																										
	Llaves fijas																										
	Remachadora																										
	Pala	/			/			/			/			/			/			/							
	Cavador	/			/			/			/			/			/			/							
	Pica	/			/			/			/			/			/			/							
CORTE	Alicates de corte	/			/			/			/			/			/			/							
	Bisturi																										
	Tijeras																										
	Cizallas																										
	Machete																										
	Motosierra																										
	Guadaña																										
POR ACERRADO	Segueta	/			/			/			/			/			/			/							
	Serrucho	/			/			/			/			/			/			/							
	Segueta de calar																										
O REBANAR	Formones																										
	Cinceles	/			/			/			/			/			/			/							
	Cepillos de carpintería	/			/			/			/			/			/			/							
HUECOS	Barrena	/			/			/			/			/			/			/							
	Broca	/			/			/			/			/			/			/							
	Berbiquí																/			/							
GOLPE	Martillo	/			/			/			/			/			/			/							
	Mazo	/			/			/			/			/			/			/							

Powered by CamScanner

LIMAR	Limas																									
	Escofina																									
MEDICIÓN	Flexómetro																									
	Calibrador o pie de rey																									
	Micrometros																									
	Torquímetro																									
	Nivel digital																									
	Nivel de mano																									
GIRATORIA	Esmerilador																									
	Cortadora 060235																									
	mezcladora																									
	Taladro 34963																									
	Taladro 34821																									
	Taladro 34499																									
	Taladro 34870																									
JARDINERIA	Llana																									
	Espatula																									
	Plana																									
	Carretilla																									

Inspeccionador por: JHON CRUZ Cargo: _____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Carlos andres Garcia - SEMANA DEL 11 Dic AL 17 MES: Dic AÑO: 2023.

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

Guarda de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Condiciones de orden y aseo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Limpieza y desinfección de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	✓																					
	✓																					
	✓																					
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NC	SI		NO
	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Firma de Operador / Quién Inspecciona																						
Firma del encargado de L y D																						
Verificación SST																						

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-104
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO	FECHA:

OPERADOR: Carlos Andres Garcia - SEMANA DEL 11 Dic AL 17 MES: Dic AÑO: 2023

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Interruptor de encendido y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorio porta brocas (Mandril).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del cuerpo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía y la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carcasa del taladro (Fisuras, ruptura, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Condiciones de orden y aseo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Limpieza y desinfección del taladro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Firma de Operador / Quién Inspecciona																		
Firma del encargado de L y D																		
Verificación SST																		

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código:
		Versión:00
		Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 11 DIC 2020 HORA LUGAR FAC

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS-SALUD, AFP-PENSION, ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
ARVIS	OP	Nueva EPS		Sura
Cesar Diaz	OP	NUEVA EPS		Positiva
JHONATHAN Soler	OP	FAMISANAR		Positiva
Kevin Soler	OP	Nueva EPS		Positiva

TIPO DE TRABAJO: Desinstalacion de Cubiertas.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Inspeccion de herramientas y areas a intervenir, inspeccion de equipos de proteccion personal. Acceso a Cubiertas, Desinstalacion y desenso de la misma

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 5 Metros.

Riesgos asociados: fracturas Contusiones en diferentes partes del Cuerpo. invalidez, Muerte.

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE	✓	KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE	✓	SILLA PARA TRABAJO EN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES		ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

escaleras, Andamios, linea de vida, arnes. Martillo, Maro, Bogui

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código:
		Versión:00
		Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	12	Dic	2023	HORA	7:00	LUGAR	Fac.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "RIESGOS") SALUD, AFP PENSION, ARL

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Andis	OP	Nueva EPS		Sura
Cesar Diaz	OP	Nueva EPS		Positiva
Jhonathan Soler	OP	FAMISANAR		Positiva
Kevin Soler	OP	Nueva EPS		positiva

TIPO DE TRABAJO: Desinstalación de Cubiertas.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Inspeccion de equipos y herramientas y areas de trabajo, inspeccion de equipos de protección contra caidas, acenso a Cubierta Desinstalar y desechar Cubiertas.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 5 MTS

Riesgos asociados: Fracturas, Contusiones. en el Cuerpo. Invalidez Muerte

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE	✓	KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE	✓	SILLA PARA TRABAJO EN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES		PRETALES		ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Escaleras, andamios, linea de vida arnes Martillo, Meto Bugui

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código:
		Versión:00
		Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	13	12	23	HORA	9:00	LUGAR	Fac

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS SALUD, AFP PENSION, ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
ADIIS	OP	Nueva EPS		Sura
Cesar Eloy	OP	NUEVA EPS		Positiva
Ubanthon Soler.	CT	FAMISANAR		Positiva
Kevin Soler	OP	Nueva EPS		Positiva

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento de Perfiles. y Cuchillas. toma de medidas

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Inspeccion de herramientas Inspeccion de equipos de proteccion contra caidas preparacion de puntos para Mantenimientos

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 5 Mts.

Riesgos asociados: fracturas, Cortaduras, invalidez, Muerte

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE	✓	KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE	✓	SILLA PARA TRABAJO EN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES		ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

escalera, andamios, arnes, linea de vida.

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código:
		Versión:00
		Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 14 | Dic | 2023 | HORA: 07:00 | LUGAR: Jpc.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD", AFP "PENSION", ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Luis	OP	Nueva EPS		Sura
Cesar Diaz	OP	Nueva EPS		Positiva
Kevin Soler	OP	Nueva EPS		Positiva

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento de Perfiles.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA:
Inspeccion de herramientas, Inspeccion de equipos de proteccion contra caidas, Preparacion de pintura y aplicacion de la misma en los perfiles.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

Riesgos asociados: Fractura, Cortocraves, muerte, Muerte

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE	✓	KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE		SILLA PARA TRABAJO EN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES		ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Escalera, andamios, arnes, linea de vida

Powered by CamScanner

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES			
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS			✓
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			✓

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ADUIS ARICTA	1005708647	
JHONATHAN soler	1.012.430303	
KEVIN soler	1070332265	
CESAR DIAZ	1001192574	Cesar Diaz

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	JHONATHAN soler.	1.012.430.303	
RESIDENTE DE OBRA	[illegible]	53.121.232	
INSPECTOR SISO	Federico Manrreosns	1066122281	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE		EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	X		NO	
FIRMA		EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO	
FECHA		EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI	✓		NO	

Powered by CamScanner

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS			/
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN NTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			/

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ADRES AYVISTA	1005708614	
JHONATHAN Soler.	1.012.430.343.	
KEVIN SOLER	1070332265	
Cesar Diaz	1150192574	Cesar Diaz

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	Jhonathan Soler.	1012430343	
RESIDENTE DE OBRA		53.121.232	
INSPECTOR SISO	Federico Hankeroons	1066182281	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE		EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	X		NO	
FIRMA		EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO	X
FECHA		EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI	X		NO	

Powered by CamScanner

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES			
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS			✓
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			✓

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ADRIS AMICA	1005708614	
JHONATHAN Soler	1.012.930343	
Kevid Soler	1090332263	
Cesar Diaz	1001792574	

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	JHONATHAN Soler	4.012.930343	
RESIDENTE DE OBRA		53.121.232	
INSPECTOR SISO	Federico Hankeeosnss	1066882281	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE		EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	X		NO	
FIRMA		EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO	
FECHA		EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI			NO	

Powered by CamScanner

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES			
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS			✓
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			✓

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ADUEN Arrieta	1005708611	
JHONATHAN Soler.	1.012.430.343.	
Kevin Soler	1070337765	
Cesar D197	100 1.1 925 14	Cesar Diaz

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	JHONATHAN Soler.	1012430343	
RESIDENTE DE OBRA	Jennifer Muñoz	53.121.232	
INSPECTOR SISO	Federico Monterrosa	1066772291	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE		EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	✓		NO		
FIRMA		EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO	X	
FECHA		EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI	✓		NO		

Powered by CamScanner

INGEOLAR S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO:
		VERSIÓN:00
		FECHA: 03/04/2018

ACTIVIDAD: EMPRESA: INGEOLAR SAS RE Federico Monte Sns FECHA: Semana DEL: 11 AL 17 DE DIC 2023

ITEM	ASPECTOS A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se ha diligenciado permiso de trabajo	✓			✓			✓			✓											
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo	✓			✓			✓			✓											
3	Existe un AST o Análisis de riesgo vigente para la tarea y los controles recomendados han sido dispuestos	✓			✓			✓			✓											
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamio	✓			✓			✓			✓											
5	La línea de vida ha sido inspeccionada?, Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓											
6	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓											
7	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer	✓			✓			✓			✓											
8	Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓											
9	Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓											
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓											
11	Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente	✓			✓			✓			✓											
12	Se ha previsto un método para asegurar elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto	✓			✓			✓			✓											
13	El peso / volumen de las piezas, elementos o equipos que se vayan a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona(s) que realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓											
14	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo																					
15	Las condiciones físicas de quien va trabajar en altura son adecuadas	✓			✓			✓			✓											
ITEM	LA PLATAFORMA																					
1	Es firme	✓			✓			✓			✓											
2	Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓											
3	Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓											
4	Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓											
5	Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas																					
Vo.Bo. Ejecutante o Inspector																						
OBSEVACIONES:																						

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Ingeniería, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
	VERSIÓN:
	FECHA:

FECHA Desde 11 Dic 2023- LUGAR: FAC

TIEMPO EN MINUTOS: 15 M.T.

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes SAS EMPRESA: INGEBLAR SAS.

TEMA: IMPORTANCIA DEL ORDEN Y ASEO (JORNADA DE ORDEN Y ASEO EN OBR)

OBJETIVO:

1	Grady Cano Ramon.	1078822716.	Contratista.	Grady
2	NEIDER CUESTA CALCEDO	1040381828	OBRERO	NEIDER CUESTA
3	Alvaro ocollo	7476923	Contratista	
4	SHON CRUZ	1445727165	OP	SHON CRUZ
5	CESAR DIAZ	1001192574	OP	CESAR DIAZ
6	Jose de los Reyes	8649073	contratista	Jose
7	Saul salgado	1131105699	obrero	SAUL
8	Milton PACHA	1073828310	instalador	Milton
9	Luis Olmos	3811816.	OBRERO	
10	ANICETA VILLALBO	1005708814	OBRERO	
11	JHONATHAN SOLER.	1.072.430.343.	OP	
12	KEVIN SOLER	1070332263	OP	
13	Javier Guzman	1003192133	ELECTRICISTA	Javier Guzman.
14				
15	FRANCISCO - HDZ	15672197.	obrero	FCO. - HDZ
16	HILARIO JOSE M.	1131106727	obrero	HILARIO
17	ERICK OROZCO RODRIGUEZ	1193533200	obrero	ERICK OROZCO.
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes SAS

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Servicios, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 12 dic 2023 LUGAR: Jose

TIEMPO EN MINUTOS: 15 min

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: IDENTIFICACACION DE SEÑALIZACIONES.

OBJETIVO:

1	JHONATHAN SOLER.	1.092.930343	Contratista	
2	ADVIS Arista	1065708614	OP.	
3	KEVIN Soler	1070357768	OP	
4	CESAR DIAZ	1001192514	OP	CESAR DIAZ
5	Javier Gutman	1.003.192.133	Electricista	Javier Gutman
6	JOSE FIDEL MORALES P	15683799	AYUDANTE	
7.	SAUL SALGADO ARIAS	1131105699	Obrero	SAUL SALGADO
8	Jose de los Reyes	8649073	contratista	Jose
9	FRANCISCO. HDZ	15682147	obrero	Fco. HDZ
10	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario
11	ERICK PEREZ	1193533200	AYUDANTE	ERICK PEREZ
12	Carlos Andres Garcia	80769089	Contratista	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR Federico Montes

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Soluciones, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde 19 Dic 2023 · LUGAR: Fac.

TIEMPO EN MINUTOS: 15 Hrt

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes SnS EMPRESA: INGEBLAR SAS.

TEMA: PROTECCION DE LA PIEL

OBJETIVO:

1	Sayl saigdo arias	1131105699	obrero	Sayl
2	Carlos Andrei Garcia	80768089	oficial	
3	Jose de los Reyes	8649073	contratista	Jose
4	FRANCISCO H-DZ	15682147	Obrero	FCO. H-DZ
5	Hilario Jose M	1131 106727	obrero	Hilario
6	Javier Guzman	1.003.192.133	Electricista	Javier Guzman
7	ERICK OROZCO	1193533200	Ayudante	ERICK OROZCO
8	ADIS MIXTA	1005708014	OP	
9	CESAR DIAZ	1001192514	OP	CESAR DIAZ
10	JHONATAN SOLER	1.012.430.343	OP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes SnS

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 14 Dic 2023 LUGAR: JAC

TIEMPO EN MINUTOS: 15 Min

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes SAS EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: Manejo de estres Laboral-

OBJETIVO:

1	Saul Salgado arias	1131105699	obrero	Saul
2	Francisco - Hdz	15-682 147	obrero	FCO. Hdz
3	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario Jose
4	Joseph Morales P	15683799	obrero	
5	Javier Guzman	1.003.192.133	Electricista	
6	ERICK OROZCO Rodrigue	1193533200	obrero	ERICK OROZCO
7	Jose de los Reyes	9649073	contratista	Jose
8	Jhonathan Soler.	1012433343.	Cotratista.	
9	ADOLFO ARRIETA	1003708364	OP	
10	KEVIN Soler	1070332265	OP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes SAS

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde 15 Dic 2023 | LUGAR: Fac.

TIEMPO EN MINUTOS: 15 Min

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes | EMPRESA: INGEBLAR

TEMA: Cuidado del Recurso Hidrico

OBJETIVO:

1	Jose de los Reyes	8649073	contratista	Jose
2	Carlos Andres Garcia	80768089	Constructor	
3	saul salgado	1131105699	obrero	saul
4	Robert Villalobos	15619479	OFC	
5	Joseph Montes	15683799	obrero	
6	Hilario Jose M	1121106727	obrero	Hilario
7	ERICK PORRAS Q.	1193533200	obrero	ERICK PORRAS
8	FRANCISCO - Hdz	15682147	obrero	FCO - Hdz
9	Luis Bernate	1.070626074	oficial	
10	EVER AIVIS	1121104841	OFC	
11	Javier German	1003192433	Electricista	Javier German.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	16 DIC 2023 -	LUGAR:	Fac.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 M.I -		
NOMBRE CAPACITADOR:	Federico Montes	EMPRESA:	INGEBLAR SAS.
TEMA:	Que es el Riesgo Locativo.		
OBJETIVO:			

1	Joseffdo Morales P	1563799	obrero	
2	Robert Villalobos	1561947	OGC	
3	Javier Guzman	1.003.192.733	Electricista	
4	FRANCISCO. Hdz	1561247	Obrero	
5	ERICK orozco Rodriguez	1193533205	obrero	ERICK orozco
6	Hilario Jose M	1131 106 727	obrero	Hilario Jose
7	Diego Capacitem	16 830 803	Maestro C.	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPA Federico Montes

Powered by CamScanner

I. GENERALIDADES

La Empresa **INGEBLAR SAS** viene realizando las actividades de obras civiles, carpintería metálica, mantenimiento de perfiles de cubiertas, elaboración de regatas para puntos eléctricos en el proyecto

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de mitigar al máximo los accidentes laborales y daños al medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

II. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 18 de diciembre al 24 de diciembre de 2023, se vienen desarrollandoen el proyecto las siguientes actividades:

- **Elaboración de carpintería metálica.**
- **Elaboración de regatas hidrosanitarias en piso y paredes.**
- **Instalación de tubería de punto hidrosanitario.**
- **Mantenimiento de perfiles para cubiertas.**
- **Elaboración de regatas para puntos eléctricos.**
- **Instalación de tubería en puntos eléctricos.**
- **Resane en cabañas y estuco.**
- **Orden y aseo**

III. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y el personal se distribuye de la siguiente manera:

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

N°	CARGOS	N° DE TRABAJADORES EN OBRA
1	**INGENIEROS** ▪ Residente Civil ▪ Auxiliar civil ▪ Ing. hidrosanitario ▪ Ing. ambiental ▪ Ing. Eléctrico	5
2	**RESIDENTE SST**	1
3	**SUPERVISOR DE OBRAS**	1
4	**CONTRATISTAS**	7
5	**OFICIAL CIVIL**	2
6	**AYUDANTE CIVIL**	4
7	**AYUDANTE ELECTRICO**	3
8	**OFICIAL ELECTRICO**	1
9	**OFICIAL DE CUBIERTA**	1
10	**AYUDANTE DE CUBIERTA**	6
11	**AYUDANTE CAROINTERIA**	3
12		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
TOTAL		**34**

VI. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE SEMANA.

Durante la presente semana se ha utilizado en obra los siguientes equipos:

Cortadora	
Atornillador inalámbrico	
pulidora	
Taladro percutor	

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

También se utilizaron las siguientes herramientas menores:

Martillo.	Picas
mazo	Alicates
cincel	Lima
Carreta	Barra
Porras	Palas
llanas	espátula

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

V. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE LA PRESENTE SEMANA.

Durante el periodo del 18 diciembre al 24 de diciembre de 2023, se han desarrollado las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el proyecto, tratando en todo momento de cumplir con los estándares planteados en la semana**.**

- **Programa de capacitación personal**

Durante la semana del 18 de diciembre al 24 de diciembre de 2023, no se realizó Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, puesto que no ingresó personal nuevo a la obra.

- **Charlas diarias de 5 minutos**

Las charlas de seguridad de 15 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Las charlas de seguridad se dictan al grupo de trabajo antes de iniciar labores de obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

En la semana se realizaron siguientes charlas cuyos temas fueron:

N	FECHA	TEMA
1	18-12-2023	Contaminación ambiental
2	19-12-2023	Condiciones inseguras vs actos inseguros
3	20-12-2023	Recomendaciones de higiene postural para las actividades diarias
4	21-12-2023	Inspección a los equipos de protección contra caídas
5	22-12-2023	Que hacer en tiempo de sequia
6	23-12-2023	Como prevenir la infección por roedores

VER ANEXO DE CHARLAS

- **Inspección reposición, entrega de EPP y Dotación.**

Los elementos de protección personal (EPP) y dotación son equipos de seguridad de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

VER ANEXO DE ENTREGA DE EPP

- **Las inspecciones de seguridad herramientas.**

Son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros.

En esta semana se hicieron inspecciones a:

1. **Inspección Herramientas Menores**
2. **Inspección de equipos de protección contra caída.**
3. **Inspección de máquinas.**

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

- **Análisis de trabajo seguro.**

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en una forma eliminen o minimicen estos riesgos.

En esta semana se hicieron los siguientes análisis de trabajo.

- **Mantenimiento de perfiles.**
- **Elaboración de regatas para puntos eléctricos.**
- **Instalación de tubería para puntos eléctricos**
- **Corte y armado de carpintería metálica**
- **Demolición y excavación para tubería hidrosanitaria**
- **Instalación de tubería hidrosanitaria pisos y paredes**
- **Orden y aseo**

VER ANEXOS DE ATS

- **Índices de accidentalidad**

INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*	INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*
N° de trabajadores.	18	N/A	N° Días Perdidos Por AT.	0	0
N° Horas Hombre Trabajadas	882	N/A	N° de días cargados.	0	0
N° Accidentes de Trabajo (Total mes).	0	0	N° de investigaciones de AT e incidentes realizadas.	0	0
N° Accidentes de Trabajo - AT Incapacitantes.	0	0	Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de Trabajo.	0	0
N° Accidentes Trabajo-AT NO Incapacitantes.	0	0	Índice de Severidad (IS) AT Incapacitantes.	0	0
N° Accidentes de trabajo graves.	0	0	N° de trabajadores Ausentes por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes de trabajo mortales.	0	0	N° de Días Perdidos por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes reportados a la ARL.	0	0	N° de Casos nuevos de enfermedad Laboral.	0	0
N° Incidents de trabajo	0	0	N° Trabajadores retirados durante el mes.	0	0

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Registro Fotográfico

CHARLAS DIARIAS		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

PAUSAS ACTIVAS		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Actividades realizadas		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

EVIDENCIAS DE INSPECCIONES		
		
		

Firma:
FEDERICO MONTEALEGRE SANCHEZ
Profesional SISO

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoría

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: MANTENIMIENTO DE PERFILES. Fecha: 19-DIC-23 HASTA - 24-DIC-23

Herramientas usadas: ESCALERA, ARNES, LINEA DE VIDA, RODILLO, BROCHA.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
• Charla de Seguridad pre-laboral • Inspeccion de herramientas y equipos • Inspeccion de Areas. • Preparacion de pintura para mantenimiento • fijacion de linea de vida: • Anclaje y seguimiento de Colaboradores en Cubiertas. • Aplicacion de pintura y Mantenimiento de estructura. • Orden y Aseo	Caida a distinto nivel Movimiento repetitivo. Golpe de Calor Picadura de insecto	• fracturas. • Contusiones. Traumas Osteo mostulares Deshidratacion. Dengue, fiebre.	Uso adecuado de equipo de Proteccion Contra Caidas aplicacion e implementacion de pausas activas. Hidratacion Constante durante la jornada laboral Uso de repelente.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cesar Diaz	1001192514	OP	Cesar Diaz
Kevin Soler	1020332263	OP	
Nestor Acosta	1040381828	OBRERO	Nestor Acosta
JHON CAS	1415 727 165	OP	JHON CAS
Las Olascoaga	3811816.	OBRERO	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: EXCAVACION MANUAL PARA REGATA HIDROSANITARIA Fecha: 18 DE DIC - HASTA 24 DIC 2021

Herramientas usadas: PICA, PALA, BARRA, BUGUI, TALADRO.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-laboral. Inspeccion de herramientas Inspeccion de Areas. trasado, toma de Medidas, Corte de Solado Cora, excavacion Manual para regata hidro Sanitaria. uso de escombro. Orden y aseo	Laseracion de Miembros trauma osteo Muscular. Golpes. Inhalacion de Material particulado. Golpe de Calor Picadura de insectos	Perdida de Miembros: Dedo, Mano. Afectaciones en los Musculos, tendones y ligamentos. fracturas. Afectacion Pulmonal y Cardiaca perdida de la audicion Deshidratacion. Dengue, fiebre.	Uso de guantes. pausas de 15 a 20 minutos para estiras Uso de epp. Uso de las cartillas, y proteccion auditiva. Hidratacion constante. Uso de repelente

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Leon Nuñez Ever Alvis	16830803 1131104841	Maestro de obra CF	
Alvis Bermudez	1.104 062607	oficial	
Alfonso Rodriguez	72209106	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: CORTE Y ARMADO DE CARPINTERIA METALICA Fecha: 18 DE DIC - HASTA 24 DIC 2023.

Herramientas usadas: CORTADORA, TALADRO, LIMA, CORTA FRIO, FLEXOMETRO

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Laseraciones en miembros.	Perdida de Miembros (Dedos, Mano).	Uso de guantes de Seguridad. Uso adecuado de elementos Proteccion personal.
Inspeccion de equipos y herramientas.	Intoxicacion de material particulado.	Afectacion en los Pulmones.	Uso de Mascarillas.
Inspeccion de area del trabajo.	Hormiguero, repetitivo o perdida auditiva	Trauma osteo Musculares	Uso de tapa oidos.
Toma de medidas.	Golpe de Calor	Hidratacion Constante.	Pausas activas
Corte de metal.	Picadura de insectos.	Dengue, fiebre.	Hidratacion Constante.
Armado de Carpinteria			Uso de repelente.
Ajuste de estructura Con tuercas, arandelas y tornillos; Orden y aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Carlos D. Garcia P.	80768089	Oficial	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código:
		Versión:00
		Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19	12	2023	HORA	07:00	LUGAR	Fac

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD", AFP "PENSION", ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Cesar Diaz	OP	Nueva EPS		Positiva
Shon Cruz	OP	Salud Total		Positiva
Kevin Soler	OP	Salud Total		Positiva

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento de perfiles en Cubierta

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Inspeccion de equipos, inspeccion areas, preparacion de puntos para mantenimiento en cubierta en cubierta y estructura, aplicacion de pintura en perfiles.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 5 MTS.

Riesgos asociados: Los riesgos asociados son caidas a distinto nivel, caidas golpes, desintalacion, inhalacion de producto quimico

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE	✓	KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE	✓	SILLA PARA TRABAJO EN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES		ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Rodillo, Brochas, arnes, Linea de vida, andamios.

Powered by CamScanner

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	/		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	/		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	/		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	/		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	/		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	/		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	/		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	/		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	/		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	/		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS			/
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			/

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
CESAR DIAZ	1001192514	CESAR DIAZ
SHAN CRUZ	1145727163	SHAN CRUZ
KEVIN SOLER	1070333263	

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	JONATAN SOLER	1012430343	
RESIDENTE DE OBRA	Sandra Murillo	53 121. 282	
INSPECTOR SISO	Federico Montealegre.	79 318 076	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE		EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	✓		NO	
FIRMA		EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO	✓
FECHA		EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI	✓		NO	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO:
VERSIÓN:00
FECHA: 03/04/2018

ACTIVIDAD:

EMPRESA: INGEBLAR SAS

RESPONSABLE:

FECHA: Semana DEL 19 AL 24 DE Oct 20 2023.

ITEM	ASPECTOS A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se ha diligenciado permiso de trabajo				✓																	
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo				✓																	
3	Existe un AST o Análisis de riesgo vigente para la tarea y los controles recomendados han sido dispuestos				✓																	
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamio				✓																	
5	La línea de vida ha sido inspeccionada?, Es adecuada para soportar una caída				✓																	
6	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado				✓																	
7	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer				✓																	
8	Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro				✓																	
9	Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo				✓																	
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo				✓																	
11	Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente				✓																	
12	Se ha previsto un método para asegurar elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto				✓																	
13	El peso / volumen de las piezas, elementos o equipos que se vayan a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona(s) que realizará el trabajo				✓																	
14	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo				✓																	
15	Las condiciones físicas de quien va trabajar en altura son adecuadas				✓																	
ITEM	LA PLATAFORMA																					
1	Es firme				✓																	
2	Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos				✓																	
3	Cuenta con barandas				✓																	
4	Tiene instalados rodapiés				✓																	
5	Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas				✓																	
Vo.Bo. Ejecutante o Inspector																						

OBSEVACIONES:

Powered by CamScanner

NGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓD: SG-SST-FOR-81
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA

BRA / LUGAR: Jde FECHA: Desde 18 Dic Hasta 24 Dic

arque con una (x) el estado de la herramienta: (B) Bueno, (M) Malo, NA (No Aplica)

CLASE	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO	¿Las herramientas manuales tienen sus agarradores/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			¿Las puntas de las herramientas no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras ?			¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente?			¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección?			¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?			¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañarlas?			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA		
SUJECIÓN	Tornillo de banco																										
	Gatos																										
	Mordaza																										
	Entenallas																										
	Tenazas																										
	Alicates																										
	Sargento																										
FIJACIÓN	Destornillador																										
	Llaves fijas																										
	Remachadora																										
	Pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Cavador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Pica	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
CORTE	Alicates de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Bisturi																										
	Tijeras																										
	Cizallas																										
	Machete																										
	Motosierra																										
	Guadaña																										
POR ACERRADO	Segueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Serrucho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Segueta de calar																										
O REBANAR	Formones																										
	Cinceles	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Cepillos de carpintería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
HUECOS	Barrena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Broca	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Berbiquí																✓			✓							
GOLPE	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Mazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							

Powered by CamScanner

LIMAR	Limas																									
	Escofina																									
MEDICIÓN	Flexómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Calibrador o pie de rey																									
	Micrometros																									
	Torquimetro																									
	Nivel digital	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Nivel de mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						
GIRATORIA	Esmeriador																									
	Cortadora 060235																									
	mezcladora																									
	Taladro 34963																									
	Taladro 34821																									
	Taladro 34499																									
	Taladro 34870																									
JARDINERIA	Llana	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Espatula	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Plana																									
	Carretilla	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						

lonador por: SHOU CRUZ Cargo: _____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia Consultoria & Construccion	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-104
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO	FECHA:

OPERADOR: Carlos Andres Garcia - SEMANA DEL 18 Dic AL 24 MES: Dic AÑO: 2023

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Interruptor de encendido y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorio porta brocas (Mandril).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del cuerpo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía y la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carcasa del taladro (Fisuras, ruptura, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Condiciones de orden y aseo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Limpieza y desinfección del taladro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Firma de Operador / Quién Inspecciona																		
Firma del encargado de L y D																		
Verificación SST																		

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Carlos Andres Garcia - SEMANA DEL 18 Dic AL 24 MES: Dic AÑO: 2023.

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
¿Qué se está inspeccionando?	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

Guarda de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Condiciones de orden y aseo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Limpieza y desinfección de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	✓																					
	✓																					
	✓																					
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NC	SI		NO
	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Firma de Operador / Quién Inspecciona																						
Firma del encargado de L y D																						
Verificación SST																						

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Servicios, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde: 22 dic 2023 | LUGAR: JAC

TIEMPO EN MINUTOS: 15 min

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Monteolesns | EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: Que Hacer en Tiempo de Sequia

OBJETIVO:

1	JHONATHAN Soler.	1.092.930343	Contratista	
2	ADRIS Arista	1005708614	OP.	
3	KEVIN Soler	1070352768	OP	
4	CESAR DIAZ	1001992514	OP	CESAR DIAZ
5	Javier Gutman	1.003.192.133	Electricista	Javier Gutman
6	Josefido Morales P	15683299	Ayudante	Josefido M P
7	Saul salvador arias	1131105699	Obrero	Saul salvador
8	Jose de los Reyes	8649073	contratista	Jose
9	FRANCISCO. Hdz	15682147	obrero	Fco. Hdz
10	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario
11	ERICK OROZCO	1123533200	ayudante	ERICK OROZCO
12	Carlos Andres Garcia	80768089	Contratista	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Monteolesns

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Servicios, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde 23 Dic 2023. LUGAR: Fac.

TIEMPO EN MINUTOS: 15 Hit

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes EMPRESA: INGEBLAR SAS.

TEMA: COMO PREVENIR LA INFECCION POR ROEDORES

OBJETIVO:

1	Saul salgado arias	1131105699	Obrero	Saul
2	Carlos Andres Garcia	80768089	oficial	
3	Jose de los Reyes	8649073	contratista	Jose
4	FRANCISCO HDZ	15682147	Obrero	FCO. HDZ
5	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario
6	Javier Guzman	1.003.192.133	Electricista	Javier Guzman
7	ERICK OROZCO	1193533200	Aprendiz	ERICK OROZCO
8	ARIS MIRCIA	1005708014	OP	ARIS
9	CESAR DIAZ	1001192514	OP	CESAR DIAZ
10	JONATHAN SOLER	1.012.430 343	OP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde: 20 Dic 2023 | LUGAR: Fac.

TIEMPO EN MINUTOS: 15min

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes | EMPRESA: INGEBLAR

TEMA: Recomendaciones de Higiene postural.

OBJETIVO:

1	JHONATHAN Solar.	1.012.430.343	Contratista.	
2	ADRIS ARRIETA	1005708614	OP	
3	NEYDER COSTA	1040391828	OBRERO	NEYDER COSTA
4	Alvaro Criollo	79469423	Carpintero	
5	Jose Mauro	3811816	OBRERO	
6	Kevin Soler	1070032763	O P	
7	Cesar Diaz	1001192514	OP	Cesar Diaz
8	JHON CRUZ.	1115 727165	OP	JHON CRUZ
9	Carlos D. Garcia	80768089	OFICIAL	
10	Hilario Jose M	1131 106 727	obrero	Hilario
11	FRANCISCO - Hdz	15.682.147	OBRERO	FCO - Hdz
12	ERICK OROZCO	1193533200	obrero	ERICK OROZCO
13	Javier Guzman	1.003.192.133		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 19 Dic 2023 | LUGAR: FAC.

TIEMPO EN MINUTOS: 15 Hit

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes | EMPRESA: INGEBLAR

TEMA: Condiciones y actos inseguros

OBJETIVO:

1	Carlos D. Garcia P	80768089	OFICIAL	
2	Hardin Rodriguez	72209/oc	ayudante	
3	ever Nivis	1131104881	ayudante	
4	Luis Bermytc	1.064.062.607	oficial	
5	NELSON COSTA	1040581826	OBRERO	NELSON COSTA
6	Diego Rojas V	16830503	Maestro de obra	
7	FRANCISCO - Hdz	15 682 147	obrero	FCO - Hdz
8	Javier Guzman	1.003.197.133	Electricista	Javier Guzman
9	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario
10	Kevin Soler	1070532260	O P	
11	JHON CRUZ	1145 727 765	OP	JHON CRUZ
12	Cesar Diaz	1007192514	O P	Cesar Diaz
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Ingeniería, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde: 19 Dic 2023 | LUGAR: FAC.

TIEMPO EN MINUTOS:

NOMBRE CAPACITADOR: Federico Montes SAS | EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: CONTAMINACION AMBIENTAL.

OBJETIVO:

1	Diego Pepe Vergara	16830803	Maestro de obra	
2	Ever Alvis	1131104841	EF	
3	Luis Barrate	1.107062607	OFICIAL	
4	Carlos D. Garcia	80768089	OFICIAL	
5	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario Jose
6	Javier Carmona	1003792135	Electricista	Javier Carmona
7	FRANCISCO - HDZ	15682147	OBRERO	T-CO - HDZ
8	ERICK Polanco Rodelo	1193533200	obrero	ERICK Polanco
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: Federico Montes SAS

Powered by CamScanner

REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES

Informe N°: 01 | **INGEBLAR SAS**

Fecha de presentación: 10-DIC-2023

No.	MEDIO	ASPECTO Y/O PROGRAMA	ACTIVIDADES REALIZADAS (Descripción de la actividad realizada en cumplimiento de las medidas ambientales con su respectiva fecha)	ANEXOS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS
2	BIOTICO	PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	•Durante la primera semana del mes de diciembre que va desde el 04de DIC hasta el 10 de DIC no se realizaron actividades referentes a manejo de fauna.	
		PROGRAMA DE MANEJO DE COBERTURA VEGETAL	•Durante la primera semanadel mes de diciembre no se realizaron actividades referentes a manejo de fauna.	Ver anexos / Biotico / Programa de manejo de cobertura vegetal / Resolución 131 de abril de 2023
1	ABIOTICO	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO	**Manejo de Residuos Sólidos Aprovechables y no Aprovechables.** • Revisión del estado de señalizaciones en puntos ecológicos provisionales. • Revisión del estado de señalizaciones en puntos de acopio de materiales. • Garantizar separación en la fuente de acuerdo al código de colores establecido. • El punto ecológico debe estar protegido de lluvias o de la intemperie. **Manejo de Residuos de Demolición RCD:** • Revisión del estado de señalizaciones en puntos de acopio de RCD • Se realiza cubrimiento del material sobrante de demolicion con plástico para evitar que el viento y la lluvia lo desplazará, evitando afectación al aire y agua. * Se establecio un area destinado para el acopio temporal de residuos de material de demolicion, el cual se encuentra señalizado e identificado • Control de Generación: Demoliciones: 7,32 m3 **Manejo de Residuos Especiales y peligrosos**: • Durante la primera semanadel mes de diciembre que va desde el 04 DIC hasta el 10 de DIC no tuvimos residuos especiales y peligrosos **Manejo de materiales para la construcción :** Teniendo en cuenta que se inicio la demolicion de enchapes,muros y excavacion. se fijo un punto de acopio tepotral , el cual fue cubierto y señalizado, para posteriormente darle la disposicion final. . En la semana que va del 04 de DIC hasta el 10 de DIC no se realizó recoleccion de ningun tipo de residuo solido.	Manejo de Residuos de Demolición RCD
		PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOFERICAS Y RUIDO	**Manejo de Emisiones y ruido:** Duramente la primera semana de diciembre que va desde el 04 hasta el 10 de DIC se implementaron las siguientes medidas: • Cubrimiento de material para evitar emisiones. • Revisión de técnico mecánicas de vehículos ingresados en sitio. • Revisión del estado de señalización del limite de velocidad. • Vehículos conduciendo con limite de velocidad permitida. • Se realiza inspección preoperacional de vehiculos de emergencia para validar que se encuentre en buenas condiciones. • El material sobrante de demolicion se encuentra cubierto con plástico para evitar emisiones de material particulado. • La jornada laboral de la primera semanade diciembre fue la siguiente: del 04 - 10 de noviembre el horario fue de 7am - 05:00pm.	
		PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	**Uso eficiente y ahorro de agua:** **Agua de consumo:** • • El proveedor del agua de consumo es la empresa AGUA SANTANA,	Agua de Consumo
		PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PELIGROSAS		
3	SOCIOECONOMICO	PROGRAMA DE MANEJO PARA LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A COMUNIDADES	• Durante la primera semana de diembre no se recibieron quejas ni solicitudes por parte de la comunidad. • Durante la primera semana de diciembreno no se tuvo requerimiento de personal nuevo	Relacion de Personal
		PROGRAMA DE CAPACITACIONES	* Durante la primera semana de diciembre del 04 al 10 se realizo 2 Charlas, en las cuales participó todo el personal que estuvo presente en obra.	Programa De Capacitaciones / Asistencia Charlas Ambientales

ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL
CC. No 43.788.651 de El Santuario
Especialista Ambiental

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoría

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoria & Construccion

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO:	REMODELACION

ACTIVIDADES



FECHA: 10-12-2023
punto de acopio ecologico



FECHA: 10-12-23.
ACTIVIDAD: Señalización y demarcación de zonas de trabajo.



FECHA: 10-12-23.
ACTIVIDAD: Señalización y demarcación de zonas de trabajo.



FECHA: 10-12-23
ACTIVIDAD: Punto de Hidratación



FECHA: 10-12-23
ACTIVIDAD: Punto de acopio RCD



FECHA 10-12-2023
ACTIVIDAD: punto de acopio de RCD

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES

ASPECTO Y/O IMPACTO	OBSERVACIÓN
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO	Durante la primera semana del mes de diciembre que comprende los dias desde el 04 de diciembre hasta el 10 del mismo mes, se hizo recoleccion de residuos RCD, a los cuales se le ha habilitado un area como centro de acopio temporal, para posteriormente darle la disposicion final.

ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL
CC. No 43.788.651 de El Santuario
Especialista Ambiental

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoría

REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES

Informe N°: 03 | **INGEBLAR SAS**

Fecha de presentación: 17-DIC-2023

No.	MEDIO	ASPECTO Y/O PROGRAMA	ACTIVIDADES REALIZADAS (Descripción de la actividad realizada en cumplimiento de las medidas ambientales con su respectiva fecha)	ANEXOS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS
2	**BIOTICO**	**PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE**	•Durante la segunda semana del mes de diciembre que va desde el 11de DIC hasta el 17 de DIC no se realizaron actividades referentes a manejo de fauna.	
		PROGRAMA DE MANEJO DE COBERTURA VEGETAL	•Durante la segunda semanadel mes de diciembre no se realizaron actividades referentes a manejo de fauna.	Ver anexos / Biotico / Programa de manejo de cobertura vegetal / Resolución 131 de abril de 2023
		PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO	**Manejo de Residuos Sólidos Aprovechables y no Aprovechables.** • Revisión del estado de señalizaciones en puntos ecológicos provisionales. • Revisión del estado de señalizaciones en puntos de acopio de materiales. • Garantizar separación en la fuente de acuerdo al código de colores establecido. • El punto ecológico debe estar protegido de lluvias o de la intemperie. **Manejo de Residuos de Demolición RCD:** • Revisión del estado de señalizaciones en puntos de acopio de RCD • Se realiza cubrimiento del material sobrante de demolicion con plástico para evitar que el viento y la lluvia lo desplazará, evitando afectación al aire y agua. * Se establecio un area destinado para el acopio temporal de residuos de material de demolicion, el cual se encuentra señalizado e identificado • Control de Generación: Demoliciones: 4 m3 **Manejo de Residuos Especiales y peligrosos**: • Durante la segunda semanadel mes de diciembre que va desde el 11 DIC hasta el 17 de DIC no tuvimos residuos especiales y peligrosos . **Manejo de materiales para la construcción :** Teniendo en cuenta que se inicio la demolicion de enchapes,muros y excavacion. se fijo un punto de acopio tepotral , el cual fue cubierto y señalizado, para posteriormente darle la disposicion final. . En la semana que va del 11 de DIC hasta el 17 de DIC no se realizó recoleccion de ningun tipo de residuo solido.	Manejo de Residuos de Demolición RCD .

1	**ABIOTICO**	**PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOFERICAS Y RUIDO**	**Manejo de Emisiones y ruido:** . Duramente la segunda semana de diciembre que va desde el 11 hasta el 17 de DIC se implementaron las siguientes medidas: • Cubrimiento de material para evitar emisiones. • Revisión de técnico mecánicas de vehículos ingresados en sitio. • Revisión del estado de señalización del limite de velocidad. • Vehículos conduciendo con limite de velocidad permitida. • Se realiza inspección preoperacional de vehiculos de emergencia para validar que se encuentre en buenas condiciones. • El material sobrante de demolicion se encuentra cubierto con plástico para evitar emisiones de material particulado. • La jornada laboral de la primera semanade diciembre fue la siguiente: del 11- 17 de noviembre el horario fue de 07:30 am - 05:00 pm.	
		PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	**Uso eficiente y ahorro de agua:** **Agua de consumo:** • El proveedor del agua de consumo es la empresa AGUA SANTANA,	Agua de Consumo
		PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PELIGROSAS		
3	**SOCIOECONOMICO**	**PROGRAMA DE MANEJO PARA LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A COMUNIDADES**	• Durante la segunda semana de diembre no se recibieron quejas ni solicitudes por parte de la comunidad. • Durante la segunda semana de diciembreno no se tuvo requerimiento de personal nuevo	Relacion de Personal
		PROGRAMA DE CAPACITACIONES	* Durante la segunda semana de diciembre del 11 al 17 se realizo 2 Charlas, en las cuales participó todo el personal que estuvo presente en obra.	Programa De Capacitaciones / Asistencia Charlas Ambientales

ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL
CC. No 43.788.651 de El Santuario
Especialista Ambiental

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoría

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoria & Construccion

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO:	REMODELACION



FECHA: 17-12-2023
punto de acopio ecologico



FECHA: 17-12-23.
ACTIVIDAD: Señalización y demarcación de zonas de trabajo.



FECHA: 17-12-23.
ACTIVIDAD: Señalización y demarcación de zonas de trabajo.



FECHA: 17-12-23
ACTIVIDAD: Punto de Hidratación



FECHA: 17-12-23
ACTIVIDAD: Punto de acopio RCD

FECHA: 30-11-2023
ACTIVIDAD: acopio de residuos (machimbre)

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES

ASPECTO Y/O IMPACTO	OBSERVACIÓN
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO	Durante la segunda semana del mes de diciembre que comprende los dias desde el 11 de diciembre hasta el 17 del mismo mes, se hizo recoleccion de residuos RCD, a los cuales se le ha habilitado un area como centro de acopio temporal, para posteriormente darle la disposicion final.

ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL
CC. No 43.788.651 de El Santuario

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoria

REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES				
Informe Nº: 04				**INGEBLAR SAS**
Fecha de presentación: 24-DIC-2023				
No.	**MEDIO**	**ASPECTO Y/O PROGRAMA**	**ACTIVIDADES REALIZADAS** (Descripción de la actividad realizada en cumplimiento de las medidas ambientales con su respectiva fecha)	**ANEXOS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS**
2	**BIOTICO**	**PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE**	•Durante la cuarta semana del mes de diciembre que va desde el 18 de DIC hasta el 24 de DIC no se realizaron actividades referentes a manejo de fauna.	
		PROGRAMA DE MANEJO DE COBERTURA VEGETAL	•Durante la cuarta semanadel mes de diciembre no se realizaron actividades referentes a manejo de fauna.	Ver anexos / Biotico / Programa de manejo de cobertura vegetal / Resolución 131 de abril de 2023
		PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO	**Manejo de Residuos Sólidos Aprovechables y no Aprovechables.** • Revisión del estado de señalizaciones en puntos ecológicos provisionales. • Revisión del estado de señalizaciones en puntos de acopio de materiales. • Garantizar separación en la fuente de acuerdo al código de colores establecido. • El punto ecológico debe estar protegido de lluvias o de la intemperie. **Manejo de Residuos de Demolición RCD:** • Revisión del estado de señalizaciones en puntos de acopio de RCD • Se realiza cubrimiento del material sobrante de demolicion con plástico para evitar que el viento y la lluvia lo desplazará, evitando afectación al aire y agua. * Se establecio un area destinado para el acopio temporal de residuos de material de demolicion, el cual se encuentra señalizado e identificado • Control de Generación: Demoliciones: 3 m3 **Manejo de Residuos Especiales y peligrosos**: • Durante la cuartas semana del mes de diciembre que va desde el 18 DIC hasta el 24 de DIC no tuvimos residuos especiales y peligrosos . **Manejo de materiales para la construcción :** Teniendo en cuenta que se inicio la demolicion de enchapes,muros y excavacion. se fijo un punto de acopio tepotral , el cual fue cubierto y señalizado, para posteriormente darle la disposicion final. . En la semana que va del 18 de DIC hasta el 24 de DIC no se realizó recoleccion de ningun tipo de residuo solido.	Manejo de Residuos de Demolición RCD

1	**ABIOTICO**	**PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOFERICAS Y RUIDO**	**Manejo de Emisiones y ruido:** . Duramente la cuarta semana de diciembre que va desde el 18 hasta el 24 de DIC se implementaron las siguientes medidas: • Cubrimiento de material para evitar emisiones. • Revisión de técnico mecánicas de vehículos ingresados en sitio. • Revisión del estado de señalización del limite de velocidad. • Vehículos conduciendo con limite de velocidad permitida. • Se realiza inspección preoperacional de vehiculos de emergencia para validar que se encuentre en buenas condiciones. • El material sobrante de demolicion se encuentra cubierto con plástico para evitar emisiones de material particulado. • La jornada laboral de la primera semanade diciembre fue la siguiente: del 18 - 24 de diciiembre el horario fue de 07:30 am - 05:00 pm.	
		PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	**Uso eficiente y ahorro de agua:** **Agua de consumo:** El proveedor del agua de consumo es la empresa AGUA SANTANA,	Agua de Consumo
		PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PELIGROSAS		
3	**SOCIOECONOMICO**	**PROGRAMA DE MANEJO PARA LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A COMUNIDADES**	• Durante la cuarta semana de diembre no se recibieron quejas ni solicitudes por parte de la comunidad. • Durante la cuarta semana de diciembreno no se tuvo requerimiento de personal nuevo	Relacion de Personal
		PROGRAMA DE CAPACITACIONES	* Durante la cuarta semana de diciembre del 18 al 24 se realizo 2 Charlas, en las cuales participó todo el personal que estuvo presente en obra.	Programa De Capacitaciones / Asistencia Charlas Ambientales

ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL
CC. No 43.788.651 de El Santuario
Especialista Ambiental

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoría

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES

ASPECTO Y/O IMPACTO	OBSERVACIÓN
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO	Durante la primera semana del mes de diciembre que comprende los dias desde el 18 de diciembre hasta el 24 del mismo mes, se hizo recoleccion de residuos RCD, a los cuales se le ha habilitado un area como centro de acopio temporal, para posteriormente darle la disposicion final.

ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL
CC. No 43.788.651 de El Santuario
Especialista Ambiental

APROBO:

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal Interventoria
