CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	34	**DEL**	**9 de enero de 2023**	**AL**	**15 de enero de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	238	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA


No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ 57,199,781	$ 95,688,542.00	$ 45,966,777	48.04%	
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 7,216,733	$ 24,055,777.00	$ 1,096,448	4.56%	
1.2.2	Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,008,558	$ 3,361,860.00	$ 884,700	26.32%	
1.2.3	Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 450,542	$ 1,501,808.00	$ 536,360	35.71%	
1.2.4	Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,125,041	$ 3,750,136.00	$ 455,624	12.15%	
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 24,082,038	$ 80,273,460.00	$ 1,143,446	1.42%	
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 4,100,044	$ 13,666,814.00	$ 1,183,600	8.66%	
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	EJEUCIÓN	$ 92,062,647	$ 96,532,269.00	$ 58,529,357	60.63%	
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	EJEUCIÓN	$ 576,349,802	$ 604,331,461.00	$ 271,723,968	44.96%	Se realiza la excavacion para la zona del bloque G
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 201,951,302	$ 942,475,330.00	$ 564,803,522	59.93%	
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 26,511,412	$ 86,953,143.00	$ 64,796,630	74.52%	
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 113,812,563	$ 232,947,620.00	$ 231,600,441	99.42%	Se instala en la zona del bloque G (Zona zapata)
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 699,042,044	$ 1,430,775,096.00	$ 492,022,573	34.39%	Vigas de conexión zapata con bloque G y C
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 7,409,258	$ 15,165,012.00	$ 10,919,939	72.01%	Zona zapata bloque G
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 634,476,783	$ 1,298,625,151.00	$ 553,046,178	42.59%	
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ 40,824,118	$ 83,557,394.00	$ 73,765,043	88.28%	Zona bloque G (zapata)
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 6,821,576	$ 33,401,960.00	$ 33,401,960	100.00%	
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	EJEUCIÓN	$ 43,848,524	$ 43,848,524.00	$ 27,835,870	63.48%	
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 961,960,758	$ 1,968,908,032.00	$ 1,088,483,447	55.28%	

2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 129,679,391	$ 265,423,296.00	$ 221,621,640	83.50%	
3.1.1	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,143,387	$ 5,658,471.00	$ 5,527,980	97.69%	
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 1,193,804	$ 16,226,946.00	$ 7,960,741	49.06%	Bloque A
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 702,003	$ 5,670,326.00	$ 1,932,690	34.08%	Bloque A
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 440,284	$ 92,838,682.00	$ 2,832,571	3.05%	Bloque A
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 10,115,279	$ 16,785,372.00	$ 5,801,953	34.57%	
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 369,206,331	$ 944,434,572.00	$ 416,400,725	44.09%	Columnas bloque C Nivel cubierta
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 662,546,554	$ 1,707,849,179.00	$ 771,612,939	45.18%	
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 636,042,079	$ 1,639,528,478.00	$ 675,669,489	41.21%	Acero de entrepiso nivel cubierta bloque C
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 390,839,331	$ 999,772,067.00	$ 714,611,088	71.48%	
4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 83,860,236	$ 216,166,901.00	$ 113,578,569	52.54%	
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 903,443,363	$ 2,947,771,795.00	$ 2,056,069,317	69.75%	
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 901,971,746	$ 1,863,467,553.00	$ 200,785,248	10.77%	
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	EJEUCIÓN	$ 180,652,650	$ 373,227,158.00	$ 18,367,618	4.92%	
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 141,028,595	$ 291,364,128.00	$ 60,026,406	20.60%	
6.1.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,841,015	$ 5,695,536.00	$ 5,288,712	92.86%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,211,507	$ 3,748,032.00	$ 1,186,877	31.67%	
6.1.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,597,266	$ 4,941,450.00	$ 614,058	12.43%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 695,181	$ 2,150,676.00	$ 364,963	16.97%	
6.1.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 823,346	$ 2,547,181.00	$ 409,764	16.09%	
6.1.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 564,746	$ 1,747,150.00	$ 322,065	18.43%	
6.1.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 746,028	$ 2,307,981.00	$ 673,097	29.16%	
6.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 411,679	$ 1,273,608.00	$ 1,334,256	104.76%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.6.3	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 293,556	$ 908,172.00	$ 100,908	11.11%	
6.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 603,769	$ 1,867,875.00	$ 298,860	16.00%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 338,576	$ 1,047,450.00	$ 146,643	14.00%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 569,256	$ 1,761,102.00	$ 434,840	24.69%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 388,232	$ 1,201,070.00	$ 55,434	4.62%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 580,456	$ 1,795,752.00	$ 73,296	4.08%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,045,751	$ 3,235,232.00	$ 294,112	9.09%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	EJEUCIÓN	$ 5,469,301	$ 16,920,337.00	$ 8,260,322	48.82%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	EJEUCIÓN	$ 7,917,273	$ 24,493,611.00	$ 12,905,982	52.69%	Se continua con la instalacion de redes de suminsitro del mudulo A

6.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 7,672,767	$ 23,737,185.00	$ 8,129,598	34.25%	
6.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,407,557	$ 4,354,548.00	$ 683,772	15.70%	
6.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 60,298	$ 186,544.00	$ 1,106,439	593.13%	
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,106,273	$ 20,153,447.00	$ 4,011,621	19.91%	
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 5,001,719	$ 15,473,784.00	$ 2,586,277	16.71%	
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,338,173	$ 7,233,588.00	$ 279,987	3.87%	
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,009,994	$ 3,124,612.00	$ 1,617,103	51.75%	
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 3,703,583	$ 11,457,748.00	$ 359,956	3.14%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,359,531	$ 7,299,664.00	$ 6,745,200	92.40%	
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 4,471,437	$ 13,833,252.00	$ 5,763,855	41.67%	
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mamposteria, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material	EJEUCIÓN	$ 1,663,039	$ 5,144,932.00	$ 2,572,466	50.00%	
6.2.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 417,326	$ 1,291,080.00	$ 89,146	6.90%	
6.2.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,635,767	$ 5,060,560.00	$ 1,148,166	22.69%	
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,273,106	$ 9,285,600.00	$ 1,743,912	18.78%	
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 10,634,216	$ 43,440,600.00	$ 29,291,376	67.43%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 32,115,505	$ 53,292,716.00	$ 12,456,561	23.37%	
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 18,198,725	$ 30,199,104.00	$ 23,152,646	76.67%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 7,014,648	$ 11,640,160.00	$ 12,044,656	103.48%	
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 21,950,148	$ 36,424,243.00	$ 11,913,982	32.71%	Exteriores frente a bloque L
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 1,497,517	$ 2,484,992.00	$ 3,370,270	135.63%	
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	EJEUCIÓN	$ 1,281,654	$ 5,235,537.00	$ 725,718	13.86%	
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 6,490,535	$ 26,513,733.00	$ 10,374,939	39.13%	
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mamposteria, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	EJEUCIÓN	$ 5,667,634	$ 23,152,194.00	$ 10,289,864	44.44%	
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,833,053	$ 7,487,994.00	$ 409,180	5.46%	Bloque A
6.2.5.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,727,454	$ 7,056,623.00	$ 650,380	9.22%	
6.2.5.3	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 608,709	$ 2,486,568.00	$ 121,296	4.88%	
6.2.5.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 188,998	$ 772,055.00	$ 597,720	77.42%	Bloque A
6.2.5.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 784,629	$ 3,205,197.00	$ 356,133	11.11%	Bloque A
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 25,219,794	$ 48,785,278.00	$ 10,119,417	20.74%	Bloque A

6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 29,731,157	$ 227,154,621.00	$ 54,158,017	23.84%	Bloque A
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 6,328,255	$ 10,501,155.00	$ 12,805,342	121.94%	Bloque A
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJEUCIÓN	$ 64,143,253	$ 106,439,805.00	$ 33,624,775	31.59%	
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 15,161,363	$ 25,158,882.00	$ 7,188,252	28.57%	
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 18,295,461	$ 30,359,628.00	$ 7,006,068	23.08%	
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 4,160,463	$ 6,903,904.00	$ 584,833	8.47%	
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 4,861,699	$ 8,067,540.00	$ 1,722,110	21.35%	
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 1,044,664	$ 1,733,524.00	$ 731,414	42.19%	
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 18,516,447	$ 75,639,390.00	$ 7,439,940	9.84%	Se inicio con la instalacion de la tuberia que comprende del bloque A al C
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 2,828,399	$ 11,553,966.00	$ 1,109,988	9.61%	Se inicio con la instalacion de la tuberia que comprende del bloque A al C
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 21,341,267	$ 46,448,640.00	$ 18,869,760	40.63%	Se inicio con la instalacion de la tuberia que comprende del bloque A al C
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	EJEUCIÓN	$ -	$ 86,599,977.00	$ 3,352,560	3.87%	Se inicio con la instalacion de la tuberia que comprende del bloque A al C
28.1	Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 14,899,878		
28.2	Tratamiento de fallos	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 253,628,157		
28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 10,989,425		Se continua con el mejoramiento del terreno en las zonas paralelas al bloque L
28.4	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 18,224,109		
28.5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 375,160,010		

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRSO
$ 9,619,226,546.58	$ 938,607,052.91	$ 10,557,833,599.49	$ 9,628,762,122.90	$ 183,203,196.67	$ 9,811,965,320	-$ 745,868,279.915873
27.31%	**2.66%**	**29.97%**	**27.33%**	**0.52%**	**27.85%**	**-2.12%**

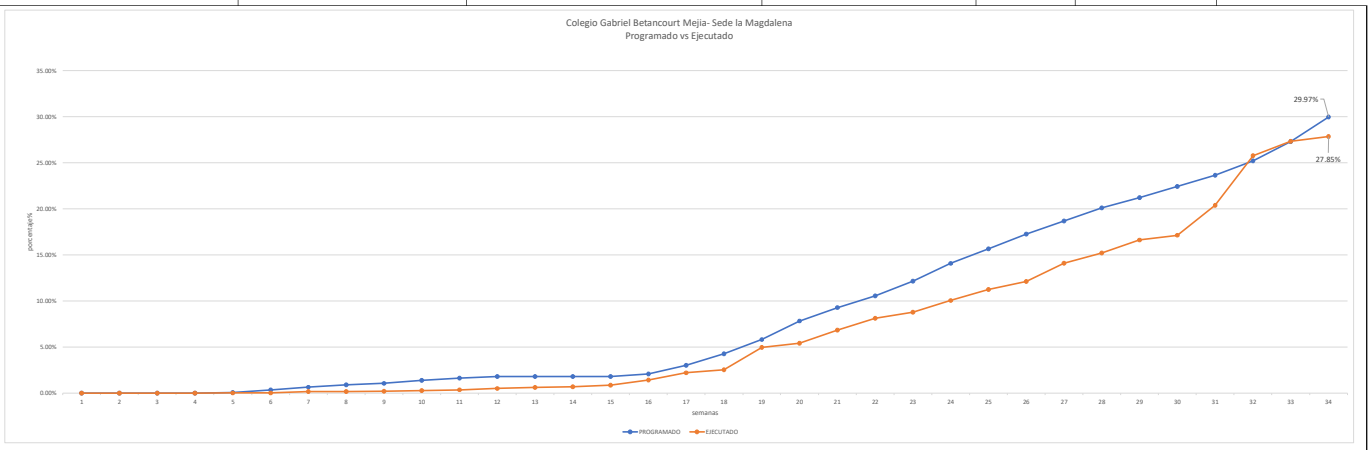

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor Programado a la fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Atraso en dias respecto al inicio de la actividad	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	$ 57,199,781	20/06/2022	10/03/2023	**-209**	**-0.03%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	$ 7,216,733	14/11/2022	18/07/2023	**-62**	**-0.02%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	$ 24,082,038	18/11/2022	24/07/2023	**-58**	**-0.07%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	$ 4,100,044	18/11/2022	24/07/2023	**-58**	**-0.01%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	$ 92,062,647	20/06/2022	10/03/2023	**-209**	**-0.10%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	$ 576,349,802	27/06/2022	17/03/2023	**-202**	**-0.86%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.

1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	$ 267,936,612	5/09/2022	3/07/2023	**-132**	**-0.76%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2.2.2	Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	$ 15,865,612	7/11/2022	10/12/2022	**-69**	**-0.05%**	Zona usada como punto de acopio o ubicación deautobomba para fundida de los bloques principales A al E.
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	$ 7,713,811	12/09/2022	27/03/2023	**-125**	**-0.02%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.1.5	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Bajo tierra)	$ 2,588,635	12/09/2022	27/03/2023	**-125**	**-0.01%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	$ 10,115,279	12/09/2022	27/03/2023	**-125**	**-0.01%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.2.5	Suministro e instalcion filtro frances tuberia 4" perforando con grava 1/2"	$ 5,162,401	12/09/2022	27/03/2023	**-125**	**-0.01%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
4.1.3	Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 36,719,421	3/10/2022	7/05/2023	**-104**	**-0.10%**	De acuerdo con el proceso constructivo sugerido por proveedores de formaleta por aspectos de seguridad del personal, las esclaeras se iniciaran a construir una vez se tenga concluida la estructura en concreto de cubierta, ya que la armadura inicia desde el primer nivel presentando apoyo hasta el nivel +11.53.
4.1.4	Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 257,985,937	3/10/2022	7/05/2023	**-104**	**-0.73%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	$ 901,971,746	24/10/2022	11/06/2023	**-83**	**-1.99%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	$ 180,652,650	24/10/2022	11/06/2023	**-83**	**-0.46%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	$ 141,028,595	24/10/2022	11/06/2023	**-83**	**-0.23%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
6.1.3.1	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 4" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 5,340,351	12/11/2022	22/05/2023	**-64**	**-0.02%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.3.2	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2.1/2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 2,013,518	12/11/2022	22/05/2023	**-64**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.3.5	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 2,860,237	12/11/2022	22/05/2023	**-64**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 6,682,442	12/11/2022	22/05/2023	**-64**	**-0.02%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 8,040,502	12/11/2022	22/05/2023	**-64**	**-0.02%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 4,109,804	12/11/2022	22/05/2023	**-64**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 25,219,794	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.04%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.2.6.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 15,464,217	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.04%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	$ 64,143,253	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.09%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 15,161,363	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.02%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.3	Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 2,986,583	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 18,295,461	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.03%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.5	Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	$ 4,306,998	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 4,160,463	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 4,861,699	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 2,554,743	12/09/2022	26/03/2023	**-125**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
11.1.1	Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	$ 29,686,202	26/11/2022	17/07/2023	**-50**	**-0.08%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	$ 65,003,690	19/12/2022	6/08/2023	**-27**	**-0.18%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad, se presenta dificultad de consecusion del material con las dimensiones referidas en la descripcion del item, se plantea cambio de formato.
12.1.2	Construccion de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos. Incluye manto impermeabilizante (sufridor).	$ 74,312,331	19/12/2022	24/06/2023	**-27**	**-0.21%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad
12.2.1	Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)	$ 16,503,319	19/12/2022	6/08/2023	**-27**	**-0.05%**	La actividad requiere que se culmine en primaria instancia la mamposteria y presenta atrasos por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
13.1.1	Suministro e instalación cubierta tipo sándwich deck ancho 525 mm aislante en fibra de vidrio e = 3cm panel inferior y superior en aluzinc cal. 24 pintada a una cara (incluye remate lateral y elementos de fijación)	$ 299,233,701	31/10/2022	18/06/2023	**-76**	**-0.85%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.1.2	Suministro e instalacion de cubierta plana en policarbonato alveolar 8mm traslucido (incluye accesorios de fijación)	$ 33,170,190	31/10/2022	18/06/2023	**-76**	**-0.09%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.2.1	Suministro e instalacion de Canal lamina galvanizada cal. 20 ds= 0.80m	$ 11,237,600	31/10/2022	18/06/2023	**-76**	**-0.03%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.

13.2.2	Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada C 22	$ 3,576,071	31/10/2022	18/06/2023	**-76**	**-0.01%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
15.1.1	Suministro e instalación de Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de drywall	$ 8,381,682	12/12/2022	31/07/2023	**-34**	**-0.02%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.2	Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	$ 30,852,243	12/12/2022	31/07/2023	**-34**	**-0.09%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.3	Suministro e instalacion Cielo raso tipo tile natura de hunter douglas o similar (bandeja de madera laminada hr 100 de 16mm enchapado natural perfilería oculta)	$ 7,204,709	12/12/2022	31/07/2023	**-34**	**-0.02%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.4	Suministro e instalación de Cielorraso en panel de aluminio en alucobond	$ 34,490,763	12/12/2022	31/07/2023	**-34**	**-0.10%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.2	Suministro e instalacion Muros cara sencilla en drywall 10 mm	$ 16,164,911	12/12/2022	31/07/2023	**-34**	**-0.05%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.3	Suministro e instalacion Aislamientos acustifibra 1 1/2" o similar (muros y techos)	$ 10,209,452	12/12/2022	31/07/2023	**-34**	**-0.03%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.4	Suministro e instalacion Aislamientos frescasa o similar (cielo rasos)	$ 218,320	12/12/2022	31/07/2023	**-34**	**0.00%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
21.1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	$ 34,329,605	27/06/2022	18/03/2023	**-202**	**-0.10%**	Las areas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, los exteriores estan siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razon por la que no pueden ser intervenidas de forma simultanea.
27.1	Suministro e instalacion de Paneles Solares 475Wp, Eficiencia 21.16%, Garantía 12 Años-92150 Wp, Incluye: Suministro e instalacion de Inversor 100Kwp Incluye Tarjeta De Monitoreo Wifi, 6 MPPT, 1000VDC, 400VAC, Garantía 5 Años - Suministro e instalacion Estructura En Aluminio Alurack Para fijación Paneles Solares, Incluye Tornilleria - Suministro e instalacion de Eclam y Mclam En Aluminio Alurack Para fijación De Paneles Solares - Transformador seco tipo H 100KVA , 400/208V - Acometida DC 1000V, 6MMQ - Acometida Ac, Canalizaciónes, Protecciónes electrica, Cofres y accesorios en AC.	$ 57,524,374.26	31/10/2022	18/06/2023	**-76**	**-0.16%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 34 comprendidos entre los días 09 de enero al 15 de enero del 2023, se radicó el siguiente oficio:
1. El dia 10 de enero del 2023 se radico el Acta Parcial de obra No. 6 a interventoria con No. de oficio CCERU--22-404. Se radica en No. de oficio CCERU-22-405 a interventoria con respecto al acabado de muros en ladrillo coral
2. El dia 11 de enero del 2023 se radican a interventoria los planos de taller estructural del bloque A y B con No. de oficio CCERU-22-410
3. El dia 12 de enero del 2023 se radica en No. de oficio CCERU-22-413 la respuesta al oficio remitido por interventoria GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_264 y dando alcance al oficio CCERU-22-354, con relacion a los informes semanales

Aspecto Financiero

Durante la semana presente se manifestó lo siguiente:
1. El dia 12 de enero del 2023 la planilla No. 21 con un valor de $ 68.414.976 para suministro de mamposteria material ladrillo santafe

Aspecto Técnico

Durante la semana presentaron los siguientes oficios:
1. El dia 11 de enero del 2023 se radica ene No. de oficio CCERU-22-406 el concepto de suelo de fundacion de la escalera del modulo G, con respecto a las respuestas adquiridas por los especialistas. Se radican resultados de cilindros en el No. de oficio CCERU-22-407
2. El dia 13 de enero del 2023 se radica muestra de resultado de cilindro en el No. de oficio CCERU-22-416

Si bien existen actividades que no se han podido iniciar y/o presentan un atraso producto de las demoras en la aprobacion de los items no previstos, factores climaticos, logisticos e inconvenientes generados por la ocupacion del colegio, este consorcio se encuentra ejecutando multiples frentes de trabajo, y a acometido e internvenido varias actividades a medida que la obra lo permite, tanto asi que a la fecha no se tienen atrasos, si no que se relaciona un avance.

Se avanza con las siguientes actividades:
- Se continua con el armado y fundida de losas de entrepiso, actividad que se vio afectada por las demoras en la aprobacion del item, a la fecha se tiene todo el nivel 3 de los bloques A al E
- Se continua con las actividades de taller de estructura metalica.
- Se realizan las instalaciones de las redes hidraulicas y sanitarias del modulo A.
- Se inicia con la instalacion de RCI en los modulos A al E.
- Se instala material (recebo comun) en las zonas exteriores.

La ocupacion del colegio a generado inconvenientes frente al normal desarrollo de la obra, toda vez que el ingreso a la misma impide la ejecucion de bloques de manera simultanea como sucede con los bloque I, J, H y G.
Ademas existen actividades que no se pueden intervenir al encontrarse dentro de la ocupacion de la sede B del colegio actividades que incurren directamente en el atraso de obra, estas actividades obedecen a excavaciones, demoliciones, redes hidraulicas y RCI enterradas que suman el 2,7%
Durante la presente jornada se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde, lo que imide continuar con el armado de acero a nivel de cubiertas.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 10 de enero del 2023 se realiza limpieza de vías y de llantas de volquetas, jornada de orden y aseo en obra
2. El dia 12 de enero del 2023 se realizo ajuste y mejoramiento visual de puntos Ecologicos, elaboración presentación comité de participación ciudadana

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 10 de enero del 2023 se realizo permiso de trabajo en alturas, permiso trabajo en caliente, charla de seguridad, lavado de baños, inducción
2. El dia 11 de enero del 2023 se realizo permiso de trabajo en alturas, permiso trabajo en caliente, charla de seguridad, lavado de baños, inducción
3. El dia 12 de enero del 2023 se realizo permiso de trabajo en alturas, permiso trabajo en caliente, charla de seguridad, lavado de baños, inducción
4. El dia 13 de enero del 2023 se realizo permiso de trabajo en alturas, permiso trabajo en caliente, charla de seguridad, lavado de baños, inducción, señalizacion sendero peatonal
5. El dia 14 de enero del 2023 se realizo permiso de trabajo en alturas, permiso trabajo en caliente, charla de seguridad, lavado de baños, inducción

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 10 de enero del 2023 se realiza a través de correo electrónico y en cumplimiento a compromiso adquirido en Reunión del Comité de Participación Ciudadana No 5, se remitió a veedor los números de radicado generados por Secretaria de Educación del Distrito, ante Secretaria de Ambiente, gestionando la autorización para instalación de la valla de obra para el Colegio Gabriel Betancourt Mejía, Sede B, la Magdalena, ahora Teresa Martinez de Varela IED. Dando cumplimiento a compromiso establecido, se notificó a interventoría respuesta emitida por la Alcaldia Local de Kennedy frente al requerimiento efectuado por el Consorcio para realizar actividades en horario adicional – No Radicado 20225833641691.
2. El dia 12 de enero del 2023 se realiza asistencia y participación en comité de seguimiento social. Se remite para revisión y aval de interventoría Presentación a proyectar en el Comité de Participación Ciudadana No 6. Se remite a interventoría, relación de personal Mano de Obra No Calificada (MONCL) con corte al 07 de enero de 2023.
3. El dia 13 de enero del 2023 se realizó ajuste en Presentación a proyectar en el Comité de Participación Ciudadana No 6 y se remite para revisión y aval de interventoría. Se radicó ante interventoría oficio CCERU-SOC-049 efectuando solicitud de certificado de PQRSD recibidas a la fecha en el contrato, con esta certificación expedida por interventoría, se realizará radicación ante Alcaldia Local de Kennedy notificando que no se han recibido PQRSD que se relacionen con el manejo de impactos ambientales (Ruido, vibraciones y material particulado).

Entre el 09 y el 14 de enero de 2023: Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presento ninguna actividad en este componente


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES

De acuerdo a corte de programación con el presente informe se presenta un atraso del 2,12% que corresponde a un atraso acumulado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, inconvenientes logisticos producto de la ocupacion del colegio y factores climaticos que han afectado el normal desarrollo de las obras que si bien este consorcio a tomado medidas para tener un avance con respecto a la programacion, existen actividades que dependen de un orden logico constructivo que por los inconvenientes que se han tenido no se pueden ejecutar en este momento de la obra, la incidencia que tiene la ocupacion del colegio que impide el desarrollo de actividades es del 2,7%

DIRECTOR DE OBRA



Firma
