CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	35	**DEL**	**16 de enero de 2023**	**AL**	**22 de enero de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	245	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA


No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ 57,199,781	$ 95,688,542.00	$ 49,519,130	51.75%	Se realiza la localizacion y replanteo de la esclaera del bloque G y zonas pendientes del I y del J.
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 7,216,733	$ 24,055,777.00	$ 1,096,448	4.56%	
1.2.2	Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,008,558	$ 3,361,860.00	$ 884,700	26.32%	
1.2.3	Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 450,542	$ 1,501,808.00	$ 536,360	35.71%	
1.2.4	Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,125,041	$ 3,750,136.00	$ 455,624	12.15%	
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 24,082,038	$ 80,273,460.00	$ 1,143,446	1.42%	
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 4,100,044	$ 13,666,814.00	$ 1,183,600	8.66%	
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	EJEUCIÓN	$ 92,062,647	$ 96,532,269.00	$ 59,703,112	61.85%	Zona colegio
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	EJEUCIÓN	$ 576,349,802	$ 604,331,461.00	$ 273,375,434	45.24%	Bloque G
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 215,180,168	$ 942,475,330.00	$ 571,943,093	60.69%	Zona colegio
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 33,040,320	$ 86,953,143.00	$ 64,796,630	74.52%	
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 141,840,934	$ 232,947,620.00	$ 236,372,736	101.47%	Bloque G
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 871,193,600	$ 1,430,775,096.00	$ 492,022,573	34.39%	
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 9,233,919	$ 15,165,012.00	$ 10,919,939	72.01%	
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 790,727,993	$ 1,298,625,151.00	$ 553,046,178	42.59%	
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ 50,877,784	$ 83,557,394.00	$ 73,765,043	88.28%	
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 6,821,576	$ 33,401,960.00	$ 33,401,960	100.00%	
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	EJEUCIÓN	$ 43,848,524	$ 43,848,524.00	$ 43,068,276	98.22%	Rampa
2.2.5	Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 22,693,378	$ 22,693,378.00	$ 7,742,447	34.12%	rampa
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 1,198,860,730	$ 1,968,908,032.00	$ 1,094,898,719	55.61%	Bloque G y mamposteria


2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 161,615,251	$ 265,423,296.00	$ 225,227,134	84.86%	Bloque A al E
3.1.1	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,277,349	$ 5,658,471.00	$ 9,928,884	175.47%	Paralelo Bloque G
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 1,268,417	$ 16,226,946.00	$ 7,960,741	49.06%	
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 8,195,924	$ 12,800,357.00	$ 1,471,556	11.50%	Paralelo Bloque G
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 745,878	$ 5,670,326.00	$ 1,932,690	34.08%	
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 467,802	$ 92,838,682.00	$ 2,832,571	3.05%	
3.1.7	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 613,990	$ 958,927.00	$ 1,286,872	134.20%	Paralelo Bloque G
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 10,747,484	$ 16,785,372.00	$ 5,801,953	34.57%	
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 419,221,684	$ 944,434,572.00	$ 444,662,694	47.08%	Columnas bloque N
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 662,546,554	$ 1,707,849,179.00	$ 800,365,208	46.86%	Bloque D
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 636,042,079	$ 1,639,528,478.00	$ 708,278,043	43.20%	Bloque E, L, N
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 443,785,247	$ 999,772,067.00	$ 731,372,089	73.15%	Bloque G y D y E
4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 83,860,236	$ 216,166,901.00	$ 123,001,928	56.90%	Bloque D, E y N
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 912,662,172	$ 2,947,771,795.00	$ 2,056,069,317	69.75%	
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 911,082,572	$ 1,863,467,553.00	$ 200,785,248	10.77%	
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	EJEUCIÓN	$ 182,477,424	$ 373,227,158.00	$ 18,367,618	4.92%	
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 142,453,126	$ 291,364,128.00	$ 60,026,406	20.60%	
6.1.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,984,205	$ 5,695,536.00	$ 5,288,712	92.86%	
6.1.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,305,736	$ 3,748,032.00	$ 1,186,877	31.67%	
6.1.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,721,498	$ 4,941,450.00	$ 614,058	12.43%	
6.1.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 749,250	$ 2,150,676.00	$ 364,963	16.97%	
6.1.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 887,384	$ 2,547,181.00	$ 409,764	16.09%	
6.1.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 608,670	$ 1,747,150.00	$ 322,065	18.43%	
6.1.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 804,052	$ 2,307,981.00	$ 673,097	29.16%	
6.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 443,698	$ 1,273,608.00	$ 1,334,256	104.76%	
6.1.6.3	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 316,388	$ 908,172.00	$ 100,908	11.11%	
6.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 650,728	$ 1,867,875.00	$ 298,860	16.00%	
6.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 364,910	$ 1,047,450.00	$ 146,643	14.00%	
6.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 613,531	$ 1,761,102.00	$ 434,840	24.69%	
6.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 418,428	$ 1,201,070.00	$ 55,434	4.62%	
6.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 625,602	$ 1,795,752.00	$ 73,296	4.08%	
6.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,127,087	$ 3,235,232.00	$ 294,112	9.09%	
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	EJEUCIÓN	$ 5,894,691	$ 16,920,337.00	$ 9,192,939	54.33%	Bloque G

6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	EJEUCIÓN	$ 8,533,061	$ 24,493,611.00	$ 13,946,787	56.94%	Bloque G
6.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 8,269,538	$ 23,737,185.00	$ 8,129,598	34.25%	
6.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,517,033	$ 4,354,548.00	$ 683,772	15.70%	
6.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 64,988	$ 186,544.00	$ 1,106,439	593.13%	
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,192,316	$ 20,153,447.00	$ 4,011,621	19.91%	
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 5,390,742	$ 15,473,784.00	$ 2,586,277	16.71%	
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,520,030	$ 7,233,588.00	$ 279,987	3.87%	
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,088,549	$ 3,124,612.00	$ 1,617,103	51.75%	
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 3,991,639	$ 11,457,748.00	$ 359,956	3.14%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,543,050	$ 7,299,664.00	$ 6,745,200	92.40%	
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 4,819,215	$ 13,833,252.00	$ 6,916,626	50.00%	Exteriores A y B
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material	EJEUCIÓN	$ 1,792,386	$ 5,144,932.00	$ 2,572,466	50.00%	
6.2.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 449,785	$ 1,291,080.00	$ 89,146	6.90%	
6.2.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,762,993	$ 5,060,560.00	$ 1,148,166	22.69%	
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,449,903	$ 9,285,600.00	$ 1,743,912	18.78%	
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 11,461,321	$ 43,440,600.00	$ 29,291,376	67.43%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 34,122,725	$ 53,292,716.00	$ 12,456,561	23.37%	
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 19,336,145	$ 30,199,104.00	$ 23,152,646	76.67%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 7,453,063	$ 11,640,160.00	$ 12,044,656	103.48%	
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 23,322,032	$ 36,424,243.00	$ 14,853,114	40.78%	Exteriores
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 1,591,112	$ 2,484,992.00	$ 3,370,270	135.63%	
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	EJEUCIÓN	$ 1,381,338	$ 5,235,537.00	$ 725,718	13.86%	
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 6,995,355	$ 26,513,733.00	$ 10,374,939	39.13%	
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	EJEUCIÓN	$ 6,108,450	$ 23,152,194.00	$ 10,289,864	44.44%	
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,975,624	$ 7,487,994.00	$ 409,180	5.46%	Bloque A
6.2.5.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,861,812	$ 7,056,623.00	$ 650,380	9.22%	
6.2.5.3	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 656,053	$ 2,486,568.00	$ 121,296	4.88%	
6.2.5.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 203,698	$ 772,055.00	$ 597,720	77.42%	Bloque A
6.2.5.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 845,656	$ 3,205,197.00	$ 356,133	11.11%	Bloque A

6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 26,796,031	$ 48,785,278.00	$ 10,119,417	20.74%	Bloque A
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 31,589,354	$ 227,154,621.00	$ 54,158,017	23.84%	Bloque A
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 6,723,771	$ 10,501,155.00	$ 12,805,342	121.94%	Bloque A
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJEUCIÓN	$ 68,152,206	$ 106,439,805.00	$ 33,624,775	31.59%	
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 16,108,948	$ 25,158,882.00	$ 7,188,252	28.57%	
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 19,438,927	$ 30,359,628.00	$ 7,006,068	23.08%	
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 4,420,492	$ 6,903,904.00	$ 584,833	8.47%	
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 5,165,555	$ 8,067,540.00	$ 1,722,110	21.35%	
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 1,109,956	$ 1,733,524.00	$ 731,414	42.19%	
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 19,956,616	$ 75,639,390.00	$ 7,439,940	9.84%	
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 3,048,386	$ 11,553,966.00	$ 1,109,988	9.61%	
8.1.4.1	Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 4ml	EJEUCIÓN	$ 83,643,130	$ 292,236,160.00	$ 10,482,384	3.59%	Bloque A al E
8.1.4.5	Suministro e instalacion de interruptor sencillo sin piloto, en tuberia EMT 3/4" en pared , caja 2x4 radwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	EJEUCIÓN	$ 3,907,278	$ 13,651,425.00	$ 481,815	3.53%	Bloque A al E
8.1.4.7	Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	EJEUCIÓN	$ 3,016,689	$ 10,539,845.00	$ 795,460	7.55%	Bloque A al E
8.1.4.11	Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	EJEUCIÓN	$ 4,946,448	$ 17,282,125.00	$ 987,550	5.71%	Bloque A al E
8.1.5.1	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	EJEUCIÓN	$ 7,938,511	$ 27,735,930.00	$ 2,291,229	8.26%	Bloque A al E
8.1.5.3	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	EJEUCIÓN	$ 3,278,950	$ 11,456,145.00	$ 1,205,910	10.53%	Bloque A al E
8.1.5.5	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared,con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	EJEUCIÓN	$ 1,026,574	$ 3,586,689.00	$ 155,943	4.35%	Bloque A al E
8.1.5.11	Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	EJEUCIÓN	$ 264,379	$ 923,700.00	$ 461,850	50.00%	Bloque A al E
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 21,968,951	$ 46,448,640.00	$ 19,514,880	42.01%	Bloque A al E
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	EJEUCIÓN	$ -	$ 86,599,977.00	$ 3,352,560	3.87%	

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRSO
$ 10,557,833,599.49	$ 965,692,764.40	$ 11,523,526,363.89	$ 9,811,963,553.74	$ 236,210,160.33	$ 10,048,173,714	-$ 1,475,352,649.820510
29.97%	**2.74%**	**32.71%**	**27.85%**	**0.67%**	**28.52%**	**-4.19%**



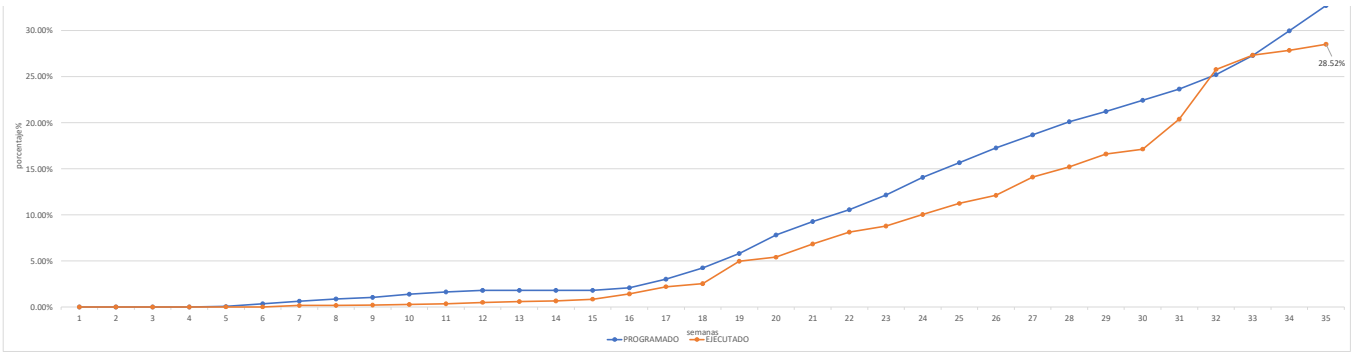

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor Programado a la fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Atraso en dias respecto al inicio de la actividad	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	$ 57,199,781	20/06/2022	10/03/2023	-216	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	$ 7,216,733	14/11/2022	18/07/2023	-69	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	$ 24,082,038	18/11/2022	24/07/2023	-65	-0.07%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	$ 4,100,044	18/11/2022	24/07/2023	-65	-0.01%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	$ 92,062,647	20/06/2022	10/03/2023	-216	-0.09%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	$ 576,349,802	27/06/2022	17/03/2023	-209	-0.86%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	$ 285,487,860	5/09/2022	3/07/2023	-139	-0.81%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2.2.2	Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	$ 15,865,612	7/11/2022	10/12/2022	-76	-0.05%	Zona usada como punto de acopio o ubicación deautobomba para fundida de los bloques principales A al E.
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	$ 8,195,924	12/09/2022	27/03/2023	-132	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.1.5	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Bajo tierra)	$ 2,750,425	12/09/2022	27/03/2023	-132	-0.01%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	$ 10,747,484	12/09/2022	27/03/2023	-132	-0.01%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.2.5	Suministro e instalcion filtro frances tuberia 4" perforando con grava 1/2"	$ 5,485,051	12/09/2022	27/03/2023	-132	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
4.1.3	Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 36,719,421	3/10/2022	7/05/2023	-111	-0.10%	De acuerdo con el proceso constructivo sugerido por proveedores de formaleta por aspectos de seguridad del personal, las esclaeras se iniciaran a construir una vez se tenga concluida la estructura en concreto de cubierta, ya que la armadura inicia desde el primer nivel presentando apoyo hasta el nivel +11.53.
4.1.4	Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 257,985,937	3/10/2022	7/05/2023	-111	-0.73%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	$ 911,082,572	24/10/2022	11/06/2023	-90	-2.02%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	$ 182,477,424	24/10/2022	11/06/2023	-90	-0.47%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	$ 142,453,126	24/10/2022	11/06/2023	-90	-0.23%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
6.1.3.1	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 4" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 5,674,123	12/11/2022	22/05/2023	-71	-0.02%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.3.2	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2.1/2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 2,139,363	12/11/2022	22/05/2023	-71	-0.01%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.3.5	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 3,039,002	12/11/2022	22/05/2023	-71	-0.01%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 7,100,095	12/11/2022	22/05/2023	-71	-0.02%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 8,543,033	12/11/2022	22/05/2023	-71	-0.02%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 4,366,667	12/11/2022	22/05/2023	-71	-0.01%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 26,796,031	12/09/2022	26/03/2023	-132	-0.05%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.2.6.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 16,430,730	12/09/2022	26/03/2023	-132	-0.05%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	$ 68,152,206	12/09/2022	26/03/2023	-132	-0.10%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 16,108,948	12/09/2022	26/03/2023	-132	-0.03%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio

7.1.2.3	Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 3,173,244	12/09/2022	26/03/2023	**-132**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 19,438,927	12/09/2022	26/03/2023	**-132**	**-0.04%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.5	Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	$ 4,576,185	12/09/2022	26/03/2023	**-132**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 4,420,492	12/09/2022	26/03/2023	**-132**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 5,165,555	12/09/2022	26/03/2023	**-132**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 2,714,414	12/09/2022	26/03/2023	**-132**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
11.1.1	Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	$ 33,927,088	26/11/2022	17/07/2023	**-57**	**-0.10%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	$ 81,254,612	19/12/2022	6/08/2023	**-34**	**-0.23%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad, se presenta dificultad de consecusion del material con las dimensiones referidas en la descripcion del item, se plantea cambio de formato.
12.1.2	Construccion de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos. Incluye manto impermeabilizante (sufridor).	$ 92,890,414	19/12/2022	24/06/2023	**-34**	**-0.26%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad
12.2.1	Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)	$ 20,629,149	19/12/2022	6/08/2023	**-34**	**-0.06%**	La actividad requiere que se culmine en primaria instancia la mamposteria y presenta atrasos por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
13.1.1	Suministro e instalación cubierta tipo sándwich deck ancho 525 mm aislante en fibra de vidrio e = 3cm panel inferior y superior en aluzinc cal. 24 pintada a una cara (incluye remate lateral y elementos de fijación)	$ 302,287,106	31/10/2022	18/06/2023	**-83**	**-0.86%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.1.2	Suministro e instalacion de cubierta plana en policarbonato alveolar 8mm traslucido (incluye accesorios de fijación)	$ 33,508,662	31/10/2022	18/06/2023	**-83**	**-0.10%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.2.1	Suministro e instalacion de Canal lamina galvanizada cal. 20 ds= 0.80m	$ 11,352,269	31/10/2022	18/06/2023	**-83**	**-0.03%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.2.2	Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada C 22	$ 3,612,561	31/10/2022	18/06/2023	**-83**	**-0.01%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
15.1.1	Suministro e instalación de Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de drywall	$ 9,905,624	12/12/2022	31/07/2023	**-41**	**-0.03%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.2	Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	$ 36,461,741	12/12/2022	31/07/2023	**-41**	**-0.10%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.3	Suministro e instalacion Cielo raso tipo tile natura de hunter douglas o similar (bandeja de madera laminada hr 100 de 16mm enchapado natural perfilería oculta)	$ 8,514,656	12/12/2022	31/07/2023	**-41**	**-0.02%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.4	Suministro e instalación de Cielorraso en panel de aluminio en alucobond	$ 40,761,811	12/12/2022	31/07/2023	**-41**	**-0.12%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.2	Suministro e instalacion Muros cara sencilla en drywall 10 mm	$ 19,103,985	12/12/2022	31/07/2023	**-41**	**-0.05%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.3	Suministro e instalacion Aislamientos acustifibra 1 1/2" o similar (muros y techos)	$ 12,065,716	12/12/2022	31/07/2023	**-41**	**-0.03%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.4	Suministro e instalacion Aislamientos frescasa o similar (cielo rasos)	$ 258,015	12/12/2022	31/07/2023	**-41**	**0.00%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
21.1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	$ 34,329,605	27/06/2022	18/03/2023	**-209**	**-0.10%**	Las areas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, los exteriores estan siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razon por la que no pueden ser intervenidas de forma simultanea.
27.1	Suministro e instalacion de Paneles Solares 475Wp, Eficiencia 21.16%, Garantía 12 Años-92150 Wp, Incluye: Suministro e instalacion de Inversor 100Kwp Incluye Tarjeta De Monitoreo Wifi, 6 MPPT, 1000VDC, 400VAC, Garantía 5 Años - Suministro e instalacion Estructura En Aluminio Alurack Para fijación Paneles Solares, Incluye Tornilleria - Suministro e instalacion de Eclam y Mclam En Aluminio Alurack Para fijación De Paneles Solares - Transformador seco tipo H 100KVA , 400/208V - Acometida DC 1000V,6MMQ - Acometida Ac, Canalizaciónes, Protecciónes electrica, Cofres y accesorios en AC.	$ 58,111,357.67	31/10/2022	18/06/2023	**-83**	**-0.16%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 35 comprendidos entre los días 16 de enero al 22 de enero del 2023, se radicó el siguiente oficio:
1. El dia 16 de enero del 2023 se hace alcance al oficio CCERU.22-404 con respecto a la splanillas de seguridad social en el oficio CCERU-22-418

Aspecto Financiero

Durante la semana presente se manifestó lo siguiente:
1. El dia 16 de enero del 2023 la planilla No. 23 con un valor de $ 500.000.041 para suministro de acero

Aspecto Técnico

Durante la semana presentaron los siguientes oficios:
1. El dia 16 de enero del 2023 se radican resultados de cilindro en el No. de oficio CCERU-22-417
2. El dia 17 de enero del 2023 se radica en No. de oficio CCERU-22-421 la solicitud de aclaracion de la estructura metalica del Modulo G. Se radica en el No. de oficio CCERU-22-422 resultados de cilindros. Se radica en No. de oficio CCERU-22-424 la aclaracion de detalle de ventaneria en aluminio
3. El dia 18 de enero del 2023 se radica en No. de oficio CCERU-22-426 el analisis de preciones unitarios no previstos de mamposteria por ml
4. El dia 20 de enero del 2023 se radica el oficio CCERU-22-429 con respecto al informe de niveles de placa de entrepiso del Modulo G. Se radica el concepto de ventilacion en el oficio No. CCERU-22-430. Se radica en No. de oficio CCERU-22-431 con respecto a la alternativa para fundir placa del Modulo E
5. El dia 21 de enero del 2023 se radica en oficio CCERU-252-432 resultados de laboratorio Durante la semana presentaron los siguientes oficios:

Se avanza con las siguientes actividades:
- Se continua con el armado y fundida de losas de entrepiso, actividad que se vio afectada por las demoras en la aprobacion del item, ademas de las afectaciones por la resistencia del concreto.
- Se continua con las actividades de taller de estructura metalica, se esta a la espera de respuesta de observaciones de estructura metalica informacion vital para culminar los planos de taller.
- Se realizan las instalaciones de las redes hidraulicas y sanitarias del modulo A.
- Se inicia con la instalacion de RCI en los modulos A al E.
- Se instala material (recebo comun) en las zonas exteriores.
- Se continua con mamposteria y se realizan las repaciones de placa.

La ocupacion del colegio a generado inconvenientes frente al normal desarrollo de la obra, toda vez que el ingreso a la misma impide la ejecucion de bloques de manera simultanea como sucede con los bloque I, J, H y G.
Ademas existen actividades que no se pueden intervenir al encontrarse dentro de la ocupacion de la sede B del colegio actividades que incurren directamente en el atraso de obra, estas actividdes obedecen a excavaciones, demoliciones, redes hidraulicas y RCI enterradas que suman el 2,7%
Durante la presente jornada se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde, lo que imide continuar con el armado de acero a nivel de cubiertas.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 17 de enero del 2023 se realiza recorrido del componente ambiental con la asistencia de las profesionales ambientales de la supervisión ERU Edna Bedoya, interventoría Mónica Gómez, y contratista Adriana sandoval, en este recorrido se solicita el retiro del acero que se encuentra sobre la zona verde, se realiza limpieza de sumideros.
2. El dia 18 de enero del 2023 se realiza jornada de aseo general en la obra
3. El dia 19 de enero del 2023 se realiza asistencia a comité integral, en donde se reitera la solicitud del retiro del acero de la zona verdes, allí se genera el compromiso de esta actividad para el 25 de enero, se deja presente que por parte del contratista se encuentra al día el cargue de la información a la plataforma de la secretaría distrital de ambiente SDA, se realiza recorrido del contratista Biólogo y profesional ambiental, se realiza conteo de 11 aves ya identificadas, se menciona en comité que se realizó manejo adecuado de la culebra sabanera encontrada el 22 de diciembre, y se genera compromiso frente a la generación de APU para el manejo del enjambre de abejas que se encuentra en obra.
4. El dia 20 de enero del 2023 se subsanan observaciones al PMFS (Plan de manejo de Fauna silvestre) por parte del biólogo del contratista.
Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operado de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 20 de enero se realizo trabajos de alturas, trabajo en caliente, inducción, charla de seguridad, lavado de baños, inspecciones
2. El dia 21 de enero se reliazo trabajo en alturas, trabajo en caliente, inducción, orden y aseo ñ, lavado de baños

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1.El dia 16 de enero del 2023 se realiza ajuste en presentación a proyectar en el Comité de Participación Ciudadana No 6 y se remite para revisión y aval de interventoría.
2. El dia 18 de enero del 2023 se remite a interventoría, relación de personal Mano de Obra No Calificada (MONCL) con corte al 14 de enero de 2023.
3. El dia 19 de enero del 2023 se realiza asistencia y participación en comité de seguimiento social
4. El dia 20 de enero del 2023 se envia a través de oficios, se radica en el área de influencia directa del proyecto, convocatoria al comité de participación ciudadana No 6. (volantes No 20 y No 21). A través de oficios, se radica en el área de influencia directa del proyecto volante No 7 Generación de empleo y No 8 recomendaciones a comerciantes.


Se realizó la actualización de Los Puntos Satélites de Información del proyecto con la instalación del volante No 21 convocatoria al CPC No 6.
Entre el 16 y el 21 de enero de 2023: Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presento ninguna actividad en este componente

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR D EOBRA
De acuerdo a corte de programación con el presente informe se presenta un atraso del 2,12% que corresponde a un atraso acumulado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, inconvenientes logisticos producto de la ocupacion del colegio y factores climaticos que han afectado el normal desarrollo de las obras que si bien este consorcio a tomado medidas para tener un avance con respecto a la programacion, existen actividades que dependen de un orden logico constructivo que por los inconvenientes que se han tenido no se pueden ejecutar en este momento de la obra, la incidencia que tiene la ocupacion del colegio que impide el desarrollo de actividades es del 2,7%	
	Firma
