CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	36	**DEL**	**23 de enero de 2023**	**AL**	**29 de enero de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	252	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ 59,124,219	$ 95,688,542.00	$ 49,519,123	51.75%	
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 7,216,733	$ 24,055,777.00	$ 1,096,448	4.56%	
1.2.2	Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,008,558	$ 3,361,860.00	$ 884,700	26.32%	
1.2.3	Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 450,542	$ 1,501,808.00	$ 536,360	35.71%	
1.2.4	Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,125,041	$ 3,750,136.00	$ 455,624	12.15%	
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 24,082,038	$ 80,273,460.00	$ 1,143,446	1.42%	
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 4,100,044	$ 13,666,814.00	$ 1,569,615	11.48%	Desmonte aula
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	EJEUCIÓN	$ 92,509,609	$ 96,532,269.00	$ 59,703,112	61.85%	
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	EJEUCIÓN	$ 576,349,802	$ 604,331,461.00	$ 273,375,434	45.24%	
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 228,409,033	$ 942,475,330.00	$ 571,943,093	60.69%	
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 38,263,446	$ 86,953,143.00	$ 64,796,630	74.52%	
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 164,263,631	$ 243,685,282.80	$ 236,372,736	97.00%	
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 1,008,914,844	$ 1,430,775,096.00	$ 492,022,573	34.39%	
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 10,693,649	$ 15,165,012.00	$ 10,919,939	72.01%	
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 915,728,961	$ 1,298,625,151.00	$ 553,046,178	42.59%	
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ 58,920,717	$ 83,557,394.00	$ 73,765,043	88.28%	
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 6,821,576	$ 33,401,960.00	$ 33,401,960	100.00%	
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	EJEUCIÓN	$ 43,848,524	$ 86,024,083.88	$ 52,107,904	60.57%	Zona rampa
2.2.5	Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 22,693,378	$ 22,693,378.00	$ 7,742,447	34.12%	
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 1,388,380,707	$ 1,968,908,032.00	$ 1,094,898,719	55.61%	


2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 187,163,939	$ 265,423,296.00	$ 225,227,134	84.86%	
3.1.1	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,411,311	$ 9,928,884.42	$ 9,928,884	100.00%	
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 1,343,030	$ 16,226,946.00	$ 7,960,741	49.06%	
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 8,678,037	$ 12,800,357.00	$ 1,471,556	11.50%	
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 789,753	$ 5,670,326.00	$ 1,932,690	34.08%	
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 495,320	$ 92,838,682.00	$ 2,832,571	3.05%	
3.1.7	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 650,107	$ 1,286,872.00	$ 1,286,872	100.00%	
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 11,379,689	$ 16,785,372.00	$ 5,801,953	34.57%	
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 459,233,966	$ 944,434,572.00	$ 452,108,763	47.87%	Columnas bloque N
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 750,471,091	$ 1,707,849,179.00	$ 800,365,208	46.86%	
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 720,449,289	$ 1,639,528,478.00	$ 708,278,043	43.20%	
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 486,141,979	$ 999,772,067.00	$ 731,372,089	73.15%	
4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 94,989,073	$ 216,166,901.00	$ 123,001,928	56.90%	
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 921,880,982	$ 2,947,771,795.00	$ 2,056,069,317	69.75%	
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 911,082,572	$ 1,863,467,553.00	$ 262,666,749	14.10%	Mamposteria segundo nivel bloque A
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	EJEUCIÓN	$ 182,477,424	$ 373,227,158.00	$ 18,367,618	4.92%	
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 142,453,126	$ 291,364,128.00	$ 60,026,406	20.60%	
6.1.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,004,661	$ 5,695,536.00	$ 5,288,712	92.86%	
6.1.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,319,197	$ 3,748,032.00	$ 1,186,877	31.67%	
6.1.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,739,245	$ 4,941,450.00	$ 614,058	12.43%	
6.1.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 756,975	$ 2,150,676.00	$ 364,963	16.97%	
6.1.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 896,533	$ 2,547,181.00	$ 409,764	16.09%	
6.1.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 614,945	$ 1,747,150.00	$ 322,065	18.43%	
6.1.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 812,341	$ 2,307,981.00	$ 673,097	29.16%	
6.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 448,273	$ 2,395,596.00	$ 1,334,256	55.70%	
6.1.6.3	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 319,650	$ 908,172.00	$ 100,908	11.11%	
6.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 657,437	$ 1,867,875.00	$ 298,860	16.00%	
6.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 368,672	$ 1,047,450.00	$ 146,643	14.00%	
6.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 619,856	$ 1,761,102.00	$ 434,840	24.69%	
6.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 422,741	$ 1,201,070.00	$ 55,434	4.62%	
6.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 632,052	$ 1,795,752.00	$ 73,296	4.08%	
6.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,138,706	$ 3,235,232.00	$ 294,112	9.09%	

6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	EJEUCIÓN	$ 5,955,461	$ 16,920,337.00	$ 9,192,939	54.33%	
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	EJEUCIÓN	$ 8,621,030	$ 24,493,611.00	$ 13,946,787	56.94%	
6.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 8,354,791	$ 23,737,185.00	$ 8,129,598	34.25%	
6.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,532,673	$ 4,354,548.00	$ 683,772	15.70%	
6.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 65,658	$ 2,224,770.38	$ 1,106,439	49.73%	
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,204,608	$ 20,153,447.00	$ 4,011,621	19.91%	
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 5,446,317	$ 15,473,784.00	$ 2,586,277	16.71%	
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,546,010	$ 7,233,588.00	$ 279,987	3.87%	
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,099,771	$ 3,124,612.00	$ 1,617,103	51.75%	
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 4,032,790	$ 11,457,748.00	$ 359,956	3.14%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,569,267	$ 7,299,664.00	$ 6,745,200	92.40%	
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 4,868,898	$ 13,833,252.00	$ 6,916,626	50.00%	
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y	EJEUCIÓN	$ 1,810,865	$ 5,144,932.00	$ 2,572,466	50.00%	
6.2.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 454,422	$ 1,291,080.00	$ 89,146	6.90%	
6.2.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,781,168	$ 5,060,560.00	$ 1,148,166	22.69%	
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,475,159	$ 9,285,600.00	$ 1,743,912	18.78%	
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 11,579,479	$ 43,440,600.00	$ 29,291,376	67.43%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 36,129,944	$ 53,292,716.00	$ 12,456,561	23.37%	
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 20,473,566	$ 30,199,104.00	$ 23,152,646	76.67%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 7,891,479	$ 13,843,060.28	$ 12,044,656	87.01%	
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 24,693,916	$ 36,424,243.00	$ 14,853,114	40.78%	
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 1,684,707	$ 3,370,270.40	$ 3,370,270	100.00%	
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	EJEUCIÓN	$ 1,395,579	$ 5,235,537.00	$ 725,718	13.86%	
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 7,067,472	$ 26,513,733.00	$ 10,374,939	39.13%	
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	EJEUCIÓN	$ 6,171,424	$ 23,152,194.00	$ 10,289,864	44.44%	
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,995,992	$ 7,487,994.00	$ 409,180	5.46%	
6.2.5.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,881,006	$ 7,056,623.00	$ 650,380	9.22%	
6.2.5.3	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 662,817	$ 2,486,568.00	$ 121,296	4.88%	
6.2.5.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 205,798	$ 772,055.00	$ 597,720	77.42%	
6.2.5.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 854,374	$ 3,205,197.00	$ 356,133	11.11%	

6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 28,372,269	$ 48,785,278.00	$ 10,119,417	20.74%	
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 33,447,552	$ 227,154,621.00	$ 54,158,017	23.84%	
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 7,119,287	$ 10,501,155.00	$ 12,805,342	121.94%	
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJEUCIÓN	$ 72,161,159	$ 106,439,805.00	$ 36,291,568	34.10%	Bloquie G
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 17,056,533	$ 25,158,882.00	$ 10,782,378	42.86%	Bloque G
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 20,582,393	$ 30,359,628.00	$ 7,006,068	23.08%	
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 4,680,521	$ 6,903,904.00	$ 584,833	8.47%	
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 5,469,411	$ 8,067,540.00	$ 1,722,110	21.35%	
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 1,175,247	$ 1,733,524.00	$ 731,414	42.19%	
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 20,162,354	$ 75,639,390.00	$ 7,439,940	9.84%	
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 3,079,813	$ 11,553,966.00	$ 1,109,988	9.61%	
8.1.4.1	Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 4ml	EJEUCIÓN	$ 84,505,431	$ 292,236,160.00	$ 10,482,384	3.59%	
8.1.4.5	Suministro e instalacion de interruptor sencillo sin piloto, en tuberia EMT 3/4" en pared , caja 2x4 radwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	EJEUCIÓN	$ 3,947,559	$ 13,651,425.00	$ 481,815	3.53%	
8.1.4.7	Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	EJEUCIÓN	$ 3,047,789	$ 10,539,845.00	$ 795,460	7.55%	
8.1.4.11	Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	EJEUCIÓN	$ 4,997,443	$ 17,282,125.00	$ 987,550	5.71%	
8.1.5.1	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	EJEUCIÓN	$ 8,020,351	$ 27,735,930.00	$ 2,291,229	8.26%	
8.1.5.3	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	EJEUCIÓN	$ 3,312,754	$ 11,456,145.00	$ 1,205,910	10.53%	
8.1.5.5	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared,con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	EJEUCIÓN	$ 1,037,157	$ 3,586,689.00	$ 155,943	4.35%	
8.1.5.11	Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	EJEUCIÓN	$ 267,105	$ 923,700.00	$ 461,850	50.00%	
26	ASEO	EJEUCIÓN	$ -	$ 0.00	$ -		
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 22,596,636	$ 46,448,640.00	$ 20,160,000	43.40%	Se realiza aseo permanente
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	EJEUCIÓN	$ -	$ 86,599,977.00	$ 3,352,560	3.87%	
28.1	Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 14,899,878		
28.2	Tratamiento de fallos	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 253,628,157		
28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 37,499,042		
28.4	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 32,291,349		Cerramiento zona aislada colegio, reubicacion bloque I y J.

28.5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 375,160,010		

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRSO
$ 11,523,526,363.89	$ 1,064,845,490.15	$ 12,588,371,854.04	$ 10,048,173,514.53	$ 87,852,036.06	$ 10,136,025,551	-$ 2,452,346,303.449310
32.71%	**3.02%**	**35.74%**	**28.52%**	**0.25%**	**28.77%**	**-6.97%**

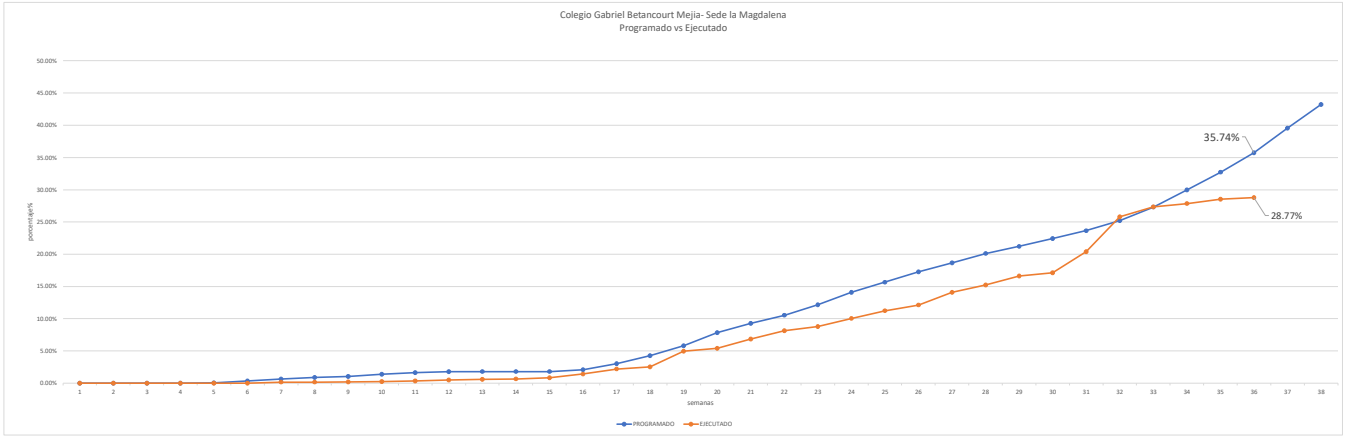

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor Programado a la fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Atraso en dias respecto al inicio de la actividad	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	$ 59,124,219	20/06/2022	10/03/2023	-223	-0.03%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	$ 7,216,733	14/11/2022	18/07/2023	-76	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	$ 24,082,038	18/11/2022	24/07/2023	-72	-0.07%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	$ 4,100,044	18/11/2022	24/07/2023	-72	-0.01%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	$ 92,509,609	20/06/2022	10/03/2023	-223	-0.09%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	$ 576,349,802	27/06/2022	17/03/2023	-216	-0.86%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	$ 303,039,109	5/09/2022	3/07/2023	-146	-0.86%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2.2.2	Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	$ 15,865,612	7/11/2022	10/12/2022	-83	-0.05%	Zona usada como punto de acopio o ubicación deautobomba para fundida de los bloques principales A al E.
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	$ 8,678,037	12/09/2022	27/03/2023	-139	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.1.5	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Bajo tierra)	$ 2,912,215	12/09/2022	27/03/2023	-139	-0.01%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	$ 11,379,689	12/09/2022	27/03/2023	-139	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
3.2.5	Suministro e instalcion filtro frances tuberia 4" perforando con grava 1/2"	$ 5,807,701	12/09/2022	27/03/2023	-139	-0.02%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
4.1.3	Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 41,592,344	3/10/2022	7/05/2023	-118	-0.12%	De acuerdo con el proceso constructivo sugerido por proveedores de formaleta por aspectos de seguridad del personal, las esclaeras se iniciaran a construir una vez se tenga concluida la estructura en concreto de cubierta, ya que la armadura inicia desde el primer nivel presentando apoyo hasta el nivel +11.53.
4.1.4	Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 292,222,466	3/10/2022	7/05/2023	-118	-0.83%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	$ 911,082,572	24/10/2022	11/06/2023	-97	-1.84%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	$ 182,477,424	24/10/2022	11/06/2023	-97	-0.47%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	$ 142,453,126	24/10/2022	11/06/2023	-97	-0.23%	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
6.1.3.1	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 4" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 6,007,895	12/11/2022	22/05/2023	-78	-0.02%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.3.2	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2.1/2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 2,265,208	12/11/2022	22/05/2023	-78	-0.01%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.3.5	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 3,217,767	12/11/2022	22/05/2023	-78	-0.01%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 7,517,748	12/11/2022	22/05/2023	-78	-0.02%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 9,045,564	12/11/2022	22/05/2023	-78	-0.03%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 4,623,529	12/11/2022	22/05/2023	-78	-0.01%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 28,372,269	12/09/2022	26/03/2023	-139	-0.05%	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio

6.2.6.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 17,397,244	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.05%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	$ 72,161,159	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.10%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 17,056,533	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.02%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.3	Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 3,359,905	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 20,582,393	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.04%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.2.5	Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	$ 4,845,372	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 4,680,521	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 5,469,411	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
7.1.3.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 2,874,086	12/09/2022	26/03/2023	**-139**	**-0.01%**	La zona de intervencion se encuentra actualmente en uso por el colegio
11.1.1	Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	$ 38,167,974	26/11/2022	17/07/2023	**-64**	**-0.11%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	$ 97,505,535	19/12/2022	6/08/2023	**-41**	**-0.28%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad, se presenta dificultad de consecusion del material con las dimensiones referidas en la descripcion del item, se plantea cambio de formato.
12.1.2	Construccion de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos. Incluye manto impermeabilizante (sufridor).	$ 111,468,497	19/12/2022	24/06/2023	**-41**	**-0.32%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad
12.2.1	Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)	$ 24,754,978	19/12/2022	6/08/2023	**-41**	**-0.07%**	La actividad requiere que se culmine en primaria instancia la mamposteria y presenta atrasos por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
13.1.1	Suministro e instalación cubierta tipo sándwich deck ancho 525 mm aislante en fibra de vidrio e = 3cm panel inferior y superior en aluzinc cal. 24 pintada a una cara (incluye remate lateral y elementos de fijación)	$ 305,340,511	31/10/2022	18/06/2023	**-90**	**-0.87%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.1.2	Suministro e instalacion de cubierta plana en policarbonato alveolar 8mm traslucido (incluye accesorios de fijación)	$ 33,847,133	31/10/2022	18/06/2023	**-90**	**-0.10%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.2.1	Suministro e instalacion de Canal lamina galvanizada cal. 20 ds= 0.80m	$ 11,466,939	31/10/2022	18/06/2023	**-90**	**-0.03%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
13.2.2	Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada C 22	$ 3,649,052	31/10/2022	18/06/2023	**-90**	**-0.01%**	La actividad presenta atrasos debido a las demoras en las aprobaciones de los items no previstos y factores logisiticos ocasionados por la ocupacion del colegio, al igual que los factores climaticos.
15.1.1	Suministro e instalación de Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de drywall	$ 11,429,566	12/12/2022	31/07/2023	**-48**	**-0.03%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.2	Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	$ 42,071,240	12/12/2022	31/07/2023	**-48**	**-0.12%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.3	Suministro e instalacion Cielo raso tipo tile natura de hunter douglas o similar (bandeja de madera laminada hr 100 de 16mm enchapado natural perfilería oculta)	$ 9,824,603	12/12/2022	31/07/2023	**-48**	**-0.03%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.1.4	Suministro e instalación de Cielorraso en panel de aluminio en alucobond	$ 47,032,859	12/12/2022	31/07/2023	**-48**	**-0.13%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.2	Suministro e instalacion Muros cara sencilla en drywall 10 mm	$ 22,043,060	12/12/2022	31/07/2023	**-48**	**-0.06%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.3	Suministro e instalacion Aislamientos acustifibra 1 1/2" o similar (muros y techos)	$ 13,921,980	12/12/2022	31/07/2023	**-48**	**-0.04%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
15.2.4	Suministro e instalacion Aislamientos frescasa o similar (cielo rasos)	$ 297,709	12/12/2022	31/07/2023	**-48**	**0.00%**	Atraso ocasionado por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, aun no se tienen zonas listas para iniciar con la actividad.
21.1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	$ 34,329,605	27/06/2022	18/03/2023	**-216**	**-0.10%**	Las areas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, los exteriores estan siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razon por la que no pueden ser intervenidas de forma simultanea.
27.1	Suministro e instalacion de Paneles Solares 475Wp, Eficiencia 21.16%, Garantía 12 Años-92150 Wp, Incluye: Suministro e instalacion de Inversor 100Kwp Incluye Tarjeta De Monitoreo Wifi, 6 MPPT, 1000VDC, 400VAC, Garantía 5 Años - Suministro e instalacion Estructura En Aluminio Alurack Para fijación Paneles Solares, Incluye Tornilleria - Suministro e instalacion de Eclam y Mclam En Aluminio Alurack Para fijación De Paneles Solares - Transformador seco tipo H 100KVA , 400/208V - Acometida DC 1000V,6MMQ - Acometida Ac, Canalizaciónes, Protecciónes electrica, Cofres y accesorios en AC.	$ 58,698,341.08	31/10/2022	18/06/2023	**-90**	**-0.17%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 36 comprendidos entre los días 23 de enero al 29 de enero del 2023, se radicó el siguiente oficio:
1. El dia 23 de enero del 2023 se hace alcance al oficio CCERU-22-404 con respecto a los informes semanales en el oficio CCERU-22-433. Se radica en Nol. de oficio CCER-22-434 la respuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_286- Estructura metalica provisional colegio. Se radica en No. de oficio CCER-22-435 la respuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_291- Conexion red alcantarillado existente. Se radica en No. de oficio CCER-22-436 la respuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_273- Plan de manejo fauna e Informe fauna
2. El dia 26 de enero del 2023 se radica el No. de oficio CCERU-22-442 con respecto al estudio de fotometrico
3. El dia 27 de enero del 2023 se radica el No. de oficio CCERU-23-449 al acueducto con respuesta a la solicitud acueducto - apertura de pozo y limpieza de redes

Aspecto Financiero

Durante la semana no se presenta ninguna actividad

Aspecto Técnico

Durante la semana presentaron los siguientes oficios:
1. El dia 23 de enero del 2023 se radica en No. de oficio CCER-22-437 la respuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_289 - Planos de taller estructura metalica. Se radica en No. de oficio CCERU-22-438 se radica el concepto de RCI
2. El dia 24 de enero del 2023 se radico en No. de oficio CCERU-22-439 con resultados de cilindro
3. El dia 25 de enero del 2023 se radica el No. de oficio CCERU-22-440 la respuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_285 - Especificacion tecnica piso en baldosa grantio. Se radica el No. de oficio CCERU-22-441 resultados de laboratorio. Se radica el No. de oficio CCERU-22-442 la actividad no prevista de alistado de pisos en mortero
4. El dia 27 de enero del 2023 se radica el oficio CCERU-22-445 con resultados de cilindro. Se radica en el oficio CCERU-22-446 las observaciones de la estructura metalica. Se radica en No. de oficio CCERU-22-447 la respuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_296 - muestra de baldosa granito. Se radica en el oficio CCERU-22-448 la solicitud de aclaracion en detalle de puerta ventana. Se radico el oficio CCERU-22-450 el informe de consumo de energia.
5. El dia 28 de enero del 2023 se radico el oficio No. CCERU-22-451 los resultados de cilindro

Si bien existen actividades que no se han podido iniciar y/o presentan un atraso producto de las demoras en la aprobacion de los items no previstos, factores climaticos, logisticos e inconvenientes generados por la ocupacion del colegio, este consorcio se encuentra ejecutando multiples frentes de trabajo, y a acometido e internvenido varias actividades a medida que la obra lo permite, tanto asi que a la fecha no se tienen atrasos, si no que se relaciona un avance.
Se avanza con las siguientes actividades:
- Se continua con las actividades de taller de estructura metalica. Se realiza instalacion de platinas
- Se realizan las instalaciones de las redes hidraulicas y sanitarias del modulo A.Se inicia con la instalacion de RCI en los modulos A al E.
- Se instala material (recebo comun) en las zonas exteriores.
- Se inicia la mamposteria del segundo nivel.
- Se continua con el retiro de bocel, piluda y remates de las losas de entrepiso.
La ocupacion del colegio a generado inconvenientes frente al normal desarrollo de la obra, toda vez que el ingreso a la misma impide la ejecucion de bloques de manera simultanea como sucede con los bloque I, J, H y G.
Como bien se ha expresado se obtuvo una disminución de personal en los frentes de estructura, actividad que está próxima a terminar la primera fase (bloques A al E), como es de conocimiento general los frentes de trabajo dependen directamente del avance de la estructura, tales como pisos, mamposteria, carpintería metálica, aluminio, metálica, entre otros, el aumento del personal se está dando a medida que la obra lo permite, e tiene alrededor de un mes de diferencia con el histograma de trabajadores del plan de contingencia debido a aspectos como: (logística constructiva, producto de la ocupación del colegio, demoras en las aprobaciones de ítems no previstos, ola invernal).

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El día 24 de enero del 2023 se inicia con la elaboración del informe mensual, se traslada el acero que se encontraba en la zona verde al patio de materiales y se da cumplimiento al compromiso adquirido en el comité del 19 de enero, se solicitan cotizaciones a apicultores para la generación de APU
2. El día 25 de enero del 2023 se realiza jornada de aseo general al interior de la obra
3. El día 26 de enero del 2023 se realiza recorrido de obra entre interventoría y contratista, capacitación al personal administrativo y al personal operativo frente al manejo adecuado de residuos sólidos convencionales y recordatorio del manejo de culebra sabanera en caso de hallazgo
4. El día 27 de enero del 2023 se remite a la interventoría documentos de proveedor de materiales pétreos y se recibe aprobación, asistencia y participación al comité de participación ciudadana
lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operado de aseo del sector de acuerdo con las micro rutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías.

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El día 23 de enero del 2023 se realizó trabajo en alturas, lavado de baños, inducción, trabajo en caliente, inspección de minicargador, orden y aseo, charla de seguridad
2. E día 24 de enero del 2023 se realizó trabajo en alturas, lavado de baños, inducción, trabajo en caliente, inspección de minicargador, orden y aseo, charla de seguridad
3. El día 25 de enero del 2023 se realizó trabajo en alturas, lavado de baños, inducción, trabajo en caliente, inspección de minicargador, orden y aseo, charla de seguridad
4. El día 26 de enero del 2023 se realizó trabajo en alturas, lavado de baños, inducción, trabajo en caliente, inspección de minicargador, orden y aseo, charla de seguridad
5. El día 27 de enero del 2023 se realizó trabajo en alturas, lavado de baños, inducción, trabajo en caliente, inspección de minicargador, orden y aseo, charla de seguridad
6. El día 28 de enero del 2023 se realizó trabajo en alturas, lavado de baños, trabajo en caliente, inspección de minicargador, orden y aseo, charla de seguridad

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 20 de enero del 2023 se envio a través de correos electrónicos, se remite a los líderes, vecinos , administradores de conjuntos y demás comunidad en general ubicada en el área de influencia directa el proyecto , convocatoria al comité de participación ciudadana No 6. (volantes No 20 y No 21). A través de correos electrónicos, se remite link para aplicar instrumento de evaluación de impactos a los líderes, vecinos, administradores de conjuntos y demás comunidad en general ubicada en el área de influencia directa del proyecto.
2. El dia 26 de enero del 2023 se realizo asistencia y participación en comité de seguimiento social
3. El dia 27 de enero del 2023 se remite a interventoría, relación de personal Mano de Obra No Calificada (MONCL) con corte al 14 de enero de 2023. A través de oficio No CCERU-SOC-071, se solicita ante interventoría certificado de PQRS abiertas y/o cerradas.


Entre el 23 y el 28 de enero de 2023: Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presento ninguna actividad en este componente

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	2022612025766 62*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
Existen factores que inciden en el atraso que no deben ser imputados únicamente a este consorcio, e insistimos la medida correctiva que planteamos es la entrega total de las áreas del lote, con el fin de ampliar el mayor número de frentes de trabajo, de igual manera solicitamos a la entidad dar respuesta al balance presentado en el que se informa que se requiere de un recurso adicional para desarrollar las obras y/o definir el alcance real del proyecto en el caso de no generarse una adición.	
	Firma
