	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	39	**DEL**	**13 de febrero de 2023**	**AL**	**19 de febrero de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	273	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ 78,368,600	$ 95,688,541.62	$ 51,019,405	53.32%	Se localiza y replantea la zona del colegio existente para las adecuaciones de cafeteria, aula y baños.
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 7,216,733	$ 24,055,777.18	$ 1,096,448	4.56%	
1.2.2	Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,008,558	$ 3,361,860.00	$ 884,700	26.32%	
1.2.3	Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 450,542	$ 1,501,808.00	$ 536,360	35.71%	
1.2.4	Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,125,041	$ 3,750,136.00	$ 455,624	12.15%	
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 24,082,038	$ 80,273,460.25	$ 1,143,446	1.42%	
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 4,100,044	$ 13,666,814.00	$ 1,569,615	11.48%	
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	EJEUCIÓN	$ 94,744,420	$ 96,532,268.95	$ 59,703,112	61.85%	
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	EJEUCIÓN	$ 593,138,797	$ 604,331,461.00	$ 274,216,572	45.38%	Zona escalera bloque A
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 268,095,631	$ 942,475,329.88	$ 571,943,093	60.69%	
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 48,907,589	$ 86,953,142.62	$ 68,921,614	79.26%	Zona blouqe G
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 209,958,564	$ 238,614,720.00	$ 236,372,736	99.06%	
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 1,289,575,244	$ 1,430,775,095.68	$ 492,022,573	34.39%	
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 13,668,413	$ 15,165,012.45	$ 13,681,709	90.22%	Zona zapatas entre rampa
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 1,170,466,868	$ 1,298,625,150.90	$ 553,046,178	42.59%	
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ 75,311,310	$ 83,557,393.95	$ 74,141,949	88.73%	Zona esclaera 1 entrebloque A y B
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 6,821,576	$ 33,401,959.73	$ 33,401,960	100.00%	
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	EJEUCIÓN	$ 43,848,524	$ 86,024,083.88	$ 75,937,096	88.27%	Zona rampa
2.2.5	Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 22,693,378	$ 22,693,378.20	$ 7,742,447	34.12%	
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 1,774,601,098	$ 1,968,908,032.00	$ 1,154,873,272	58.66%	Acero Rampa
2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 239,229,291	$ 265,423,295.88	$ 230,395,335	86.80%	Acero mamposteria


3.1.1	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,942,490	$ 9,928,884.42	$ 9,928,884	100.00%	
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 1,638,881	$ 16,226,945.82	$ 7,960,741	49.06%	
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 10,589,692	$ 12,800,356.80	$ 1,471,556	11.50%	
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 963,725	$ 5,670,325.96	$ 1,932,690	34.08%	
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 604,432	$ 9,291,630.96	$ 2,832,571	30.49%	
3.1.7	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 793,317	$ 2,407,696.00	$ 1,286,872	53.45%	
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 13,886,481	$ 16,785,371.90	$ 5,801,953	34.57%	
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 679,806,841	$ 944,434,571.73	$ 452,108,763	47.87%	
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 1,147,342,870	$ 1,707,849,178.75	$ 800,365,208	46.86%	
4.1.3	Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 63,587,631	$ 94,651,813.98	$ 19,581,751	20.69%	Escalera bloque entre bloque G
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 1,101,444,632	$ 1,639,528,478.14	$ 715,850,607	43.66%	
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 719,638,936	$ 999,772,066.58	$ 731,372,089	73.15%	
4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 145,222,163	$ 216,166,901.04	$ 123,001,928	56.90%	
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 1,040,849,980	$ 2,947,771,794.88	$ 2,056,069,317	69.75%	
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 1,047,542,495	$ 1,863,467,553.48	$ 371,616,672	19.94%	Segundo nivel bloque C
5.1.2	Construcción de Muro contraterreno en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a inmersion de 2	EJEUCIÓN	$ 209,808,487	$ 373,227,158.40	$ 37,407,653	10.02%	
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 163,789,439	$ 291,364,128.00	$ 82,835,214	28.43%	
6.1.5.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 927,172	$ 2,581,546.00	$ 1,764,839	68.36%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,045,573	$ 5,695,536.00	$ 5,288,712	92.86%	
6.1.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,346,119	$ 3,748,032.00	$ 1,186,877	31.67%	
6.1.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,774,740	$ 4,941,450.00	$ 1,518,672	30.73%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 772,423	$ 2,150,676.00	$ 805,091	37.43%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 914,829	$ 2,547,181.00	$ 677,930	26.61%	Bloque E segundo nivel acceso a baños
6.1.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1" RDE 13.5 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 487,632	$ 1,357,725.00	$ 94,725	6.98%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 627,495	$ 1,747,150.00	$ 640,973	36.69%	Bloque E segundo nivel acceso a baños
6.1.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 828,920	$ 2,307,981.00	$ 886,990	38.43%	Bloque E segundo nivel acceso a baños
6.1.5.10	Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 4"	EJEUCIÓN	$ 401,482	$ 1,117,857.00	$ 1,117,857	100.00%	Bloques del A al E
6.1.5.11	Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 3"	EJEUCIÓN	$ 1,531,203	$ 4,263,364.00	$ 4,263,364	100.00%	Bloques del A al E
6.1.6.1	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 128,472	$ 520,304.00	$ 325,190	62.50%	
6.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 457,421	$ 2,092,356.00	$ 1,485,876	71.01%	
6.1.6.3	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 326,173	$ 1,513,620.00	$ 100,908	6.67%	
6.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 670,854	$ 3,113,125.00	$ 821,865	26.40%	Bloque E segundo nivel acceso a baños
6.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 376,195	$ 2,157,747.00	$ 335,184	15.53%	Bloque E segundo nivel acceso a baños
6.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 632,506	$ 3,565,688.00	$ 587,034	16.46%	

6.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 431,369	$ 1,995,624.00	$ 110,868	5.56%	
6.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 644,951	$ 2,986,812.00	$ 256,536	8.59%	
6.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,161,945	$ 14,981,330.00	$ 459,550	3.07%	
6.1.7.4	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/2"	EJEUCIÓN	$ 2,196,204	$ 6,114,942.00	$ 1,358,876	22.22%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.7.5	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/4"	EJEUCIÓN	$ 1,753,619	$ 4,882,644.00	$ 813,774	16.67%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.7.7	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 3/4"	EJEUCIÓN	$ 2,458,900	$ 6,846,374.00	$ 1,432,962	20.93%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.8.1	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1.1/4" para fluxómetro y ducha lavaojos	EJEUCIÓN	$ 4,417,454	$ 12,299,622.00	$ 4,761,144	38.71%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.8.2	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría hidráulico 3/4" para orinales	EJEUCIÓN	$ 710,995	$ 1,979,640.00	$ 879,840	44.44%	Adecuaciones provisionales colegio
6.1.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	EJEUCIÓN	$ 7,599,121	$ 21,158,412.00	$ 4,017,420	18.99%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	EJEUCIÓN	$ 6,077,001	$ 16,920,337.00	$ 11,724,328	69.29%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	EJEUCIÓN	$ 8,796,970	$ 24,493,611.00	$ 16,722,267	68.27%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 8,525,297	$ 23,737,185.00	$ 16,104,051	67.84%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,563,952	$ 4,354,548.00	$ 1,077,841	24.75%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 66,998	$ 2,215,210.00	$ 1,931,197	87.18%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,229,192	$ 20,153,447.28	$ 4,011,621	19.91%	
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 5,557,466	$ 15,473,784.00	$ 2,586,277	16.71%	
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,597,970	$ 7,233,588.00	$ 279,987	3.87%	
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,122,216	$ 3,124,612.00	$ 1,617,103	51.75%	
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 4,115,092	$ 11,457,748.00	$ 359,956	3.14%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,621,701	$ 7,299,664.00	$ 6,745,200	92.40%	
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 4,968,263	$ 13,833,252.00	$ 8,069,397	58.33%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en	EJEUCIÓN	$ 1,847,821	$ 5,144,932.00	$ 2,572,466	50.00%	
6.2.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 463,696	$ 10,513,080.00	$ 2,376,202	22.60%	
6.2.3.2	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 392,366	$ 1,234,091.00	$ 1,118,774	90.66%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,817,519	$ 5,060,560.00	$ 1,380,454	27.28%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,525,673	$ 9,285,600.00	$ 1,798,608	19.37%	Adecuaciones provisionales colegio
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 11,815,795	$ 43,440,600.00	$ 29,291,376	67.43%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 44,088,882	$ 53,292,716.00	$ 12,456,561	23.37%	
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 24,983,616	$ 30,199,104.00	$ 23,152,646	76.67%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 9,629,865	$ 13,843,060.28	$ 12,044,656	87.01%	
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 30,133,652	$ 36,424,243.00	$ 14,853,114	40.78%	
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,055,825	$ 3,370,270.40	$ 3,370,270	100.00%	
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	EJEUCIÓN	$ 1,424,060	$ 5,235,537.00	$ 725,718	13.86%	

6.2.4.15	Suministro e instalacion de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 7,211,706	$ 26,513,733.00	$ 10,374,939	39.13%	
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	EJEUCIÓN	$ 6,297,371	$ 23,152,194.00	$ 15,434,796	66.67%	Exteriores
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 2,036,726	$ 7,487,994.00	$ 613,770	8.20%	Bloques del A al E
6.2.5.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,919,394	$ 7,056,623.00	$ 1,170,684	16.59%	Bloques del A al E
6.2.5.3	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 676,344	$ 2,486,568.00	$ 394,212	15.85%	Bloques del A al E
6.2.5.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 209,998	$ 3,237,650.00	$ 1,270,155	39.23%	Bloques del A al E
6.2.5.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 871,810	$ 3,205,197.00	$ 356,133	11.11%	
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 34,622,296	$ 48,785,278.08	$ 10,119,417	20.74%	
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 40,815,595	$ 227,154,620.88	$ 61,139,542	26.92%	
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 8,687,570	$ 61,012,710.66	$ 12,805,342	20.99%	
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJEUCIÓN	$ 88,057,288	$ 106,439,805.00	$ 36,291,568	34.10%	
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 20,813,857	$ 25,158,882.00	$ 10,782,378	42.86%	
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 25,116,417	$ 30,359,628.00	$ 7,006,068	23.08%	
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 5,711,576	$ 6,903,904.00	$ 584,833	8.47%	
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 6,674,248	$ 8,067,540.00	$ 1,722,110	21.35%	
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 1,434,138	$ 1,733,524.00	$ 731,414	42.19%	
7.1.5.1	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"	EJEUCIÓN	$ 7,648,799	$ 28,120,698.00	$ 4,408,754	15.68%	
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 20,573,830	$ 75,639,390.00	$ 9,355,311	12.37%	Bloques del A al E
7.1.5.3	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ 5,588,724	$ 20,546,864.00	$ 341,458	1.66%	Bloques del A al E
7.1.5.4	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 6,803,632	$ 25,013,454.00	$ 651,722	2.61%	Bloques del A al E
7.1.5.5	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 3,422,384	$ 12,582,346.00	$ 469,988	3.74%	Bloques del A al E
7.1.5.6	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 28,311,889	$ 104,088,250.00	$ 3,914,855	3.76%	Bloques del A al E
7.1.5.7	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"	EJEUCIÓN	$ 3,662,846	$ 13,466,400.00	$ 868,800	6.45%	
7.1.5.8	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 1,377,868	$ 5,065,710.00	$ 779,340	15.38%	
7.1.5.9	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ 141,176	$ 519,030.00	$ 57,670	11.11%	Bloques del A al E
7.1.5.10	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 4"x2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 1,691,145	$ 6,217,471.00	$ 478,267	7.69%	
7.1.5.11	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 2,072,487	$ 7,619,468.00	$ 672,306	8.82%	
7.1.5.12	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	EJEUCIÓN	$ 1,409,669	$ 5,182,628.00	$ 471,148	9.09%	Bloques del A al E
7.1.5.14	Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	EJEUCIÓN	$ 1,115,152	$ 4,099,839.00	$ 143,854	3.51%	Bloques del A al E
7.1.5.15	Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 3,088,820	$ 11,356,002.00	$ 1,622,286	14.29%	
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 3,142,666	$ 11,553,966.00	$ 1,664,982	14.41%	Bloques del A al E
7.1.10.3	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,171,925	$ 4,308,565.00	$ 174,335	4.05%	Bloques del A al E
7.1.10.4	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,350,451	$ 4,964,913.00	$ 188,541	3.80%	Bloques del A al E

7.1.10.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 703,742	$ 2,587,298.00	$ 1,087,100	42.02%	Bloques del A al E
8.1.3.10	Suministro e instalación de alimentador tableros T1, T3 y T7 en 3 # 6 fases + 1 # 6 neutro + 1 # 8 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø11/4" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de	EJEUCIÓN	$ -	$ 18,455,748.00	$ 12,470,100	67.57%	Adecuaciones provisionales colegio
8.1.3.23	Suministro e instalación tablero trifilar 12 circuitos, con puerta , incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación	EJEUCIÓN	$ -	$ 2,117,468.00	$ 529,367	25.00%	Adecuaciones provisionales colegio
8.1.3.33	Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x40A, 25KA ,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación	EJEUCIÓN	$ -	$ 680,774.00	$ -	0.00%	
8.1.3.34	Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 3x40A, 10KA,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación	EJEUCIÓN	$ -	$ 130,636.00	$ -	0.00%	
8.1.3.38	Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación	EJEUCIÓN	$ -	$ 44,649.00	$ 14,883	33.33%	Adecuaciones provisionales colegio
8.1.4.1	Suministro e instalación salida de iluminación interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie,tomacorriente doble	EJEUCIÓN	$ 86,230,031	$ 292,236,160.00	$ 12,070,624	4.13%	Adecuaciones provisionales colegio
8.1.4.5	Suministro e instalación de interruptor sencillo sin piloto, en tuberia EMT 3/4" en pared , caja 2x4 rxdwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta	EJEUCIÓN	$ 4,028,122	$ 13,651,425.00	$ 481,815	3.53%	
8.1.4.7	Suministro e instalación de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion	EJEUCIÓN	$ 3,109,989	$ 10,539,845.00	$ 795,460	7.55%	
8.1.4.11	Suministro e instalación de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos	EJEUCIÓN	$ 5,099,431	$ 17,282,125.00	$ 987,550	5.71%	
8.1.5.1	Suministro e instalación tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta	EJEUCIÓN	$ 8,184,032	$ 27,735,930.00	$ 3,255,957	11.74%	Adecuaciones provisionales colegio
8.1.5.3	Suministro e instalación tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos	EJEUCIÓN	$ 3,380,361	$ 11,456,145.00	$ 1,205,910	10.53%	
8.1.5.5	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared,con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su	EJEUCIÓN	$ 1,058,323	$ 3,586,689.00	$ 155,943	4.35%	
8.1.5.11	Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion	EJEUCIÓN	$ 272,556	$ 2,771,100.00	$ 1,847,400	66.67%	Adecuaciones provisionales colegio
12.1.1	Suministro e instalación Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	EJEUCIÓN	$ 146,258,302	$ 452,478,283.80	$ 6,753,332	1.49%	Adecuaciones provisionales colegio
13.2.1	Suministro e instalacion de Canal lamina galvanizada cal. 20 ds= 0.80m	EJEUCIÓN	$ 12,946,750	$ 36,666,249.49	$ -	0.00%	
15.1.2	Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	EJEUCIÓN	$ 54,412,137	$ 156,186,600.36	$ 79,042,504	50.61%	Adecuaciones provisionales colegio
16.1.1	Suministro y colocación de Estuco y pintura en vinilo tipo 1 (Incluye Filos y Dilataciones)	EJEUCIÓN	$ 9,646,244	$ 68,867,345.30	$ 8,617,240	12.51%	Adecuaciones provisionales colegio
16.1.4	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	EJEUCIÓN	$ 2,855,582	$ 20,386,834.92	$ 9,743,803	47.79%	Adecuaciones provisionales colegio
21.1.17	Suministro e instalacion Loseta cuadratica 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	EJEUCIÓN	$ -	$ 68,141,952.77	$ 4,667,053	6.85%	Adecuaciones provisionales colegio
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 24,479,688	$ 46,448,640.00	$ 21,288,960	45.83%	
26.2	Aseo Final	EJEUCIÓN	$ -	$ 36,501,198.97	$ 838,350	2.30%	Adecuaciones provisionales colegio
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	EJEUCIÓN	$ -	$ 86,599,977.36	$ 7,655,012	8.84%	Adecuaciones provisionales colegio
28.1	Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos	EJEUCIÓN		$ 28,251,908.41	$ 15,061,408		Zona esclaera 1 entre bloque A y E
28.2	Tratamiento de fallos	EJEUCIÓN		$ 261,343,385.00	$ 253,628,157		
28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	EJEUCIÓN		$ 97,056,344.00	$ 77,203,910		Zona frontal bloques del A al E
28.4	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	EJEUCIÓN		$ 34,652,301.20	$ 32,291,349		
28.5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	EJEUCIÓN		$ 605,567,912.40	$ 375,160,010		
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJEUCIÓN		$ 243,919,720.80	$ 19,620,778		

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRSO
$ 15,222,715,572.35	$ 1,325,552,797.04	$ 16,548,268,369.39	$ 10,325,445,454.70	$ 354,982,336.34	$ 10,680,427,791	-$ 5,867,840,578.349760
43.21%	3.76%	46.98%	29.31%	1.01%	30.32%	-16.66%

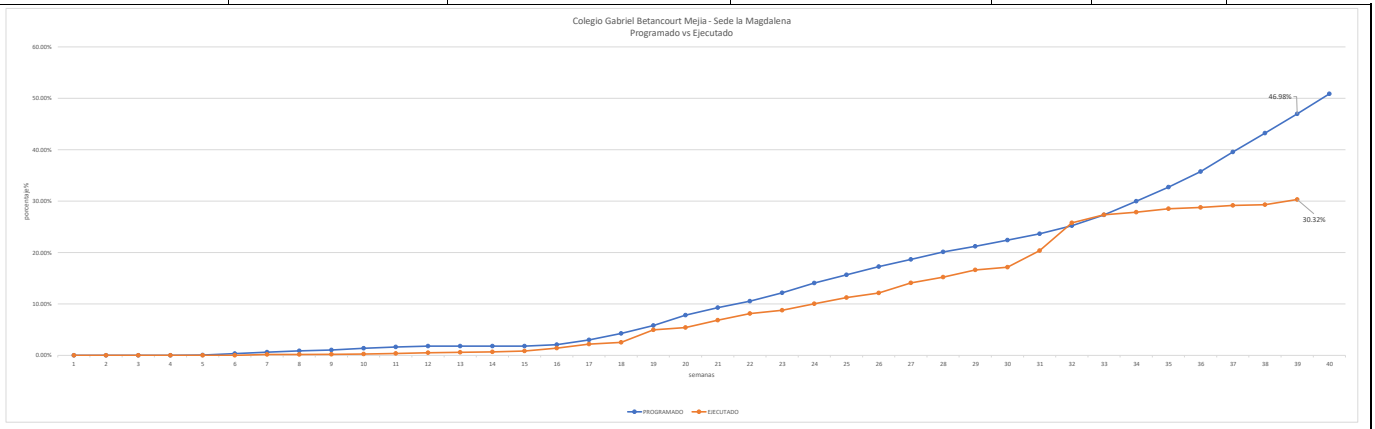

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor Programado a la fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Atraso en dias respecto al inicio de la actividad	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	$ 78,368,600	20/06/2022	10/03/2023	-244	-0.08%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2	DEMOLICIONES Y DESMONTES	$ -	14/11/2022	24/07/2023	-97	-0.09%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	20/06/2022	3/07/2023	-244	-1.15%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2	CIMENTACION - RAMPA - ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO CIMENTACION	$ -	12/09/2022	28/04/2023	-160	-5.62%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - ESTRUCTURAS METALICAS - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ -	12/09/2022	6/08/2023	-160	-4.15%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
4.3	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ -	24/10/2022	11/06/2023	-118	-0.25%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5	MAMPOSTERIA	$ -	24/10/2022	11/06/2023	-118	-2.64%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS	$ -	12/09/2022	23/10/2023	-160	-0.30%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
7	INSTALACION RED CONTRAINCENDIOS	$ -	12/09/2022	25/09/2023	-160	-0.64%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
8.1	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ -	14/11/2022	25/09/2023	-97	-0.86%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
8.2	INSTALACIONES COMUNICACIONES	$ -	14/11/2022	25/09/2023	-97	-0.39%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
8.3	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA CCTV	$ -	14/11/2022	25/09/2023	-97	-0.10%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
8.4	SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS	$ -	14/11/2022	25/09/2023	-97	-0.16%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
8.5	SISTEMA DE AUDIO VOZ Y SONIDO	$ -	3/04/2023	2/07/2023	43	0.00%	
9	RED DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	14/11/2022	3/07/2023	-97	-0.08%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
10	INSTALACION ELECTRICA RED DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	14/11/2022	2/07/2023	-97	-0.02%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
11	PAÑETES	$ -	26/11/2022	17/07/2023	-85	-0.13%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
12	PISOS Y ENCHAPES	$ -	19/12/2022	22/10/2023	-62	-1.10%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
13	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	$ -	31/10/2022	26/09/2023	-111	-1.20%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
14	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	$ -	4/03/2023	21/10/2023	13	0.00%	
15	CIELO RASOS Y ESTRUCTURA LIVIANA	$ -	12/12/2022	31/07/2023	-69	-0.33%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
16	ESTUCO, PINTURA Y SEÑALIZACION	$ -	12/12/2022	22/10/2023	-69	-0.04%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
17	CARPINTERIA DE MADERA - MOBILIARIO	$ -	10/02/2023	22/10/2023	-9	-1.27%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
18	CARPINTERIA METALICA	$ -	23/01/2023	14/10/2023	-27	-1.26%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
19	VIDRIOS TEMPLADOS Y ESPEJOS	$ -	23/01/2023	14/10/2023	-27	-0.03%	
20	RECUBRIMIENTOS ESPECIALES FACHADAS	$ -	23/01/2023	11/09/2023	-27	-0.61%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
21	OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	$ -	27/06/2022	22/10/2023	-237	-0.19%	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
22	SEÑALETICA	$ -	5/03/2023	22/10/2023	14	0.00%	
23	EQUIPOS ESPECIALES	$ -	3/04/2023	2/07/2023	43	0.00%	
23.1	EQUIPOS DE COCINA	$ -	3/04/2023	2/07/2023	43	0.00%	
24	MUEBLES Y MESONES	$ -	23/01/2023	9/10/2023	-27	0.00%	
24.1	MESONES	$ -	18/02/2023	9/10/2023	-1	0.00%	
25	ZONAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$ -	20/03/2023	23/09/2023	29	0.00%	
26	ASEO	$ -	23/05/2022	23/10/2023	-272	-0.01%	
27	SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR	$ -	31/10/2022	18/06/2023	-111	-0.20%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 39 comprendidos entre los días 13 de febrero al 19 de febrero del 2023, se radicó el siguiente oficio:
1. El día 13 de febrero del 2023 se radicó en No. de oficio CCERU-22-487 con respecto al acontecimiento de robo continuo en obra
2. El día 16 de febrero del 2023 se radicó la respuesta de la visita de la ERU el día 26 de enero del 2023 con número de oficio CCERU-22-490. Se radicó el No. de oficio CCERU-22-491 con respecto a la lectura de energía del medidor de luz. Se radica el acta de comité de la reunión con el tema estructural de obra con No. de oficio CCERU-22-492. Se radica la ficha técnica del proveedor de enchape de pared en el oficio CCERU-22-493. Se radica nuevamente la solicitud del diseño fotométrico en el oficio CCERU-22-494
3. El día 17 de febrero del 2023 se radica la solicitud con respecto a la visita del acueducto en el oficio CCERU-22-495
4. El día 18 de febrero del 2023 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_16_2021_338 con respecto a la revision de los proveedores ficha técnica de enchape de muro. Se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_16_2021_344 en el oficio CCERU-22-500. Se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_16_2021_342 en el oficio CCERU-22-501.

Aspecto Financiero

Durante la semana no se presento ninguna actividad

Aspecto Técnico

Durante la semana presentaron los siguientes oficios:
1. El día 14 de febrero del 2023 se radica en No. de oficio CCERU-22-488 resultados de cilindro
2. El día 15 de febrero del 2023 se radica en No. de oficio CCERU-22-489 con respecto a la solicitud de aclaración de estructura metálica
3. El día 18 de febrero del 2023 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_16_2021_332 con respecto a la programación de la instalación de la estructura metálica. Se radica el oficio CCERU-22-502 con respecto a la estructura y acabados de plazoletas de banderas y acceso.

Si bien existen actividades que no se han podido iniciar y/o presentan un atraso producto de las demoras en la aprobación de los ítems no previstos, factores climáticos, logísticos e inconvenientes generados por la ocupación del colegio, este consorcio se encuentra ejecutando múltiples frentes de trabajo, y ha acometido e intervenido varias actividades a medida que la obra lo permite, tanto así que a la fecha no se tienen atrasos, sino que se relaciona un avance.

Se avanza con las siguientes actividades:
- Se continúa con el armado y fundida de losas de entrepiso, actividad que se vio afectada por las demoras en la aprobación del ítem, a la fecha se tiene todo el nivel 3 de los bloques A al E, Se tuvo dificultad con la resistencia de los concretos lo cual ha incluido en demoras con las fundidas de algunas placas. Se continúa con las actividades de taller de estructura metálica, se programa para el día 25 de febrero la llegada de material de taller para iniciar montaje, se suministraron los planos para aprobación, estamos atentos a dicha aprobación.
- Se realizan las instalaciones de las redes hidráulicas y sanitarias del segundo nivel batería de baños Modulo E. Se continúa con la instalación de RCI en los módulos A al E.
- Se instala material (recebo común) en las zonas exteriores zona frontal bloques principales
- Adecuaciones colegio.

La ocupación del colegio ha generado inconveniente frente al normal desarrollo de la obra, toda vez que el ingreso a la misma impide la ejecución de bloques de manera simultánea como sucede con los bloques I, J, H y G.
Además existen actividades que no se pueden intervenir al encontrarse dentro de la ocupación de la sede B del colegio actividades que incurren directamente en el atraso de obra, estas actividades obedecen a excavaciones, demoliciones, redes hidráulicas, acometidas principales, y estructuras en concreto las cimentaciones de los bloques ya debieron iniciarse únicamente este ítem representa un atraso del 5,14%, adicionala esto las actividades de acometidas eléctricas e hidráulicas también se encuentran localizadas dentro del colegio existente.
Durante la presente jornada se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde, lo que impide continuar con el armado de acero a nivel de cubiertas.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El día 15 de febrero del 2023 se realiza jornada de aseo general al interior de la obra
2. El día 17 de febrero del 2023 se realiza recorrido de obra entre interventoría y contratista,

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El día 13 de febrero del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador, orden y aseo en áreas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente,
2. El día 14 de febrero del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador, orden y aseo en áreas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, y dotación, inducción
3. El día 15 de febrero del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador, orden y aseo en áreas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, y dotación, inducción, lavado de baños
4. El día 16 de febrero del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador, orden y aseo en áreas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, y dotación, inducción, lavado de baños
5. El día 17 de febrero del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador, orden y aseo en áreas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp lavado de baños, capacitaciones al personal en obra
6. El día 18 de febrero del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador, orden y aseo en áreas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, y dotación, inducción, divulgación de políticas del consorcio, lavado de baños

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

1. El día 13 y 14 de febrero del 2023 sé elaboro y consolidación de la presentación para la Reunión No 7 del Comité de Participación Ciudadana.
2. El día 15 de febrero del 2023 se hizo a través de correo electrónico, se remite para revisión y aprobación de interventoría presentación para la Reunión No 7 del Comité de Participación Ciudadana.
3. El día 16 de febrero del 2023 se remite a interventoría, relación de personal Mano de Obra No Calificada (MONCL) con corte al 18 de febrero de 2023. Asistencia y participación en comité de seguimiento social e integral del contrato. Se realizó actualización de los Puntos Satélites de Información del proyecto, con la instalación del volante No 23 Convocatoria al Comité de Participación Ciudadana No 7.


Entre el 13 y el 18 de febrero de 2023: Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presento ninguna actividad en este componente

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	2022612017084 22* 2022612017466 52*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	2022612017084 22* 2022612017466 52*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	2022612025766 62*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	2022612025766 62*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	2022612025766 62*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
No se presenta ninguna observación	
	Firma
