CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	50	**DEL**	**1 de mayo de 2023**	**AL**	**7 de mayo de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	350	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ 95,688,542	$ 95,688,541.62	$ 65,112,733	68.05%	
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 7,216,733	$ 24,055,777.18	$ 1,096,448	4.56%	
1.2.2	Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,008,558	$ 3,361,860.00	$ 884,700	26.32%	
1.2.3	Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 450,542	$ 1,501,808.00	$ 536,360	35.71%	
1.2.4	Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 1,125,041	$ 3,750,136.00	$ 455,624	12.15%	
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 24,082,038	$ 80,273,460.25	$ 2,982,250	3.72%	Se dispone la estructura metalica de las aulas desmontadas
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	EJEUCIÓN	$ 4,100,044	$ 13,666,814.00	$ 1,569,615	11.48%	
1.2.9	Demolición de estructura de cimentación existente	EJEUCIÓN	$ 912,528	$ 6,221,499.00	$ 4,738,195	76.16%	
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	EJEUCIÓN	$ 96,532,269	$ 96,532,268.95	$ 59,703,112	61.85%	
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	EJEUCIÓN	$ 604,331,461	$ 524,184,717.20	$ 338,007,030	64.48%	
1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	EJEUCIÓN	$ 357,982,574	$ 357,982,574.40	$ 22,532,796	6.29%	
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 269,821,457	$ 942,475,329.88	$ 605,817,766	64.28%	
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 54,262,642	$ 86,953,142.62	$ 72,504,240	83.38%	
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 232,947,620	$ 238,614,720.00	$ 236,372,736	99.06%	
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 1,430,775,096	$ 1,073,905,599.20	$ 643,654,093	59.94%	
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 15,165,012	$ 17,389,967.70	$ 17,389,968	100.00%	
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 1,298,625,151	$ 1,123,072,650.00	$ 730,152,616	65.01%	
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ 83,557,394	$ 83,557,393.95	$ 82,121,833	98.28%	
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 6,821,576	$ 44,535,947.04	$ 44,535,947	100.00%	
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	EJEUCIÓN	$ 43,848,524	$ 86,024,083.88	$ 84,976,724	98.78%	

2.2.5	Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 22,693,378	$ 25,865,739.72	$ 25,865,740	100.00%	
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 1,968,908,032	$ 1,968,908,032.00	$ 1,439,930,182	73.13%	Referzo mamposteria
2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 265,423,296	$ 322,319,855.88	$ 282,316,590	87.59%	
3.1.1	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 3,556,753	$ 10,298,417.22	$ 10,298,417	100.00%	
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 1,981,008	$ 16,226,945.82	$ 8,559,892	52.75%	
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 12,800,357	$ 12,800,356.80	$ 2,081,097	16.26%	
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 1,164,909	$ 5,670,325.96	$ 3,086,016	54.42%	
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 730,611	$ 9,291,630.96	$ 2,832,571	30.49%	
3.1.7	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 958,927	$ 2,407,696.00	$ 1,286,872	53.45%	
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 16,785,372	$ 16,785,371.90	$ 5,801,953	34.57%	
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 944,434,572	$ 944,434,571.73	$ 535,777,758	56.73%	columnas I
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 1,707,849,179	$ 1,707,849,178.75	$ 993,803,449	58.19%	
4.1.3	Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 94,651,814	$ 94,651,813.98	$ 35,345,020	37.34%	
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 1,639,528,478	$ 1,639,528,478.14	$ 1,221,197,708	74.48%	Refuerzo mamposteria
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 999,772,067	$ 999,772,066.58	$ 935,644,600	93.59%	
4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 216,166,901	$ 216,166,901.04	$ 187,175,113	86.59%	
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 2,696,911,546	$ 2,947,771,794.88	$ 2,056,069,317	69.75%	
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 1,782,158,496	$ 1,799,733,536.36	$ 490,932,606	27.28%	Se realizan actividades de mamposteria en los bloques C, D y E en el piso 3 y adicional se ejcutan antepechos de la rampa y muros divisiorios de la escalera del piso 1 del bloque G
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	EJEUCIÓN	$ 356,942,062	$ 373,227,158.40	$ 37,407,653	10.02%	
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 278,650,978	$ 291,364,128.00	$ 267,326,281	91.75%	Se realizan actividades de anclajes necesarios para la mamposteria en los bloques C, D y E en el piso 3 y adicional se ejcutan antepechos de la rampa y muros divisiorios de la escalera del piso 1 del bloque G. anclajes para actividades de elementos no estructurales del piso 2 y piso 3
6.1.5.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,279,339	$ 2,581,546.00	$ 1,764,839	68.36%	
6.1.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 5,028,791	$ 5,695,536.00	$ 5,288,712	92.86%	
6.1.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 3,309,270	$ 3,748,032.00	$ 1,186,877	31.67%	
6.1.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 4,362,982	$ 4,941,450.00	$ 2,006,229	40.60%	
6.1.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,898,908	$ 2,150,676.00	$ 983,228	45.72%	
6.1.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,248,996	$ 2,547,181.00	$ 818,737	32.14%	
6.1.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1" RDE 13.5 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,198,784	$ 1,357,725.00	$ 1,298,785	95.66%	
6.1.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,542,621	$ 1,747,150.00	$ 640,973	36.69%	
6.1.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,037,798	$ 2,307,981.00	$ 886,990	38.43%	
6.1.5.10	Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 4"	EJEUCIÓN	$ 986,996	$ 1,117,857.00	$ 1,117,857	100.00%	
6.1.5.11	Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 3"	EJEUCIÓN	$ 3,764,275	$ 4,263,364.00	$ 4,263,364	100.00%	
6.1.6.1	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 315,834	$ 520,304.00	$ 682,899	131.25%	BLOQIE A PISO 3
6.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,124,514	$ 2,092,356.00	$ 1,485,876	71.01%	
6.1.6.3	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 801,857	$ 1,513,620.00	$ 100,908	6.67%	

6.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,649,213	$ 3,113,125.00	$ 946,390	30.40%	
6.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 924,831	$ 2,157,747.00	$ 439,929	20.39%	
6.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,554,939	$ 3,565,688.00	$ 695,744	19.51%	
6.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,060,467	$ 1,995,624.00	$ 203,258	10.19%	
6.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,585,533	$ 2,986,812.00	$ 348,156	11.66%	
6.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 2,856,501	$ 14,981,330.00	$ 551,460	3.68%	
6.1.7.3	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 2"	EJEUCIÓN	$ 3,540,585	$ 4,010,016.00	$ 1,002,504	25.00%	
6.1.7.4	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/2"	EJEUCIÓN	$ 5,399,099	$ 6,114,942.00	$ 2,378,033	38.89%	
6.1.7.5	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/4"	EJEUCIÓN	$ 4,311,060	$ 4,882,644.00	$ 1,085,032	22.22%	
6.1.7.6	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1"	EJEUCIÓN	$ 3,220,175	$ 3,647,124.00	$ 607,854	16.67%	
6.1.7.7	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 3/4"	EJEUCIÓN	$ 6,044,907	$ 6,846,374.00	$ 2,229,052	32.56%	
6.1.7.8	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1/2"	EJEUCIÓN	$ 6,155,049	$ 6,971,120.00	$ 134,060	1.92%	BLOQUE E PISO 2
6.1.8.1	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1.1/4" para fluxómetro y ducha lavaojos	EJEUCIÓN	$ 10,859,773	$ 12,299,622.00	$ 6,215,938	50.54%	
6.1.8.2	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría hidráulico 3/4" para orinales	EJEUCIÓN	$ 1,747,894	$ 1,979,640.00	$ 1,173,120	59.26%	
6.1.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	EJEUCIÓN	$ 18,681,513	$ 21,158,412.00	$ 6,026,130	28.48%	
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	EJEUCIÓN	$ 14,939,566	$ 16,920,337.00	$ 11,724,328	69.29%	
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	EJEUCIÓN	$ 21,626,278	$ 24,493,611.00	$ 16,930,428	69.12%	
6.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 20,958,403	$ 23,737,185.00	$ 20,246,423	85.29%	
6.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 3,844,785	$ 4,354,548.00	$ 1,620,900	37.22%	
6.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 164,706	$ 4,430,420.00	$ 3,155,159	71.22%	
6.2.2.4	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	EJEUCIÓN	$ 367,050	$ 498,858.00	$ 498,858	100.00%	
6.2.2.5	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 3" para bajantes	EJEUCIÓN	$ 272,820	$ 308,992.00	$ 231,744	75.00%	
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 3,021,818	$ 20,153,447.28	$ 4,011,621	19.91%	
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 13,662,353	$ 15,473,784.00	$ 2,586,277	16.71%	
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 6,386,792	$ 7,233,588.00	$ 279,987	3.87%	
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 2,758,831	$ 3,124,612.00	$ 1,617,103	51.75%	
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 10,116,452	$ 11,457,748.00	$ 359,956	3.14%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 6,445,132	$ 7,299,664.00	$ 6,745,200	92.40%	
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 12,213,869	$ 13,833,252.00	$ 8,069,397	58.33%	
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material	EJEUCIÓN	$ 4,542,643	$ 5,144,932.00	$ 2,572,466	50.00%	
6.2.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 1,139,940	$ 10,513,080.00	$ 2,376,202	22.60%	
6.2.3.2	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 964,584	$ 3,945,045.00	$ 2,563,268	64.97%	
6.2.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 4,468,148	$ 5,060,560.00	$ 1,380,454	27.28%	
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 8,050,752	$ 9,285,600.00	$ 3,775,296	40.66%	


6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 37,663,642	$ 43,440,600.00	$ 38,472,857	88.56%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 53,292,716	$ 53,292,716.00	$ 12,456,561	23.37%	
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 30,199,104	$ 30,199,104.00	$ 23,152,646	76.67%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 11,640,160	$ 13,843,060.28	$ 12,044,656	87.01%	
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 36,424,243	$ 36,424,243.00	$ 14,853,114	40.78%	
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 2,484,992	$ 3,370,270.40	$ 3,370,270	100.00%	
6.2.4.12	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 8" x 6"	EJEUCIÓN	$ 11,303,697	$ 13,037,490.00	$ 598,050	4.59%	
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	EJEUCIÓN	$ 4,539,288	$ 5,235,537.00	$ 881,229	16.83%	
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ 22,987,798	$ 26,513,733.00	$ 10,374,939	39.13%	
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	EJEUCIÓN	$ 20,073,294	$ 23,152,194.00	$ 15,434,796	66.67%	
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 6,492,201	$ 7,487,994.00	$ 613,770	8.20%	
6.2.5.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 6,118,196	$ 7,056,623.00	$ 1,170,684	16.59%	
6.2.5.3	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 2,155,891	$ 2,486,568.00	$ 394,212	15.85%	
6.2.5.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 669,383	$ 3,237,650.00	$ 1,394,680	43.08%	
6.2.5.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 2,778,953	$ 3,205,197.00	$ 460,878	14.38%	
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 41,849,920	$ 48,785,278.08	$ 10,458,748	21.44%	
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 49,336,110	$ 227,154,620.88	$ 62,576,184	27.55%	
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 10,501,155	$ 61,012,710.66	$ 12,805,342	20.99%	
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJEUCIÓN	$ 106,439,805	$ 106,439,805.00	$ 39,978,698	37.56%	
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 25,158,882	$ 25,158,882.00	$ 14,376,504	57.14%	
7.1.2.3	Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 4,955,958	$ 4,955,958.00	$ 4,955,958	100.00%	
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 30,359,628	$ 30,359,628.00	$ 7,006,068	23.08%	
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 6,903,904	$ 6,903,904.00	$ 584,833	8.47%	
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 8,067,540	$ 8,067,540.00	$ 1,722,110	21.35%	
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 1,733,524	$ 1,733,524.00	$ 731,414	42.19%	
7.1.5.1	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"	EJEUCIÓN	$ 24,381,061	$ 28,120,698.00	$ 7,745,108	27.54%	
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 65,580,469	$ 75,639,390.00	$ 33,168,906	43.85%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.3	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ 17,814,435	$ 20,546,864.00	$ 3,032,147	14.76%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.4	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 21,687,034	$ 25,013,454.00	$ 7,802,192	31.19%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.5	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 10,909,080	$ 12,582,346.00	$ 8,043,714	63.93%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.6	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 90,246,051	$ 104,088,250.00	$ 27,096,440	26.03%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.7	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"	EJEUCIÓN	$ 11,675,568	$ 13,466,400.00	$ 1,737,600	12.90%	
7.1.5.8	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 4,392,045	$ 5,065,710.00	$ 3,740,832	73.85%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3

7.1.5.9	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ 450,007	$ 519,030.00	$ 230,680	44.44%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.10	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 4"x2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 5,390,639	$ 6,217,471.00	$ 478,267	7.69%	
7.1.5.11	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 6,606,191	$ 7,619,468.00	$ 3,921,785	51.47%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.12	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	EJEUCIÓN	$ 4,493,415	$ 5,182,628.00	$ 4,475,906	86.36%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.14	Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	EJEUCIÓN	$ 3,554,621	$ 4,099,839.00	$ 791,197	19.30%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.5.15	Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 9,845,822	$ 11,356,002.00	$ 6,489,144	57.14%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.6.2	Suministro e instalación de válvula de mariposa 2.1/2" listada UL	EJEUCIÓN	$ 4,133,686	$ 4,767,723.00	$ 529,747	11.11%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.6.3	Suministro e instalación de cheque ranurado listado 2.1/2" listado UL	EJEUCIÓN	$ 2,609,820	$ 3,010,122.00	$ 334,458	11.11%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.6.4	Suministro e instalación de Sensor de flujo 2.1/2" listado UL	EJEUCIÓN	$ 4,633,703	$ 5,344,434.00	$ 593,826	11.11%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.7.1	Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura ordinaria (K=5.6 y rango de temperatura 55-77 °C) para instalar en cielo raso	EJEUCIÓN	$ 105,778,645	$ 122,003,278.00	$ 1,054,024	0.86%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.7.2	Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura intermedia (K=5.6 y rango de temperatura 79-107°C) para instalar en cubierta traslucida	EJEUCIÓN	$ 7,406,533	$ 8,542,568.00	$ 2,763,772	32.35%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.8.1	Suministro e instalación de soporte sísmico transversal 2.1/2" para red de rociadores	EJEUCIÓN	$ 5,564,466	$ 6,417,960.00	$ 1,497,524	23.33%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.8.2	Suministro e instalación de soporte sísmico longitudinal 2.1/2" para red de rociadores	EJEUCIÓN	$ 3,272,634	$ 3,774,600.00	$ 503,280	13.33%	
7.1.9.1	Suministro e instalación de salida de manguera de 2.1/2" con buje de 2.1/2" x 1.1/2"	EJEUCIÓN	$ 12,320,755	$ 14,210,548.00	$ 3,875,604	27.27%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.10.1	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 1,663,473	$ 1,918,621.00	$ 260,152	13.56%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 10,017,459	$ 11,553,966.00	$ 4,389,498	37.99%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.10.3	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 3,735,590	$ 4,308,565.00	$ 473,195	10.98%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.10.4	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 4,304,653	$ 4,964,913.00	$ 691,317	13.92%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.10.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 2,243,226	$ 2,587,298.00	$ 1,130,584	43.70%	Se realizan instalaciones en Bloques A, B, C, D, E de piso 3
7.1.10.6	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 16,437,237	$ 18,958,428.00	$ 3,584,732	18.91%	
8.1.3.6	Suministro e instalacion de alimentador tableros T6 y T8 en 3 # 1/0 fases + 1 # 1/0 neutro + 1 # 6 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø2" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 7,898,680	$ 39,493,400.00	$ 3,554,406	9.00%	
8.1.3.10	Suministro e instalacion de alimentador tableros T1, T3 y T7 en 3 # 6 fases + 1 # 6 neutro + 1 # 8 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø11/4" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 1,197,130	$ 18,455,748.00	$ 13,700,483	74.23%	
8.1.3.11	Suministro e instalación de alimentador de circuitos de iluminación en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø3/4" emt sobrepuesto en losa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera	EJEUCIÓN	$ 3,238,800	$ 16,194,000.00	$ 1,619,400	10.00%	
8.1.3.13	Suministro e instalación de alimentador de circuitos de tomacorrientes en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø1/2" PVC embebido en placa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera	EJEUCIÓN	$ 2,184,000	$ 10,920,000.00	$ 713,440	6.53%	
8.1.3.17	Suministro e instalación de paso para dilatación estructural con caja de paso metálica pintada, con puerta y chapa, 0,6x0,6x0,3m y coraza metálica flexible 2", incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 368,480	$ 1,842,400.00	$ 1,105,440	60.00%	
8.1.3.20	Suministro e instalacion tablero trifasico 30 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 255,516	$ 1,277,580.00	$ 63,879	5.00%	
8.1.3.22	Suministro e instalacion tablero trifasico 18 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 250,345	$ 1,251,726.00	$ 625,863	50.00%	
8.1.3.23	Suministro e instalacion tablero trifilar 12 circuitos, con puerta , incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 423,494	$ 2,117,468.00	$ 529,367	25.00%	
8.1.3.38	Suministro e instalacion de interruptor termomagnético enchufable 1x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 8,930	$ 44,649.00	$ 14,883	33.33%	
8.1.3.44	Suministro e instalacion de interruptor termomagnético enchufable 1x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	EJEUCIÓN	$ 503,045	$ 2,515,227.00	$ 14,883	0.59%	
8.1.4.1	Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los	EJEUCIÓN	$ 211,986,029	$ 292,236,160.00	$ 20,805,944	7.12%	
8.1.4.3	Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4", descolgada en estructuras de cubierta, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4" RADWELL Retie; tomacorriente doble	EJEUCIÓN	$ 7,725,086	$ 10,649,520.00	$ 3,651,264	34.29%	
8.1.4.5	Suministro e instalacion de interruptor sencillo sin piloto, en tuberia EMT 3/4" en pared , caja 2x4 radwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion	EJEUCIÓN	$ 9,902,646	$ 13,651,425.00	$ 1,606,050	11.76%	
8.1.4.7	Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion	EJEUCIÓN	$ 7,645,528	$ 10,539,845.00	$ 1,590,920	15.09%	

8.1.4.11	Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta	EJEUCIÓN	$ 12,536,330	$ 17,282,125.00	$ 2,468,875	14.29%	
8.1.5.1	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de	EJEUCIÓN	$ 20,119,446	$ 27,735,930.00	$ 5,064,822	18.26%	
8.1.5.3	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion,	EJEUCIÓN	$ 8,310,206	$ 11,456,145.00	$ 2,411,820	21.05%	
8.1.5.5	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared,con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y	EJEUCIÓN	$ 2,601,759	$ 3,586,689.00	$ 467,829	13.04%	
8.1.5.11	Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	EJEUCIÓN	$ 670,045	$ 2,771,100.00	$ 1,847,400	66.67%	
8.2.1.13	Suministro e instalacion de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 2xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	EJEUCIÓN	$ 28,310,778	$ 39,028,200.00	$ 1,951,410	5.00%	
8.2.1.14	Suministro e instalacion de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 1xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	EJEUCIÓN	$ 2,773,757	$ 3,823,800.00	$ 1,376,568	36.00%	
8.2.1.27	Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo rejilla, uso interior, zincada, 400x50mms, con todos los accesorios de soporte tipo columpio en riel, uniones, derivaciones de tuberias, y puesta a tierra en cable de cobre desnudo #8AWG con conectores	EJEUCIÓN	$ 84,606,198	$ 116,635,000.00	$ 11,896,770	10.20%	
11.1.1	Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	EJEUCIÓN	$ 95,125,936	$ 118,079,991.87	$ 16,341,294	13.84%	
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	EJEUCIÓN	$ 277,528,451	$ 452,478,283.80	$ 95,686,782	21.15%	Avance segundo nivel
12.1.13	Suministro e instalacion Pavimento en concreto reforzado MR-39 e=0.15M	EJEUCIÓN	$ 208,624,087	$ 208,624,087.43	$ 49,757,220	23.85%	
12.2.1	Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)	EJEUCIÓN	$ 70,459,700	$ 114,876,453.58	$ 9,611,467	8.37%	
15.1.2	Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	EJEUCIÓN	$ 107,419,003	$ 156,186,600.36	$ 79,042,504	50.61%	
16.1.1	Suministro y colocación de Estuco y pintura en vinilo tipo 1 (Incluye Filos y Dilataciones)	EJEUCIÓN	$ 28,493,252	$ 68,867,345.30	$ 8,617,240	12.51%	
16.1.4	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	EJEUCIÓN	$ 8,434,872	$ 20,386,834.92	$ 9,743,803	47.79%	
21.1.5	Suministro e instalacion de Geotextil tejido pavco ref. 2400	EJEUCIÓN	$ 35,040,352	$ 35,040,351.80	$ 3,017,455	8.61%	
21.1.17	Suministro e instalacion Loseta cuadratica 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	EJEUCIÓN	$ 26,208,443	$ 28,422,352.77	$ 4,667,053	16.42%	
24.1.1	Construccion de meson en concreto Acabado en granito pulido fundido en sitio con formaleta metálica, con salpicadero y cortagotera. Pendiente 1%. Ver detalles de Elementos no Estructurales.	EJEUCIÓN	$ 1,363,393	$ 3,873,600.80	$ 1,014,786	26.20%	
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 31,384,216	$ 46,448,640.00	$ 28,143,360	60.59%	se realiza aseo constante por toda la obra
26.2	Aseo Final	EJEUCIÓN	$ -	$ 36,501,198.97	$ 838,350	2.30%	
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	EJEUCIÓN	$ -	$ 86,599,977.36	$ 24,306,060	28.07%	Se realiza la disposicion del material sobrante acopiado en la plazoleta principal
28.1	Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos	EJEUCIÓN		$ 28,251,908.41	$ 18,575,814	65.75%	
28.2	Tratamiento de fallos	EJEUCIÓN		$ 343,872,875.00	$ 293,401,965	85.32%	
28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	EJEUCIÓN		$ 97,056,344.00	$ 85,144,884	87.73%	
28.4	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	EJEUCIÓN		$ 34,652,301.20	$ 32,291,349	93.19%	
28.5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	EJEUCIÓN		$ 605,567,912.40	$ 435,062,215	71.84%	
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJEUCIÓN		$ 243,919,720.80	$ 102,548,381	42.04%	Se realizan actividades de dovela los cuales son necesarios para la mamposteria en los bloques C, D y E en el piso 3 y adicional se ejcutan antepechos de la rampa y muros divisiorios de la escalera del piso 1 del bloque G. anclajes para actividades de elementos no estructurales del piso 2 y piso 3
28.11	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación)	EJEUCIÓN		$ 87,396,750.94	$ 8,978,150	10.27%	Se realizan actividades de chapa ladrillo en m2 de bloques C, D y E en el piso 3
28.15	Suminstro y colocacion de Concreto bombeable para columnas de Rampa 3,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN		$ 7,915,666.50	$ 7,915,667	100.00%	
28.16	Desmonte, desarme parque infantil grande y empaque en plastico- vinipel	EJEUCIÓN		$ 3,570,000.00	$ 3,570,000	100.00%	
28.17	Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm	EJEUCIÓN		$ 230,063,086.00	$ 50,752,364	22.06%	se realizan actividades de alistado de pisos en la instalación de la baldosa en granito del bloque D piso 2
28.18	Procedimiento de rescatar una colmena de abejas establecidas, incluye aplicación de productos que eliminen las feromonas logrando asi que no regresen las abejas	EJEUCIÓN		$ 300,000.00	$ 300,000	100.00%	
28.20	Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral	EJEUCIÓN		$ 91,640,539.62	$ 25,639,160	27.98%	Se realizan actividades de hilada parada de bloques C, D y E en el piso 3 , antepechos de bloque C, D y rampa

28.21	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) ancho menor e igual a 60cm.	EJEUCIÓN		$ 74,889,276.75	$ 26,525,558	35.42%	Se realizan actividades de chapa ladrillo en m2 de bloques C, D y E en el piso 3
28.22	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO III INCLUYE (VALVULA ANGULARES 1-1/2´, VALVULA ANGULAR 2-1/2´, TAPA CADENA 2-1/2´, MANGUERA CHTA SENCILLA 150 PSI X 100 FT 1-1/2, BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO 1-1/2´, HACHA PICO 4.5 IB, LLAVE SPANNER, EXTINTOR POLVO SECO ABC 10 LBS	EJEUCIÓN		$ 61,422,997.00	$ 13,869,709	22.58%	
28.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS (INCLUYE BRIDA SANITARIA)	EJEUCIÓN		$ 58,096,356.00	$ 14,992,608	25.81%	
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	EJEUCIÓN		$ 167,945,665.04	$ 115,244,564	68.62%	Se realizan actividades de hilada parada de bloques C, D y E en el piso 3 , antepechos de bloque C, D y rampa

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRASO
$ 26,567,522,408.89	$ 615,408,323.88	$ 27,182,930,732.77	$ 13,556,180,757.70	$ 202,997,169.84	$ 13,759,177,927.54	-$ 13,423,752,805.228600
75.42%	**1.75%**	**77.17%**	**38.48%**	**0.58%**	**39.06%**	**-38.11%**

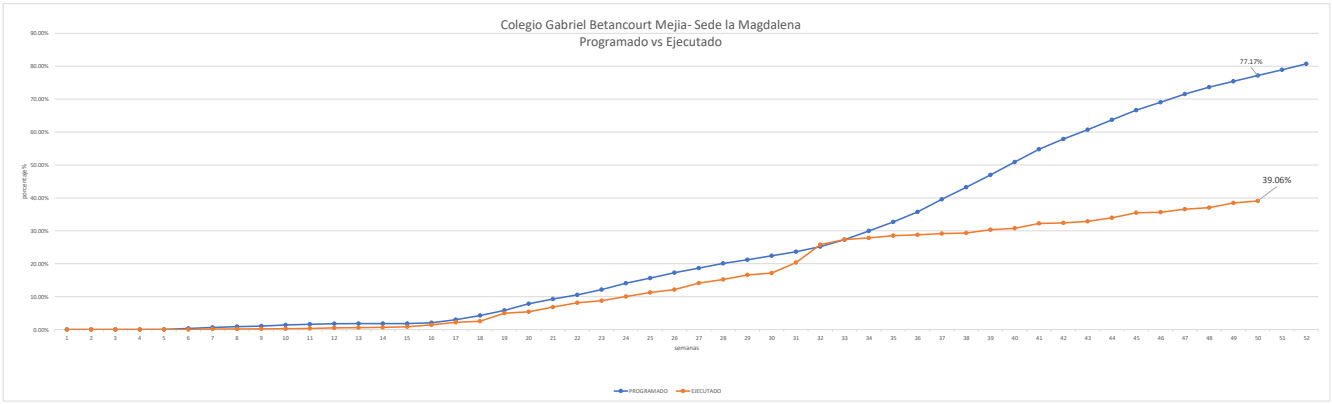

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor Programado a la fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Atraso en dias respecto al inicio de la actividad	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	$ 95,688,542	20/06/2022	10/03/2023	**-321**	**-0.09%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.2	DEMOLICIONES Y DESMONTES	$ -	14/11/2022	24/07/2023	**-174**	**-0.08%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	20/06/2022	3/07/2023	**-321**	**-0.86%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2.1	CIMENTACION	$ -	12/09/2022	28/04/2023	**-237**	**-3.78%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2.2.2	Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	$ 15,865,612	7/11/2022	10/12/2022	**-181**	**-0.05%**	El item no se requiere
2.2.4	Suminstro y colocacion de Concreto para columnas de Rampa 4,000 PSI (28 Mpa)	$ 9,861,409	21/11/2022	9/01/2023	**-167**	**-0.03%**	Se modificica al no tener concistencia con los planos, toda vez que la resistencia requerida es de 3000 psi, el item se presento para aproacion de la entidad.
2.3	ACERO DE REFUERZO	$ -	12/09/2022	5/03/2023	**-237**	**-1.45%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion, a excepcion del bloque I el cual se inicio el 14 de marzo de 2023. sumado a Atrasos generados por actividades predecesoras como lo son estructura, mamposteria, ocasionados por las demoras en las aprobaciones de los items no previstos, adicionalmente factores logisticos ocasionados por la ocupacion del colegio y factores climaticos (lluvias) lo que ha incedido en alrededor de 166 horas.
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	$ -	12/09/2022	27/03/2023	**-237**	**-0.08%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion, el item esta cuantificado doble vez.
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - ESTRUCTURAS METALICAS - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ -	12/09/2022	6/08/2023	**-237**	**-6.76%**	Se elevo consulta a la entidad frente a la imposibilidad de conseguir los perfiles metalicos de columnas, ya que no son comerciales, presentando atraso en el item 4.4.1 De igual forma con los emplames de la estructura en policarbonato se elevo consulta a la entidad y no se ha dado respuesta. lo anterior es indispensable para el desarrollo de la actividad.
4.3	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ -	24/10/2022	11/06/2023	**-195**	**-0.42%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos.
5	MAMPOSTERIA	$ -	24/10/2022	11/06/2023	**-195**	**-4.61%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Adicional a lo anterior, los proveedores del ladrillo nos informaron en el transcurso de la semana que el insumo se encuentra sin producción aplazando la entrega del mismo en la obra, quedando hasta la fecha sin suministro de ladrillo para la continuación de las respectivas actividades, dentro de la matriz de riesgo se indica " Posibilidad de encontrar dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos " con una probabilidad de ocurrencia Baja Sin embaego es un factor que dado el volvumen de obras que se encuentran en ejecucion a nivel colo,bia se encuentra excases de insumos, presentando dificultades y generando atrasos
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS	$ -	12/09/2022	23/10/2023	**-237**	**-1.21%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y la zona de las instalaciones de gas son en el bloque J donde no se a dado incio a este bloque dado que se tiene un problema con un poste eléctrico donde la acometida eléctrica esta muy cerca a nuestro proyecto, ya se están realizando los tramites para el movimiento de este
7	INSTALACION RED CONTRAINCENDIOS	$ -	12/09/2022	25/09/2023	**-237**	**-1.32%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
8.1	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ -	14/11/2022	25/09/2023	**-174**	**-2.82%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.

8.2	INSTALACIONES COMUNICACIONES	$ -	14/11/2022	25/09/2023	**-174**	**-0.92%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
8.3	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA CCTV	$ -	14/11/2022	25/09/2023	**-174**	**-0.25%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
8.4	SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS	$ -	14/11/2022	25/09/2023	**-174**	**-0.38%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
9	RED DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	14/11/2022	3/07/2023	**-174**	**-0.27%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
10	INSTALACION ELECTRICA RED DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	14/11/2022	2/07/2023	**-174**	**-0.06%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
11	PAÑETES	$ -	26/11/2022	17/07/2023	**-162**	**-0.25%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
12	PISOS Y ENCHAPES	$ -	19/12/2022	22/10/2023	**-139**	**-2.35%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias - Dentro de la matriz de riesgos no esta contemplado los factores climaticos
13	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	$ -	31/10/2022	26/09/2023	**-188**	**-3.11%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias - Dentro de la matriz de riesgos no esta contemplado los factores climaticos
14	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	$ -	4/03/2023	21/10/2023	**-64**	**-0.21%**	
15	CIELO RASOS Y ESTRUCTURA LIVIANA	$ -	12/12/2022	31/07/2023	**-146**	**-0.86%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
16	ESTUCO, PINTURA Y SEÑALIZACION	$ -	12/12/2022	22/10/2023	**-146**	**-0.23%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
17	CARPINTERIA DE MADERA - MOBILIARIO	$ -	10/02/2023	22/10/2023	**-86**	**-0.21%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
18	CARPINTERIA METALICA	$ -	23/01/2023	14/10/2023	**-104**	**-3.43%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
19	VIDRIOS TEMPLADOS Y ESPEJOS	$ -	23/01/2023	14/10/2023	**-104**	**-0.10%**	
20	RECUBRIMIENTOS ESPECIALES FACHADAS	$ -	23/01/2023	11/09/2023	**-104**	**-1.80%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
21	OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	$ -	27/06/2022	22/10/2023	**-314**	**-0.97%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
24	MUEBLES Y MESONES	$ -	23/01/2023	9/10/2023	**-104**	**-0.03%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
27	SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR	$ -	31/10/2022	18/06/2023	**-188**	**-0.67%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 50 comprendidos entre los días 01 de mayo al 7 de mayo del 2023, se radicó el siguiente oficio:
1. El dia 5 de mayo se radica la propuesta de vigas para cierre de mamposteria en el oficio CCERU-22-647
2. El dia 4 de mayo del 2023 se radica la remocion y reemplazo de concreto de columnas en el oficio CCERU-22-650. Se radica el informe de resltados de kaboratorio de nucleos en el oficio CCERU-22-653
3. El dia 6 de mayo del 2023 se radica los informes semanales del 46 al 49 en el oficio CCERU-22-655. Se radica el informe de asentamiento en el oficio CCERU-22-656

Aspecto Financiero

Durante la semana no se genero ninguna actividad

Aspecto Técnico

La obra a tenido afectaciones por factores climaticos, logisticos e inconvenientes generados por la ocupacion del colegio, este consorcio se encuentra ejecutando multiples frentes de trabajo, y a acometido e internvenido varias actividades a medida que la obra lo permite, se tramito balance con solicitud de adicion a lo cual no se ha reciido respuesta formal por parte de la ERU, si existe la posibilidad de adicionar los recursos o por si el contrario hay que definir el alcance del contrato.

- Se procedio con la instalacion de las columnas metalicas del bloque A, El 4 de mayo de 2023 se realiza validacion del dosier de estructura metalica en compania del supervisor independiente, adicionalmente se realizan pruebas de ultra sonido en la viga cajon, resultados que salen satisfactorios.
El 6 de mayo de 2023 se inicia con la instalacion de la estructura del bloque A, mediante izaje de 3 maquinas, previamente se realizan pruebas de tinta de las columnas y correciones en donde el inspector de soldaduras indico.
- Estamos a la espera de la viavilidad de parte de la interventoria para la compra de iluminacion.
- Se esta a la espera de respuesta del sistema foto voltaico.
- Se continua con los resanes de las placas aligeradas, y maquillaje.
- Se realizan excavaciones y rellenos en la plazoleta de acceso con el fin de poder ubicar la maquinaria.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 2 de mayo del 2023 se realiza limpieza de sumideros
2. El dia 3 de mayo se remite a la interventoría permisos minero ambientales de gravicon, se realiza visita a obra por parte del contratista
3. El dia 4 de mayo del 2023 se realiza recorrido del área ambiental por parte de la interventoría y contratista, se reciben observaciones informe ambiental No. 10 v2, se realiza evacuación de RCD aprovechable
4. El dia 5 de mayo del 2023 se remite a interventoría informe ambiental No. 11, V1

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las área intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 2 de mayo del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador. inspección de vibro compactador ,orden y aseo en areas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, lavado de baños, inspección de equipos de protección contra caídas,, señalización en areas de trabajo de alto riesgo,inducción
2. El dia 3 de mayo del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador. inspección de vibro compactador ,orden y aseo en areas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, lavado de baños, inspección de equipos de protección contra caídas,, señalización en areas de trabajo de alto riesgo,inducción
3. El dia 4 de mayo del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador. inspección de vibro compactador ,orden y aseo en areas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, lavado de baños, inspección de equipos de protección contra caídas,, señalización en areas de trabajo de alto riesgo.
4. El dia 5 de mayo del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador. inspección de vibro compactador ,orden y aseo en areas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, lavado de baños, inspección de equipos de protección contra caídas,, señalización en areas de trabajo de alto riesgo
5. El dia 6 de mayo del 2023 se realiza charlas de seguridad, inspección de minicargador. inspección de vibro compactador ,orden y aseo en areas comunes, permisos de trabajo en alturas, ats, permisos de trabajo en caliente, entrega de epp, lavado de baños, inspección de equipos de protección contra caídas,, señalización en areas de trabajo de alto riesgo.

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 2 de mayo del 2023 se remite a interventoría, relación de personal Mano de Obra No Calificada (MONCL) con corte al 29 de abril de 2023.
2. El dia 4 de mayo del 2023 se realiza aprobacion or parte de interventoría al Informe Mensual Social No 11. Asistencia y participación en comité de seguimiento social. (virtual)
3. El dia 5 de mayo del 2023 se contactan algunos líderes el sector, para validar disponibilidad y acompañamiento a vista de la Alcaldesa el día 9 de mayo de 2023, en atención a solicitud explicita se concreta y envía información de (3) líderes mujeres a interventoría y profesional social de la Secretaria de Educación del Distrito.


Entre el 01 y el 06 de mayo de 2023: Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presenta ninguna actividad en el componente

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	20226120170842* 20226120174665*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	20226120170842* 20226120174665*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	20226120257666*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	20226120257666*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	20226120257666*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
No se presenta ninguna observacion	
	Firma
