	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	76	**DEL**	**30 de octubre de 2023**	**AL**	**5 de noviembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	532	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**INTERVENTOR:**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Prorroga No.01	7 MESES	**Prorroga No.01**	7 MESES
Plazo Actualizado	24 MESES	**Plazo Actualizado**	24 MESES
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación**	22/05/2024
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA


No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	EJEUCIÓN	$ 72,504,240	$ 382,029,112.08	$ 50,948,674	13.34%	LLENO PARA AREA DE TANQUES Y CUARTO DE BOMBAS PARA SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL PARA LA ETAPA 1 DEL PROYECTO.
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 82,121,833	$ 279,519,248.38	$ 242,643,332	86.81%	CONCRETO POBRE PARA CIMENTACION DE GRADAS SOBRE TERRENO DE PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL DEL PROYECTO
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ -	$ 939,185,978.64	$ 659,322,470	70.20%	VIGAS DE CIMENTACION DEL CERRAMIENO TIPO S.E.D. SOBRA LA CARRERA 94 (COSTADO ORIENTAL) DEL PROYECTO
2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 8,559,892	$ 387,604,671.12	$ 313,958,899	81.00%	REFUERZO CORTA GOTERO SOBRE TERRENO FRENTE A MODULO A (PRIMER TRAMO DE 22ml)
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 1,084,624,887	$ 3,948,097,736.16	$ 2,969,408,261	75.21%	ESTRUCTURA METALICA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA DIVISION DE ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYETO EN PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL
9.4.1	Suministro e instalacion Tuberia pvc sch 40 (rde21) de 4",incluye (tuberia, codo, union, tee, adaptador macho y hembra, union universal, soldadura, limpiador, cañuela preformada, soporteria y mano de obra de instalacion)	EJEUCIÓN	$ -	$ 2,159,655.00	$ 2,159,655	100.00%	RED DE VENTILACION DE LAS BATERIA DEL BANOS Y UNIDADES SANITARIAS DE LOS MODULOS A, B, C, D y E DE LOS NIVELES 1, 2 y 3
12.1.13	Suministro e instalacion Pavimento en concreto reforzado MR-39 e=0.15M	EJEUCIÓN	$ 630,243	$ 363,042,682.64	$ 184,396,744	50.79%	PARA AREA DE TANQUES Y CUARTO DE BOMBAS PARA SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL PARA LA ETAPA 1 DEL PROYECTO.
14.2.2	Suministro e instalacion de grifería antivandalica para lavamanos	EJEUCIÓN	$ 8,000,950	$ 67,350,592.00	$ 42,537,216	63.16%	PARA LAS BATERIA DEL BANOS Y UNIDADES SANITARIAS DE LOS MODULOS A, B, C, D y E DE LOS NIVELES 1, 2 y 3
14.2.3	Suministro e instalación de griferia tipo push para lavamanos	EJEUCIÓN	$ 11,263,020	$ 5,422,080.00	$ 3,162,880	58.33%	PARA LAS BATERIA DEL BANOS Y UNIDADES SANITARIAS DE LOS MODULOS A, B, C, D y E DE LOS NIVELES 1, 2 y 3
14.2.4	Suministro e instalacion de griferia especial para baños PMR	EJEUCIÓN	$ 2,770,801	$ 3,130,992.00	$ 1,826,412	58.33%	PARA LAS BATERIA DEL BANOS Y UNIDADES SANITARIAS DE LOS MODULOS A, B, C, D y E DE LOS NIVELES 1, 2 y 3
21.1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	EJEUCIÓN	$ 7,924,585	$ 261,793,792.35	$ 4,222,450	1.61%	PARA AREA DE TANQUES Y CUARTO DE BOMBAS PARA SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL PARA LA ETAPA 1 DEL PROYECTO.
21.1.14	Suministro e instalacion de Adoquines trafico peatonal 20x10x8 cm, incluye capa de arena suministro e instalacion	EJEUCIÓN	$ -	$ 75,282,515.55	$ 12,687,697	16.85%	RESTITUCION DE SENDERO PEATONAL O ZONA URBANISTICA ALEDANA AL LINDERO DEL PROYECTO EN CALLE 8C Y CARRERA 94 DEL MISMO.
23.1.5	Suministro e instalacion Extractor tipo plafon de 80 CFM	EJEUCIÓN	$ -	$ 2,793,856.00	$ 2,793,856	100.00%	RED DE VENTILACION DE LAS BATERIA DEL BANOS Y UNIDADES SANITARIAS DE LOS MODULOS A, B, C, D y E DE LOS NIVELES 1, 2 y 3
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	EJEUCIÓN	$ -	$ 167,628,000.00	$ 76,454,572	45.61%	PARA AREA DE TANQUES Y CUARTO DE BOMBAS PARA SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL PARA LA ETAPA 1 DEL PROYECTO.
28.4	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	EJEUCIÓN	$ -	$ 93,862,052.50	$ 84,050,587	89.55%	ESTRUCTURA METALICA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA DIVISION DE ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYETO EN PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL
28.5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	EJEUCIÓN	$ 10,039,938	$ 720,751,868.55	$ 535,955,900	74.36%	CUBIERTA DEL MODULO O.

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	76	**DEL**	**30 de octubre de 2023**	**AL**	**5 de noviembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	532	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRASO
$ 20,951,533,668.22	$ 298,757,631.09	$ 21,250,291,299.31	$ 20,348,907,337.64	$ 100,083,355.34	$ 20,448,990,692.98	-$ 801,300,606.33
48.90%	**0.70%**	**49.59%**	**47.49%**	**0.23%**	**47.72%**	**-1.87%**

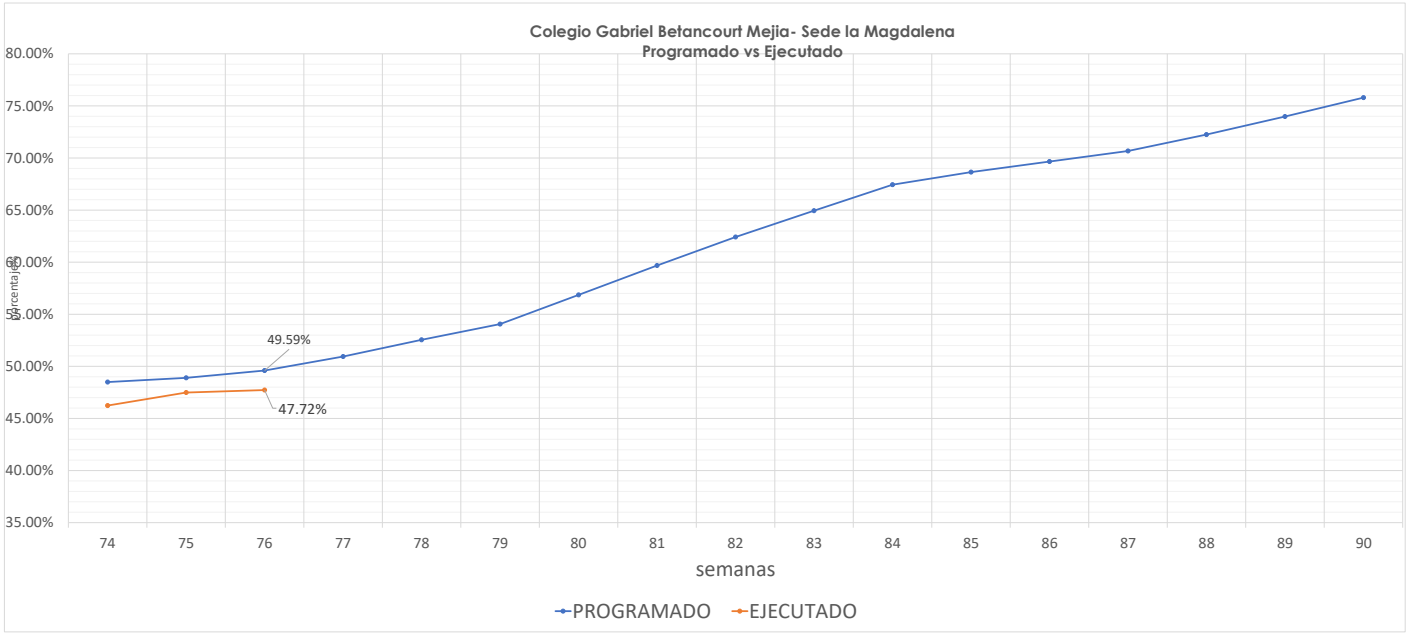

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor atrasos	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	-$ 4,644,719	**-0.01%**	Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio, que corresponden a los modulo k, t y zonas de exteriores, se hace necesario la entrega de dichas areas o espacion para cumplir con la programacion.
1.2	DEMOLICIONES Y DESMONTES	-$ 119,761,541	**-0.28%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-$ 29,726,301	**-0.07%**	Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio, que corresponden a los modulo k, t y zonas de exteriores, se hace necesario la entrega de dichas areas o espacion para cumplir con la programacion.
6.1.9	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	-$ 8,610,776	**-0.02%**	Según conclusiones dadas despues de los recorridos en obra este item no se requiere.
11.1.2	Suministro y colocación de Pañete liso en mortero 1:3, incluye filos y dilataciones	-$ 6,262,072	**-0.01%**	Los panetes requeridos para el desarrollo del proyecto según especificaciones tecnicas deben ser impermeabilizados, asi que este item no se requiere.
12.1.2	Construccion de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos. Incluye manto impermeabilizante (sufridor).	-$ 167,757,181	**-0.39%**	Según conclusiones dadas despues de los recorridos en obra este item no se requiere.
12.1.6	Construccion de Piso en concreto pulido 0.05-0.07 M de 3000 PSI allanado y afinado mecanicamente, con endurecedor de cuarzo color de acuerdo a plano de detalle de piso.	-$ 54,380,525	**-0.13%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
13.1.1	Suministro e instalación cubierta tipo sándwich deck ancho 525 mm aislante en fibra de vidrio e = 3cm panel inferior y superior en aluzinc cal. 24 pintada a una cara (incluye remate lateral y elementos de fijación)	-$ 420,021,672	**-0.98%**	Desde la semana pasada se han presentado bastantes llovisnas, lluvias, tormentas electricas durante las jornadas laborales que por temas de seguridad y salud en el trabajo se detenien el normal desarrollo de este tipo de actividades constructivas.
13.1.2	Suministro e instalacion de cubierta plana en policarbonato alveolar 8mm traslucido (incluye accesorios de fijación)	-$ 60,420,708	**-0.14%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
13.2	CANALES Y FLANCHES	-$ 34,146,037	**-0.08%**	Desde la semana pasada se han presentado bastantes llovisnas, lluvias, tormentas electricas durante las jornadas laborales que por temas de seguridad y salud en el trabajo se detenien el normal desarrollo de este tipo de actividades constructivas.
15.1.3	Suministro e instalacion Cielo raso tipo tile natura de hunter douglas o similar (bandeja de madera laminada hr 100 de 16mm enchapado natural perfilería oculta)	-$ 105,539,719	**-0.25%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
16.1.5	Lavado e impermeabilización con hidrófugo para protección de mamposteria a la vista	-$ 178,716,222	**-0.42%**	Desde la semana pasada se han presentado bastantes llovisnas, lluvias, tormentas electricas durante las jornadas laborales que por temas de seguridad y salud en el trabajo se detenien el normal desarrollo de este tipo de actividades constructivas.
17.1	MUEBLES FIJOS Y DIVISIONES EN MADERA	-$ 112,874,697	**-0.26%**	SILLAS Y DIVISIONES DE AUDITORIO ZONA SIN ENTREGAR

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	76	**DEL**	**30 de octubre de 2023**	**AL**	**5 de noviembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	532	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 76 comprendidos entre los días 30 de octubre al 5 de noviembre del 2023, se radicó los siguientes oficio:
1. El dia 30 de octubre del 2023 se radica el documento de apropiacion de diseños en el oficio CCERU-22-1037. Se da respuesta al comunicado GNGSER_BTA_ERU_16_21_666 con respecto al trslado de especies arboreos en el oficio CCERU-22-1048. Se radica las actividades sin definir que marcan atraso en programacion semana 75 en el oficio CCERU-22-1049. Se radica la citacion de visita alaco proveedor de puertas de evacuacion en el oficio CCERU-22-1050. S eradica el traslado de poste del bloque J en el oficio CCERU-22-1052
2. El dia 1 de noviembre del 2023 se radica el balance contrato de obra y solicitud de definicionees en el oficio CCERU-22-1054. Se da respuesta al comunicado GNGSER_BTA_ERU_16_21_708 con respecto a la ventna de porteria en el oficio CCERU-22-1055. Se radica la propuesta de puerta vestier de enfermeria bloque A piso 1 en el oficio CCERU-22-1056. Se radica el cambio de vidrio a ventaneria de la fachada este en el oficio CCERU-22-1057
3. El dia 2 de noviembre del 2023 se radica el acta parcial de obra No. 16 en el oficio CCERU-22-1058
4. El dia 3 de noviembre del 2023 se da alcance al comunicado CCERU-22-1021 con respecto a los ensayos de laboratorio en el oficio CCERU-22-1061. Se radica el informe de baranda de aulas y pasamanos escalera de evacuacion en el oficio CCERU-22-1063. Se da respuesta al comunicado GNGSER_BTA_ERU_16_21_709 con respecto a la legalizacion de anticipo en el oficio CCERU-22-1064. Se radica actividades en obra fin de semana en el oficio CCERU-22-1065

Aspecto Financiero

No se presento ninguna actividad en la semana

Aspecto Tecnico

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que actualmente tiene el Colegio, razón por la que este Consorcio requiere la entrega inmediata del Colegio, en aras de recuperar los atrasos.

Tambien se aclara que desde la semana pasada se han presentado lloviznas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas leves que por temas de seguridad y salud en el trabajo se deben detener actividades para salvaguardar o proteger la integridad de cada trabajador retrasando el normal desarrollo de algunas actividades constructivas del proyecto. Es de aclarar que para todo el tema de las actividades que se adelantan en exteriores, especialmente en urbanismo como lo es el movimiento de tierras y llenos, no solo afecta el tiempo de la precipitación sino el tiempo en que se sequen los materiales y se re construya o este adecuado lo que se había avanzado para poder continuar con dichas labores y garantizar la estabilidad y calidad de ello.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 1 de noviembre del 2023 se realiza recoleccion de residuos (icopor)
2. El dia 2 de noviembre del 2023 se hace construccion de informe ambiental No. 17
3. El dia 3 de noviembre del 2023 se realiza visita a obra profesional ambiental Jenny Mancipe, orden y aseo de algunos espacios, mantenimiento protección de individuos arbóreos internos.
4. El dia 4 de noviembre del 2023 se hace entrega a la interventoría de informe ambiental No. 17 V1

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 30 de octubre del 2023 se realiza charla de seguridad, validacion de permisos personal propio, recorrdios en obra verificando actividades, inspeccion uso adecuado de epp, inspecciones de seguridad, gestion en campo, señalizacion de areas criticas, gestion en campo y acompañamiento de actividades de alto riesgo
2. El dia 31 de octubre del 2023 se hace recorrido en obra, socializacion de hallazgos, acompañamiento en axctividades de lto riesgo, charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats, verificacion de planillas de seguridad y radicacion oficios de ingreso
3. El dia 1 de noviembre del 2023 se realiza charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats, permisos de trabajo, inspecciones de entrega de EPP, capacitaciones sst, señalizacion de areas,supervision de actividades y subcontratistas metodologia del trabajo
4. El dia 2 de3 noviembre del 2023 se realiza charla de seguridad, pausas activas, supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades de los contratistas activos en este momento, señalizacion condiciones inseguras y acciones correctvidad de hallazgoz socializados por interventoria
5. El dia 3 de noviembre del 2023 se realiza charla de seguridad, verificaciones de ats, permisos de trabajo, verificacion de plaillas para ingreso de vehiculos, radicacion personal nuevo, capacitacion sst y acompañamientos recorrido de obra
6. El dia 4 de noviembre del 2023 se diligencia permisos segun actividades realizadas durante la semana, seguimiento cronograma actividades servicios generales. Alistamiento de formatos de permisos proxima semana, organbizacion de formatos de actividades de programacion

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 30 de octubre del 2023 se realiza a través de correo electrónico, se remite a interventoría, Relación Personal Mano de Obra No Calificada (MONC) - Obra Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena con corte al 30 de octubre de 2023.
2. El dia 31 de octubre del 2023 se remite para revisión y validación de interventoría volante No 07 correspondiente a Generación de empleo, pieza ajustada en el nombre de la entidad contratante.
3. El dia 2 de noviembre del 2023 se realiza asistencia y participación Comité de Seguimiento Social (campamento de obra). Con el objeto de incentivar la contratación de personal Mano de Obra No Calificada a través de correo electrónico, se remitió nuevo requerimiento de hojas de vida al referente de participación de la Alcaldía Local de Bosa.
4. El dia 3 de noviembre del 2023 el Señor Rector confirma que de común acuerdo con el Director Local de Educación la fecha del próximo Comité de Participación Ciudadana seria el 10 de noviembre de 2023. A través de correo electrónico, se remite a interventoría, Relación Personal Mano de Obra No Calificada (MONC) - Obra Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena con corte al 31 de octubre de 2023.
5. El dia 4 de noviembre del 2023 se remite para revisión y aprobación de interventoría volantes No 40 y 41 correspondiente la convocatoria para el Comité de Participación Ciudadana No 16. Se remitió para revisión y validación de interventoría informe mensual de gestión social No 17


Entre el 30 de octubre al 04 de noviembre de 2023: Se garantizó la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presenta ninguna actividad esta semana.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite	
	Firma
