CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	81	**DEL**	**4 de diciembre de 2023**	**AL**	**10 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	567	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**INTERVENTOR:**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Valor Adicion No.01	$ 9,372,533,448.00	**Valor Adicion No.01**	$ 608,308,421.00
Valor Total	$ 52,694,671,128.00	**Valor Total**	$ 2,178,466,360.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Prorroga No.01	7 MESES	**Prorroga No.01**	7 MESES
Plazo Actualizado	24 MESES	**Plazo Actualizado**	24 MESES
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación**	22/05/2024
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	11/10/2023 hasta 23/11/2024	$ 10,538,934,255.60	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/10/2023 hasta 23/05/2027	$ 5,269,467,112.80	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/05/2024 hasta 23/05/2029	$ 13,173,667,782.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11/10/2023 hasta 23/07/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/05/2024	$ 2,634,733,556.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 911,558,485	$ 807,180,036.88	$ 695,777,027	86.20%	MODULO P - PRIMERA CAPA DE LLENOS CIMENTACION
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 104,504,375	$ 939,185,978.64	$ 711,315,902	75.74%	ARQUEO DE ESTRUCTURA FUNDIDAS A LAS FECHAS (ERROR INVOLUNTARIO)
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ -	$ 92,445,124.80	$ 29,863,844	32.30%	CIMENTACION - ZARPA DE ANTEPECHO EN EL MODULO E PARA RAMPA DE BICICLETAS.
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 31,809,687	$ 1,005,736,279.80	$ 777,752,532	77.33%	CIMENTACION - TORTA INFERIOR MODULO J PRIMERA PARTE
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ -	$ 82,804,632.56	$ 82,804,633	100.00%	MODULO P - PRIMERA CAPA DE LLENOS CIMENTACION
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 6,130,030	$ 2,193,172,276.96	$ 1,792,838,928	81.75%	CIMENTACION - ZARPA DE ANTEPECHO EN EL MODULO E PARA RAMPA DE BICICLETAS.
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 3,784,280	$ 1,709,972,228.90	$ 909,874,589	53.21%	MAMPOSTERIA DEL MODULO H PISO 2
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 2,770,147	$ 927,803,448.00	$ 591,772,071	63.78%	MAMPOSTERIA DEL MODULO H PISO 2
6.1.7.1	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 4"	EJEUCIÓN	$ 6,651,732	$ 2,512,504.00	$ 2,512,504	100.00%	MODULO B - PRIMER NIVEL CONEXIÓN HACIA MODULO I
6.1.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	EJEUCIÓN	$ -	$ 21,961,896.00	$ 14,931,411	67.99%	MODULO N - PRIMER NIVEL EN BATERIA DE BANOS
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 46,002,038	$ 9,728,764.80	$ 5,424,062	55.75%	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN MODULO H NIVEL 3 PARA DESAGUES DE TERRAZAS
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 120,262,620	$ 9,001,960.00	$ 4,419,144	49.09%	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN MODULO H NIVEL 3 PARA DESAGUES DE TERRAZAS
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 460,964	$ 75,639,390.00	$ 47,369,271	62.63%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.5.3	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ 5,521,899	$ 20,546,864.00	$ 7,410,529	36.07%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.5.8	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 10,061,737	$ 6,624,390.00	$ 5,767,116	87.06%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.5.11	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 4,224,337	$ 34,063,504.00	$ 23,530,710	69.08%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1

CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	81	**DEL**	**4 de diciembre de 2023**	**AL**	**10 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	567	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	


7.1.5.14	Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	EJEUCIÓN	$ 3,213,799	$ 4,099,839.00	$ 1,366,613	33.33%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.5.15	Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 1,601,313	$ 11,356,002.00	$ 7,570,668	66.67%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.6.1	Suministro e instalación de válvula de angulo 1.1/4" para drenaje	EJEUCIÓN	$ 108,098,332	$ 3,215,214.00	$ 714,492	22.22%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.6.2	Suministro e instalación de válvula de mariposa 2.1/2" listada UL	EJEUCIÓN	$ 29,274,048	$ 4,767,723.00	$ 2,118,988	44.44%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.6.3	Suministro e instalación de cheque ranurado listado 2.1/2" listado UL	EJEUCIÓN	$ -	$ 3,010,122.00	$ 1,337,832	44.44%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.6.4	Suministro e instalación de Sensor de flujo 2.1/2" listado UL	EJEUCIÓN	$ 5,686,493	$ 5,344,434.00	$ 2,375,304	44.44%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.8.1	Suministro e instalación de soporte sísmico transversal 2.1/2" para red de rociadores	EJEUCIÓN	$ 3,833,812	$ 6,417,960.00	$ 4,278,640	66.67%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.8.2	Suministro e instalación de soporte sísmico longitudinal 2.1/2" para red de rociadores	EJEUCIÓN	$ 4,417,838	$ 3,774,600.00	$ 1,132,380	30.00%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ -	$ 11,553,966.00	$ 8,425,818	72.93%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
7.1.10.3	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	EJEUCIÓN	$ 6,471,852	$ 4,308,565.00	$ 1,544,110	35.84%	RED CONTRA INCENDIO MODULO G y H NIVEL 1
18.1.4	Puerta ventana PYV04 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	EJEUCIÓN	$ 22,642,870	$ 159,671,681.89	$ 159,671,682	100.00%	MODULO A - PRIMER NIVEL EN EL AREA DISPUESTA A ENFERMERIA
18.1.6	Puerta ventana PYV06 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	EJEUCIÓN	$ -	$ 751,039,302.37	$ 363,273,876	48.37%	MODULO E - SEGUNDO NIVEL FACHADA CICLOVIA COSTADO NORTE
18.1.7	Puerta ventana PYV07 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	EJEUCIÓN	$ 730,118	$ 9,223,589.34	$ 2,578,638	27.96%	MODULO A - PRIMER NIVEL EN EL AREA DISPUESTA A PORTERIA
18.1.10	Ventana PYV10 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-02,04P,V04).	EJEUCIÓN	$ 22,850,100	$ 1,073,651.63	$ 1,073,652	100.00%	MODULO A - PRIMER NIVEL REJILLAS
18.1.12	Ventana PYV12 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01, 03T, DP02).	EJEUCIÓN	$ -	$ 64,191,797.58	$ 1,309,286	2.04%	MODULO A - PRIMER NIVEL EN EL AREA DISPUESTA A PORTERIA
21.1.13	Cerramiento exterior tipo sed en malla eslabonada altura 2.4 (parales en tubo estructural 100x40x2 empotrado en dados de concreto cuerpos en ángulos de 2 1/2" - 1 1/4" x 3/16 -3/4 x 1/8", malla ondulada 2x2" 4mm, terminada con base imprimante epóxica y esmalte	EJEUCIÓN	$ -	$ 523,648,697.18	$ 95,338,724	18.21%	CERRAMIENTO DEFINITIVO ZONA ORIENTAL DEL PROYECTO, PARALELO A CARRERA 94
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 59,137,083	$ 69,027,840.00	$ 48,867,840	70.79%	ASEO DE NIVEL 3 DE LA PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS A, B, C, D y E
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJEUCIÓN	$ -	$ 439,360,678.80	$ 228,940,938	52.11%	MAMPOSTERIA DEL MODULO H PISO 2
28.12	Guardaescobas baldosa vibroprensada biselado grano de marmol. Dim.: h= 10 x L= 30 cm Ref: Perlato claro grano 3 fondo crema.	EJEUCIÓN	$ 72,881,929	$ 74,551,522.00	$ 28,512,141	38.24%	GUARDAESCOBAS DE SALONES NIVEL 3 DE LOS MODULOS A, B, C, D y E.
28.17	Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm	EJEUCIÓN	$ 7,755,494	$ 624,358,986.00	$ 246,690,967	39.51%	SALONES DE NIVEL 1 DE LOS MODULOS L, M y N.
28.20	Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral	EJEUCIÓN	$ 45,729,572	$ 127,562,083.74	$ 100,524,793	78.80%	MAMPOSTERIA DEL MODULO H PISO 2
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	EJEUCIÓN	$ 18,421,888	$ 641,250,880.88	$ 437,913,641	68.29%	MAMPOSTERIA DEL MODULO H PISO 2
28.54	suministro e instalacion de pasamanos	EJEUCIÓN	$ 20,587,494	$ 316,957,472.00	$ 92,278,000	29.11%	NIVEL 3 DE LOS MODULOS DEL A al E

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	AVANCE
$ 21,770,899,423.72	$ 329,449,425.87	$ 22,100,348,849.59	$ 22,116,897,603.31	$ 213,923,033.86	$ 22,330,820,637.17	$ 230,471,787.58
50.81%	**0.77%**	**51.58%**	**51.62%**	**0.50%**	**52.12%**	**0.54%**

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	81	**DEL**	**4 de diciembre de 2023**	**AL**	**10 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	567	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

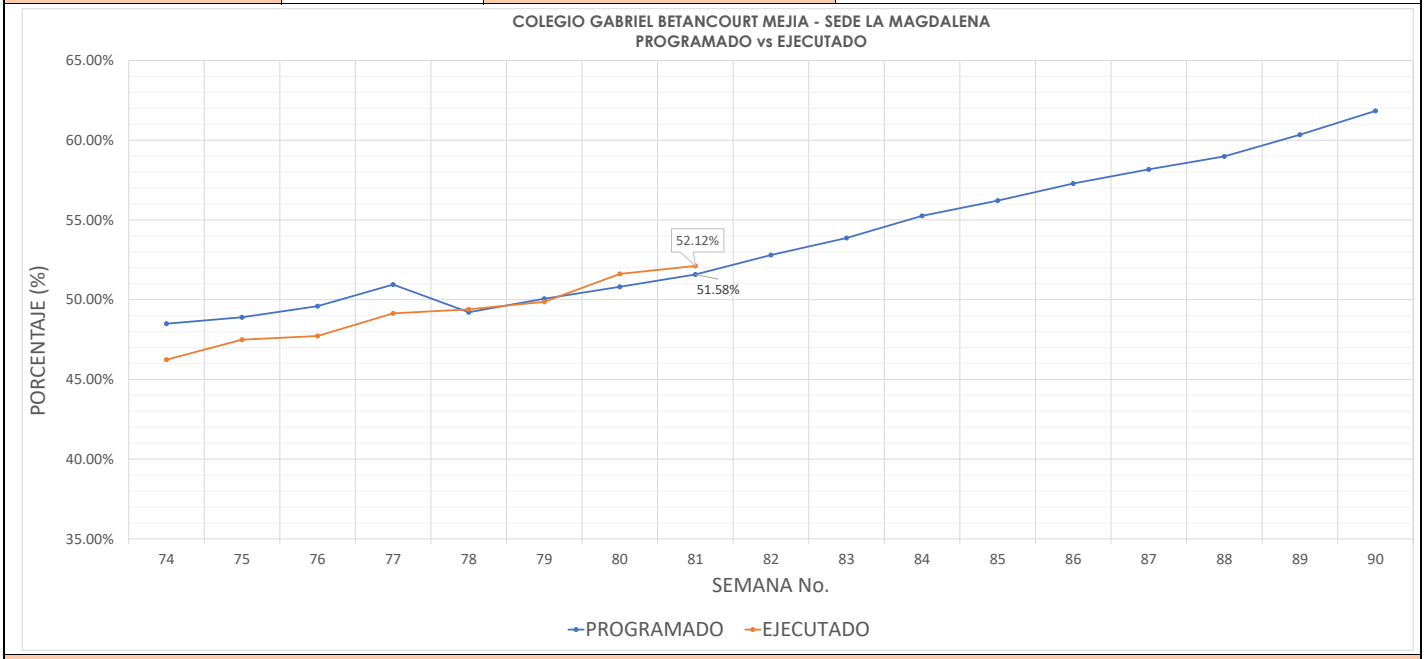

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor atrasos	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-$ 974,186,017	**-2.27%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2.1	CIMENTACION	-$ 399,521,122	**-0.93%**	Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas estan pendiente por definir el piso de acabado en zona de primera infancia (por ende su conformacion y confinamiento) y zonas de cubiertas o exteriores que no puedieron ser ejecutadas por temas de lluvias
5.1	MAMPOSTERIA	-$ 647,597,264	**-1.51%**	Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio, que corresponden a los modulo k, t y zonas de exteriores, se hace necesario la entrega de dichas areas o espacion para cumplir con la programacion, y se aclara que se neceta area en el proyecto para los talleres de ornamentacion, pintura, ventaneria de las diferentes actividades que no se pueden realziar a la interperie y no se cuenta con el suficiente espacion para adelantar labores

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 81 comprendidos entre los días 4 de diciembre al 10 de diciembre del 2023, se radicó los siguientes oficio:
1. El dia 4 de diciembre del 2023 se radica el acta parcial de obra No. 17 en el oificio CCERU-22-1129. Se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16:2021_783 en el oficio CCERU-22-1130. S eradica el cambio de ubicacion de panel de sistema de incendios en el oficio CCERU-22-1131. Se radica la hoja de vida de residente de obra en el oficio CCERU-22-1133. Se radica las memorias de calculo de cortasoles en el oficio CCERU-22-1134.
2. El dia 5 de diciembre del 2023 se radica el conepto de vidrios en el oficio CCERU-22-1137. Se radica las garantias modificatorias 1 del contrato 133 en el oficio CCERU-22-1139. Se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16:2021_787 de recubrimiento minimo de tuberias de 14¨ en el oficio CCERU-22-1140
3. El dia 6 de diciembre del 2023 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16:2021_735 documento de apropiacion de diseños CCERU-22-1141. Se radica la trazabilidad correspondencia actualizada de polizas en el oficio CCERU-22-1142. Se radica el soporte de mano de obra de ezpecializada de np 70 y 71 en el oficio CCERU-22-1143
4. El dia 7 de diciembre del 2023 se radica la solicitud de adicion 2 y prorroga 2 en el oficio CCERU-22-1145

Aspecto Financiero

No se presento ninguna actividad en la semana

Aspecto Tecnico

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que actualmente tiene el Colegio, razón por la que este Consorcio requiere la entrega inmediata del Colegio, en aras de recuperar los atrasos.

Tambien se aclara que desde la semana pasada se han presentado lloviznas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas leves que por temas de seguridad y salud en el trabajo se deben detener actividades para salvaguardar o proteger la integridad de cada trabajador retrasando el normal desarrollo de algunas actividades constructivas del proyecto. Es de aclarar que para todo el tema de las actividades que se adelantan en exteriores, especialmente en urbanismo como lo es el movimiento de tierras y llenos, no solo afecta el tiempo de la precipitación sino el tiempo en que se sequen los materiales y se re construya o este adecuado lo que se había avanzado para poder continuar con dichas labores y garantizar la estabilidad y calidad de ello.

Es de anotar que las areas solicitadas que se encuentran en uso tambien se requieren para poder adecuar talles de ornamentacion (estructura metalica, de cerramiento, de barandas, de pasamanos), talleres de pintura, talleres de ventaneria y demas actividades que requieran espacios cerrados, ya que con el avance de las actividades poco a poco aumentan los espacios de trabajo y terminados disminuyenndo las areas para acopio de materiales y ejecucion de actividades ya mencionadas, que son adelanto para el proyecto.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras. Es de anotar que el atraso no es tan representativo pero se debe a que el contratista ha buscado la forma de ejecutar actividades que se permitan a medida del avance de la obra y los espacios entregados, sin importar o no que esten en la programacion con el fin de no reflejar incumplimientos ni retrasos mayores.

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	81	**DEL**	**4 de diciembre de 2023**	**AL**	**10 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	567	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 4 de diciembre del 2023 se da respuesta las observaciones emitidas por la interventoría al informe No. 18 V2
2. El dia 5 de diciembre del 2023 se envía carpeta ZIP con informe ambiental No. 18 V2, se recibe aprobación parcial de informe, pues faltan certificaciones por entregar, se realiza recorrido ambiental – forestal para verificar el estado de individuo arbóreo contigo al bloque M, se recibe inspección ambiental de la interventoría para firma de contratista, se devuelve documento con firma respectiva.

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 4 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, pausas activas, diligenciar documentos para las actividades del consorcio y de urbanismo (ats,permisos de trabajo,inspecciones,)entrega de epp, Supervision de actividades en obra- verificacion de planillas ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo señalizacion de areas, supervicion de actividades del personal de servicios .
2. El dia 5 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,hacer carnet de personal nuevo, capacitaciones sst,señalizacion de areas, supervicion de actividades.
3. El dia 6 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo,
4. El dia 7 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo, capacitaciones sst
5. El dia 9 de diciembre del 2023 se realiza Charla 5 minutos, validacón de permisos en campo, reunión SST , recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, socializacion actividades semanales .

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 4 de diciembre del 2023 se recibe aprobación al informe Mensual de Gestión Social No 18
2. El dia 6 de diciembre del 2023 se realiza asistencia y participación Comité de Seguimiento Social (campamento de obra)


Entre el 04 al 09 de diciembre de 2023: Se garantizó la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presenta ninguna actividad esta semana.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE OBRA**
Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite	
	Firma
