ENGINEERS SAS

Florencia, 26 de diciembre del 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Contratista:	HILMON MERCHAN SUAREZ
Nit:	91.210.294-0
Representante Legal:	HILMON MERCHAN SUAREZ
Cedula de ciudadanía:	91.210.294 de Bucaramanga
Nº Contrato de Obra Pública:	20230000789
Pago Nº:	ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01
Valor del pago:	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($69.245.979,00) PESOS MCTE

Yo JESUS ROBERTO PENAGOS ROA, identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.117.516.434, expedida en Florencia Caquetá, actuando como representante legal de ENGINEERS S.A.S., con NIT Nº 900.297.930-4, interventor del contrato de obra Nº 202300000789, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA", teniendo en cuenta que el contratista HILMON MERCHAN SUAREZ, relaciono y entrego el informe de avance de obra Nº 02.

Se reporta para este pago final un porcentaje de ejecución de obra del 10.07%, por valor a pagar de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($69.245.979,00) PESOS MCTE, cumpliendo con la respectiva calidad en la construcción de la obra, sobre el avance entregado en tiempos y requisitos del contrato reportado en el informe de avance de obra Nº 02, los respectivos soportes que fueron entregados reposan en el expediente del proceso que se encuentra en custodia en la Secretaria de Infraestructura – PDA, el

ENGINEERS SAS

cual se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, de todo el personal vinculado al contrato de obra Nº 202300000789.

Por lo anterior el suscrito interventor, certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato y todas las obligaciones del mismo, durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre al 26 de diciembre del 2023, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días de diciembre del 2023.

Atentamente

Sin otro particular,

JESUS ROBERTO PENAGOS ROA
C.C. No. 1.117.516.434
Rep. Legal ENGINEERS SAS

Carrera 5 N° 15-57 Barrio porvenir – Cel: 3115025401
e-mail: engineers01sas@gmail.com
Florencia – Caquetá - Colombia

	ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA DEL 10.07%
	Gobernación de Caquetá
Código: F-CBS-075	**Versión:** 2009

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

Tipo de contrato	Obra		Clase	Construcción		X	Mantenimiento		
Contratista	**HILMON MERCHÁN SUAREZ**								
	PN	X	PJ		UT		C		
Objeto del contrato	**"CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".**								
Interventor	**JESUS ROBERTO PENAGOS ROA REPRESENTANTE LEGAL ENGINEERS S.A.S.**					**NIT**	**900.297.930-4**		
Supervisión	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – PDA GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ**								
Funcionario supervisor	**LUIS ANTONIO VESGA**				**Cargo**		**Profesional Universitario**		

*Marcar X

F/ suscripción	01/09/2023								
Publicación	Si		No	X	Fecha			Valor	
Plazo inicial del contrato	Cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		F/Inicio		28/11/2023		F/Terminación normal		31/12/2023
Adicional									
Valor inicial del contrato	$687.700.193			Plazo del adicional	N/A		Valor final del contrato		$687.700.193

En la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del departamento del Caquetá se reunieron: La Doctora SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 30.575.788 expedida en el Municipio de Sahagún – Córdoba,

Revisó parte jurídica		Revisó parte técnica	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

mayor de edad y vecina de esta ciudad, en su calidad de directora técnica de contratación encargada, según decreto Nº 001168 del 10/11/2023, delegada como ordenadora del gasto, mediante decreto Nº 000411 del 27/05/2020 en uso de sus funciones y facultades otorgadas actuando para suscribir contratos siguiendo las disposiciones de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y demás normatividad vigente, el señor JESUS ROBERTO PENAGOS ROA, representante legal de ENGINEERS S.A.S. actuando en calidad de interventor del contrato Nº 202300000789 de 2023 el Señor HILMON MERCHAN SUAREZ, identificado a píe de firma, actuando en calidad de CONTRATISTA de la obra y el Ingeniero LUIS ANTONIO VESGA RUEDA, en su calidad de supervisor del contrato Nº 202300000789 de 2023 identificado a píe de firma, actuando en las calidades descritas, para dejar constancia por medio de la presente acta del pago final de obra del 10.07%, correspondiente al periodo del 12/12/2023 al 20/12/2023, según condiciones que se detallan a continuación.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	MODIFICACIONES		ACTA DE PAGO Nº 01 DEL 89.93%		% DE EJECUCION	ACTA DE PAGO DEL 10.07%		% DE EJECUCION
						CANT	VALOR	CANT	VALOR		CANT	VALOR	
	RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS												
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION**												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	Km	7,22	658.250	4.752.565	7,32	4.818.390	7,32	4.818.390	100,00%			
2	**APOYOS MEDIA TENSION**												
2.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN	Un	43	143.113	6.153.838	33	4.722.713	33	4.722.713	100,00%			
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE 10 METROS 510 KG	Un	17	1.690.675	28.741.475	15	25.360.125	15	25.360.125	100,00%			
2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	26	1.970.070	51.221.820	23	45.311.610	23	45.311.610	100,00%			
3	**VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION**												
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	8	1.651.567	13.212.536	10	16.515.670	10	16.515.670	100,00%			
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	1	1.534.094	1.534.094	1	1.534.094	1	1.534.094	100,00%			
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (505)	Un	4	217.157	868.628	8	1.737.256	8	1.737.256	100,00%			
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (506)	Un	6	347.921	2.087.526	18	6.262.578	18	6.262.578	100,00%			
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	7	431.081	3.017.568	4	1.724.325	4	1.724.325	100,00%			

Revisó parte jurídica		Revisó parte técnica	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	4	831.494	3.325.976	2	1.662.988	2	1.662.988	100,00%				
3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	4	1.061.638	4.246.552	1	1.061.638		0	0,00%	1	1.061.638	100,00%	
3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (RH214)	Un	2	1.084.390	2.168.780	1	1.084.390	1	1.084.390	100,00%				
3.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (PH211) MONOFASICA EN ANGULO	Un	1	1.031.774	1.031.774				0					
4	**TENDIDO RED MEDIA TENSION**													
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	7,22	14.302.667	103.265.253	7,12	101.834.987	7,12	101.834.987	100,00%				
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TIPO STOCKBRIDGE PARA 13,2 kV	Un	24	83.448	2.002.750	68	5.674.458	68	5.674.458	100,00%				
4.2	PLACA PARA CODIFICACION DE EXTRUCTURAS DE MEDIA TENSION A 13,2 kV	Un	25	51.431	1.285.781	50	2.571.563	50	2.571.563	100,00%				
5	**TEMPLETES MEDIA TENSION**								0					
5.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	43	143.113	6.153.838	79	11.305.888	79	11.305.888	100,00%				
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS	Un	31	429.908	13.327.133	50	21.495.375	50	21.495.375	100,00%				
5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES DOBLES	Un	10	667.787	6.677.868	26	17.362.456	26	17.362.456	100,00%				
	SUBTOTALES				255.075.754		272.040.503		270.978.865			1.061.638		
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS				255.075.754		272.040.503		270.978.865			1.061.638		
	RED DE BAJA TENSIÓN ABIERTA A 220/120 VOLTIOS													
6	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BAJA TENSION**													
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	6,57	845.250	5.553.293	4,73	4.000.568	4,73	4.000.568	100,00%				
7	**APOYOS BAJA TENSION**								0					
7.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN	Un	41	143.113	5.867.613	29,00	4.150.263	29	4.150.263	100,00%				
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE 8 METROS 510 KG	Un	27	1.268.650	34.253.550	11,00	13.955.150	11	13.955.150	100,00%				
7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS - 510 KG	Un	14	1.651.270	23.117.780	21	34.676.670	21	34.676.670	100,00%				
8	**VESTIDA / ARMADA POSTES BAJA TENSION**													
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (617)	Un	21	149.135	3.131.835	12,00	1.789.620	12	1.789.620	100,00%				
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (619)	Un	42	149.135	6.263.670	46	6.860.210	46	6.860.210	100,00%				
9	**TENDIDO RED BAJA TENSION**													

Revisó parte jurídica		Revisó parte técnica	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

9.2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 2 ACSR	Km	2,87	19.610.700	56.282.709	3,59	70.402.413	3,59	70.402.413	100,00%					
9.3	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 4 ACSR	Km	3,70	14.154.900	52.373.130	1,14	16.179.051	1,14	16.179.051	100,00%					
10	**TEMPLETES BAJA TENSION**														
10	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	10	143.113	1.431.125	49,00	7.012.513	49	7.012.513	100,00%					
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	40	408.318	16.332.700	49,00	20.007.558	49	20.007.558	100,00%					
10	**PUESTA A TIERRA BAJA TENSION**														
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSIÓN CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS, CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	30	273.420	8.202.600	19,00	5.194.980	19	5.194.980	100,00%					
	SUBTOTALES				212.810.004		184.228.994		184.228.994			0			
	TOTAL RED DE BAJA TENSIÓN ABIERTA A 220/120 VOLTIOS				212.810.004		184.228.994		184.228.994			0			
	TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS														
12	**TRANSFORMADORES**														
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA	Un	7	5.800.500	40.603.500	9,00	52.204.500		0	0,00%	9	52.204.500	100,00%		
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	Un	1	8.972.429	8.972.429	1,00	8.972.429	1	8.972.429	100,00%					
	SUBTOTALES				49.575.929		61.176.929		8.972.429			52.204.500			
	TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS				49.575.929		61.176.929		8.972.429			52.204.500			
	SUBTOTALES														
	COSTOS DIRECTOS				517.461.687		517.446.426		464.180.288			53.266.138			
	ADMINISTRACIÓN	22%			113.841.571		113.838.214		102.119.663			11.718.550			
	IMPREVISTOS	2%			10.349.234		10.348.929		9.283.606			1.065.323			
	UTILIDAD	6%			31.047.701		31.046.786		27.850.817			3.195.968			
	COSTOS INDIRECTOS				155.238.506		155.233.928		139.254.086			15.979.841			
	SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				672.700.193		672.680.354		603.434.374			69.245.979			
	INTERVENTORÍA INTEGRAL														

Revisó parte jurídica		Revisó parte técnica	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

	SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORÍA INTEGRAL)		672.700.193		672.680.354		603.434.374		69.245.979
	RETIE		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + RETIE)		687.700.193		687.680.354		618.434.374		69.245.979
	VALOR A PAGAR		687.700.193		687.680.354		618.434.374		69.245.979

OBSERVACIONES:	

Nota: En los Contratos a precio global la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Mediante la presente acta se deja pactadas en el contrato de obra pública constancia que el contratista cumplió cabalmente con todas y cada una de sus obligaciones contractuales Nº 202300000789 y por tanto se avala el pago.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	MODIFICACIONES	VALOR EJECUTADO
VALOR CONTRATO CONDICIONES INICIALES	$687.700.193		
VALOR CONTRATO CONDICIONES FINALES		$687.680.354	
VALOR DISMINUIDO SEGÚN OTROSI 1		$ 19.839	$ 19.840
ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 1 (89,93%)			$618.434.374
ACTA DE PAGO FINAL (10.07%)			$69.245.979
SUMAS IGUALES	$687.700.193	$687.700.193	$687.700.193

VALOR A PAGAR: El valor de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción es de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($69.245.979,00) PESOS MCTE

Revisó parte jurídica		Revisó parte técnica	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

	ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA DEL 10.07%	
	Gobernación de Caquetá	
Código: F-CBS-075		**Versión:** 2009

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

El recibo por parte de la Supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Mediante la presente acta se recibe a satisfacción las obras ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales y por ende se avala para el respectivo pago

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia (Caquetá), a los

Por El CONTRATISTA	Por el INTERVENTOR	Por el SUPERVISOR	Por el DEPARTAMENTO
HILMON MERCHÁN SUAREZ	**JESUS ROBERTO PENAGOS ROA**	**LUIS ANTONIO VESGA RUEDA**	**SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT**
C.C Nº 91.210.294 Bucaramanga (Santander)	Representante Legal de ENGINEERS S.A.S. NIT Nº 900.297.930-4	C.C Nº 91.073.126 San Gil (Santander)	DIRECTORA TECNICA DE CONTRATACION ENCARGAD, SEGÚN DECRETO Nº 001168 DEL 10/11/2023, DELEGADA ORDENADORA DEL GASTO, MEDIANTE DECRETO Nº 000411 DEL 27/05/2020

Revisó parte jurídica		Revisó parte técnica	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

OBJETO:	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA VEREDAS VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.						
CONTRATISTA DE OBRA	HILMON MERCHAN SUAREZ	CONTRATO DE OBRA No. :		202300000789	FECHA CONTRATO DE OBRA:	01/09/2023	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LUIS ANTONIO VESGA RUEDA	INTERVENTOR DEL CONTRATO	JESUS ROBERTO PENAGOS ROA R/L ENGINERRS S.A.S.		PREACTA PAGO FINAL DEL 10.07%		
CAPITULO DE OBRA	TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS		SUB CAPITULO DE OBRA		TRANSFORMADORES		
ITEM: 12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA				UN	PAGINA:	20
REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	Los transformadores de distribución para redes rurales urbanas se Instalaran en el sitio más cercano al centro de carga, teniendo en cuenta que ningún cliente en forma individual quede ubicado a más de 600 metros del transformador siempre y cuando se mantengan los límites de regulación, debe realizar el montaje de la subestación aérea, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del transformador, con lo indicado en los planos y diagramas unifilares. Posteriormente, debe realizar el montaje de la puesta a tierra utilizando los cables apropiados para tal fin. El	UN	9	5,800,500.00	52,204,500.00		
	TOTAL PRESENTE ACTA				52,204,500.00		
	TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL				52,204,500.00		



OBESERVACIONES:

ELABORO:


LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
SUPERVISOR

JESUS ROBERTO PENAGOS ROA
INTERVENTOR R/L ENGINEERS S.A.S.

HILMON MERCHAN SUAREZ
CONTRATISTA

OBJETO:	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA VEREDAS VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.				
CONTRATISTA DE OBRA	HILMON MERCHAN SUAREZ	CONTRATO DE OBRA No. :	202300000789	FECHA CONTRATO DE OBRA:	01/09/2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN	INTERVENTOR DEL CONTRATO	JESUS ROBERTO PENAGOS ROA R/L ENGINERRS S.A.S.	PREACTA PAGO FINAL DEL 10.07%	
CAPITULO DE OBRA	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	SUB CAPITULO DE OBRA		VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION	
ITEM:3,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)			UN	PAGINA: 10

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Corrresponde a la estructura de retencion disposicion horizontal circuito bifasico, el cual debe llevase a cabo por personal con experiencia y con las herramientas apropiadas, revisar el ensamble adecuado de aisladores, colocación correcta y la cantidad requerida crucetas, diagonales, esparragos, pernos, tornillos, pasadores y pines de seguridad, verificación de perfecto estado de la porcelana	UN	1	1,061,638.00	1,061,638.00
TOTAL PRESENTE ACTA					1,061,638.00
TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL					1,061,638.00

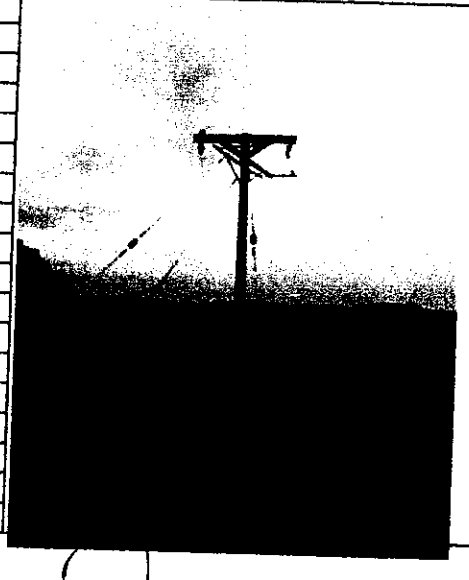

OBESERVACIONES:

ELABORO:

LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
SUPERVISOR

JESUS ROBERTO PENAGOS ROA
INTERVENTOR R/L ENGINEERS S.A.S.

HILMON MERCHAN SUAREZ
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ

NIT.800.091.594-4

Florencia, 30 de diciembre de 2023.

PARA: **LUZ ELENA LÓPEZ GIRALDO**
Director Técnico de Contabilidad

DE: **LUIS ANTONIO VESGA RUEDA**
Profesional Universitario

ASUNTO: Distribución RP para el pago final del Contrato No. 202300000844 del 11/10/2023.

De manera comedida me permito informar la distribución de los valores para el pago parcial No. 1 del contrato de obra No. 202300000844 del 11/10/2023. cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE MEDIA, BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA VEREDAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", por un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($53.729.869,00)., lo expuesto de acuerdo al siguiente cuadro.

Obj. Presupuestal	Descripción Objeto Del Gasto	Valor Acta No.1	Valor Acta Final	Valor RP
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-2023006180107	Construcción y servicios de la construcción / Proyecto: "CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE MEDIA, BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA VEREDAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"- (Estamp. Pro.electrificacion)	$ 96.132.393,00	$-	$ 96,132,393.00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-2023006180107	Construcción y servicios de la construcción / Proyecto: "CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE MEDIA, BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA VEREDAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"- (Estamp. Pro.electrificacion)	$ 320,939,212.00	$-	$ 320,939,212.00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-2023006180107	Construcción y servicios de la construcción / Proyecto: "CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE MEDIA, BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA VEREDAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"- (Estamp. Pro.electrificacion)	$ 36.081.553,00	$41.729.869,00	$ 77,813,450.00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-2023006180107	Construcción y servicios de la construcción / Proyecto: "CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE MEDIA, BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA VEREDAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"- (Estamp. Pro.electrificacion)	$ -	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
TOTAL		$ 453.153.158,00	$53.729.869,00	$ 506.885.055,00

Cordialmente,

LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
Profesional Universitario de Secretaría De Infraestructura

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

CAQUETÁ SOMOS TODOS

Florencia, 30 de diciembre de 2023.

PARA: **LUZ ELENA LÓPEZ GIRALDO**
Director Técnico de Contabilidad

DE: **LUIS ANTONIO VESGA RUEDA**
Profesional Universitario

ASUNTO: Distribución RP para el pago final del Contrato No. 202300000789 del 01/09/2023.

De manera comedida me permito informar la distribución de los valores para el pago parcial No. 1 del contrato de obra No. 202300000789 del 01/09/2023. cuyo objeto es ""CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"", por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($69.245.980,00)., lo expuesto de acuerdo al siguiente cuadro.

Obj. Presupuestal	Descripción Objeto Del Gasto	Valor Acta No.1	Valor Acta Final	Valor RP
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180055	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción de redes de electrificación rural en media y baja tensión con montaje de subestaciones areas para la zona rural del municipio de San Jose del Fragua en el departamento del Caquetá" R.B (Estamp. Pro electrificación)	$330.337.486,00	$-	$330.337.486,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180055	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción de redes de electrificación rural en media y baja tensión con montaje de subestaciones areas para la zona rural del municipio de San Jose del Fragua en el departamento del Caquetá" R.B (Estamp. Pro electrificación)	$ 281.357.087,00	$-	$ 281.357.087,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180055	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción de redes de electrificación rural en media y baja tensión con montaje de subestaciones areas para la zona rural del municipio de San Jose del Fragua en el departamento del Caquetá" R.B (Estamp. Pro electrificación)	$ 6.739.801,00	$ 54.245.980,00	$ 61.005.620,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180055	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción de redes de electrificación rural en media y baja tensión con montaje de subestaciones areas para la zona rural del municipio de San Jose del Fragua en el departamento del Caquetá" R.B (Estamp. Pro electrificación)	$ -	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
TOTAL		$ 618.434.374,00	$ 69.245.980,00	$687.700.193,00

Cordialmente,

LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
Profesional Universitario de Secretaría De Infraestructura

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

CAQUETÁ SOMOS TODOS

Florencia, 30 de diciembre de 2023.

PARA: **LUZ ELENA LÓPEZ GIRALDO**
Director Técnico de Contabilidad

DE: **LUIS ANTONIO VESGA RUEDA**
Profesional Universitario

ASUNTO: Distribución RP para el pago final del Contrato No. 202300000721 del 18/07/2023.

De manera comedida me permito informar la distribución de los valores para el pago parcial No. 1 del contrato de obra No. 202300000721 del 18/07/2023. cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIÓN EN POSTE, PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS, MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", por un valor de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($31.826.898,00)., lo expuesto de acuerdo al siguiente cuadro.

Obj. Presupuestal	Descripción Objeto Del Gasto	Valor Acta No.1	Valor Acta Final	Valor RP
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180065	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción redes de media, baja tensión y montaje de subestación en poste, para las veredas Capitolio y Las Margaritas, municipios de Florencia y La Montañita, departamento del Caquetá " R.B (Estamp. Pro Electrificación)	$ 130.648.743,00		$ 130.648.743,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180065	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción redes de media, baja tensión y montaje de subestación en poste, para las veredas Capitolio y Las Margaritas, municipios de Florencia y La Montañita, departamento del Caquetá " R.B (Estamp. Pro Electrificación)	$ 142.847.279,00		$ 142.847.279,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180065	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción redes de media, baja tensión y montaje de subestación en poste, para las veredas Capitolio y Las Margaritas, municipios de Florencia y La Montañita, departamento del Caquetá " R.B (Estamp. Pro Electrificación)	$ 3.892.298,00	$ 25.826.898,00	$ 29.754.218,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.3.20-21-2102-2102015-210201500-2023006180065	Construcción y servicios de la construcción. Proy: "Construcción redes de media, baja tensión y montaje de subestación en poste, para las veredas Capitolio y Las Margaritas, municipios de Florencia y La Montañita, departamento del Caquetá " R.B (Estamp. Pro Electrificación)		$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
TOTAL		$ 277.388.320,00	$ 31.826.898,00	$ 309.250.240,00

Cordialmente,

LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
Profesional Universitario de Secretaría De Infraestructura
