

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.5090635 DE 2023 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Vicepresidencia Técnica

12 de diciembre de 2023

Comprometidos con Colombia

CCOM-FO-001 V17 / 19-May-2023 / Clasificada

CONVENIO CO1.PCCNTR.5090635 DE 2023

No. CONTRATO	**CO1.PCCNTR.5090635**	
OBJETO	ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	
VALOR	$ 294,145,282,376,00 ($ 278,399,202,376 Proyectos y $ 15,746,080,000 para AT).	
CLIENTE	Ministerio de Educación Nacional – MEN	
PLAZO	18 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. - Orden de inicio: 29 de junio 2023 Terminación: 28 de febrero de 2025	
UBICACIÓN	- Mejoramiento sedes banco de provectos - Mejoramiento sedes emergencia - Diseños Prioritários MEN - Proyectos estratégicos	- Líneas Estratégicas
ESTADO	En ejecución	

Contrato 5090635 | MEN

OBJETO	**ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.**
ALCANCE PROGRAMA	- Mejoramiento sedes banco de proyectos - Mejoramiento sedes emergencia - Diseños Prioritarios MEN - Proyectos estratégicos
TIEMPO	**18** meses Fecha inicio: 29/06/2023 Fecha Fin: 28/02/2025
$	**294,145** Millones Ejecución: **$ 278,399** Millones Asistencia Técnica: **$ 15,,746** Millones
ESTADO ACTUAL	✓ Patrimonio Autónomo - **29/06/2023** • Manual Operativo Aprobado – **14/08/2023**. • Actualmente se encuentra en revisión documental y elaboración los Estudios Previos de la contratación derivada.

18/06/2023
Suscripción Contrato Interadministrativo

29/06/2023
Inicio Contrato Interadministrativo

Octubre a Diciembre 2023
Publicación Contratos Derivados

Noviembre a diciembre 2023
Adjudicación Contratos Derivados

Diciembre 2023 a enero 2024
Inicio Contratos Derivados

31/12/2024
Terminación Contrato Obra

28/02/2025
Terminación Contrato Interventoría

28/02/2025
Terminación Contrato Interadministrativo

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Consolidado de sedes focalizadas para el contrato "Administrar recursos y brindar asistencia técnica para la atención de proyectos de infraestructura y dotación de establecimientos educativos que sean priorizados por el MEN"	
Descripción	**No. de sedes**
1) Sedes del banco de proyectos de la convocatoria MEN	385
2)Sedes obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	61
3)Sedes de consultorías de proyectos de infraestructura educativa	9
5)Sedes para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructuras educativa	77
Sedes Estimadas a atender	**532**

Nota: En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia ,estás pueden ser reemplazadas de acuerdo al orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario.

1) Recurso disponible para obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN	$116.450.000.000
2)Recurso disponible para obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	$29.800.132.757
3)Recurso disponible para diseños de proyectos de infraestructura educativa	$29.143.085.188
4)Recurso disponible para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura educativa	$102.346.834.431
Subtotal recursos para la ejecución de las obras	**$277.740.052.376**
a) Viabilidades (asistencia técnica)	$1.125.549.600
b) Asistencia Técnica y administración de recursos	$14.620.530.400
Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (5.66%)	**$15.746.080.000**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**$294.145.282.376**

RESUMEN AVANCE EN CADA LÍNEA

	SEDES PRIORIZADAS	OBSERVACIONES
LÍNEA MEJORAMIENTO	390	Viabilizadas 175 jurídicamente y se iniciara proceso de contratación y subsanes se efectuarán en desarrollo del proceso y diagnóstico de intervenciones.
LÍNEA EMERGENCIA	63	50 sedes viables jurídicamente 8 sedes por viabilizar jurídicamente 5 sedes no viables técnicamente
LÍNEA BANCO DE DISEÑOS	9 Proyectos Priorizados	5 REUNIONES CON EQUIPO MEN
LÍNEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	18 Proyectos	12 Proyectos con información 2 Proyectos Atendidos con otras líneas 4 Proyectos sin Información.



Grupos de contratación Mejoramientos

Grupos de contratación Mejoramientos

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	EXP PROPONENTE	AREA CUBIERTA TOTAL (M2)	OBRA	INTERVENTORIA	CONVOCATORIA DE OBRA	CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA	LINKS	No. Proponentes
Grupo 1	Rioblanco	Tolima	16	32	1,5 Y 0,7	15400	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-090-2023	PAF-MENPNIE-I-085-2023	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-o-090-2023	4
	Chaparral	Tolima	16								https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-i-085-2023	8
Grupo 2	Tame	Arauca	20	20	1 Y 0,5	9625	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-091-2023	PAF-MENPNIE-I-086-2023	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-o-091-2023	3
											https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-i-086-2023	4
Grupo 3	Saravena	Arauca	4	11	1 Y 0,5	5300	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-092-2023	PAF-MENPNIE-I-087-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-092-2023	4
	Fortul	Arauca	3								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-087-2023	3
	Hato Corozal	Casanare	4									
Grupo 4	Timbiquí	Cauca	10	10	1 Y 0,5	1227	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-093-2023	PAF-MENPNIE-I-088-2023	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-o-093-2023	1
											https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-i-088-2023	3
Grupo 5	Morales	Cauca	8	13	1 Y 0,5	5195	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-094-2023	PAF-MENPNIE-I-089-2023	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-o-094-2023	2
	Piendamó	Cauca	5								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-089-2023	2
Grupo 6	Suárez	Cauca	7	14	1 Y 0,5	3325	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-107-2023	PAF-MENPNIE-I-099-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-107-2023	1
	Buenos Aires	Cauca	7								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-099-2023	
Grupo 7	Lopez	Cauca	16	16	1 Y 0,5	1728	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-095-2023	PAF-MENPNIE-I-090-2023	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-o-095-2023	2
											https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-090-2023	2
Grupo 8	Bajo Baudó	Chocó	3	17	1 Y 0,5	8200	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-096-2023	PAF-MENPNIE-I-091-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-096-2023	1
	Riosucio	Chocó	1								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-091-2023	3
	Quibdó	Chocó	13									
Grupo 9	La Jagua De Ibirico	Cesar	8	25	1,5 Y 0,7	1443	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-097-2023	PAF-MENPNIE-I-092-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-097-2023	3
	Curumaní	Cesar	7								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-092-2023	11
	Chiriguana	Cesar	5									
	Becerril	Cesar	5									
Grupo 10	Valencia	Córdoba	15	18	1,5 Y 0,7	10287	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-098-2023	PAF-MENPNIE-I-093-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-098-2023	6
	San Pedro de Urabá	Antioquia	3								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-093-2023	4
Grupo 11	Tierralta	Córdoba	23	23	1,5 Y 0,7	15277	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-099-2023	PAF-MENPNIE-I-094-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-099-2023	2
											https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-094-2023	8
Grupo 12	La Tola	Nariño	6	13	1 Y 0,5	936	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-100-2023	PAF-MENPNIE-I-095-2023	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-o-100-2023-0	0
	Santa Barbara	Nariño	6								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-095-2023	1
	Mosquera	Nariño	1									
Grupo 14	Puerto Asís	Putumayo	10	21	1 Y 0,5	1989	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-106-2023	PAF-MENPNIE-I-104-2023	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-menpnie-o-106-2023	
	Valle Guamez	Putumayo	5								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-104-2023	
	San Miguel	Putumayo	4									
	Puerto Caicedo	Putumayo	2									
Grupo 15	Tibú	Norte de Santander	9	16	1,5 Y 0,7	4297	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-112-2023	PAF-MENPNIE-I-109-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-112-2023	
	El Tarra	Norte de Santander	7								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-109-2023	
Grupo 17	Teorama	Norte de Santander	5	14	1,5 Y 0,7	2155	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-105-2023	PAF-MENPNIE-I-100-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-105-2023	
	San Calixto	Norte de Santander	4								https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-100-2023	
	Hacarí	Norte de Santander	5									
Grupo 22	Dibulla	La Guajira	6	6	1,5 Y 0,7	4828	PUBLICADO	PUBLICADO	PAF-MENPNIE-O-113-2023	PAF-MENPNIE-I-108-2023	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-o-113-2023	
											https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-menpnie-i-108-2023	

Grupos de contratación Mejoramientos

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	EXP PROPONENTE	AREA CUBIERTA TOTAL (M2)	OBRA	INTERVENTORIA
Grupo 13	Barbacoas	Nariño	15	15	1 Y 0,5	1080	LISTO PARA PUBLICAR	LISTO PARA PUBLICAR
Grupo 16	El Carmen	Norte de Santander	5	14	1,5 Y 0,7	3028	LISTO PARA PUBLICAR	LISTO PARA PUBLICAR
	Convención	Norte de Santander	9					
Grupo 19	Segovia	Antioquia	4	12	1,5 Y 0,7	1097	LISTO PARA PUBLICAR	LISTO PARA PUBLICAR
	Nechí	Antioquia	8					
Grupo 20	Quinchia	Risaralda	3	12	1,5 Y 0,7		LISTO PARA PUBLICAR	LISTO PARA PUBLICAR
	Mistrató	Risaralda	4					
	Apia	Risaralda	1					
	Marsella	Risaralda	3					
	Guatica	Risaralda	1					
Grupo 21	Uribia	La Guajira	19	19	1 Y 0,5	3312	LISTO PARA PUBLICAR	LISTO PARA PUBLICAR
Grupo 24	El Retorno	Guaviare	4	16	1 Y 0,5	2016	LISTO PARA PUBLICAR	LISTO PARA PUBLICAR
	San José Del Guaviare	Guaviare	8					
	Calamar	Guaviare	2					
	San Vicente del Caguán	Caquetá	1					
	Uribe	Meta	1					

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	EXP PROPONENTE	AREA CUBIERTA TOTAL (M2)	OBRA	INTERVENTORIA
Grupo 18	Sardinata	Norte de Santander	16	16	1,5 Y 0,7	1512	EN ELABORACION	EN ELABORACION
Grupo 23	Maicao	La Guajira	21	21	1,5 Y 0,7	2736	EN ELABORACION	EN ELABORACION
Grupo 25	Buenaventura	Valle del cauca	3	3	1 Y 0,5	2800	EN ELABORACION	EN ELABORACION

VOTADOS EN EL COMITÉ No. 9 - 11/12/2023

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

EMERGENCIA

10 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 29,800

60 Sedes a intervenir

Resumen Avance Verificación Técnica

SEDES LISTADO INICIAL (63)	
SEDES A INTERVENIR	60
SEDES NO INTERVENIDAS EN ESTE CI	3
TOTAL	63

Nota: Las dos sedes que no serán intervenidas en este contrato, es debido a que ya serán intervenidas por otro contrato o en su defecto por otras entidades territoriales.

Resumen Avance Verificación Predial

Resultados de verificación predial sobre 63 sedes institucionales

SEDES TOTAL	
POSIBLE VIABILIDAD	6**
VIABLES	**54**
TOTAL	60

** Posible Viabilidad:
- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión
- Pendiente postulación nuevo predio

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Sedes no intervenidas (3)

ID MEN	Departamento	Municipio	IE	SEDE	REVISIÓN PRELIMINAR	OBSERVACIONES ABOGADO A CARGO
40	Magdalena	Ciénaga	INSTITUCION EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIASCOS	I.E. ENOC MENDOZA - SEDE PRINCIPAL	NO INTERVENCIÓN	NO INTERVENCIÓN / INTERVENIDA POR EL CONTRATO DE LLUVIAS
45	Antioquia	Anorí	I. E. ANORI	I. E. R. AMANDA POSADA	NO INTERVENCIÓN	NO INTERVENCIÓN / PRIORIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
10	Putumayo	Puerto Asís	IE CIUDAD DE ASIS	COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS	NO VIABLE JURIDICAMENTE	EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, REMITE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DONDE CERTIFICA QUE EL PREDIO PERTENECE A LA DIÓSECIS DE SIBUNDOY. SE RECOMIENDA NO INTERVENCIÓN POR SER PREDIO PARTICULAR.

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Sedes por viabilizar Jurídicamente (6)

ID MEN	Departamento	Municipio	IE	SEDE	RECOMENDACION PRELIMINAR	OBSERVACIONES ABOGADO A CARGO
17	sucre	Majagual	INSTITUCION EDUCATIVA LA SIERPITA	SEDE PRINCIPAL	NO INTERVENCIÓN	De acuerdo a instrucciones impartida por el MEN, el 04/10/2023 se establece comunicación con el rector y este confirma que no se cuenta con un lote adicional en el que se pueda construir alguna solución provisional mientras se define la posibilidad de reubicación de la IE. Señala que el Municipio ha realizado gestiones para comprar un predio nuevo, pero aún no se ha materializado la adquisición (costos muy elevados). Así mismo indicó que la Gobernación habría señalado que no están en capacidad de adquirir un predio nuevo. Se plantea al MEN la alternativa de realizar diagnostico con el contratista del grupo 8. En caso de ser viable se incluiría en al alcance y valor del grupo.
33	Cesar	San Diego	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES	SEDE EL JUNCAL ARRIBA	NO INTERVENCIÓN	Sede cerrada, el rector pide que se tenga en cuenta otra sede (Nuevas Flores). Se remite solicitud a ETC, Municipio y colegio de entrega documentación para viabilidad de nueva sede el 15-nov reiteración 23-nov. Como no se ha recibido respuesta de las citadas entidades se solicitó ayuda en la gestión a Cristian Sua – MEN el 06/12/2023 James Quiroz de SED de la ETC.
34	Cesar	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO LOS ENCANTOS GUAIMARAL	SEDE LOS CAMPANARIOS	NO INTERVENCIÓN	El rector solicita intervención en otra sede, ya que la sede los campanarios se encuentra cerrada, sin embargo, envía dos certificaciones de sana posesión con otras sedes: caño padilla abajo y sede principal. Se remite solicitud a ETC, Municipio y colegio de entrega documentación para viabilidad de nueva sede el 15-nov, reiteración 23-nov. El 24-nov. se recibe de rectora acto administrativo de sana posesión de la sede p/pal los Encantos y sede Caño Padilla Abajo. Se solicitó subsanación del acto administrativo el cual no cumple Ley 2140 de 2021 y se solicita complementación de la documentación requerida. Como no se ha recibido respuesta respecto de lo requerido se solicitó ayuda en la gestión a Cristian Sua – MEN el 06/12/2023 james Quiroz de la SED de la ETC.
60	Santander	Tona	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL EL ALIZAL	NO INTERVENCIÓN	Según Resolución de la SED No. 03573 de 2023 de la ETC, la sede El Alizal se cerró temporalmente por falta de matrícula. El 15-nov. de acuerdo a la oportunidad brindada por el MEN respecto del cambio de sede, se solicita a ETC, Municipio y colegio los documentos para viabilidad jurídica y técnica de nueva sede. El 27-nov. se recibe documentación de la sede Alizal, la cual una vez revisada se envía a la rectora, municipio con copia a ETC solicitud de aclaración el 28-nov. Teniendo en cuenta que se remiten 2 CTL. Y se solicita aclaración de funcionamiento de la sede. EL 06-dic. Como no se ha recibido respuesta de las citadas entidades se solicitó ayuda en la gestión a German Gómez – MEN

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Sedes por viabilizar Jurídicamente (6)

ID MEN	Departamento	Municipio	IE	SEDE	RECOMENDACION PRELIMINAR	OBSERVACIONES ABOGADO A CARGO
35	Cesar	Agustín Codazzi	INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	NO INTERVENCIÓN	No se ha podido tener una respuesta por parte del rector, toda vez que se le ha requerido mediante correos electrónicos, mensajes por WhatsApp y llamadas telefónicas solicitando la información requerida, con el fin de lograr la viabilidad jurídica y técnica. Se ha reiterado solicitud de entrega de E.P. 197 / 1971 (20 y 28 de nov.), rector, sec. educación municipal y sec. educación departamental. Como no se ha recibido respuesta de las citadas entidades se solicitó ayuda en la gestión a Cristian Sua – MEN el 06/12/2023 James Quiroz de la SED - ETC.
59	Bolívar	Carmen de Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE MACAYEPOS	LAS PELOTAS	NO INTERVENCIÓN	En atención a la instrucción impartida el 28 de septiembre por el MEN, los dias 29 de septiembre, 18 de octubre se solicitó al rector de la institución lo siguiente: 1. Certificación o acto administrativo mediante el cual la Secretaría Departamental de Educación como entidad territorial certificada, autorizó el traslado de la matrícula educativa a la nueva sede. 2. El código DANE de esta nueva sede e información de si la sede se encuentra funcionando; 3. Información de la gestión que ha realizado la administración municipal para obtener la titularidad del predio donde está funcionando la sede educativa. Esta misma solicitud se realizó a la administración municipal el 30-oct y 2-nov. En llamada el rector informo que la distancia entre las dos sedes es de 3 a 4 km aprox. Se adelanto gestión con la ETC, mediante correos remitidos el 15 y 23-nov. No se ha recibido respuesta

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Sedes viables Jurídicamente (4)

ID MEN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	DESCRIPCION
8	Valle Del Cauca	Buenaventura	JAIME ROOCK	SAGRADO CORAZON DE JESUS	La rectora de la institución educativa, remite decreto de sana posesión suscrito por el Alcalde municipal, el cual es viable jurídicamente. Se incluye en el GRUPO 3 para ejecución
13	Valle Del Cauca	Florida	INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS	INSTITUTO LAS AMERICAS	El rector de la institución educativa, remite decreto de sana posesión suscrito por el Alcalde municipal, el cual es viable jurídicamente. Se incluye en el GRUPO 3 para ejecución
49	Putumayo	San Miguel	INST ETNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTATKIT KAMNA KAN TATKIT	AWA MAKNA - UNIÓN LA DORADA	La rectora de la institución educativa, remite decreto de sana posesión suscrito por el Alcalde municipal, el cual es viable jurídicamente. Se incluye en el GRUPO 1 para ejecución
63	Cauca	Puerto Tejada	I.E. SAN PEDRO CLAVER	SEDE PRINCIPAL	La rectora de la institución educativa, remite decreto de sana posesión suscrito por el Alcalde municipal, el cual es viable jurídicamente. Se incluye en el GRUPO 3 para ejecución

Caso Especial

ID MEN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	DESCRIPCION
46	Chocó	Lloró	CENTRO EDUCATIVO BORAUDO	SEDE PRINCIPAL	Con relación a la presente sede educativa, municipio de Lloró, inicialmente el predio de la sede es revisado y aprobado (Viabilizado Jurídicamente), sin embargo este predio presenta afectación por inundación. Se encuentra incluida en ejecución del Grupo 4 Ante esto, se postula por el rector nuevo predio en el corregimiento de Boraudo – Lloró en el cual se reubicara la sede. Sobre este nuevo predio se revisa documentación predial y se valida jurídicamente

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia

(46) INSTITUCION EDUCATIVA BORAUDO - SEDE: BORAUDO - SEDE PRINCIPAL


PREDIO:


- Terreno ubicado fuera del perímetro urbano del municipio de Lloró, en el PARAJE DE BORAUDO, identificado con la Matricula inmobiliaria N° 180-46424, el cual tiene una extensión de cinco (5) Hectáreas más 020 M2
- TITULARIDAD: Municipio de Lloró
- CERRAMIENTO / SEGURIDAD: En la actualidad el lote no cuenta con ningún cerramiento
- ACCESIBILIDAD: Terrestre y fluvial







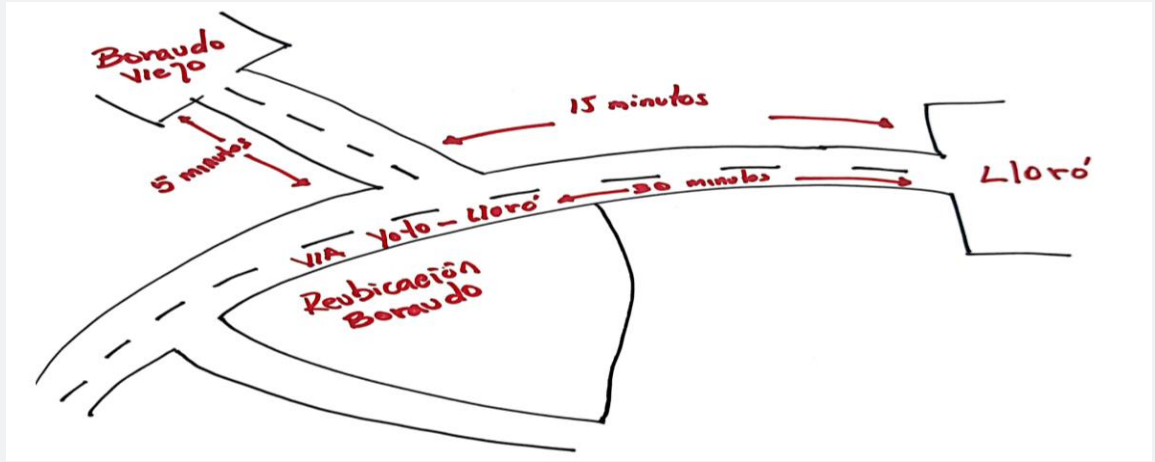

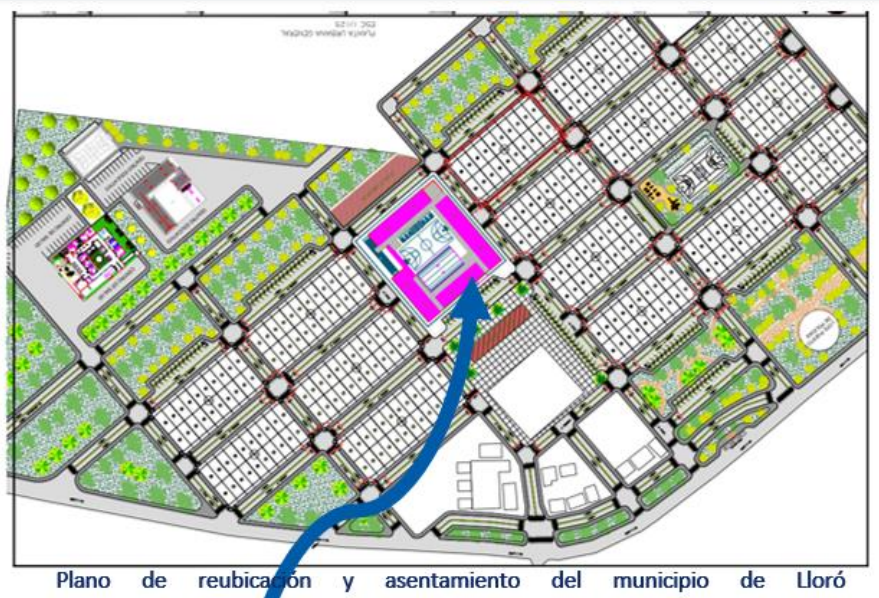

Plano de reubicación y asentamiento del municipio de Lloró



Estado actual de ubicación para la construcción de la Institución Educativa BORAUDÓ – SEDE PRINCIPAL

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia

(46) INSTITUCION EDUCATIVA BORAUDO - SEDE: BORAUDO - SEDE PRINCIPAL

SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA: El servicio lo presta la empresa DISPAC

ALCANTARILLADO: IE no cuenta con este servicio

ACUEDUCTO: IE no cuenta con este servicio

GAS: IE no cuenta con este servicio

TELECOMUNICACIONES: Servicio de Internet con la empresa CLARO

INSTITUCION EDUCATIVA

- SEDE / COD DANE: CE BORAUDO - SEDE PRINCIPAL - 227413000011
- MATRICULA: 226 según SIMAT del 14 de Agosto del 2023
- JORNADA EDUCATIVA / PROGRAMA ACADEMICO: MAÑANA, TARDE, NOCTURNA, FIN DE SEMANA, ÚNICA

PRESTACION DEL SERVICIO ACTUAL / DESCRIPCION: El servicio se está prestando en 10 casas prestadas por la comunidad, en regular estado sin condiciones para ejecutar la labor, escaso mobiliario se perdió todo en las múltiples inundaciones tales como (computadores, TV, etc.)





Gobierno pone en marcha la construcción del primer reasentamiento de la Colombia Profunda que busca beneficiar el corregimiento de Boraudo

Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. Más información

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Sedes viables Jurídicamente (53)

ID MEN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE
1	Chocó	Unguía	IE ALCIDES FERNANDEZ	IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL
2	Nariño	Roberto Payán(San José)	INSTITUCION EDUCATIVA PUMBI LAS LAJAS	SEDE 11 FATIMA
3	Cauca	Suárez	CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL SATH FXINXI DXI´J	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES
4	Guajira	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA	AIPIR
5	Guaviare	San José Del Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER	DIVINO NIÑO
6	Risaralda	Pueblo Rico	IE DACHI DADA KERA	SE BICHUBARA
7	Cauca	El Tambo	I.E. LA PAZ	LA PAZ (sede principal)
8	Valle Del Cauca	Buenaventura	JAIME ROOCK	SAGRADO CORAZON DE JESUS
9	Putumayo	Puerto Leguízamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX ALTO AGUA BLANCA
11	Guajira	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	ALMIRANTE PADILLA
12	Bolívar	Magangué	INST EDUC COMUNAL DE VERSALLES	ILUSION
13	Valle Del Cauca	Florida	INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS	INSTITUTO LAS AMERICAS
14	Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3	SEDE MARIA EUGENIA
15	Sucre	San Marcos	INST EDUC SAN JOSE	INST EDUC SAN JOSE
16	Cauca	López(Micay)	I.E. PABLO VI	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)
18	Bolívar	Achí	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE RIO NUEVO	I.E. DE RIO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
19	Antioquia	Santa Bárbara	I. E. EL GUAYABO	I. E. EL GUAYABO
20	Chocó	Itsmina	IE PUERTO SALAZAR	IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL
21	Guajira	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU
22	Cauca	Buenos Aires	I.E. MAZAMORRERO	MAZAMORRERO (sede principal)
23	Sucre	San Benito Abad	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	SEDE PRINCIPAL LA CEIBA
24	Sucre	Sucre	INST EDUC JOSE MARIA CORDOBA	CENTRO EDUCATIVO ARBOLEDA
25	Cauca	Balboa	C.E. CAMPO BELLO ALTO	BUENAVISTA
26	Antioquia	Ituango	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA	LA LOMITA
27	Chocó	Medio Atrato	CE BOCA DE BEBARA	SEDE VILLA DE BEBARA
28	Córdoba	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	SAN LUIS
29	Sucre	Guaranda	I.E. GAVALDÁ	EL JARDÍN
30	Chocó	Bojayá (Bellavista)	IE CESAR CONTO	SEDE LA BOBA
31	Caquetá	Florencia	IE RURAL REMOLINO ALTO ORTEGUAZA	RAMOS
32	Chocó	Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL
36	Bolívar	Cantagallo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ	I.E.T.I. Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ - SEDE PRINCIPAL
37	Cauca	Santander De Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA LIMBANIA VELASCO	LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal)
38	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA	VILLA CORELCA
39	Magdalena	Aracataca	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	COL JOHN F KENNEDY
41	Chocó	Condoto	IE MARIA AUXILIADORA	SEDE ARCO
42	Magdalena	Fundación	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	CENT EDUC 16 DE JULIO
43	Antioquia	Turbo	I.E. SAN MARTIN DE PORRES	E.U. GONZALO MEJIA
44	Antioquia	Tarazá	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	LAS PALMAS
46	Chocó	Lloró	CE BORAUDO	CE BORAUDO - SEDE PRINCIPAL
47	Chocó	Quibdó	IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ	SEDE MIS ESFUERZOS
48	Chocó	Bajo Baudó (Pizarro)	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL
49	Putumayo	San Miguel	INST ETNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTATKIT KAMNA KAN TATKIT	AWA MAKNA - UNIÓN LA DORADA
50	Chocó	Río Iró	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL
51	Chocó	Río Quito	IE ANTONIO ANGLES DE SAN ISIDRO	SEDE LA SOLEDAD
52	Chocó	Tadó	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	SEDE SIMON BOLIVAR
53	Cauca	Argelia	CENTRO EDUCATIVO LA PRIMAVERA	LA PRIMAVERA (sede principal)
54	Cesar	Manaure Balcon Dl Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	SEDE SABANAS DE LEON
55	Antioquia	San Pedro De Urabá	C. E. R. BETANIA	C. E. R. SAN EMIGDIO
56	Antioquia	Segovia	I. E. LIBORIO BATALLER	C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA
57	Bolívar	San Jacinto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAISO	SAN JOSE DE MORENA ABAJO
58	Antioquia	Valdivia	I. E. VALDIVIA	C. E. R. SANTA INES
61	Cesar	Bosconia	INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO	INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO
62	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia

Proyección Grupos de Contratación

SUPERVISOR	GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR ASIGNADO O+I	TOTAL POR GRUPO	EXP PROPONENTE	AREA CUBIERTA TOTAL (M2)	OBRA	ESTADO	INTERVENTORIA	ESTADO	ABOGADO DERIVADA
Marcela Peña	1	Caquetá	Florencia	$ 473.017.980	$ 1.892.071.921,08	1 Y 0,5	1.084,70	RADICADO	Enviado a Marcela Peña para ajuste respecto de la última versión. 05.12.23.	RADICADO	Enviado a Marcela Peña para ajuste respecto de la última versión. 05.12.23.	SEBASTIAN
		Putumayo	Puerto Leguízamo	$ 473.017.980								
			San Miguel	$ 473.017.980								
		Guaviare	San José Del Guaviare	$ 473.017.980								
José Joaquín	2	Cauca	Argelia	$ 473.017.980	$ 2.365.089.901,35	1 Y 0,5	1.085,00	RADICADO	* RADICADO 27-10-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	RADICADO	* RADICADO 03-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	ANDREA
			Balboa	$ 473.017.980								
			El Tambo	$ 473.017.980								
			López(Micay)	$ 473.017.980								
		Nariño	Roberto Payán(San José)	$ 473.017.980								
Marcela Peña	3	Cauca	Buenos Aires	$ 473.017.980	$ 3.311.125.861,89	1 Y 0,5	1.726,00	RADICADO	* RADICADO 15-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	RADICADO	* RADICADO 15-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	ANDREA
			Puerto Tejada	$ 473.017.980								
			Santander De Quilichao	$ 473.017.980								
			Suárez	$ 473.017.980								
		Valle del cauca	Buenaventura	$ 473.017.980								
			Florida	$ 473.017.980								
		Chocó	Bajo Baudó(Pizarro)	$ 473.017.980								
Ismael Gonzalez	4	Chocó	Bojayá(Bellavista)	$ 473.017.980	$ 2.365.089.901,35	1 Y 0,5	1.084,70	RADICADO	* RADICADO 16/11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION. Se remitió a paula para la revisión técnica el 23/11/2023	RADICADO	* RADICADO 20/11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	DANIELA
			Lloró	$ 473.017.980								
			Medio Atrato	$ 473.017.980								
			Quibdó	$ 473.017.980								
			Río Quito	$ 473.017.980								
Ismael Gonzalez	5	Chocó	Condoto	$ 473.017.980	$ 2.838.107.881,62	1 Y 0,5	1.428,00	RADICADO	* RADICADO 27-10-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	RADICADO	* RADICADO 03-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	ANDREA
			Itsmina	$ 473.017.980								
			Medio Baudó	$ 473.017.980								
			Río Iró	$ 473.017.980								
			Tadó	$ 473.017.980								
		Risaralda	Pueblo Rico	$ 473.017.980								

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia

Proyección Grupos de Contratación

Supervisor	GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR ASIGNADO O+I	TOTAL POR GRUPO	EXP PROPONENTE	AREA CUBIERTA TOTAL (M2)	OBRA	ESTADO	INTERVENTORIA	ESTADO	ABOGADO DERIVADA
Eva Longas	**6**	**Antioquia**	Ituango	$ 473.017.980	$ 2.838.107.881,62	1 Y 0,5	1.427,50	RADICADO	* RADICADO 27-10-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	RADICADO	* RADICADO 02-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	NATALIA REYES
			Santa Bárbara	$ 473.017.980								
			Segovia	$ 473.017.980								
			Valdivia	$ 473.017.980								
		Bolívar	Cantagallo	$ 473.017.980								
		Santander	Puerto Wilches	$ 473.017.980								
Eva Longas	**7**	**Antioquia**	Turbo	$ 473.017.980	$ 2.838.107.881,62	1 Y 0,5	1.726,00	RADICADO	* RADICADO 14-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	RADICADO	* RADICADO 14-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	NATALIA REYES
			San Pedro De Urabá	$ 473.017.980								
		Chocó	Unguía	$ 473.017.980								
		Bolivar	Magangué	$ 473.017.980								
			San Jacinto	$ 473.017.980								
		Sucre	San Benito Abad	$ 473.017.980								
Jose Joaquin	**8**	**Bolívar**	Achí	$ 473.017.980	$ 2.838.107.881,62	1 Y 0,5	1.726,00	RADICADO	Enviado a Jose Joaquin Salazar para ajuste respecto de la última versión. 05.12.23.	RADICADO	Enviado a Jose Joaquin Salazar para ajuste respecto de la última versión. 05.12.23.	SEBASTIAN
		Córdoba	Ayapel	$ 473.017.980								
		Sucre (*)	Guaranda	$ 473.017.980								
			San Marcos	$ 473.017.980								
			Sucre	$ 473.017.980								
		Antioquia	Tarazá	$ 473.017.980								
Jose Joaquin	**9**	Cesar	Bosconia	$ 473.017.980	$ 2.365.089,901,35	1 Y 0,5	1.427.5	RADICADO	* RADICADO 01-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	RADICADO	* RADICADO 03-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION. Devuelto el 3/11/2023. Está en revisión del área técnica la obra e interventoría	DANIELA
			Manaure Balcon Dl Cesar	$ 473.017.980								
			Valledupar	$ 473.017.980								
		Magdalena	Aracataca	$ 473.017.980								
			Fundación	$ 473.017.980								
Ismael Gonzalez	10	Guajira	Maicao	$ 473.017.980	$ 1.892.071.921,08	1 Y 0,5	1.027,60	RADICADO	* RADICADO 02-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION	RADICADO	* RADICADO 03-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION. Devuelto el 3/11/2023. Está en revisión del área técnica la obra e interventoría	DANIELA
			Manaure	$ 473.017.980								
			Riohacha	$ 473.017.980								
			Uribia	$ 473.017.980								

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	SOACHA - TORRENTES	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	• Se remitió comunicado 2202352011869 del 7 de diciembre de 2023, con la trazabilidad de las acciones realizadas, así como de lo encontrado en la información suministrada por parte del Municipio, quedando pendiente la definición de la continuidad de los dos proyectos y proceder con las gestiones correspondientes con la estructuración de los procesos. • Se encuentra pendiente la viabilidad técnica en revisión documentación entregada el pasado jueves ya se cuenta con viabilidad jurídica
2	SOACHA - CIUDAD VERDE	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	• Se remitió comunicado 2202352011869 del 7 de diciembre de 2023, con la trazabilidad de las acciones realizadas, así como de lo encontrado en la información suministrada por parte del Municipio, quedando pendiente la definición de la continuidad de los dos proyectos y proceder con las gestiones correspondientes con la estructuración de los procesos. • Se encuentra pendiente la viabilidad técnica en revisión documentación entregada el pasado jueves ya se cuenta con viabilidad jurídica
ID	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
3	MANIZALES	CALDAS	Cuenta con diseños	Se presentan observaciones a la licencia la cual se encuentra en subsanación del Municipio Referente a la viabilidad jurídica es viable en proceso de expedición de ficha Respecto a la viabilidad técnica el municipio remite la información pendiente la cual se encuentra en revisión. Se ha requerido al municipio la solicitud del concepto Costo/Beneficio por la actividad de reforzamiento y construcción obra nueva a la espera de respuesta. Se encuentra en proceso oficio al MEN para informar la trazabilidad y las gestiones a adelantar sobre el proyecto.
4	PUERTO LEGUÍZAMO	PUTUMAYO	Sin diseños	Se han realizado diferentes requerimientos al municipio el último con fecha del 24 de noviembre mediante comunicado 2202352011214 El municipio remite información de manera parcial El municipio presenta discrepancia en el área ofertada para hacer el Colegio con diferencias que pasan de las 5Ha a las 8Ha por lo que se ha requerido mesas de trabajo con el fin de poder aclarar lo requerido a pesar de los distintos correos enviados Reunión para el 13 de diciembre con municipio Se remitió EP borrador al MEN el 24 de noviembre, se recibieron observaciones el 27 de noviembre, se atendieron y enviaron el mismo 27 de nov al MEN

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
5	CALDONO	CAUCA	Sin Diseños	• El 30 de noviembre de 2023 se realizó reunión con el municipio, la secretaría de educación municipal, departamental y el MEN, en donde se revisaron los temas relacionados con la medida cautelar que se evidenció en el certificado de tradición y la expedición de la resolución para el internado. • El municipio realizó la entrega de la Resolución 1786 del 11 de septiembre de 2012, para lo cual Findeter, conforme a dicha resolución, se encuentra realizando la elaboración de la ficha de la viabilidad jurídica y técnica, pese a que en el certificado de tradición y libertad aún aparece la anotación de la medida cautelar, por lo que es importante tener el acercamiento con la ANT, con el fin de realizar la actualización respectiva en el predio postulado. • Pendiente los trámites de la Resolución del internado.
6	QUIBDO - IE CARRASQUILLA	CHOCO	Sin Diseños	• Pendiente la entrega del acta sin número del 29 de enero de 2015, por medio de la cual se realizó la CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES LOTE DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL, CONFORME LA ANOTACION No. 29 del Folio de Matricula Inmobiliaria 180-3351 • El municipio manifiesta que se encuentra recolectando la información técnica y jurídica para la respectiva viabilidad.
7	QUIBDO - IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	CHOCO	Sin Diseños	• Pendiente la entrega de aclaración de la titularidad del predio, el área y la documentación correspondiente toda vez que se relaciona el predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 180-24638, que corresponde al Lote MZ A LT 1 con un área de 84 Mts, cuyo certificado de tradición se anexa, y de igual manera se adjunta un avalúo de un predio con un área de 4.708 M2, con folio de matrícula inmobiliaria No, 180-2810, cual está errado y el área no corresponde. • El municipio manifiesta que se encuentra recolectando la información técnica y jurídica para la respectiva viabilidad.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
8	URIBIA - NAZARETH	LA GUAJIRA	Sin reporte	• **Pendiente** - Incluido para adicionar al contrato 4762508 MEN
9	CATATUMBO – EL TARRA	NORTE DE SANTANDER	Diseños en proceso (nivel anteproyecto)	• Se llevan a cabo mesas de trabajo con FondoPaz los jueves 2:00 p.m. para avanzar en la verificación de componentes • Se cuenta con carpeta donde reposan las diferentes observaciones realizadas como ultimo compromiso se cuenta con generar nuevas propuestas en la distribución de la cocina con el fin de generar un cumplimiento a las Normas • El MEN informa que el Colegio prestará Básica Primaria y Básica Media, el preescolar se realizará de manera independiente en la sede bracitos, este último **requiere de un análisis técnico pendiente por definir por parte del MEN** la suerte de este nuevo espacio, en el entendido que sus servicios deben prestarse de manera independiente a los servicios que proporcione el Colegio • En la última reunión se citó a la Gobernación y Municipio para continuar con la documentación necesaria para la viabilidad técnica y jurídica del Lote

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

16 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 102,346

20 Proyectos
77 Intervenciones en IE

1	Ibague – Tolima	**IE JOSÉ ANTONIO RICAURTE** $ 20,000,000,000,00	• 1 proceso obra: Radicado contratación • 1 proceso interventoría: Radicado JCD • Prórroga de la LC expedida 19/10/2023, pago causado 30/11/2023 • Viabilidad jurídica: 13/09/2023 • Se suscribirá convenio interadministrativo con el Municipio de Ibagué (mesa de trabajo 24/11/2023)
2	San Jose del Palmar – Choco	**IE SAN JOSE** $ 15,000,000,000,00	• 1 proceso obra: Radicado contratación • 1 proceso interventoría: Radicado JCD • Viabilidad jurídica: 10/10/2023
3	Soacha – C/marca	**IE EUGENIO DIAZ SEDE PPAL "CHARQUITO"** $ 13,066,299,432.00	• Proceso Obra: 2 Habilitados 3 en subsanación hasta el 12/12. • Proceso intv: 6 habilitados. Informe económico en traslado hasta el 11/12. • Adjudicación 20/12
4	Sedes Bahía Solano	**SEDES EDUCATIVAS RURALES INDÍGENAS DE EL BRAZO, DOTOMÁ, BOROBORO Y DUMÁ, DEL PUEBLO EMBERA DOBIDA.** $1,500 millones	Estas sedes van a ser atendidas por el contrato de Cumbre Agraria. Quedando por ahora disponible esta atención y recurso **Se atiende por la línea de mejoramientos**

PROYECTOS ESTRATEGICOS

16 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 102,346

20 Proyectos
77 Intervenciones en IE

5	Risaralda	21 Sedes Autoridades Pueblos Embera $11,024,565,520.55 • 2 procesos obra • 2 procesos Interventoría	Sedes priorizadas por el MEN el 05/12, Estructurados EP con modelo de mejoramiento. Viabilidades Jurídicas 15. En atención de observaciones a documentación jurídica de lasa demás.
6	Litoral de San Juan, Chocó	**CONDOTO,** **LITORAL DE SAN JUAN,** **ISTMINA** **MEDIO SAN JUAN** $ 4,500,000,000.00 SON 30 SEDES : 19 afros; 11 indígenas • 2 procesos obra • 2 procesos Interventoría	Pendiente priorización por parte del MEN. Se atiende con modelo de Mejoramientos. 6 sedes indígenas viabilizadas jurídicamente (Pendiente 5) Sedes Afro no existe ninguna viable jurídicamente.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

16 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 102,346

20 Proyectos
77 Intervenciones en IE

7	Olaya Herrera - Nariño	**ENCUENTROS SANQUIANGA** **6 Sedes** $ 1,440,000,000,00	**IE. Rurales: 4 2 IE. Urbanas** 1. IE. Las Marías: Viabilidad jurídica 08/11/2023 APROBADA 2. Merizalde Porvenir: Viabilidad jurídica 31/10/2023 APROBADA 3. San José Calabazal: En revisión Jurídica 07/11/2023 4. Agropecuario Río Sanquianga: En revisión Jurídica 07/11/2023 5. IDELPA En revisión Jurídica 09/11/2023 6. Inmaculada: En revisión Jurídica 07/11/2023
8		**ENCUENTROS SANQUIANGA** **2 Sedes** $ 360,000,000,00	Institución Educativa del Litoral Pacífico -IDELPA: **2 sedes Rurales** **7.** Vívora Paraiso: En revisión Jurídica 09/11/2023 **8.** Tórtola: En revisión Jurídica 08/11/2023 **Se realizan visitas técnicas de viabilización entre el 28/11 al 01/12. en elaboración de las fichas técnicas y presentación de informa de resultados para priorización y validación.** **Se solicita información predial para viabilización jurídica.** **Posteriormente se iniciara elaboración EP**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

16 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 102,346

20 Proyectos
77 Intervenciones en IE

9	Mercaderes - Cauca	**CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS** $ 5,839,076,493.00	• Contacto con el Alcalde y el rector del CE. • 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: EP en Estructuración y perfeccionamiento • Viabilidad jurídica: 26/09/2023 • PPT diseño $6.269.907.795, recursos pendientes por asignar $430.831.302,00
10	Totoró - Cauca	**IE PUEBLO TOTOREZ SEDE BETANIA** $ 2,695,988,000.00	• 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: radicado en jefatura de contratación, en revisión conjunta para radicación a dirección de contratación. • La visita la realizará el contratista, • Viabilidad jurídica: 23/10/2023 • Se cuenta con la totalidad de los estudios y diseños.
11	Pueblo Bello - Cesar	**Establecimientos Educativos en la zona rural del Municipio de Pueblo Bello** $ 3,356,319,893.00	Aulas digitales multifuncionales Pendiente definición de alcance y sedes a intervenir
12	Comunidad Indígena Kogüi - Cesar	**Internado de la Comunidad indígena kogui** $ 4,500,000,000.00	Mejoramiento, ampliación y dotación de la infraestructura educativa Pendiente definición de alcance y sedes a intervenir
13	IE Rurales –San Juan del Cesar - La Guajira	**Instituciones Educativas Rurales del Municipio de San Juan del Cesar** $3,665,720,724,00	Aulas digitales multifuncionales Pendiente definición de alcance y sedes a intervenir

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

16 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 102,346

20 Proyectos
77 Intervenciones en IE

14	Colon - Nariño	**IE AGROPECUARIA SAN CARLOS** $6,500,586,706,00	• Viabilidad jurídica: 30/10/2023 APROBADA • 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: EP en Estructuración y perfeccionamiento • La visita técnica se realizó entre el 12 y el 14 de abril de 2023 por parte del MEN. • En revisión de documentación técnica para terminar elaboración de EP.
15	Caimito - Sucre	**IE SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL** $ 3,857,427,662,00	• La visita técnica se realizó el 13/09/2023 • Viabilidad técnica: 13/09/2023 • Viabilidad jurídica: 18/10/2023 • Si cuenta con Estudios y Diseños. • 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: radicado en jefatura de contratación, en revisión conjunta para radicación a dirección de contratación.
16	Huila	**Instituciones educativas indígenas del CRIHU** $ 1,010,850,000,00	• Valor y sedes definidas por el MEN. • 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: EP en Estructuración y perfeccionamiento bajo el modelo de la línea de mejoramientos.
17	Quibdo - Choco	**IE Carrasquilla e IE Santo Domingo** $ 320,000,000.00	**Se atiende por la línea de Consultorías.**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

16 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 102.346

20 Proyectos
77 Intervenciones en IE

18	B/ventura – Valle del Cauca	**Infraestructura Educativa - Mesas de Trabajo con la ETC de Buenaventura** $ 4,660,000,000.00	De las 15 sedes inicialmente focalizadas, se tiene previsto abordarlas de la siguiente manera: • 3 sedes se encuentran en la línea de Mejoramientos • 12 sedes se encuentran en la Línea de Estratégicos. 1. I.E. Antonio Nariño sede La Nueva Colombia. 2. I.E. Atanasio Girardot sede Atanasio Girardot. 3. I.E. Francisco Javier Cisneros sede La Gran Colombia. 4. IE Francisco Javier Cisneros sede Héctor Epalza Quintero. 5. I.E. Agropecuaria José María Córdoba sede José María Córdoba. 6. I.E. Nonam sede San Juan Bautista. 7. I.E. Jaime Roock sede Jaime Roock 8. I.E. José María Córdoba sede San Cipriano. 9. I.E. José Ramón Bejarano sede La Comuna. 10. I.E. Nonam sede Nonam 11. I.E. Simón Bolívar sede Granadinos. 12. I.E. Comunidad Indigena de Santa Rosa de Guayacán. Se realiza visita a las sedes entre el 27/11 y el 02/12. las sedes 6, 10 y 12 no pudieron ser visitadas por paro armado en la zona. Se solicita información predial a todas las sedes. En elaboración de las fichas técnicas y proceso de viabilidad jurídica.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

16 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 102.346

20 Proyectos
77 Intervenciones en IE

19	Cartagena - Bolívar	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARTEL** (Sin Recursos)	• Se realizó visita técnica el 12/10/2023 en compañía de la secretaria de educación de Cartagena, la Rectora de la Institución Educativa y su equipo de apoyo técnico, con el fin de realizar el diagnóstico y viabilidad de intervención de la infraestructura existente. • La intervención consiste en realizar las obras de mejoramiento a la infraestructura existente en áreas de: comedores, biblioteca, restaurante, biblioteca y salas de informática. No existe aun presupuesto asignado. • Está pendiente recepción de la documentación solicitada a la secretaria de Educación de Cartagena, para poder dar cierre a la construcción de las viabilidades jurídica y técnicas construidas a partir de la visita.
20	Villa Rica - Cauca	**I.E. Técnico Senón Fabio Villegas sede Principal** $ 1,230,000,000.00	Sede priorizada el 15/11 por valor de $1,230,000,000

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CCOM-FO-001 V17 / 19-May-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

FOTO: Pueblo Kankuamo

ISO 27001 Certified
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
