

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.5090635 DE 2023 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Vicepresidencia Técnica

17 de noviembre de 2023

Comprometidos con Colombia

CCOM-FO-001 V17 / 19-May-2023 / Clasificada

CONVENIO CO1.PCCNTR.5090635 DE 2023

No. CONTRATO	**CO1.PCCNTR.5090635**	
OBJETO	ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	
VALOR	$ 294,145,282,376,00 ($ 278,399,202,376 Proyectos y $ 15,746,080,000 para AT).	
CLIENTE	Ministerio de Educación Nacional – MEN	
PLAZO	18 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. - Orden de inicio: 29 de junio 2023 Terminación: 28 de febrero de 2025	
UBICACIÓN	- Mejoramiento sedes banco de provectos - Mejoramiento sedes emergencia - Diseños Prioritários MEN - Proyectos estratégicos	- Líneas Estratégicas
ESTADO	En ejecución	

Contrato 5090635 | MEN

OBJETO	**ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.**
ALCANCE PROGRAMA	- Mejoramiento sedes banco de proyectos - Mejoramiento sedes emergencia - Diseños Prioritarios MEN - Proyectos estratégicos
TIEMPO	**18** meses Fecha inicio: 29/06/2023 Fecha Fin: 28/02/2025
$	**294,145** Millones Ejecución: **$ 278,399** Millones Asistencia Técnica: **$ 15,,746** Millones
ESTADO ACTUAL	✓ Patrimonio Autónomo - **29/06/2023** • Manual Operativo Aprobado – **14/08/2023**. • Actualmente se encuentra en revisión documental y elaboración los Estudios Previos de la contratación derivada.

18/06/2023
Suscripción Contrato Interadministrativo

29/06/2023
Inicio Contrato Interadministrativo

Octubre a Diciembre 2023
Publicación Contratos Derivados

Noviembre a diciembre 2023
Adjudicación Contratos Derivados

Diciembre 2023 a enero 2024
Inicio Contratos Derivados

31/12/2024
Terminación Contrato Obra

28/02/2025
Terminación Contrato Interventoría

28/02/2025
Terminación Contrato Interadministrativo

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Consolidado de sedes focalizadas para el contrato "Administrar recursos y brindar asistencia técnica para la atención de proyectos de infraestructura y dotación de establecimientos educativos que sean priorizados por el MEN"	
Descripción	**No. de sedes**
1) Sedes del banco de proyectos de la convocatoria MEN	390
2)Sedes obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	63
3)Sedes de consultorías de proyectos de infraestructura educativa	89
5)Sedes para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructuras educativa	79
Sedes Estimadas a atender	**609**

Nota: En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia ,estás pueden ser reemplazadas de acuerdo al orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario.

1) Recurso disponible para obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN	$116.450.000.000
2)Recurso disponible para obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	$29.800.132.757
3)Recurso disponible para diseños de proyectos de infraestructura educativa	$29.143.085.188
4)Recurso disponible para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura educativa	$103.005.984.431
Subtotal recursos para la ejecución de las obras	**$278.399.202.376**
a) Viabilidades (asistencia técnica)	$1.125.549.600
b) Asistencia Técnica y administración de recursos	$14.620.530.400
Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (5.66%)	**$15.746.080.000**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**$294.145.282.376**

RESUMEN AVANCE EN CADA LÍNEA

	SEDES PRIORIZADAS	OBSERVACIONES
LÍNEA MEJORAMIENTO	**390**	**Viabilizadas 150 jurídicamente y se iniciara proceso de contratación y subsanes se efectuarán en desarrollo del proceso y diagnóstico de intervenciones.**
LÍNEA EMERGENCIA	**63**	**50 sedes viables jurídicamente 8 sedes por viabilizar jurídicamente 5 sedes no viables técnicamente**
LÍNEA BANCO DE DISEÑOS	**9 Proyectos Priorizados**	**5 REUNIONES CON EQUIPO MEN**
LÍNEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	**18 Proyectos**	**12 Proyectos con información 2 Proyectos Atendidos con otras líneas 4 Proyectos sin Información.**



Grupos de contratación Mejoramientos

Grupos de contratación Mejoramientos

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	OBRAS DE MEJOPRAMIENTO	INTERVENTORIA	PLAZO	AIU	EXP PROPONENTE	AREA CUBIERTA TOTAL (M2)
Grupo 1	Rioblanco	Tolima	16	32	$ 6.061.878.367,00	$ 338.617.160,00	4,00	25,12%	1,5 Y 0,7	15400
	Chaparral	Tolima	16							
Grupo 2	Tame	Arauca	20	20	$ 5.258.435.054,00	$ 317.884.530,00	4,00	$ 26,38	1 Y 0,5	9625
Grupo 3	Saravena	Arauca	4	11					1 Y 0,5	5300
	Fortul	Arauca	3		$ 3.409.435.611,00	$ 225.817.580,00	4,00	29,32%		
	Hato Corozal	Casanare	4							
Grupo 4	Timbiquí	Cauca	10	10	$ 1.768.487.439,00	$ 193.479.780,00	4,00	39,06%	1 Y 0,5	1227
Grupo 5	Morales	Cauca	8	13	$ 2.632.463.934,00	$ 205.729.040,00	4,00	31,66%	1 Y 0,5	5195
	Piendamó	Cauca	5							
Grupo 6	Suárez	Cauca	7	14	$ 2.470.653.628,00	$ 208.165.040,00	4,00	32,71%	1 Y 0,5	3325
	Buenos Aires	Cauca	7							



Grupos de contratación Mejoramientos

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	OBRAS DE MEJOPRAMIENTO	INTERVENTORIA	PLAZO	AIU	EXP PROPONENTE	AREA CUBIERTA TOTAL (M2)
Grupo 7	Lopez	Cauca	16	16	$ 3.132.864.242,00	$ 232.542.620,00	4,00	29,13 %	1 Y 0,5	1728
Grupo 8	Bajo Baudó	Chocó	3	17					1 Y 0,5	8200
	Riosucio	Chocó	1		$ 3.459.276.447,00	$ 264.784.630,00	4,00	29,21 %		
	Quibdó	Chocó	13							
Grupo 9	La Jagua De Ibirico	Cesar	8	25	$ 6.164.756.229,00	$ 308.296.030,00	4,00	24,96 %	1,5 Y 0,7	1443
	Curumaní	Cesar	7							
	Chiriguana	Cesar	5							
	Berrecil	Cesar	5							
Grupo 10	Valencia	Córdoba	15	18	$ 6.074.469.090,00	$ 319.129.160,00	4,00	25,07 %	1,5 Y 0,7	10287
	San Pedro de Urabá	Antioquia	3							
Grupo 11	Tierralta	Córdoba	23	23	$ 9.359.559.040,00	$ 420.616.710,00	5,00	24,21 %	1,5 Y 0,7	15277
Grupo 12	La Tola	Nariño	6	13	$ 2.622.772.452,00	$ 205.729.040,00	4,00	31,72 %	1 Y 0,5	936
	Santa Barbara	Nariño	6							
	Mosquera	Nariño	1							



Grupos de contratación en proceso de publicación Mejoramientos

Grupo 13	Barbacoas	Nariño	15	15
Grupo 14	Puerto Asís	Putumayo	10	21
	Valle Guamez	Putumayo	5	
	San Miguel	Putumayo	4	
	Puerto Caicedo	Putumayo	2	
Grupo 15	Tibú	Norte de Santander	9	16
	El Tarra	Norte de Santander	7	
Grupo 16	El Carmen	Norte de Santander	5	14
	Convención	Norte de Santander	9	
Grupo 17	Teorama	Norte de Santander	5	14
	San Calixto	Norte de Santander	4	
	Hacarí	Norte de Santander	5	
Grupo 18	Sardinata	Norte de Santander	16	16
Grupo 19	Segovia	Antioquia	4	12
	Nechí	Antioquia	8	
Grupo 20	Quinchia	Risaralda	3	5
	Pueblo Rico	Risaralda	2	
Grupo 21	Uribia	La Guajira	19	19
Grupo 22	Dibulla	La Guajira	6	6
Grupo 23	Maicao	La Guajira	21	21
Grupo 24	El Retorno	Guaviare	4	16
	San José Del Guaviare	Guaviare	8	
	Calamar	Guaviare	2	
	San Vicente del Caguán	Caquetá	1	
	Uribe	Meta	1	
Grupo 25	Buenaventura	Valle del cauca	3	3
TOTAL DE SEDES ATENDER EN MEJORAMIENTOS			390	390

EMERGENCIA

8 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 29,800

63 Sedes a intervenir

Resumen Avance Verificación Técnica

SEDES LISTADO INICIAL (63)	
SEDES A INTERVENIR	58
SEDES NO INTERVENIDAS EN ESTE CI	5
TOTAL	63

Nota: Las dos sedes que no serán intervenidas en este contrato, es debido a que ya serán intervenidas por otro contrato o en su defecto por otras entidades territoriales.

Resumen Avance Verificación Predial

Resultados de verificación predial sobre 63 sedes institucionales

SEDES TOTAL	
SIN DOCUMENTOS	3*
POSIBLE VIABILIDAD	5**
NO VIABLE	0
VIABLES	**50**
TOTAL	58

* Sin Documentos:
- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:
- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia

Proyección Grupos de Contratación

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR ASIGNADO O+I	TOTAL POR GRUPO	EXP PROPONENTE	ESTADO
1	Caquetá	Florencia	$ 473.017.980	$ 2.365.089.901,35	1 Y 0,5	
	Putumayo	Puerto Asís	$ 473.017.980			
		Puerto Leguízamo	$ 473.017.980			
		San Miguel	$ 473.017.980			
	Guaviare	San José Del Guaviare	$ 473.017.980			
2	Cauca	Argelia	$ 473.017.980	$ 2.365.089.901,35	1 Y 0,5	* RADICADO 27-10-2023 JEFATURA DE CONTRATACION
		Balboa	$ 473.017.980			
		El Tambo	$ 473.017.980			
		López(Micay)	$ 473.017.980			
	Nariño	Roberto Payán(San José)	$ 473.017.980			
3	Cauca	Buenos Aires	$ 473.017.980	$ 3.311.125.861,89	1 Y 0,5	
		Puerto Tejada	$ 473.017.980			
		Santander De Quilichao	$ 473.017.980			
		Suárez	$ 473.017.980			
	Valle Del Cauca	Buenaventura	$ 473.017.980			
		Florida	$ 473.017.980			
	Chocó	Bajo Baudó(Pizarro)	$ 473.017.980			
4	Chocó	Bojayá(Bellavista)	$ 473.017.980	$ 2.365.089.901,35	1 Y 0,5	
		Lloró	$ 473.017.980			
		Medio Atrato	$ 473.017.980			
		Quibdó	$ 473.017.980			
		Río Quito	$ 473.017.980			
5	Chocó	Condoto	$ 473.017.980	$ 2.838.107.881,62	1 Y 0,5	* RADICADO 27-10-2023 JEFATURA DE CONTRATACION
		Itsmina	$ 473.017.980			
		Medio Baudó	$ 473.017.980			
		Río Iró	$ 473.017.980			
		Tadó	$ 473.017.980			
	Risaralda	Pueblo Rico	$ 473.017.980			

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia

Proyección Grupos de Contratación

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR ASIGNADO O+I	TOTAL POR GRUPO	EXP PROPONENTE	ESTADO
6	Antioquia	Ituango	$ 473.017.980	$ 2.838.107.881,62	1 Y 0,5	* RADICADO 27-10-2023 JEFATURA DE CONTRATACION
		Santa Bárbara	$ 473.017.980			
		Segovia	$ 473.017.980			
		Valdivia	$ 473.017.980			
	Bolívar	Cantagallo	$ 473.017.980			
	Santander	Puerto Wilches	$ 473.017.980			
7	Antioquia	Turbo	$ 473.017.980	$ 3.311.125.861,89	1 Y 0,5	
		San Pedro De Urabá	$ 473.017.980			
	Chocó	Unguía	$ 473.017.980			
	Bolívar	El Carmen De Bolívar	$ 473.017.980			
		Magangué	$ 473.017.980			
		San Jacinto	$ 473.017.980			
	Sucre	San Benito Abad	$ 473.017.980			
8	Bolívar	Achí	$ 473.017.980	$ 3.311.125.861,89	1 Y 0,5	
	Córdoba	Ayapel	$ 473.017.980			
	Sucre	Guaranda	$ 473.017.980			
		Majagual	$ 473.017.980			
		San Marcos	$ 473.017.980			
		Sucre	$ 473.017.980			
	Antioquia	Tarazá	$ 473.017.980			
9	Cesar	Agustín Codazzi	$ 473.017.980	$ 2.838.107.881,62	1 Y 0,5	* RADICADO 01-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION
		Bosconia	$ 473.017.980			
		Manaure Balcon Dl Cesar	$ 473.017.980			
		Valledupar	$ 473.017.980			
	Magdalena	Aracataca	$ 473.017.980			
		Fundación	$ 473.017.980			
10	Guajira	Maicao	$ 473.017.980	$ 1.892.071.921,08	1 Y 0,5	* RADICADO 02-11-2023 JEFATURA DE CONTRATACION
		Manaure	$ 473.017.980			
		Riohacha	$ 473.017.980			
		Uribia	$ 473.017.980			

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Sedes por viabilizar Jurídicamente (8)

ID MEN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	DESCRIPCION
8	Valle Del Cauca	Buenaventura	JAIME ROOCK	SAGRADO CORAZON DE JESUS	se realiza la solicitud de documentos por medio de correo electrónico, los días 05 de septiembre, 18 de septiembre y 02 de octubre y 01 de noviembre, en donde hasta el momento no tenemos respuesta por parte de la institución Educativa.
10	Putumayo	Puerto Asís	IE CIUDAD DE ASIS	COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS	se realiza la solicitud de documentos por medio de correo electrónico, los días 05 de septiembre, 18 de septiembre, 06 de octubre y 01 de noviembre, en donde hasta el momento no tenemos respuesta por parte de la institución Educativa, esta institución educativa tiene algo particular ya que como lo informo el secretario de educación del municipio, esta sede pertenece a la Diocesís de Sibundoy, por tal motivo no podría ser viable jurídicamente ya que pertenece a un particular, Findeter solicito la certificación de planeación municipal se mencione la situación, en donde no hemos tenido respuesta.
13	Valle Del Cauca	Florida	INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS	INSTITUTO LAS AMERICAS	se realiza la solicitud de documentos por medio de correo electrónico, los días 05 de septiembre,30 de octubre y 01 de noviembre, en donde hasta el momento no recibos dichos documentos, adicional el rector de esta sede educativa manifiesta que el predio de esta sede presenta una hipoteca la cual debe ser levantada por el municipio.
17	Sucre	Majagual	INSTITUCION EDUCATIVA LA SIERPITA	SEDE PRINCIPAL	de acuerdo a instrucciones impartida por el MEN, el 04/10/2023 se establece comunicación con el rector y este confirma que no se cuenta con un lote adicional en el que se pueda construir alguna solución provisional mientras se define la posibilidad de reubicación de la IE. Señala que el Municipio ha realizado gestiones para comprar un predio nuevo pero aún no se materializado la adquisición (costos muy elevados). Así mismo indicó que la Gobernación habría señalado que no están en capacidad de adquirir un predio nuevo.
46	Chocó	Lloró	CENTRO EDUCATIVO BORAUDO	SEDE PRINCIPAL	Con relación a la presente sede educativa, municipio de Lloró, nos permitimos manifestar que no se ha podido tener una respuesta por parte del rector, toda vez que se le ha requerido mediante correos electrónicos, mensajes por Whatsapp y llamadas telefonicas solicitando la información requerida, con el fin de lograr la viabilidad jurídica y técnica.
49	Putumayo	San Miguel	INST ETNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTATKIT KAMNA KAN TATKIT	AWA MAKNA - UNIÓN LA DORADA	se realiza la solicitud de documentos por medio de correo electrónico, los días 05 de septiembre, 02 octubre, 30 de octubre y 01 de noviembre de 2023, en donde hasta el momento no recibos dichos documentos, adicional la rectora de esta sede educativa manifiesta que el predio de esta sede no cuenta con la resolución de adjudicación a la comunidad indígena "AWA", por parte de la agencia nacional de tierras, la cual no sería viable jurídicamente.
59	Bolívar	Carmen de Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE MACAYEPOS	LAS PELOTAS	En atención a la instrucción impartida el 28 de septiembre por el MEN, los dias 29 de septiembre, 18 de octubre se solicitó al rector de la institución certificación o acto administrativo mediante el cual, la Secretaría Departamental de Educación como entidad territorial certificada, autorizó el traslado de la matrícula educativa a la nueva sede, el código DANE de esta nueva sede e información de si la sede se encuentra funcionando; así como información de la gestión ha realizado la administración municipal para obtener la titularidad del predio donde está funcionando la sede educativa. Esta misma solicitud se realizó a la administración municipal el 30 de octubre de 2023.
63	Cauca	Puerto Tejada	I.E. SAN PEDRO CLAVER	SEDE PRINCIPAL	se realiza la solicitud de documentos por medio de correo electrónico, los días 14,24,29 agosto y el 01 de noviembre del presente año, en donde hasta el momento no recibos dichos documentos, adicional el rector de esta sede educativa manifiesta que el predio de esta sede presenta una hipoteca la cual debe ser levantada por el municipio.

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Sedes viables Jurídicamente (50)

ID MEN	Departamento	Municipio	IE	SEDE	REVISIÓN PRELIMINAR	OBSERVACIONES ABOGADO A CARGO
1	Choco	Unguía	IE ALCIDES FERNANDEZ	SEDE PRINCIPAL	OK	VIABLE
2	Nariño	Roberto Payán(San José)	INSTITUCION EDUCATIVA PUMBI LAS LAJAS	SEDE 11 FATIMA	OK	VIABLE
3	Cauca	Suárez	CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL SATH FXINXI DXI´J	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES	OK	VIABLE
4	Guajira	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA	AIPIR	OK	VIABLE
5	Guaviare	San José Del Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER	DIVINO NIÑO	OK	VIABLE
6	Risaralda	Pueblo Rico	IE DACHI DADA KERA	SE BICHUBARA	OK	VIABLE
7	Cauca	El Tambo	I.E. LA PAZ	LA PAZ (sede principal)	OK	VIABLE
9	Putumayo	Puerto Leguízamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX ALTO AGUA BLANCA	OK	VIABLE
11	Guajira	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	ALMIRANTE PADILLA	OK	VIABLE
12	Bolívar	Magangué	INST EDUC COMUNAL DE VERSALLES	ILUSION	OK	VIABLE
14	Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3	SEDE MARIA EUGENIA	OK	VIABLE
15	Sucre	San Marcos	INST EDUC SAN JOSE	INST EDUC SAN JOSE	OK	VIABLE
16	Cauca	López(Micay)	I.E. PABLO VI	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)	OK	VIABLE
17	Sucre	Majagual	I.E. LA SIERPITA	I.E. LA SIERPITA - SEDE PRINCIPAL	OK	VIABLE
18	Bolívar	Achí	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE RIO NUEVO	I.E. DE RIO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	OK	VIABLE
19	Antioquia	Santa Bárbara	I. E. EL GUAYABO	I. E. EL GUAYABO	OK	VIABLE
20	Choco	Itsmina	IE PUERTO SALAZAR	SEDE PRINCIPAL	OK	VIABLE
21	Guajira	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	OK	VIABLE
22	Cauca	Buenos Aires	I.E. MAZAMORRERO	MAZAMORRERO (sede principal)	OK	VIABLE
23	Sucre	San Benito Abad	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	SEDE PRINCIPAL LA CEIBA	OK	VIABLE
24	Sucre	Sucre	INST EDUC JOSE MARIA CORDOBA	CENTRO EDUCATIVO ARBOLEDA	OK	VIABLE
25	Cauca	Balboa	C.E. CAMPO BELLO ALTO	BUENAVISTA	OK	VIABLE
26	Antioquia	Ituango	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA	LA LOMITA	OK	VIABLE
27	Choco	Medio Atrato	CE BOCA DE BEBARA	SEDE VILLA DE BEBARA	OK	VIABLE
28	Córdoba	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	SAN LUIS	OK	VIABLE
29	Sucre	Guaranda	I.E. GAVALDÁ	EL JARDÍN	OK	VIABLE
30	Choco	Bojayá(Bellavista)	IE CESAR CONTO	LA BOBA	OK	VIABLE
31	Caquetá	Florencia	IE RURAL REMOLINO ALTO ORTEGUAZA	RAMOS	OK	VIABLE
32	Choco	Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	SEDE PRINCIPAL	OK	VIABLE
36	Bolívar	Cantagallo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ	I.E.T.I. Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ - SEDES SINZONA Y SEDE PATICO BAJO	OK	VIABLE
37	Cauca	Santander De Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA LIMBANIA VELASCO	LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal)	OK	VIABLE
38	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA	VILLA CORELCA	OK	VIABLE
39	Magdalena	Aracataca	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	COL JOHN F KENNEDY	OK	VIABLE
41	Choco	Condoto	IE MARIA AUXILIADORA	SEDE ARCO	OK	VIABLE
42	Magdalena	Fundación	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	CENT EDUC 16 DE JULIO	OK	VIABLE
43	Antioquia	Turbo	I.E. SAN MARTIN DE PORRES	E.U. GONZALO MEJIA	OK	VIABLE
44	Antioquia	Tarazá	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	LAS PALMAS	OK	VIABLE
47	Choco	Quibdó	IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ	SEDE MIS ESFUERZOS	OK	VIABLE
48	Choco	Bajo Baudó(Pizarro)	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO	SEDE PRINCIPAL	OK	VIABLE
50	Choco	Río Iró	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO	SEDE PRINCIPAL	OK	VIABLE
51	Choco	Río Quito	IE ANTONIO ANGLES DE SAN ISIDRO	SEDE LA SOLEDAD	OK	VIABLE
52	Choco	Tadó	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	SEDE SIMON BOLIVAR	OK	VIABLE
53	Cauca	Argelia	CENTRO EDUCATIVO LA PRIMAVERA	LA PRIMAVERA (sede principal)	OK	VIABLE
54	Cesar	Manaure Balcon Dl Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	SEDE SABANAS DE LEON	OK	VIABLE
55	Antioquia	San Pedro De Urabá	C. E. R. BETANIA	C. E. R. SAN EMIGDIO	OK	VIABLE
56	Antioquia	Segovia	I. E. LIBORIO BATALLER	C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA	OK	VIABLE
57	Bolívar	San Jacinto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAISO	SAN JOSE DE MORENA ABAJO	OK	VIABLE
58	Antioquia	Valdivia	I. E. VALDIVIA	C. E. R. SANTA INES	OK	VIABLE
61	Cesar	Bosconia	INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO	INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO	OK	VIABLE
62	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	OK	VIABLE

Línea 2 - Mejoramiento En Sedes Afectadas Por Emergencia
Resumen Sedes No intervenidas Técnicamente (5)

ID MEN	Departamento	Municipio	IE	SEDE	REVISIÓN PRELIMINAR	OBSERVACIONES ABOGADO A CARGO
33	Cesar	San Diego	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES	SEDE EL JUNCAL ARRIBA	NO INTERVENCIÓN	Sede cerrada, el rector pide que se tenga en cuenta otra sede (Nuevas Flores).
34	Cesar	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO LOS ENCANTOS GUAIMARAL	SEDE LOS CAMPANARIOS	NO INTERVENCIÓN	EL RECTOR SOLICITA INTERVENCIÓN EN OTRA SEDE, YA QUE LA SEDE LOS CAMPANARIOS SE ENCUENTRA CERRADA, SIN EMBARGO, ENVIA DOS CERTIFICACIONES DE SANA POSESIÓN CON OTRAS SEDES: Caño Padilla Abajo y sede principal,
40	Magdalena	Ciénaga	INSTITUCION EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIASCOS	I.E. ENOC MENDOZA - SEDE PRINCIPAL	NO INTERVENCIÓN	NO INTERVENCIÓN / INTERVENIDA POR EL CONTRATO DE LLUVIAS
45	Antioquia	Anorí	I. E. ANORI	I. E. R. AMANDA POSADA	NO INTERVENCIÓN	NO INTERVENCIÓN / PRIORIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
60	Santander	Tona	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL EL ALIZAL	NO INTERVENCIÓN	ACTUALMENTE LA SEDE NO SE ENCUENTRA OPERANDO, DEBIDO A QUE SUS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SON LAS ADECUADAS

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

30 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

89 Proyectos / **9** Priorizados

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	SOACHA - TORRENTES	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	• Proyecto sobredimensionado en aproximadamente 4000m2 de más para esta tipología de proyectos • Proyecto con valor de m2 aproximadamente de $3.700.000.000 • Se solicito soporte de la contribución en términos de pedagogía y revaluación de la información para justificar estas mayores áreas a la fecha sin respuesta por parte del Municipio • El municipio no va a modificar el diseño / Proyecto cuenta con licencia del año 2023 • No se cuenta con un análisis costo beneficio teniendo en cuenta las condiciones del municipio (déficit) • Referente a las viabilidades del predio se cuenta con viabilidad jurídica • Referente a la viabilidad técnica sigue pendiente documentación referente a: Certificado IGAC, Paz y Salvo Valorización, Paz u Salvo servicios públicos, Certificación por parte del municipio referente a que el lote se encuentra saneado, boletín de nomenclatura y certificado de estrato entre otros. Adicional y teniendo en cuenta la presencia del Humedal Tierra Blanca se solicito concepto referente al aislamiento teniendo en cuenta las directrices de la CAR donde se requiere de 30m por lo que se requiere de las certificados de cumplimiento. Así mismo en lo referente a los diseños se requiere certificación del revisor independiente esto teniendo en cuenta que para proyectos con área construida mayor a 2000 m2 se requiere el certificación del revisor independiente. • Dentro de la revisión de diseños se evidencia falencias en la conexión vial
2	SOACHA - CIUDAD VERDE	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	• Proyecto sobredimensionado en aproximadamente 4000m2 de más para esta tipología de proyectos • Proyecto con valor de m2 aproximadamente de $4.200.000.000 • Se solicito soporte de la contribución en términos de pedagogía y revaluación de la información para justificar estas mayores áreas a la fecha sin respuesta por parte del Municipio • El municipio no va a modificar el diseño / Proyecto cuenta con licencia del año 2023 • No se cuenta con un análisis costo beneficio teniendo en cuenta las condiciones del municipio (déficit) • Referente a las viabilidades del predio se cuenta con viabilidad jurídica • Referente a la viabilidad técnica sigue pendiente documentación referente a: Certificado IGAC, Paz y Salvo Valorización, Paz u Salvo servicios públicos, Certificación por parte del municipio referente a que el lote se encuentra saneado, boletín de nomenclatura y certificado de estrato entre otros. Así mismo en lo referente a los diseños se requiere certificación del revisor independiente esto teniendo en cuenta que para proyectos con área construida mayor a 2000 m2 se requiere el certificación del revisor independiente.

CONSULTORIAS

30 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

89 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
3	MANIZALES	CALDAS	Cuenta con diseños	De acuerdo con visita realizada El proyecto implica la mejora estructural y la adaptación de dos edificios, específicamente los bloques D y E, en la institución educativa INEM Baldomero Sanín Cano, con la finalidad de atender a una población estimada de 960 estudiantes. A la fecha, el proyecto ha sido oficialmente radicado ante la Curaduría 2 de la ciudad de Manizales. Dicha entidad ha emitido observaciones, las cuales están siendo abordadas y corregidas por los responsables de los estudios y diseños. Se presentan observaciones a la licencia la cual se encuentra en subsanación del Municipio Referente a la viabilidad jurídica es viable en proceso de expedición de ficha Respecto a la viabilidad técnica el municipio remite la información pendiente la cual se encuentra en revisión. Se ha requerido al municipio la solicitud del concepto Costo/Beneficio por la actividad de reforzamiento y construcción obra nueva a la espera de respuesta.
4	PUERTO LEGUÍZAMO	PUTUMAYO	Sin diseños	Mediante comunicado 2202352010035 del 23 de octubre se realizó reiteración de entrega de información para obtener viabilidad técnica y jurídica. El 23 de octubre la Secretaría de Educación Municipal remite información parcial, la cual fue revisada en cuanto a su completitud, encontrando que hace falta el 64% de la requerida para poder realizar la viabilidad técnica del proyecto. Teniendo en cuenta la información pendiente, se realiza reiteración mediante correo del 2 de noviembre Referente a la viabilidad jurídica es viable en proceso de expedición de ficha

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

30 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

89 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
5	CALDONO	CAUCA	Sin Diseños	• Mediante oficio No. 2202352010288 del 27 de octubre de 2023 se realizó reiteración de entrega de información para obtener viabilidad técnica y jurídica. • Mediante correo electrónico del 31 de octubre de 2023 se informó que el Folio de matrícula inmobiliaria No.: 132-56939, que corresponde al predio denominado LOTE DE TERRENO "RESGUARDO DE PUEBLONUEVO", presenta anotación de medida cautelar de iniciación de diligencias administrativas de clarificación de la propiedad por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, por lo que se requirió el pronunciamiento dentro del procedimiento para acreditar la propiedad. • El 09 de noviembre de 2023 se realizó reunión con el municipio, la secretaría de educación municipal, departamental y el MEN, en donde se revisaron los temas relacionados con la medida cautelar que se evidenció en el certificado de tradición y la expedición de la resolución para el internado.
6	QUIBDO - IE CARRASQUILLA	CHOCO	Sin Diseños	• Mediante correo electrónico del 31 de octubre de 2023 se realizó la solicitud del acta sin número del 29 de enero de 2015, por medio de la cual se realizó la CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES LOTE DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL, CONFORME LA ANOTACION No. 29 del Folio de Matricula Inmobiliaria 180-3351 • El municipio manifiesta que se encuentra recolectando la información técnica y jurídica para la respectiva viabilidad.
7	QUIBDO - IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	CHOCO	Sin Diseños	• Mediante correo electrónico del 03 de noviembre de 2023 se realizó la solicitud de aclaración de la titularidad del predio, el área y la documentación correspondiente toda vez que se relaciona el predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 180-24638, que corresponde al Lote MZ A LT 1 con una área de 84 Mts, cuyo certificado de tradición se anexa, y de igual manera se adjunta un avalúo de un predio con un área de 4.708 M2, con folio de matrícula inmobiliaria No, 180-2810, cual está errado y el área no corresponde. • El municipio manifiesta que se encuentra recolectando la información técnica y jurídica para la respectiva viabilidad.

CONSULTORIAS

30 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

89 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
8	URIBIA - NAZARETH	LA GUAJIRA	Sin reporte	• **Pendiente** - por definición del predio por parte del MEN
9	CATATUMBO – EL TARRA	NORTE DE SANTANDER	Diseños en proceso (nivel anteproyecto)	• Se requirió información para iniciar con la viabilidad técnica y jurídica sin entrega hasta el momento, reiterada en las distintas mesas de trabajo con FondoPaz • Se han realizado mesas de trabajo con Fondo Paz para conocer el proyecto y presentar recomendaciones por parte de Findeter para tener en cuenta dentro del anteproyecto • Se recibe el 23 de octubre información del proyecto por parte de Fondo Paz • Se realiza mesa de trabajo el 8 de noviembre con MEN, Fondo Paz y Findeter donde se presentan observaciones a la información entregada • Dentro del a información entregada no se evidencia la inclusión de ambiente preescolar indicar de acuerdo con directriz del MVCT se deben contemplar los primeros tres grados (prejardín – jardín y transición) inician es desde grado 1 condición que fue informada en la mesa de trabajo del 8 de noviembre donde se tiene pendiente aclaración de Fondo Paz referente a la conectividad del Lote contiguo (Preescolar existente) y la definición de fecha por MEN para programar y aclarar si se requiere o no incluir estos grados • Como compromisos de la reunión se creo carpeta compartida para recibir información correspondiente. No obstante, en la presente semana no se ha recibido información adicional para adelantar las mesas de trabajo.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

18 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 103,005

16 Proyectos
79 Intervenciones en IE

1	Ibague – Tolima	**IE JOSÉ ANTONIO RICAURTE** $ 20,000,000,000,00	• 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: EP en Estructuración y perfeccionamiento • Se radicó la prórroga de la LC el 13/10/2023, gestionando tramite de pago de prorroga • Viabilidad jurídica: 13/09/2023
2	San Jose del Palmar – Choco	**IE SAN JOSE** $ 15,000,000,000,00	• 1 proceso de obra y 1 proceso de interventoría – Radicado en JCD en revisión y validación • Viabilidad jurídica: 10/10/2023
3	Soacha – C/marca	**IE EUGENIO DIAZ SEDE PPAL "CHARQUITO"** $ 13,066,299,432.00	• 1 proceso de obra y 1 proceso de interventoría – Radicado contratación, en votación de comité técnico, próximo a salir a convocatoria pública • 1 Viabilidad jurídica: 05/09/2023
4	Sedes Bahía Solano	**SEDES EDUCATIVAS RURALES INDÍGENAS DE EL BRAZO, DOTOMÁ, BOROBORO Y DUMÁ, DEL PUEBLO EMBERA DOBIDA.** $1,500 millones	Estas sedes van a ser atendidas por el contrato de Cumbre Agraria. Quedando por ahora disponible esta atención y recurso **Se atiende por la línea de mejoramientos**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

18 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 103,005

16 Proyectos
79 Intervenciones en IE

5	Risaralda	26 Sedes Autoridades Pueblos Embera $11,024,565,520.55 • 2 procesos obra • 2 procesos Interventoría	Se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de Educacion Departamental y los cabildos Embera en la ciudad de Pereira los días 2 y 3 de octubre, donde se solicitó complementar y enviar la documentación jurídica de los predios, la cual se encuentra en revisión jurídica para solo la mitad de las sedes, pues los demás no se ha recibido la información solicitada.
6	Litoral de San Juan, Chocó	**CONDOTO,** **LITORAL DE SAN JUAN,** **ISTMINA** **MEDIO SAN JUAN** $ 4,500,000,000.00 SON 30 SEDES : 19 afros; 11 indígenas • 2 procesos obra • 2 procesos Interventoría	Visitas realizadas entre el 8 y 11 de septiembre. - 19 Viabilidades Técnicas Afros. - 11 Viabilidades Técnicas Indígenas (7 focalizadas). - 6 Viabilidades Jurídicas Indígenas. Las restantes se encuentran en proceso de subsanación y recopilación de la documentación requerida, considerando las limitantes de las comunidades para el traslado y consecución de la información. El 31 de octubre se remitió al MEN las presentaciones de los alcances de intervención de cada una de las sedes, de acuerdo con el análisis de necesidades y cobertura, para la revisión y priorización.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

18 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 103,005

16 Proyectos
79 Intervenciones en IE

7	Olaya Herrera - Nariño	**ENCUENTROS SANQUIANGA** **6 Sedes** $ 1,440,000,000,00	**IE. Rurales: 4 2 IE. Urbanas** 1. IE. Las Marías: Viabilidad jurídica 08/11/2023 APROBADA 2. Merizalde Porvenir: Viabilidad jurídica 31/10/2023 APROBADA 3. San José Calabazal: En revisión Jurídica 07/11/2023 4. Agropecuario Río Sanquianga: En revisión Jurídica 07/11/2023 5. IDELPA En revisión Jurídica 09/11/2023 6. Inmaculada: En revisión Jurídica 07/11/2023 **Nota:** Se solicitó a las sedes lo siguiente: •Certificación de servicios públicos y certificaciones de alcaldía. •Visita técnica programada entre el 20 y el 25 de noviembre.
8		**ENCUENTROS SANQUIANGA** **2 Sedes** $ 360,000,000,00	Institución Educativa del Litoral Pacífico -IDELPA: **2 sedes Rurales** **7.** Vívora Paraiso: En revisión Jurídica 09/11/2023 **8.** Tórtola: En revisión Jurídica 08/11/2023 **Nota:** •Visita técnica programada entre el 20 y el 25 de noviembre

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

18 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 103,005

16 Proyectos
79 Intervenciones en IE

9	Mercaderes - Cauca	**CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS** $ 5,839,076,493.00	• Contacto con el Alcalde y el rector del CE. • 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: EP en Estructuración y perfeccionamiento • Viabilidad jurídica: 26/09/2023 • PPT diseño $6.269.907.795, recursos pendientes por asignar $430.831.302,00
10	Totoró - Cauca	**IE PUEBLO TOTOREZ SEDE BETANIA** $ 2,695,988,000.00	• 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: radicado en jefatura de contratación, en revisión conjunta para radicación a dirección de contratación. • La visita la realizará el contratista, • Viabilidad jurídica: 23/10/2023 • Se cuenta con la totalidad de los estudios y diseños.
11	Pueblo Bello - Cesar	**Establecimientos Educativos en la zona rural del Municipio de Pueblo Bello** $ 3,356,319,893.00	Aulas digitales multifuncionales Pendiente definición de alcance y sedes a intervenir
12	Comunidad Indígena Kogüi - Cesar	**Internado de la Comunidad indígena kogui** $ 4,500,000,000.00	Mejoramiento, ampliación y dotación de la infraestructura educativa Pendiente definición de alcance y sedes a intervenir
13	IE Rurales –San Juan del Cesar - La Guajira	**Instituciones Educativas Rurales del Municipio de San Juan del Cesar** $3,665,720,724,00	Aulas digitales multifuncionales Pendiente definición de alcance y sedes a intervenir

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

18 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 103,005

16 Proyectos
79 Intervenciones en IE

14	Colon - Nariño	**IE AGROPECUARIA SAN CARLOS** $6,500,586,706,00	• Viabilidad jurídica: 30/10/2023 APROBADA • 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: EP en Estructuración y perfeccionamiento • La visita técnica se realizó entre el 12 y el 14 de abril de 2023 por parte del MEN. • Pendiente recepción Gestion Previa de LC , para verificar el alcance y concluir con los Estudios Previos.
15	Caimito - Sucre	**IE SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL** $ 3,857,427,662,00	• La visita técnica se realizó el 13/09/2023 • Viabilidad técnica: 13/09/2023 • Viabilidad jurídica: 18/10/2023 • Si cuenta con Estudios y Diseños. • 1 proceso obra y 1 proceso interventoría: radicado en jefatura de contratación, en revisión conjunta para radicación a dirección de contratación.
16	Huila	**Instituciones educativas indígenas del CRIHU** $ 720,000,000,00	Del 17 al 19 de octubre se realizaron las visitas técnicas a las 4 sedes focalizadas en coordinación con el CRIHU. Estas se encuentran viabilizadas técnicas y jurídicamente.
17	Quibdo - Choco	**IE Carrasquilla e IE Santo Domingo** $ 320,000,000.00	**Se atiende por la línea de Consultorías.**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

18 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 103,005

16 Proyectos
93 Intervenciones en IE

18	B/ventura – Valle del Cauca	**Infraestructura Educativa - Mesas de Trabajo con la ETC de Buenaventura** $ 4,660,000,000.00	De las 15 sedes inicialmente focalizadas, se tiene previsto abordarlas de la siguiente manera: • **3 sedes se atenderán por la línea de Mejoramientos** • 12 sedes se atenderán por Línea Estratégicos, de las cuales Se tiene un listado como línea base de 12 sedes educativas que tienen previstas realizar las visitas entre el 20 y el 30 de noviembre de 2023: 1. I.E. Antonio Nariño sede La Nueva Colombia. 2. I.E. Atanasio Girardot sede Atanasio Girardot. 3. I.E. Francisco Javier Cisneros sede La Gran Colombia. 4. IE Francisco Javier Cisneros sede Héctor Epalza Quintero. 5. I.E. Agropecuaria José María Córdoba sede José María Córdoba. 6. I.E. Nonam sede San Juan Bautista. 7. I.E. Jaime Roock sede Jaime Roock 8. I.E. José María Córdoba sede San Cipriano. 9. I.E. José Ramón Bejarano sede La Comuna. 10. I.E. Nonam sede Nonam 11. I.E. Simón Bolívar sede Granadinos. 12. I.E. Comunidad Indigena de Santa Rosa de Guayacán. **Nota:** Se solicitó a las sedes lo siguiente, los documentos están en proceso de firma de la alcaldía de Buenaventura: •Decreto de posesión •Destinación para uso público. •Certificación de servicios públicos y certificaciones de alcaldía. •Visita técnica programada entre el 28 y el 02 de diciembre.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

Otras Gestiones

1	Cartagena - Bolívar	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARGELI** (Recursos por definir)	• Se realizó visita técnica el 12/10/2023 en compañía de la secretaria de educación de Cartagena, la Rectora de la Institución Educativa y su equipo de apoyo técnico, con el fin de realizar el diagnóstico y viabilidad de intervención de la infraestructura existente. • La intervención consiste en realizar las obras de mejoramiento a la infraestructura existente en áreas de: comedores, biblioteca, restaurante, biblioteca y salas de informática. • Está pendiente recepción de la documentación solicitada a la secretaria de Educación de Cartagena, para poder dar cierre a la construcción de las viabilidades jurídica y técnicas construidas a partir de la visita. • Pendiente definición y/o asignación de recursos por parte del MEN.
2	B/ventura – Valle del Cauca	**Instituciones Educativas, Cuenca Baja del río Calima** (Recursos por definir)	Se visitaron 7 sedes educativas de las comunidades indígenas y afrodescendientes a lo largo de la cuenca baja del río Calima en el municipio de Buenaventura, marco de la estrategia de Escuela Protectora y Segura y con el fin de avanzar en los acuerdos de la mesa de diálogo con el ELN liderados desde la Vicepresidencia (visita técnica del 18 al 23 de octubre de 2023: MEN; ADR; Unidad de Restitución de Victimas; Vicepresidencia de la Republica; Fondo Paz; FINDETER) **I.E. Comunidad Indígena de Santa Rosa de Guayacán**; I.E. Comunidad Indígena de San Isidro; I.E. Alfredo Vásquez Cobo Sede Guadual; I.E. Alfredo Vásquez Cobo Sede Ceibito; I.E. Alfredo Vásquez Cobo Sede Nueva Esperanza; I.E. Alfredo Vásquez Cobo Sede La Trojita; I.E. Alfredo Vásquez Cobo Sede Principal


CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

COMISIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CRIHU

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

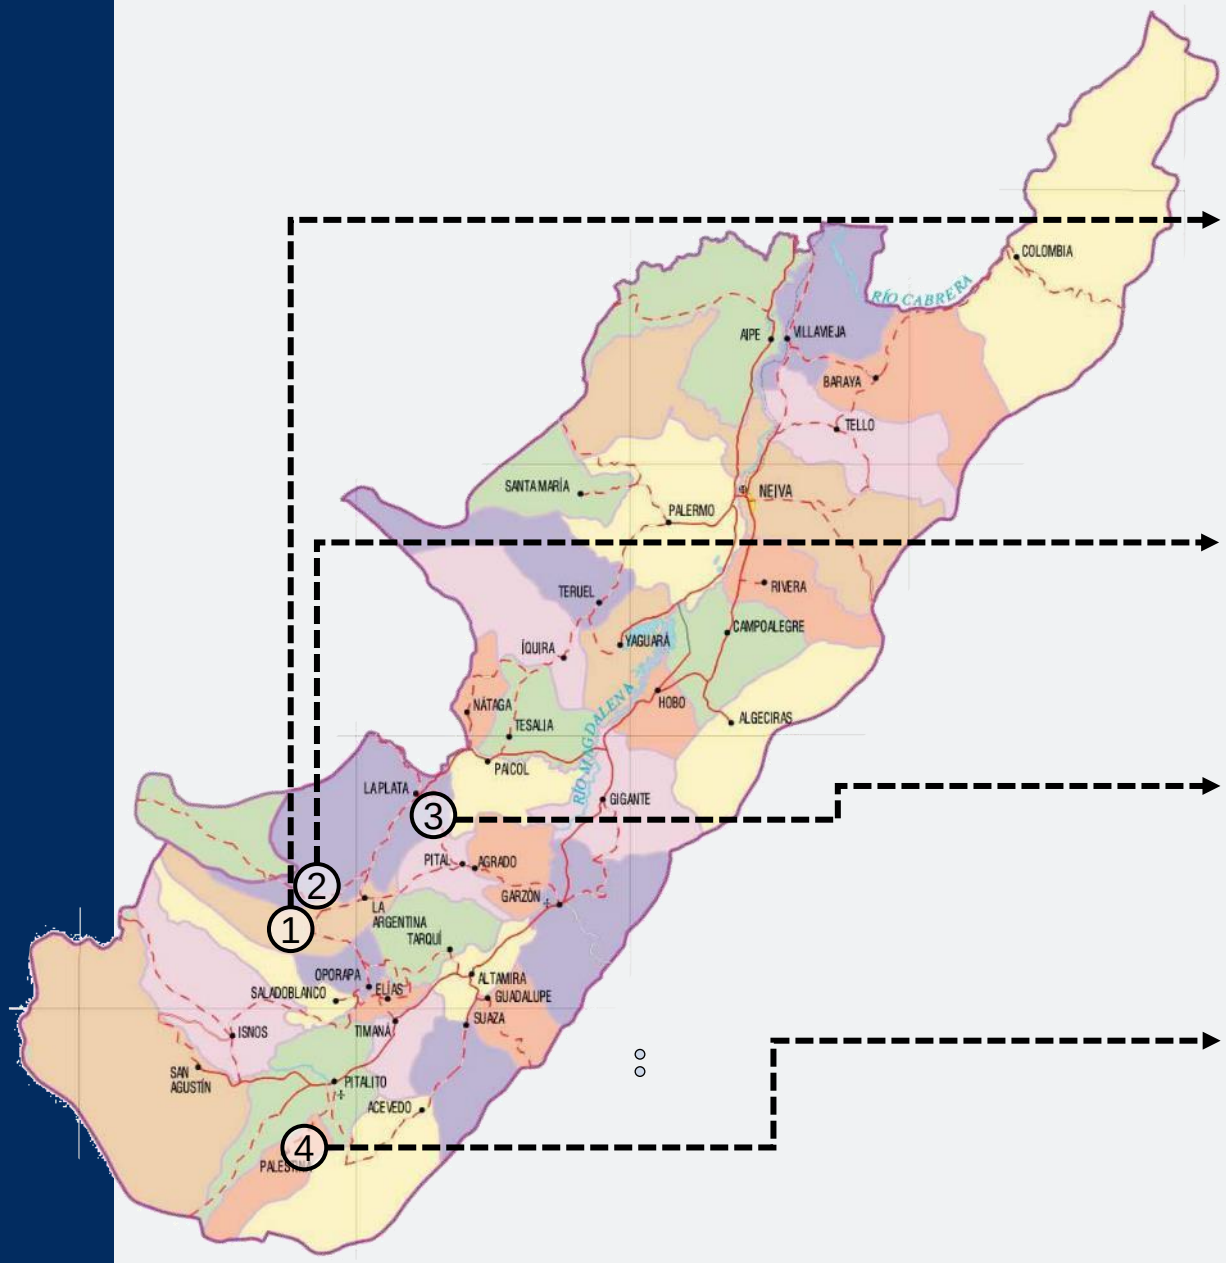

Centro Etnoeducativo Namui Nu Mai - Sede La Cristalina (43,4KM):

El recorrido dura aproximadamente dos horas saliendo por la vía Puracé Popayán desde el casco urbano del Municipio de La Plata hasta el desvío por la vereda El Congreso. Desde el desvío hasta la vereda Campo Alegre del Municipio de la Argentina y cruce del río Loro el recorrido dura aproximadamente treinta minutos. Desde este punto se debe caminar por aproximadamente 30 minutos hasta la sede ubicada en el predio Capitolio del Resguardo Gambiano Nam Misak.

Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Peñón de Tálaga (41,3KM):

El recorrido dura aproximadamente dos horas y treinta minutos (41,3KM) saliendo por la vía Puracé Popayán desde el casco urbano del Municipio de La Plata hasta la vereda la Estación, donde se encuentran asentados el Resguardo Indígena Nasa Páez Estación – Tálaga y la sede Peñón de Tálaga de la Institución Educativa Yu Luucx Pishau.

Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Potrerito (15,1KM):

El recorrido dura aproximadamente treinta minutos saliendo por la vía Pital – Garzón desde el casco urbano del Municipio de La Plata hasta la vereda El Coral, donde se encuentran asentados el Resguardo Indígena Nasa Páez Potrerito y la sede de la Institución Educativa Yu Luucx Pishau.

Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna - Sede Yakuas (1,3KM):

Saliendo por la carrera 1 del casco urbano del Municipio de Palestina hacia la vereda Santa Barbara, el recorrido dura aproximadamente diez minutos hasta la sede Yakuas de la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna, ubicada en la comunidad indígena Yacuas del pueblo Yanacona.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

1. CENTRO ETNOEDUCATIVO NAMUI NU MAI - SEDE LA CRISTALINA

Focalizada: Si
Total Matricula SIMAT: 12
Presupuesto: $49.200.000
Viabilidad jurídica: Si
Viabilidad Técnica: Si
Alcance:

- Mejoramiento de las 2 aulas existentes
- Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales y conexiones sanitarias.





CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada





2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA YU LUUCX PISHAU - SEDE PEÑÓN DE TÁLAGA:

Focalizada: Si
Total Matricula SIMAT: 103
Presupuesto: $353.650.000
Viabilidad jurídica: Si
Viabilidad Técnica: Si
Alcance:

- Mejoramiento de 7 aulas existentes
- Mejoramiento de 2 baterías sanitarias existentes
- Mejoramiento de 1 espacio complementario.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA YU LUUCX PISHAU - SEDE POTRERITO

Focalizada: Si
Total Matricula SIMAT: 155
Presupuesto: $377.000.000
Viabilidad jurídica: Si
Viabilidad Técnica: Si
Alcance:

- Mejoramiento de las 3 aulas existentes
- Reposición y construcción de 2 aulas en un sistema alternativo – liviano.
- Construcción de 1 espacio complementario (aula múltiple laboratorios)





CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada





4. INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA YACHAY WASI RUNA YANAKUNA - SEDE YAKUAS

Focalizada: Si
Total Matricula SIMAT: 40
Presupuesto: $231.000.000
Viabilidad jurídica: Si
Viabilidad Técnica: Si
Alcance:

- Mejoramiento de 1 aula existente.
- Construcción de 1 “Wasi”, espacio cultural complementario requerido para la práctica de pilares pedagógicos del modelo educativo indígena.

TOTAL INTERVENCIÓN

SEDE	TOTAL SIMAT	FOCALIZADA	PRESUPUESTO INTERVENCIÓN	AULAS	BATERÍA BAÑOS	COMPLEMENTARIOS
CENTRO EDUCATIVO NAMUI NU MAI SEDE LA CRISTALINA	12	SI	$ 49.200.000	2	1	
INSTITUCION EDUCATIVA YU LUUCX PISHAU SEDE PEÑON DE TÁLAGA	103	SI	$ 353.650.000	7	2	1
INSTITUCION EDUCATIVA YU LUUCX PISHAU SEDE POTRERITO	155	SI	$ 377.000.000	5		
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA YACHAY WASI RUNA YANAKUNA SEDE YAKUAS	40	SI	$ 231.000.000	1		1
TOTAL SEDES INDÍGENAS CRIHU	310		$ 1.010.850.000	15	3	2



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

PRIORIZACIÓN IE’s MEDIO CUENCA BAJA RIO CALIMA

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

SEDES AFROS Y COMUNIDADES INDIGENAS

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



Punto de inicio: Cuenca Baja Rio Calima

El 19 octubre 2023 Cuenca Baja Rio Calima:

1. I.E. Técnico Agroecológico Nounan Sede Santa Rosa
2. I.E. Alfredo Vásquez Cobo: contienen las siguientes sedes educativas:
   - San Antonio de Guadual
   - Ceibito
   - La Trojita
   - Nueva Esperanza
   - Sede principal

Visitada este día : San Antonio de Guadual

El 20 de octubre 2023 Cuenca Baja Rio Calima:

I.E. Alfredo Vásquez Cobo sede:
-Ceibito
- La Trojita

El 21 de octubre 2023 Cuenca Baja Rio Calima:

I.E. Alfredo Vásquez Cobo sede:
- Principal

El 22 de octubre 2023 Cuenca Baja Rio Calima:

I.E. Alfredo Vásquez Cobo sede:
- Nueva Esperanza

I.E. Media Agropecuaria Niño Jesús de Praga sede:
- Principal

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

1. I.E. Técnico Agroecológico Nounan Sede Santa Rosa

Se realizo Visita Técnica sin embargo, se cuenta ya con recursos asignados para sui intervención, se evidencia que se encuentra priorizada bajo la línea de proyectos ETC Buenaventura, en el marco de los proyectos priorizados para atender las infraestructura educativa objeto de las mesas de trabajo con la ETC de Buenaventura.





CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 // Clasificada

CCOM-FO-001 V17 / 19-May-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

FOTO: Pueblo Kankuamo

ISO 27001 Certified
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
