
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONTRATO DE OBRA No. 054 del 2023**	**60 días**	**mar 10/10/23**	**jue 14/12/23**	
2		INICIO DE OBRA	0 días	mar 10/10/23	mar 10/10/23	
3		**AREA DE SALAS DE AUDIENCIA**	**9 días**	**mar 10/10/23**	**jue 19/10/23**	
4		DEMOLICIÓN PAÑETES	2 días	mar 10/10/23	mié 11/10/23	
5		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	2 días	mar 10/10/23	mié 11/10/23	4CC
6		RESANE FILOS MUROS	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	5
7		PAÑETE LISO MUROS 1:4	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	5
8		ESTUCO MUROS	2 días	jue 12/10/23	vie 13/10/23	5
9		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	5 días	vie 13/10/23	jue 19/10/23	8
10		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	2 días	jue 12/10/23	vie 13/10/23	8CC
11		**AREA JUZGADO PRIMERO**	**7 días**	**sáb 21/10/23**	**lun 30/10/23**	
12		DEMOLICIÓN PAÑETES	2 días	sáb 21/10/23	mar 24/10/23	9FC+2 días
13		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	3 días	sáb 21/10/23	mié 25/10/23	12CC
14		RESANE FILOS MUROS	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	13CC
15		PAÑETE LISO MUROS 1:4	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	13CC
16		ESTUCO MUROS	2 días	sáb 21/10/23	mar 24/10/23	13CC
17		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	5 días	mar 24/10/23	lun 30/10/23	16
18		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	16CC
19		**AREA JUZGADO SEGUNDO**	**5 días**	**mar 31/10/23**	**sáb 4/11/23**	
20		DEMOLICIÓN PAÑETES	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	17FC+1 día
21		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	20CC
22		RESANE FILOS MUROS	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	21CC
23		PAÑETE LISO MUROS 1:4	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	21CC
24		ESTUCO MUROS	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	21CC
25		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	5 días	mar 31/10/23	sáb 4/11/23	24FC-1 día
26		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	24CC
27		**AREA PENAL DEL CIRCUITO**	**6 días**	**jue 9/11/23**	**jue 16/11/23**	
28		DEMOLICIÓN PAÑETES	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	25FC+4 días
29		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	28CC
30		RESANE FILOS MUROS	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	29CC
31		PAÑETE LISO MUROS 1:4	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	29CC
32		ESTUCO MUROS	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	29CC
33		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	5 días	vie 10/11/23	jue 16/11/23	32
34		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	32CC
35		**AREA JUZGADO**	**6 días**	**vie 17/11/23**	**jue 23/11/23**	
36		DEMOLICIÓN PAÑETES	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	33FC+1 día
37		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	36CC
38		RESANE FILOS MUROS	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	37CC
39		PAÑETE LISO MUROS 1:4	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	37CC
40		ESTUCO MUROS	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	37CC
41		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	40
42		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	40CC
43		**AREA EXTERNA**	**18 días**	**vie 24/11/23**	**jue 14/12/23**	
44		LIMPIEZA, RASPADO Y LAVADO MECÁNICO DE VIGA CANAL EN CONCRETO, ANCHO 0.20 - 0.30 m	5 días	vie 24/11/23	jue 30/11/23	41FC+1 día
45		ARREGLO FILTRACIÓN TUBERÍA AGUA POTABLE 1 1/2"	3 días	vie 24/11/23	mar 28/11/23	44CC
46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA PARA AGUA LLUVIAS	2 días	vie 1/12/23	lun 4/12/23	44FC+1 día
47		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS + ACCESORIOS	2 días	vie 1/12/23	lun 4/12/23	46CC
48		ANTIHUMEDAD FACHADAS TRANSPARENTE (2 CAPAS)	5 días	jue 30/11/23	mié 6/12/23	44
49		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES BLANCA, ROJA, AMARILLA, AZUL	3 días	jue 30/11/23	lun 4/12/23	48CC
50		ESMALTE PUERTA EN PARALES METÁLICOS DOS MANOS (INCLUYE ANTICORROSIVO)	4 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23	49
51		ESMALTE MARCOS FACHADA (INCLUYE ANTICORROSIVO)	5 días	lun 4/12/23	vie 8/12/23	50CC
52		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ASFÁLTICA	6 días	vie 24/11/23	vie 1/12/23	44CC
53		MANTENIMIENTO MANTO ASFÁLTICO	6 días	vie 24/11/23	vie 1/12/23	52CC
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FACHADA LÁMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	3 días	jue 7/12/23	lun 11/12/23	55
55		DESMONTE VIDRIO TEMPLADO	3 días	mar 5/12/23	jue 7/12/23	50CC+1 día
56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 5 mm	5 días	vie 8/12/23	jue 14/12/23	55FC+1 día

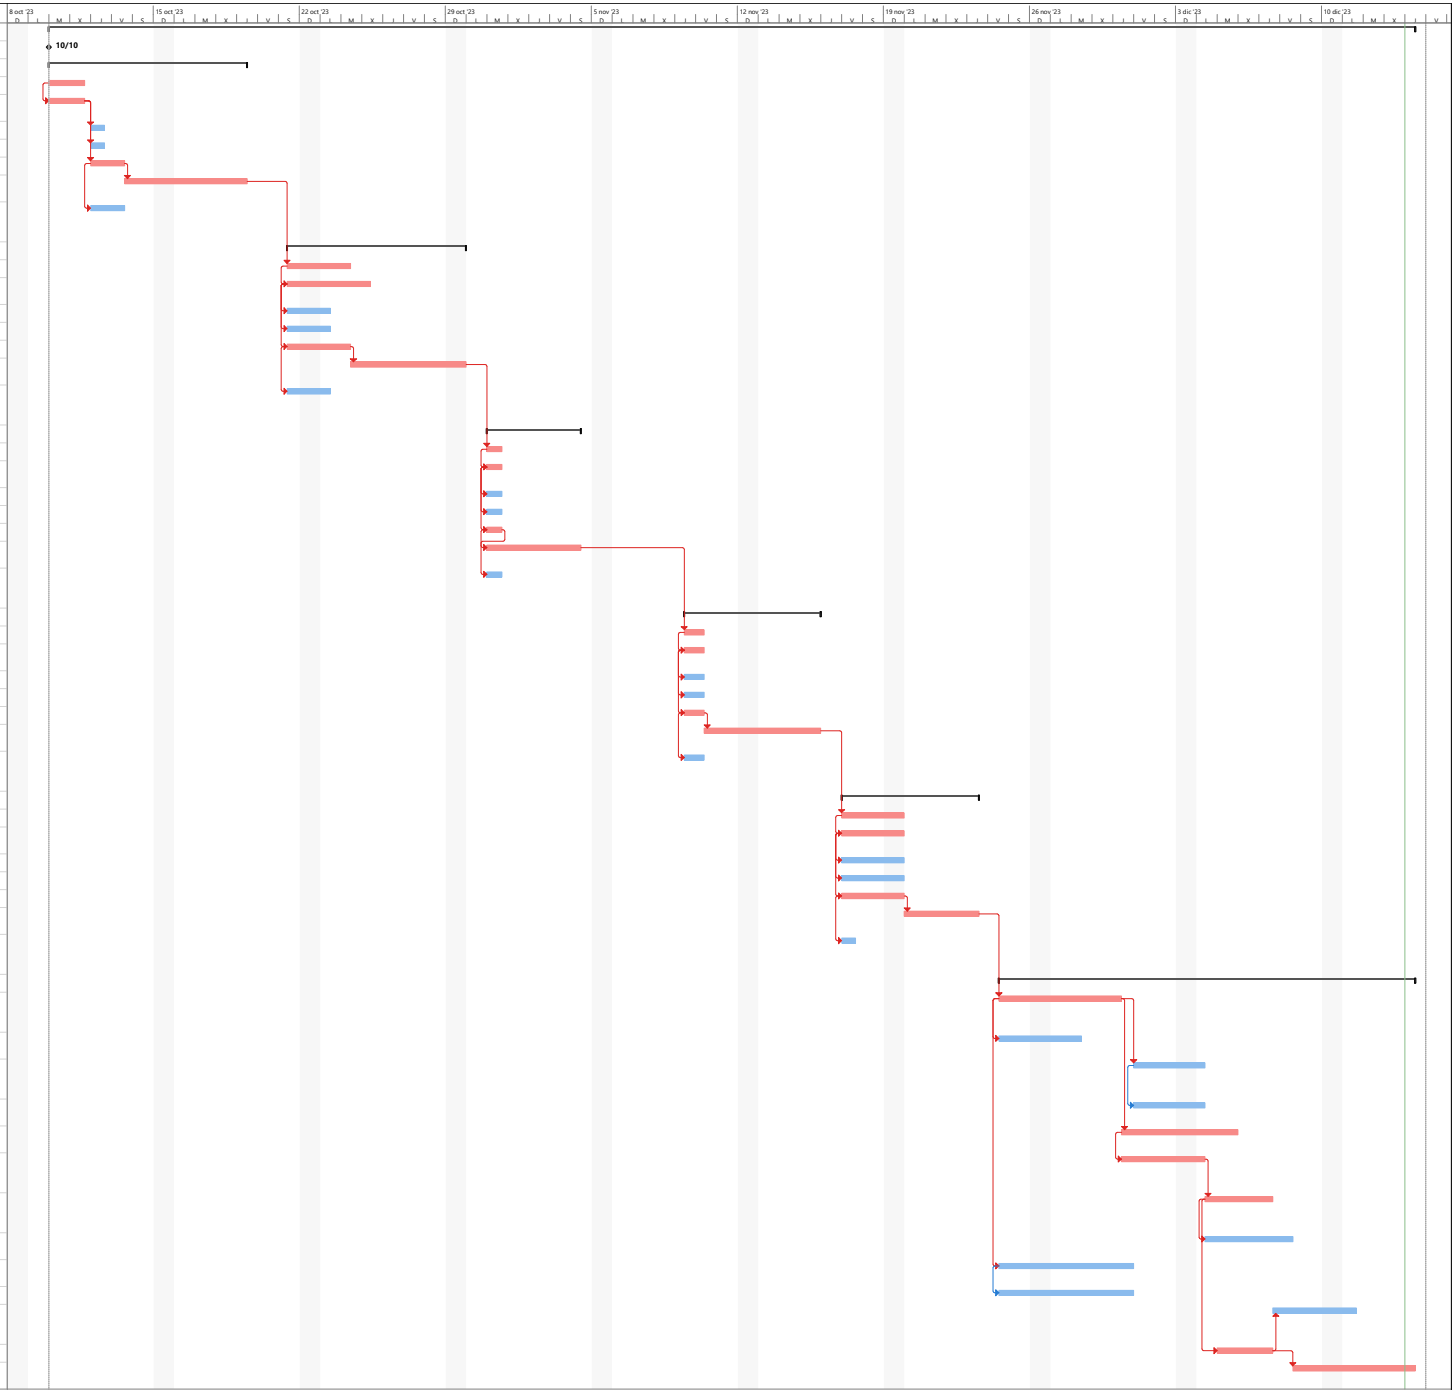

Proyecto: PROGRAMACION 1
Fecha: jue 14/12/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
