AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1**

NÚMERO DE CONTRATO	19000789 H4 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GRUPO SYC S.A.S NIT 811031728-8
OBJETO	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMADEL AEROPUERTO DE CONDOTO
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS ($ 353.687.114) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	TRES (3) MESES
CDP SIIF	4519 DEL 8 DE MAYO DE 2019
RP SIIF	27719 DE 20 DE JUNIO DE 2019
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE JUNIO DE 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

En la ciudad de Rionegro, a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2019. Se reunieron: **OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA** identificado con cedula de ciudadanía número 1.128.415.291 de Medellín, en representación de **GRUPO SYC S.A.S** con Nit 811.031.728-8

como contratista y **MAURICIO HOYOS SIERRA** identificado con cedula de ciudadanía número

71.778.683 de Medellín, supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 27 de junio y 9 de septiembre de 2019, se ejecutaron cantidades de obra relacionadas al objeto del presente contrato, que corresponden al acta parcial de obra N° 1, por un valor de noventa y ocho millones veintisiete mil ciento ochenta y cinco pesos ($ 98.027.185) cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad.

DAVID VILLEGAS SERNA
Representante legal
GRUPO SYC S.A.S
Contratista

MAURICIO HOYOS SIERRA
AEROCIVIL
Supervisor designado

CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
CC 70.033.368 de Medellín
Ordenador del gasto

GRUPO S Y C S.A.S

NIT. 811031728

CL 35 63 B 47

Teléfono: 4487868 Fax: Email:info@gruposyc.co

MEDELLIN

Fecha de Impresión: 2019/09/9 Hora: 09:14 a. m.

FACTURA DE VENTA : 1942
FECHA : 2019/09/09
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN N° 18762009665887 AUTORIZACION DEL 1375 AL 2000 DEL 13/08/2018 FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GRUPO S Y C S.A.S. REGIMEN COMÚN.

Cliente : 899999059 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL **NIT** : 899999059
Dirección: AV CL 26 103 15 **Ciudad** : BOGOTA

Vendedor : 3 OSCAR MANUEL VILLEGAS GARCIA **Zona** : GENERAL

Detalle:
ACTA N° 1: MANTENER LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CONDOTO. CONTRATO N° 19000789 H4 DE 2019.

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva	Valor Total
102	ACTA N° 1: MANTENER LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CONDOTO. CONTRATO N° 19000789 H4 DE 2019.	1.00	74,291,160.00			74,291,160.00
109	ADMINISTRACION	1.00	18,572,790.00			18,572,790.00
110	IMPREVISTOS	1.00	742,912.00			742,912.00
123	UTILIDAD	1.00	3,714,558.00		19.00	4,420,324.00

Son: Noventa y Siete Millones Novecientos VeintiUn Mil Trescientos VeintiUn Pesos

Observaciones:
ACTA N° 1: MANTENER LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CONDOTO. CONTRATO N° 19000789 H4 DE 2019.

Total Venta	97,321,420.00
Descuento	0.00
Total Venta Neta	97,321,420.00
IVA	705,766.00
Total Factura	98,027,186.00
ReteIva	-105,865.00
Anticipo (2019/09/09)	0.00
Valor a Pagar:	97,921,321.00

Forma de Pago: Credito

No. Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2019/10/09	97,921,321.00	97,921,321.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ANDREA

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - FORMULARIO No.1

OBJETO: MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	cantidad	unidad	valor acta 1
	AEROPUERTO MANDINGA							
2	Localización y replanteo	M2	1335	$ 2.949	$ 3.936.915	133,00	M2	$ 392.217
3	Mantenimiento rejilla de cunetas	ml	35	$ 30.473	$ 1.066.555	33,00	ml	$ 1.005.609
4	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SANITARIO	UND	7	$ 429.817	$ 3.008.719	4,00	UND	$ 1.719.268
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	8	$ 410.000	$ 3.280.000	1,00	UND	$ 410.000
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UND	1	$ 346.016	$ 346.016	1,00	UND	$ 346.016
7	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre muros sin pintar o cubierta en teja de asbesto cemento, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2	985	$ 25.525	$ 25.142.125	194,30	M2	$ 4.959.508
8	Suministro y aplicación de pintura a base de agua , vinilo de primera calidad, tipo Viniltex o similar, sobre muros sin pintura, color a definir, antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiara y sellaran las superficies, se aplicara imprimante, se resanara y preparará la superficie.	M2	1180	$ 21.270	$ 25.098.600	115,44	M2	$ 2.455.430
9	Demolicion de enchape piso y pared(incluye Botedero)	m2	140	$ 11.796	$ 1.651.440	175,39	m2	$ 2.068.866
10	Suministro e colocación de impermeabilización con Restrucreto MIP o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	M2	70	$ 91.419	$ 6.399.330	25,93	M2	$ 2.370.842
11	Suministro e instalacion enchape en ceramica piso 40*30	M2	50	$ 66.844	$ 3.342.200	25,30	M2	$ 1.690.885
13	Suministro e instalacion enchape en ceramica pared 30*30	m2	108	$ 63.895	$ 6.900.660	92,18	m2	$ 5.890.097
15	bajantes en pvc	ml	18	$ 51.116	$ 920.088	19,12	ml	$ 977.338
17	Tapete piso en caucho o estoperol	m2	23	$ 45.218	$ 1.040.014	24,85	m2	$ 1.123.577
20	mantenimiento redes sanitarias(incluye mantenimienton del pozo septico)	global	1	$ 1.966.000	$ 1.966.000	1,00	global	$ 1.966.000
21	mantenimiento general redes electricas	global	1	$ 3.145.600	$ 3.145.600	1,00	global	$ 3.145.600
22	mantenimiento general cubierta termoacustica	global	1	$ 3.932.000	$ 3.932.000	1,00	global	$ 3.932.000
23	demolicion cuartos de madera(incluye botadero)	m2	60	$ 21.626	$ 1.297.560	21,80	m2	$ 471.447
24	pintura en esmalte color azul	ml	80	$ 7.864	$ 629.120	367,76	ml	$ 2.892.065
25	suministro e instalacion cielo raso en pvc	m2	32	$ 114.028	$ 3.648.896	22,34	m2	$ 2.547.386
26	Desmonte y retiro de cubierta en acrilico. Incluye botada de escombros	m2	98	$ 6.390	$ 626.220	98,07	m2	$ 626.660
27	suministro e instalacion cubierta en acrilico	m2	98	$ 39.861	$ 3.906.378	98,07	m2	$ 3.909.248
29	Base en recebo compactado e=0,20m.	M3	30	$ 93.593	$ 2.807.790	26,60	M3	$ 2.489.574
30	Placa en Concreto de 3000 PSI. Incluye Refuerzo en Malla Electrosoldada (e=0,10m).	M3	15	$ 735.284	$ 11.029.260	13,30	M3	$ 9.779.277
31	desmonte de cubierta en teja de zinc(incluye botadero)	m2	20	$ 6.881	$ 137.620	40,52	m2	$ 278.784
32	Cubierta en teja de asbestocemento	M2	25	$ 30.473	$ 761.825		M2	$ -
33	Canal en lamina de acero galvanizado, calibre 22 o su equivalente	ML	27	$ 84.538	$ 2.307.887	22,12	ML	$ 1.869.981
34	Revoques o Pañetes liso en muros interiores(incluye -fajas, filos y dilataciones)	M2	90	$ 25.558	$ 2.300.220	37,28	M2	$ 952.848
35	Excavación en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibado natural. Incluye cargue y botada de escombros. De 0,0 a 2,00m.	M3	30	$ 50.133	$ 1.503.990	26,60	M3	$ 1.333.538
36	Desmonte y retiro de cielo raso en madera. Incluye botada de escombros	m2	24	$ 4.424	$ 106.176	23,50	m2	$ 103.945

37	suministro e instalacion de Reflector led de 50W	UND	3	$ 458.078	$ 1.374.234	3,00	UND	$ 1.374.234
O.E 1	instalacion de estuco	m2		$ 17.619	$ -	140,92	m2	$ 2.482.820
O.E 2	retiro de aparatos sanitarios, incluye lavamanos	ud		$ 31.450	$ -	5,00	und	$ 157.250
O.E 3	suministro e instalacion de manto impermeable para losa de concreto (torre control, losa de tanques de agua)	m2			$ -			$ -
O.E 4	suministro e intalacion de meson en acero inoxidable, incluye lavamanos	ml		$ 669.525	$ -			$ -
O.E 5	suministro e instalacion de divisiones en acero inoxidable	m2		$ 366.625	$ -			$ -
O.E 6	sunistro e instalacio de sanitario para discapacitaos	und		$ 974.750	$ -	2,00	und	$ 1.949.500
O.E 7	suministro e instalacion de lavamanos para personal discapacitado	UND		$ 654.200	$ -	2,00	UND	$ 1.308.400
O.E 8	sumistro e instalacion de socalo en fachada frontal	m		$ 24.562	$ -	21,95	m	$ 539.129
O.E 9	suministro e instalacion de cielo en drywall	m2		$ 54.875	$ -	6,93	m2	$ 380.009
O.E 10	desmonte de cielo en drywall	m2		$ 9.437	$ -	6,93	m2	$ 65.351
O.E 11	Construcción de PISO EN MORTERO IMPERMEABLE 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m.	m2		$ 54.025	$ -	28,03	m2	$ 1.514.472
O.E 12	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad DOBLE para discapacitados, en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und		$ 309.157	$ -	2,00	und	$ 618.313
OE 13	Suministro, transporte y colocación de teja de fibrocemento, incuye gachos, amarres, traslapo, equipos de alturas y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	m2		$ 54.138		40,52	m2	$ 2.193.656
		TOTAL COSTOS			$ 268.027.542	TOTAL COSTO DIRECTO		$ 74.291.160
	ADMINISTRACION	25%			$ 67.006.886	25%		$ 18.572.790
	IMPREVISTOS	1%			$ 2.680.275	1%		$ 742.912
	UTILIDAD	5%			$ 13.401.377	5%		$ 3.714.558
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 2.546.262	19%		$ 705.766
TOTAL PROYECTO					$ 353.662.342	TOTAL ACTA 1		$ 98.027.185

GRUPO EMPRESARIAL

Medellín, 09 de septiembre de 2019

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Nit. 899999059-3
Certificado de pago seguridad social.

Respetados señores:

Me permito certificar el pago de los aportes de pensión, salud, riesgos, caja de compensación y parafiscales pertenecientes al mes de Agosto del año en curso para el personal empleado en la ejecución del contrato 1900084 H4 DE 2019.

Adjunto planillas y comprobante de pago.

Cordialmente,

LUZ ANDREA MARÍN CASTRILLÓN
C.C. 32.208.401
T.P. 135676-T
Revisor Fiscal
Grupo SYC SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811031728	8	GRUPO SYC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO SYC SAS	CL 35 CR 63 B 47	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4487868	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09			E	2019/09/06				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	wip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GRUPO SYC SAS (26 Afiliados)																							$16,626,057	$2,660,700			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$1,158,500		$0	$0		$5,152,800
Centro de Trabajo: ROCERIA (26 Afiliados)																							$16,626,057	$2,660,700			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$1,158,500		$0	$0		$5,152,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (26 Afiliados)																							$16,626,057	$2,660,700			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$1,158,500		$0	$0		$5,152,800
1	CC	2755259	ALVAREZ ALMANZA EDUARDO ENRIQUE																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
2	CC	78030183	AVILEZ MORALES JUAN PABLO	X																	230201	12	$331,247	$53,000	ESSC07	12	$331,247	$13,300	CCF03	12	$331,247	$13,300	14-11	12	$331,247	$23,100	12	$0	$0	SI	$102,700
3	CC	7382702	DORIA HERNANDEZ GUSTAVO ALFREDO	X																	25-14	14	$386,455	$61,900	EPS002	14	$386,455	$15,500	CCF03	14	$386,455	$15,500	14-11	14	$386,455	$26,900	14	$0	$0	SI	$119,800
4	CC	1073823389	GALVAN CANTERO FRANCISCO ALBERTO																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
5	CC	78291366	GARCES ALVAREZ DAGOBERTO ANTONIO	X																	230301	4	$110,416	$17,700	ESSC02	4	$110,416	$4,500	CCF03	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	SI	$34,400
6	CC	2759999	GARCES PASTRANA RAFAEL HUMBERTO	X																	230301	2	$55,208	$8,900	ESSC07	2	$55,208	$2,300	CCF03	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
7	CC	78031196	HERNANDEZ DIAZ EDUARDO SANTOS	X																	230301	14	$386,455	$61,900	EPS002	14	$386,455	$15,500	CCF03	14	$386,455	$15,500	14-11	14	$386,455	$26,900	14	$0	$0	SI	$119,800
8	CC	15535806	HERNANDEZ GILDARDO DE JESUS																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
9	CC	1609330	HERNANDEZ JOSE GUILLERMO																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
10	CC	1079092304	IBARGÜEN MOSQUERA JHON JARRY									X									230201	30	$871,247	$139,400	ESSC33	30	$871,247	$34,900	CCF03	30	$871,247	$34,900	14-11	30	$871,247	$60,700	30	$0	$0	SI	$269,900
11	CC	2758449	MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO ELIAS	X																	230201	2	$55,208	$8,900	ESSC24	2	$55,208	$2,300	CCF03	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
12	CC	13452095	MARTINEZ MARTINEZ EDUARDO EMIRO	X	X																230301	21	$579,682	$92,800	ESSC07	21	$579,682	$23,200	CCF03	21	$579,682	$23,200	14-11	21	$579,682	$40,400	21	$0	$0	SI	$179,600
13	CC	1037975216	MARTINEZ SOTO JOHYBER HERNANDO																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
14	CC	1046913650	MONTOYA ARIAS HERNANDO																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
15	CC	1128024677	MOSQUERA RIVAS EDINSON																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC33	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
16	CC	2758654	OCHOA HERRERA ROSENDO RAFAEL																		230301	30	$828,116	$132,500	CCFC5	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
17	CC	1003588039	OSORIO CANCHILA JORGE DANIEL	X																	230301	2	$55,208	$8,900	EPS037	2	$55,208	$2,300	CCF03	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
18	CC	78293560	OYOLA CONDE GABRIEL ENRIQUE																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
19	CC	1071350495	PACHECO ROMERO JOSE DOLORES	X																	230201	2	$55,208	$8,900	ESSC07	2	$55,208	$2,300	CCF03	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
20	CC	1064982038	PALENCIA CONDE FERNANDO AURELIO																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
21	CC	1078116427	PALOMEQUE GOMEZ LUIS ENRIQUE																		230301	30	$1,102,968	$176,500	EPS016	30	$1,102,968	$44,200	CCF03	30	$1,102,968	$44,200	14-11	30	$1,102,968	$76,800	30	$0	$0	SI	$341,700
22	CC	15540373	QUINTERO CELIS YHOAN ARLEY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF03	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
23	CC	15535608	RENDON CONRADO DE JESUS																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
24	CC	1076324540	SERNA BRAYAN ANDRES									X									230301	30	$871,247	$139,400	CCFC2	30	$871,247	$34,900	CCF03	30	$871,247	$34,900	14-11	30	$871,247	$60,700	30	$0	$0	SI	$269,900
25	CC	1046909733	URIBE URIBE WILSON ALEJANDRO																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS040	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
26	CC	1007639127	URIBE URIBE YAN ALBEIRO																		230201	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
Total			**Afiliados(26)**																				$16,626,057	$2,660,700			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$666,800			$16,626,057	$1,158,500		$0	$0		$5,152,800

Rionegro, 9 de septiembre 2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DEL CONTRATO

No. 19000916 H4 A DE 2019

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 9 de septiembre de 2019 presentado por parte del contratista GRUPO S Y C S.A.S, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden No. 19000789 H4 de 2019 por el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS MCTE ($353.687.114) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura 1942, que corresponde al acta parcial 1, equivalente a la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES VEITISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 98.027.185)

POR CONCEPTO DE:

Acta parcial # 1

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago parafiscales.

-

Para constancia firma el 9 de septiembre de 2019

MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DE CONTRATO No. 19000789 H4 DE 2019

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					26	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Localización y replanteo			UNIDAD	m2	ITEM	2
	ACTA N° 1						
UBICACIÓN	ANCHO	LONGITUD		m	REGISTRO FOTOGRAFICO		
área administrativa	3,50	38,00		133,00			
TOTAL				133,00			

OBSERVACIONES

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Mantenimiento rejilla de cunetas		UNIDAD	m	ITEM	3

ACTA N° 1

Ubicación	Longitud		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
plataforma frontal	33,00		33,00	
TOTAL			33,00	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					26	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SANITARIO		UNIDAD	m2	ITEM	4
	ACTA N° 1					
Ubicación	CANTIDAD		m	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Baños para hombes	1.00		1.00			
Baños para damas	2.00		2.00			
baños en área administrativa	1.00		1.00			
TOTAL			4,00			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	und	ITEM	5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS					
Ubicación	Cantidad		Und	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
baño area administrativa	1,00		1,00			
TOTAL			1,00			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	und	ITEM	6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL					
Ubicación	Longitud		Und	REGISTRO FOTOGRAFICO		
baños para hombres	1,00		1,00			
TOTAL			1,00			

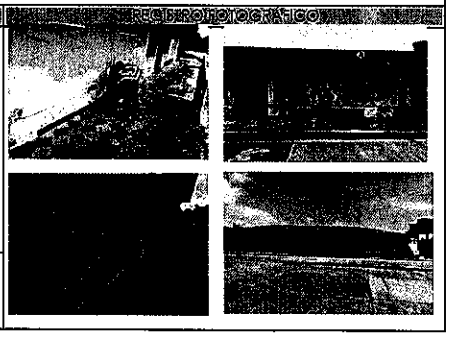
Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						26	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre muros sin pintar o cubierta en teja de asbesto cemento, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	UNIDAD	m2	ITEM	7

ACTA N° 1

Ubicación	ANCHO	ALTO		TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
edificio principal (fachada)	58,00	3,35		194,30	
TOTAL				**194,30**	

Observaciones


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						24	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro y aplicación de pintura a base de agua , vinilo de primera calidad, tipo Viniltex o similar, sobre muros sin pintura, color a definir, antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiara y sellaran las superficies, se aplicara imprimante, se resanara y preparará la superficie.	UNIDAD	m2	ITEM	8

ACTA N° 1

Ubicación	ANCHO	ALTO		m²	REGISTRO FOTOGRAFICO
edificio principal					
sala de espera	4,98	3,30		16,43	
cafeteria	15,82	3,30		52,21	
	2,39	1,10		2,63	
baños para hombre	10,26	1,55		15,90	
baños para mujeres	14,58	1,65		24,06	
baños sala de espera	7,80	0,54		4,21	
TOTAL				115,44	



Observaciones:



10,26

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						23-24	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Demolicion de enchape piso y pared(incluye Botedero).baños de hombres, damas y cafeteria	UNIDAD	m2	ITEM	9

ACTA N° 1

Ubicación	ANCHO	LARGO		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
edificio principal	13,38	10,02		134,07	   
Área planta electrica	6,30	3,60		22,68	
	10,84	0,20		2,17	
área administrativa				0,00	
piso	1,55	1,83		2,84	
muro	6,06	2,25		13,64	
TOTAL				**175,39**	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro e colocación de impermeabilización con Restrucreto MIP o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.			UNIDAD	m2	ITEM	10
	ACTA N° 1						
Ubicación	ANCHO	LARGO		M2	REGISTRO FOTOGRAFICO		
salon principal (sala de espera)	4,98	3,30		16,43			
MURO TANQUES DE AGUA	4,26	2,23		9,50			
TOTAL				25,93			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro e instalacion enchape en ceramica piso 40*30			UNIDAD	m2	ITEM	11
	ACTA N° 1						
Ubicación	ANCHO	ALTO		m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
BAÑOS PARA HOMBRES	2,8	3,00		8,40			
BAÑOS PARA DAMAS	4,2	3,58		15,04			
BAÑOS AREA ADMISTRTIVA	1,55	1,20		1,86			
TOTAL				25,30			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro e instalacion enchape en ceramica pared 30*30			UNIDAD	m2	ITEM	13
	ACTA N° 1						
Ubicacion	LARGO			m2	REGISTRO FOTOGRAFICO		
baños para hombres	10,25	1,20		12,30			
baños para damas	11,98	1,20		14,38			
	2,60	1,80		4,68			
AREA ADMINISTRATIVA	6,06	2,55		15,45			
cocina	4,75	1,10		5,23			
	6,50	1,82		11,83			
meson	4,72	6,00		28,32			
TOTAL				92,18			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	bajantes en pvc		UNIDAD	m	ITEM	15
	ACTA N° 1					
Ubicación	Longitud		m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
archivo	7,62		7,62			
coordinacion	5,80		5,80			
cocina	5,70		5,70			
TOTAL			19,12			

Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Tapete piso en caucho o estoperol			UNIDAD	m2	ITEM	17
Ubicación	Longitud	Ancho		Und	REGISTRO FOTOGRAFICO		
archivo (planta electrica)	6,30	3,60		22,68			
	10,84	0,20		2,17			
TOTAL				24,85			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	mantenimiento redes sanitarias(Incluye mantenimienton del pozo septico)			UNIDAD	global	ITEM	20
Ubicación	Cantidad			Uns	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	1,00			1,00			
TOTAL				1,00			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	mantenimiento general redes electricas		UNIDAD	global	ITEM	21
Ubicación	Cantidad		Unid	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	1,00		1,00	[redacted]		
TOTAL			1,00			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	mantenimiento general cubierta termoacustica		UNIDAD	global	ITEM	22
	ACTA N° 1					
Ubicación	CANTIDAD		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO		
salon principal	1,00		1,00			
TOTAL			1,00			

principal

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	demolicion cuartos de madera(incluye botadero)			UNIDAD	m2	ITEM	23
	ACTA N° 1						
Ubicación	ANCHO	ALTO		m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
area admon	19,06	2,74		21,80			
TOTAL				21,80			

Observaciones





MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	pintura en esmalte color azul. Lavado y lijado			UNIDAD	ml	ITEM	24
	ACTA N° 1						
Ubicación	ANCHO	LARGO		m	REGISTRO FOTOGRAFICO		
area admon		46,10		367,76			
Torre control		13,60 20,40 5,14					
Tanques de agua		92,30					
salon rincipal (fachada)		150,50					
Virgen		24,92 14,80					
TOTAL				367,76			

Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion cielo raso en pvc			UNIDAD	m2	ITEM	25
Ubicación	Ancho	Largo		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO		
baños para hombres	2,80	3,00		8,40			
baños para damas	3,58	4,25		15,22			
descuento de viga aerea	0,30	4,25		-1,28			
TOTAL				22,34			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Desmonte y retiro de cubierta en acrilicoy lijada de tubos. Incluye botada de escombros	UNIDAD	m2	ITEM	26

ACTA Nº 1

Ubicación	ANCHO	LARGO		m	REGISTRO FOTOGRAFICO
edificio pricipal	9,20	10,66		98,07	
TOTAL				98,07	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion cubierta en acrilico			UNIDAD	m2	ITEM	27
	ACTA N° 1						
Ubicación	ANCHO	LARGO		m	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
edificio pricipal	9,20	10,66		98,07			
TOTAL				98,07			

Observaciones

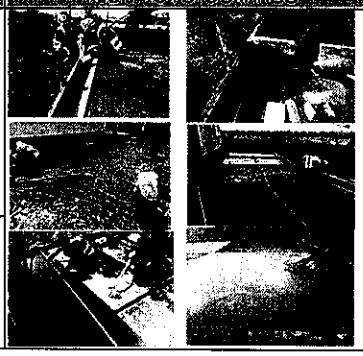
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA			1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO							
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						05 hasta 17	8	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Base en receba compactado e=0,20m.				UNIDAD	m3	ITEM	29
	ACTA N° 1							
UBICACION	ANCHO	LARGO	ESPESOR		m	REGISTRO FOTOGRAFICO		
patio al frente de la admon	3,50	38,00	0,20		26,60	   		
TOTAL					26,60			

Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						20 hasta 24	8	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Placa en Concreto de 3000 PSI. Incluye Refuerzo en Malla Electrosoldada (e=0,10m).				UNIDAD	m3	ITEM	30
	ACTA N° 1							
UBICACIÓN	ANCHO	LARGO	ESPESOR		m	REGISTRO FOTOGRAFICO		
patio al frente de la admon	3,50	38,00	0,10		13,30			
TOTAL					13,30			

Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	desmonte de cubierta en teja de zinc(incluye botadero)			UNIDAD	m2	ITEM	31
Ubicación	ancho	largo		m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	2.60	3.70		4,81			
	2.30	3.70		4,26			
	2.52	3.70		4,66			
	2.60	3.70		4,81			
kiosko	2.40	3.70		4,44			
	2.58	3.70		4,77			
	1.90	3.70		3,52			
	2.40	3.70		4,44			
	2.60	3.70		4,81			
TOTAL				40,52			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA				ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO					
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Canal en lamina de acero galvanizado, calibre 22 o su equivalente		UNIDAD	m	ITEM	33
Ubicación	Longitud		m	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
archivo	10,82		10,82			
coordinacion	11,30		11,30			
TOTAL			22,12			

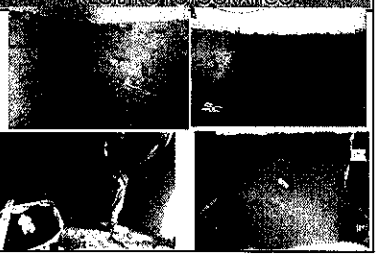
Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Revoques o Pañetes liso en muros interiores(incluye -fajas, filos y dilataciones)	UNIDAD	m2	ITEM	34

ACTA N° 1

Ubicación	ANCHO	ALTO		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
edificio pricipal	2,17	1,82		3,95	
	3,22			5,86	
	3,02			5,50	
	5,44			9,90	
	2,17			3,95	
	3,02			5,50	
	2,39	1,10		2,63	
TOTAL				37,28	

Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO				GRUPO EMPRESARIAL		
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Excavación en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibado natural. Incluye cargue y botada de escombros. De 0,0 a 2,00m.	UNIDAD	m3	ITEM	35

ACTA N° 1

Ubicación	ANCHO	ALTO	LARGO		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
placa area administrativa	3,5	0,20	38		26,60	
TOTAL					26,60	


Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Desmonte y retiro de cielo raso en madera. Incluye botada de escombros	UNIDAD	m2	ITEM	36

ACTA N° 1

Ubicación	ANCHO	LARGO		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
edificio pricipal	7,78	3,02		23,50	
TOTAL				**23,50**	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion de Reflector led de 50W	UNIDAD	m	ITEM	37

Ubicación	Cantidad			Unid	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	3,00			3,00	
TOTAL				3,00	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte e instalacion ESTUCO ACRILICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, incluye ranuras, filetes	UNIDAD	m2	ITEM	O.E 1

ACTA N° 1

Ubicación	ANCHO	ALTO	m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO
salon principal				
baños para hombres	10,26	1,00	10,26	
baños para mujeres	11,98	1,00	11,98	
cafeteria	15,82	1,82	28,79	
	2,39	1,10	2,63	
baños sala de espera	15,16	0,54	8,19	
facha posterior	7,40	1,10	8,14	
	4,98	3,30	16,43	
	1,33	1,90	2,53	
	1,20	0,85	1,02	
fachada frontal	2,73	1,52	4,15	
	10,00	2,04	20,40	
	8,80	3,00	26,40	
TOTAL			140,92	



Observaciones (*)

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	retiro de aparatos sanitarios, Incluye lavamanos		UNIDAD	UND	ITEM	O.E 2
	ACTA N° 1					
Ubicación	CANTIDAD		UND	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Bañadministrativo area	1,00		1,00			
baños para hombres	2,00		2,00			
baños para mujeres	3,00		3,00			
TOTAL			5,00			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	sunistro e instalacio de sanitario para discapacitaos	UNIDAD	und	ITEM	O.E 6

Ubicación	Cantidad		Und	REGISTRO FOTOGRÁFICO
baño para damas	1,00		1,00	
baños para hombres	1,00		1,00	
TOTAL			2,00	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion de lavamanos para personal discapacitado		UNIDAD	und	ITEM	O.E 7
Ubicación	cantidad		Und	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
baño para damas	1,00		1,00			
baños para hombres	1,00		1,00			
TOTAL			2,00			

OBSERVACIONES

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	sumistro e instalacion de socalo en fachada frontal			UNIDAD	m	ITEM	O.E 8
Ubicación	Cantidad			m	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
FACHADO FRONTAL	21,95			21,95			
TOTAL				21,95			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		


CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion de cielo en drywall			UNIDAD	m2	ITEM	O.E 9
Ubicación	Longitud	Ancho	Observaciones	m2	REGISTRO FOTOGRAFICO		
baños sala de espera	2,50	1,40		3,50			
	2,50	1,37		3,43			
TOTAL				6,93			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA				ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO					
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	desmonte de cielo en drywall			UNIDAD	m2	ITEM	O.E 10
Ubicación	Longitud	Ancho		m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
baños sala de espera	2,50	1,40		3,50			
	2,50	1,37		3,43			
TOTAL				6,93			



Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		2
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Construcción de PISO EN MORTERO IMPERMEABLE 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m.			UNIDAD	m2	ITEM	O.E 11
Ubicación	Longitud	Ancho		m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
losa torre control	3,80	3,70		14,06			
losa tanques de agua	3,28	4,26		13,97			
TOTAL				28,03			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad DOBLE para discapacitados, en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	und	ITEM	O.E 12

Ubicación	No.	cantidad		UNIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
baño para damas		1,00		1,00	
baño para hombres		1,00		1,00	
TOTAL				2,00	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	18001197 H4 DE 2018	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte y colocación de teja de fibrocemento, incuye gachos, amarres, traslapo, equipos de alturas y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.		UNIDAD	m2	ITEM	OE 13

Ubicación	ancho	largo		m2	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	2,60	3,70		4,81	
	2,30	3,70		4,26	
	2,52	3,70		4,66	
	2,60	3,70		4,81	
kiosko	2,40	3,70		4,44	
	2,58	3,70		4,77	
	1,90	3,70		3,52	
	2,40	3,70		4,44	
	2,60	3,70		4,81	
TOTAL				40,52	

Observaciones

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	19000789 H4 de 2019
Nombre del Contratista:	GRUPO S Y C S.A.S. NIT. 811031728-8
Periodo informe:	del veintisiete (27) de junio al nueve (9) de septiembre de 2019
Nombre de Supervisor:	Mauricio Hoyos Sierra
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

3. MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- 2 Localización y replanteo
- 3 Mantenimiento rejilla de cunetas

- 4 SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SANITARIO
- 5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
- 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL
- 7 suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre muros sin pintar o cubierta en teja de asbesto cemento, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.
- 8 Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad, tipo Viniltex o similar, sobre muros sin pintura, color a definir, antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiara y sellaran las superficies, se aplicara imprimante, se resanara y preparará la superficie.
- 9 Demolición de enchape piso y pared(incluye Botadero)
- 10 Suministro e colocación de impermeabilización con Restrucreto MIP o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.
- 11 Suministro e instalación enchape en cerámica piso 40*30
- 13 Suministro e instalación enchape en cerámica pared 30*30
- 15 bajantes en pvc
- 17 Tapete piso en caucho o estoperol
- 20 mantenimiento redes sanitarias(incluye mantenimiento del pozo séptico)
- 21 mantenimiento general redes eléctricas
- 22 mantenimiento general cubierta termoacústica
- 23 demolición cuartos de madera(incluye botadero)
- 24 pintura en esmalte color azul
- 25 suministro e instalación cielo raso en pvc
- 26 Desmonte y retiro de cubierta en acrílico. Incluye botada de escombros
- 27 suministro e instalación cubierta en acrílico

- 29 Base en recebo compactado e=0,20m.
- 30 Placa en Concreto de 3000 PSI. Incluye Refuerzo en Malla Electrosoldada (e=0,10m).
- 31 desmonte de cubierta en teja de zinc(incluye botadero)
- 33 Canal en lamina de acero galvanizado, calibre 22 o su equivalente
- 34 Revoques o Pañetes liso en muros interiores (incluye -fajas, filos y dilataciones)
- 35 Excavación en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibado natural. Incluye cargue y botada de escombros. De 0,0 a 2,00m.
- 36 Desmonte y retiro de cielo raso en madera. Incluye botada de escombros
- 37 suministro e instalación de Reflector led de 50W

4.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por **LA AEROCIVIL** que se relacionen con el objeto del contrato.
2. Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas en el marco del Sistema de Gestión Calidad; así como sugerir medidas que contribuyan a su mantenimiento y mejora, cuando sea conveniente.
3. Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental, y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema.
4. Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las actividades del contrato y velar por que las respuestas se tramiten dentro de los términos establecidos en la ley.
5. Entregar los informes y documentos relacionados en la cláusula novena del presente contrato, una vez sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor de este, en la Dirección Regional Antioquia de **LA AEROCIVIL.**
6. Conocer y aplicar las Políticas de Seguridad de la Información, definidas por **LA AEROCIVIL.**
7. Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción.

8. **El CONTRATISTA** debe acreditar al supervisor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, **LA AEROCIVIL** dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
9. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:
   a) Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
   b) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de **LA AEROCIVIL.**
   c) Hacer entrega al Grupo de Salud Ocupacional del certificado del examen médico pre-ocupacional de conformidad con la legislación vigente.
   d) Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como incidentes, accidentes o enfermedades laborales y contribuir en la implementación de actividades para su mitigación.
   e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la inducción, definido en el programa de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
   f) Participar en las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo determinadas por LA AEROCIVIL, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores.
   g) Participar y contribuir al cumplimiento de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
   h) Participar en la investigación y análisis de accidentes de trabajo, si usted como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha sido testigo de un accidente de trabajo en su dependencia.
10. Quedan sujetos al código de ética de **LA AEROCIVIL** especialmente en lo relacionado con las causales de conflicto de intereses.
11. Atender a los clientes internos y externos de **LA AEROCIVIL** de manera cordial, eficiente y oportuna.
12. Apoyar a **LA AEROCIVIL** en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y servicio al ciudadano; así como en el seguimiento permanente del cumplimiento de los requisitos normativos en el marco de su objeto contractual.

- El contratista ha cumplido con las obligaciones mencionadas anteriormente en el literal 3.2

4.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución, durante este periodo no se presentó ninguna entrega de bienes o productos, todos son suministro e instalación en obra.

5. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

6. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presenta ninguna observación

6.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES:		

6.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
17 DE junio 2019	

6.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

7. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

7.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO 2019	SALDO	PAGADO	VALOR PERIODO PENDIENTE
19000789 H4 DE 2019	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	$ 353.687.114,00	JULIO	$ 353.687.114,00	$ -	$ 98.027.185,00
			AGOSTO	$ 353.687.114,00	$ -	$ -
			SEPTIEMBRE	$ 353.687.114,00	$ -	$ -
			OCTUBRE	$ 353.687.114,00	$ -	$ -

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 27.71 % hasta el 9 de septiembre de 2019.

7.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO APLICA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Hoyos Sierra
IDENTIFICACIÓN 71.778.683 de Medellín
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
