INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 59 **DEL** 18 **AL** 24 **DE NOVIEMBRE DE 2019**

CONTRATO No 141-2018 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO (Indique el objeto del contrato de ejecución asociado) CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018

CONSTRUCTOR LUIS GABRIEL NIETO GARCIA (Escriba el nombre o razón social del Contratista de obra) **NIT** (Indique en este espacio el número del contrato Asociado) 11331006-4

INTERVENTOR INTERSA S.A (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría) **NIT** 860450844-3 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISIÓN FDLPA ING. TATIANA ESPEJO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la supervisión)

FECHA DE INICIACIÓN DE CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA	8 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2018 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA	7	DE	AGOSTO	DE	2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA PRÓRROGA No 1	7 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2019 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA PRÓRROGA No 2	7	DE	FEBRERO	DE	2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	7	DE	SEPTIEMBRE	DE	2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DEINTERVENTORÍA PRÓRROGA No 1	7 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2019 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DEINTERVENTORÍA PRÓRROGA No 2	7	DE	MARZO	DE	2020

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		86,00%		Trabajo Ejecutado		88%
Valor del Trabajo Programado		$ 7.511.240.000,00		Valor del Trabajo Ejecutado		$ 7.686.920.000,00
ETAPA DE DIAGNÓSTICO (PREVIA)	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		100%		Trabajo Ejecutado		100%
Valor del Trabajo Programado		$ 273.071.600,00		Valor del Trabajo Ejecutado		$ 273.071.600,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	86%		Trabajo Ejecutado	0%	88%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 6.899.860.000,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 7.685.920.000,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE /TRAMO	CENEFA	CÓDIGO ELEMENTO	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCIÓN	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
N.A				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

CIV 16001256 Barrio José Antonio Galán
- Demolición de andén existente por costado Oriental.
- Instalación de sardinel tipo A-10 y A-85 en zona de andén costado Oriental.
- Excavación para estructura en zonas de andén costado Oriental.
- Instalación de subbase en zonas de andén.
- Instalación de bordillo prefabricado tipo A-80, acero de refuerzo, malla electrosoldada, cenefas y cajillas.
- Excavación y construcción de cajas de inspección domiciliarias.
- Fundida andenes costado Oriental.

CIV 16003173 Barrio Alquería
- Excavación costado occidental de la Calle 38B Sur

CIV 16003758 Barrio Alquería
- Instalación provisional de material granular en el faltante de asfalto.

CIV 16002769 Barrio Bochica
- Excavaciones para instalación de rajón y sello para capa de mejoramiento de la subrasante.
- Conformación de sello con material B-200.

CIV 16002879 Barrio Bochica
- Realce de pozo de inspección red sanitaria, manija costado norte. Rellenos en zona de intersección poos carrera 32B.

CIV 16002846 Barrio Bochica
- Excavaciones, instalación de tubería aguas lluvias Concreto reforzado 30", costado oriental.
- Rellenos en triturado, instalación de tubería.
- Instalación tubería novafort 6" red domiciliaria costado sur.
- Demolición zona de andén existente costado norte, renivelación y mejoramiento con subbase.
- Instalación de bordillos, instalación de adoquín para cenefa e instalación concreto de planta para zona de espacio público.

COMPONENTE SOCIAL:

• Del 18 al 22 de noviembre, el contratista realiza atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12.m.
• El día 19 de noviembre, interventoria realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m.
Los días 18 y 22 de noviembre, el contratista realizó voz a voz en los CIV´s: 16002905, 16002879 y 16002846 (Asunción- Bochica) preguntando a los propietarios si estaban o no de acuerdo con la construcción de andenes, levantando acta de esta actividad.

Volantes de invitación o convocatoria:

• El día 18 d noviembre, el contratista realizó la entrega de los volantes de inicio de obra y levantamiento de actas de fachada para el CIV16004450 (Zona Industrial).

Volantes informativos:

• El día 18 de noviembre, el contratista envió a interventoria los volantes de inicio de obra y levantamiento de actas de fachada para el CIV16004450 (Zona Industrial). para revisión y aprobación. La interventoria envió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.
• El día 18 de noviembre, el contratista informó por medio de correo electrónico sobre el recorrido en el CIV 16002026 (Milenta 1), para realizar el cierre de algunas manifestaciones ciudadanas en este segmento vial.

COMPONENTE AMBIENTAL:

• Se realizaron recorridos en los frentes en ejecución, revisando la implementación del MAO aprobado, se hacen observaciones y son comunicadas al contratista, para que tomen la acción correctiva.
2 • El día 18, el contratista vía correo electrónico el reporte del RCD, correspondiente al mes de septiembre, el cual fue revisado y aprobado.
• El 18 se radico ante el FDLPA, la respuesta sobre el radicado No. 2019662270311 de fecha 21 de octubre del 2019.
• El día 19, se envió al FDLPA reportes y aplicativos de la WEB, correspondientes a los meses de obra, con el objetivo de realizar el reporte en su totalidad ante la SDA.
• Se realiza la calificación de las listas de chequeo correspondientes a la semana reportada.

ACTIVIDADES PROXIMA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO

CIV 16001256 Barrio José Antonio Galán
Instalación de cajillas de acueducto y cenefas. Armado e instalación de refuerzo en zonas de rampa y colocación de malla en zona peatonal. Fundida de andenes costado Oriental. Excavación para construcción de sumideros. Instalación de bordillo A-80. Excavación y construcción de cajas de inspección costado oriental.
CIV 16001793 Barrio El Sol
Remates en zona de acceso a prediosy atención a manifestaciones ciudadanas.
CIV 16003173 Barrio Alquería
Instalación de mezcla asfáltica.
CIV 16003758 Barrio Alquería
Acabados asfalto y remates.
CIV 16002769 Barrio Bochica
Rellenos granulares en subbase costado sur, instalación geobloque.
CIV 16002879 Barrio Bochica
Inicio red sanitaria 12" costado sur.
CIV 16002846 Barrio Bochica
Rellenos mejoramiento subrasante, estructura de vía, rajón y sello.


COMPONENTE SOCIAL

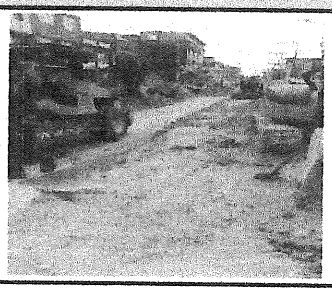
Se realizará mantenimiento a los puntos satélites de información según recorrido.
Se realizará mantenimiento a loa afiches informativos según recorrido.
Se realizará la entrega de los volantes para realizar reunión de finalización del CIV 16003612 (Santa Rita 2).
Se realizará seguimiento a las manifestaciones ciudadanas.
El día 26 de noviembre se realizará capacitación social al personal de obra
Los días 25 y 26 de noviembre se realizarán actas de fachada del CIV 16004450 Zona Industrial
El día 25 de noviembre se realizará la sistematización de las actas de cierre del CIV 16003612 barrio Santa Rita.

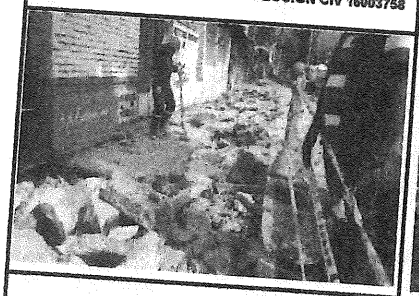
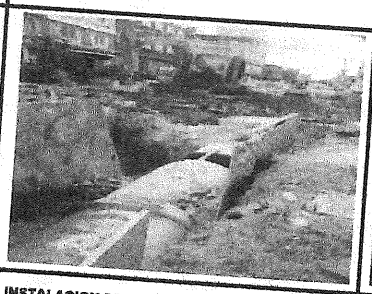
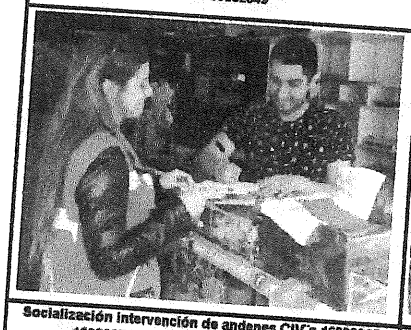
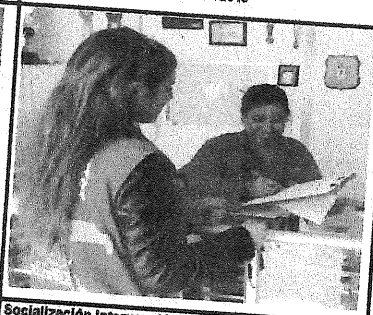
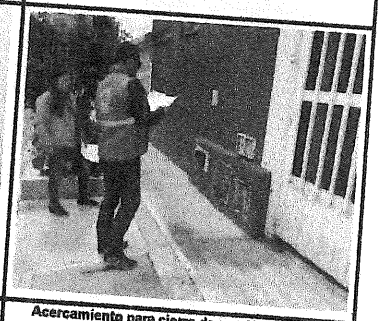
COMPONENTE AMBIENTAL

Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes SSTMA.
Revisión por parte de la interventoria de los documentos de ingreso, afiliaciones, inducciones del personal nuevo.
Calificación lista de chequeo del componente SISOMA.
Se asistirá el 26 de noviembre, a la capacitación programada por el contratista.
Elaborar informe semanal.
Se radicará al FDLPA informe No 11 y 12 del área ambiental, aprobado.
Se radicará al FDLPA el reporte de los RCD, correspondientes al mes de septiembre.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO





ESMALTADO DE CAJAS DE INSPECCION CIV 16003758	RETIRO DE MATERIALPROVENIENTE DE EXCAVACION CIV 16002769	INSTALACION DE SUBBASE CIV 16002769
		
DEMOLICION DE ESPACIO PUBLICO CIV 16002849	INSTALACION DE BORDILLO A-80 CIV 16002849	VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI EN ESPACIO PUBLICO CIV 16002849
		
EJECUCION DE TEXTURIZADO EN ESPACIO PUBLICO CIV 16002849	INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 30" CIV 16002849	Levantantamienro de actas de actas de fachada del CIV 16004450 Zona Industrial
		
Socialización intervención de andenes CIV´s 16002905, 16002879 y 16002846 Asunción-Bochica	Socialización intervención de andenes CIV´s 16002905, 16002879 y 16002846 Asunción-Bochica	Acercamiento para cierre de manifestaciones ciudadanas barrio Milenta CIV 16002026
		
Acopio de material granular frente Bochica	Implementación de senderos peatonales Bochica-asunción	Caja para tratamiento radicular, frente Bochica

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (Día en letras) (25) (Día en números) días del mes de NOVIEMBRE de 2019 (Año en letras con acta)

(Firma)
(nombre) Andres Usache Gutman
Director de Interventoría
INTERSA S.A

00000267

ANEXO Nº. 12
PRÓRROGAS

ANEXO Nº. 12.1
PRÓRROGA No.1
INTERVENTORÍA

SECRETARIA DE GOBIERNO
Alcaldía Local
PUENTE ARANDA

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 APLICABLES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 141 DE 2018, RESULTANTE DEL PROCESO DEL CONCURSO DE MÉRITOS ALPA-CMA-008-2018, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA E INTERSA S.A.

No. Contrato	Contrato de Interventoría No. 141 de 2018
Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".**
Contratista	**INTERSA S.A.**
Valor Inicial del contrato	$ **971.200.000.oo**, incluido impuestos, tasas y gravámenes a que haya lugar, de conformidad con los precios presentados en la oferta económica.
Fecha de Suscripción	13 de agosto de 2018
Plazo de Ejecución	Once (11) Meses
Fecha de Inicio	8 de octubre de 2018
Fecha de Terminación Inicial.	7 de septiembre de 2019
Prórroga No. 1	Dos (2) Meses. Comprendidos entre el 8 de septiembre 2019 y el 7 de noviembre de 2019.
Fecha de Terminación Incluidas Prórroga No. 1.	7 de noviembre de 2019.
Prórroga No. 2	Cuatro (4) meses. Comprendidos a partir del 8 de noviembre de 2019 hasta el 7 de marzo de 2020
Fecha de terminación con Prórroga No. 2	7 de marzo de 2020
Valor de adición No. 1	$309.018.181

Entre los suscritos a saber: **MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.919.224 expedida en Bogotá, en calidad de Alcaldesa Local (E) de Puente Aranda, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 337 del 13 de junio de 2019 y Acta de posesión No. 315 del 13 de junio de 2018, quien actúa en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA,** en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 374 de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, quien para efectos de este documento se designará como **EL FONDO**, de una parte, y por la otra, **ISABEL VICTORIA LEÓN REYES**, identificada con C.C. No. 39.778.286 de Bogotá, en

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 APLICABLES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 141 DE 2018, RESULTANTE DEL PROCESO DEL CONCURSO DE MÉRITOS ALPA-CMA-008-2018, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA E INTERSA S.A.

calidad de representante legal de INTERSA S.A, identificada con NIT 860.450.644-3 quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos acordado suscribir la Prórroga No. 2 y adición No. 1 aplicables al contrato de interventoría No. 141 de 2018, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el día 13 de agosto de 2018, se suscribió el contrato de interventoría No. 141 de 2018, que tiene por objeto "**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA**" **2).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en Once (11) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo cual se surtió el día 8 de octubre de 2018, con fecha de terminación inicial el día 7 de septiembre de 2019. **3).** Que el valor del contrato se pactó en la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (**$971.200.000,00**), incluidos todos los gastos en que incurra **EL CONTRATISTA** para el cumplimiento del contrato, impuestos, tasas y gravámenes de Ley **4).-** Que la interventoría objeto del contrato 141 de 2018 se realiza sobre el contrato de obra pública No. 156 de 2018, suscrito entre el FDLPA y LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA. **5).-** Que las partes suscribieron prórroga No. 1, por un término de Dos (2) meses a partir del 8 de septiembre 2019 al 7 de noviembre de 2019, por lo que el contrato está vigente. **6).-** Que el contratista **LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA** presentó solicitud de prórroga mediante oficio No. LNG-326-2019, sustentado en circunstancias de orden técnico, concernientes a la etapa de diagnóstico y diseño del contrato de obra, las cuales generaron reuniones con la interventoría, en el cual se informa la posible intervención de algunos segmentos viales, que a la fecha no se han podido iniciar por inconvenientes en la limpieza de redes de alcantarillado por parte de la EAB, al igual que la definición de datos técnicos estructurales y geotécnicos de colector pluvial por parte de la misma entidad, y/o aprobación de los PMT por parte de la SDM en virtud de su exigencia y actual estudio por parte de esta Entidad a los aforos y modelaciones de tránsito que hemos realizado. **7).** - Que mediante oficio No. 20196610127472 de fecha 9 de octubre de 2019, la interventoría INTERSA S.A., avala la prórroga del contrato principal de obra y solicita adición por un valor de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS ($309.018.181) MCTE y prórroga por un término de cuatro (4) meses, de conformidad a las circunstancias de orden técnico que se le han presentado al contratista, para continuar con la labor de interventoría durante el término adicional del contrato principal **8).-** Que el apoyo a la supervisión del área de infraestructura del FDL Arquitecta Tatiana Espejo, mediante documento de solicitud de modificación contractual, avala la solicitud de prórroga y adición conforme a las consideraciones realizadas por el interventor, por lo tanto, solicita prorrogar por cuatro (4) meses y adición por un valor de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

20000271

SECRETARIA DE GOBIERNO
Alcaldía Local
PUENTE ARANDA

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 APLICABLES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 141 DE 2018, RESULTANTE DEL PROCESO DEL CONCURSO DE MÉRITOS ALPA-CMA-008-2018, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA E INTERSA S.A.

PESOS ($309.018.181) MCTE al contrato de interventoría. **9).-** Que los documentos anteriormente relacionados justifican la prórroga y adición al contrato de interventoría No. 141 de 2018, forman parte integral de la presente modificación contractual. **10).** Que en atención a las consideraciones expuestas por el contratista, por el interventor, y el apoyo a la supervisión del FDL Arquitecta Tatiana Espejo, la Alcaldesa Local (E) aprobó la prórroga de cuatro (4) meses más y la adición por un valor de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS ($309.018.181) MCTE al contrato de interventoría No. 141 de 2018, por lo tanto, remite los documentos al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. **11)**. Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el contrato de interventoría No. 141 de 2018, por CUATRO (4) MESES, contados a partir del día 8 de noviembre de 2019, con nueva fecha de terminación el día 7 de marzo de 2020 inclusive. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Adicionar el contrato de interventoría por un valor de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS ($309.018.181) MCTE. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato de interventoría No. 141 de 2018 se mantienen sin modificación alguna.

La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes a través de la plataforma del SECOP II.

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2019.

Elaboró: Jenny Andrea Rocha – Abogada de Apoyo FDL
Revisó: Bladimir Rincón – Abogado del FDL
Revisó: Angela Martínez López – Abogada Despacho
Aprobó María del Pilar Muñoz Torres. Alcaldesa Local.

20000272

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME N°12 ETAPA DE OBRA

GESTIÓN SSTMA

PERIODO: 01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA FDLPA- 141-2018

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.

INTERSA S.A.

00000273

INFORME Nº 12. ETAPA DE OBRA
GESTIÓN SSTMA

PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
GESTIÓN SSTMA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA- 141-2018
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 156-2018

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.

INTERSA S.A
NIT: 860.450.644-3

BOGOTA D.C, NOVIEMBRE 2019

00000274

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSION	DETALLE
NOVIEMBRE DE 2019	00	ORIGINAL

CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaboró		FIRMA
Nombre:	Biól. Mónica Andrea Fajardo Paramo	
Cargo:	Residente SSTMA	

00000275

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION **7**

1 OBJETIVOS **8**

1.1. GENERAL **8**

ESPECÍFICOS **8**

2 GENERALIDADES DEL PROYECTO **9**

2.1. Ubicación **9**

2.2. Descripción del proyecto **10**

2.3. Descripción de contratos de obra y de interventoría **11**

3 ACTIVIDADES DE GESTION SST DEL CONTRATISTA **13**

3.1. Componente D1 seguridad y salud en el trabajo **13**

3.1.1 COPASST O Comité de Convivencia en Seguridad y Salud en el Trabajo ... 13

3.1.2 Socialización Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo 13

3.1.3 Socialización Política de SST 13

3.1.4 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3.1.5 Pago de Parafiscales 15

3.1.6 Inducción 15

3.1.7 Auditorias 15

3.1.8 Actualización Matriz de Peligros 15

3.1.9 Diagnóstico de Condiciones de salud 16

4 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL **17**

5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS **22**

6 ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA **22**

6.1.1 A-1: Conformación del equipo de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 22

6.1.2 A-2: Capacitación ambiental (ver anexo 23

00000276

6.1.3 B1. Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o temporales y centros de acopio 23
6.1.4 B2- Manejo de materiales de construcción 24
6.1.5 B3 - Manejo integral de residuos sólidos 26
6.1.6 B4 – Control de emisiones atmosféricas 27
6.1.7 B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros 27
7 COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACION Y EL PAISAJE 28
7.1.1 C-1: Manejo de la vegetación 28
8 COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 28
8.1.1 E-1: Manejo de Señalización 28
9 INDICADORES DE DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA 29
9.1.1 Valoración de desempeño SSTMA del contratista .....
9.1.2 Cumplimiento del Componente Ambiental .....
9.1.3 Cumplimiento del Componente SST .....
10 VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA 30
11 ACTIVIDADES DE GESTION SST Y AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA 30
12 CONCLUSIONES 33
13 RECOMENDACIONES 35
ANEXOS CONTRATISTA .....
ANEXOS INTEVENTORIA .....

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Relación de CIV a intervenir 10
Tabla 2: Información Contrato 11
Tabla 3: .Relación de los ingresos nuevos y antiguos 14
Tabla 4. indicador de accidentabilidad 19
Tabla 5. Los integrantes de la Brigada de Emergencias son: 21
Tabla 6.residentes sstma del contratista 23
Tabla 7. Relación fechas de capacitación 23
Tabla 8. Relación de personal BOAL – noviembre de 2019. 24
Tabla 9. Relación de materiales utilizados en obra mes de noviembre 25

00050277

Tabla 10. Relación de RCD mes noviembre. 26

Tabla 11 RCD´s utilizados en el mes de noviembre de 2019. 27

Tabla 12. cantidad de sumideros por frente de obra. 28

LISTADO DE ANEXOS

- **ANEXO 1. FT-17; APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA** 37
- **ANEXO 2 SOPORTES PAGOS DE NOMINA CONTRATISTA**....38
- **ANEXO 3. FORMATOS DE ACCIDENTABILIDAD DEL CONTRATISTA** 39
- **ANEXO 4. FORMATOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CONTRATISTA** 40
- **ANEXO 5 FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE RCD , MATERIALES Y CERTIFICACIONES** 41
- **ANEXO 6. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SSTMA** 42
- **ANEXO 7. ACTAS DE REUNION Y COMITES SEMANALES**....43
- **ANEXO 8. CERTIFICADOS DE REVISION DE INFORMES Y CUMPLIMIENTOS SSTMA DEL CONTRATISTA** 45
- **ANEXO 9. FT-17; APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA**....46
- **ANEXO 10. FORMATOS SSTMA**....47
- **ANEXO 11.CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO** ..48
- **ANEXO 12 . SOPORTE PAGO DE NOMINA**....49
- **ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO** 50
- **ANEXO 14. LISTAS DE CHEQUEO**....51

00000278

INTRODUCCION

La seguridad y salud en el trabajo junto con La Gestión Ambiental, están orientadas a mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad, en el desarrollo de los proyectos y para el caso en particular, los diagnósticos e intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda, se realice bajo el marco normativo SSTMA aplicable y vigente y por lo establecido en los términos contractuales de las partes, además por el compromiso por parte de la Gerencia en esta temática, por lo anterior, se lograra una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismo, en los diferentes oficios contribuyendo al bienestar físico y social del trabajador

INTERSA S.A, en cumplimiento de las obligaciones contractuales presenta el siguiente informe de las actividades Ambientales, Seguridad y salud en el Trabajo, ejecutadas durante el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2019, en esta Etapa de Construcción, como cumplimiento de cada uno de los componentes de la gestión SSTMA

El contrato 141 de 2018 junto con el COP 156 de 2018, inició la etapa de diagnóstico el 08 de octubre de 2018, teniendo en cuenta que durante los primeros días de etapa preliminar se revisaron y aprobaron los documentos contractuales, requisito para la ejecución del proyecto, los documentos fueron radicados en el FDLPA.

00000279

1 OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Describir de forma detallada la gestión, seguimiento y control semanal y mensual de las actividades programadas dentro del MAO, presentado por el contratista. Lo anterior se evaluara con lo establecido en el anexo sisoma y por medio de las listas de chequeo; enmarcadas a las actividades de *diagnósticos e intervención del mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá DC"*, con el fin de verificar que los productos presentados por el Contratista respondan a criterios de calidad y suficiencia; de tal manera que sus resultados garanticen el adecuado manejo de los impactos ambientales y desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los parámetros del FDLPA.

ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento y acompañamiento a las actividades ejecutadas por el contratista para la etapa de obra.
- Verificar que las actividades realizadas, se lleven a cabo según la normativa vigente y el anexo SISOMA.
- Verificar el manejo y el transporte de los RCD's Generados en obra
- Revisar y aprobar el acopio de los materiales en obra
- Verificar las actividades ejecutadas por los BOAL en el frente de obra
- Verificar el estado y la documentación de la maquinaria utilizada en obra.
- Revisión y Aprobación de informes semanales y mensuales por parte del contratista

00000280


- Recomendar y realizar las observaciones que se presenten en obra para las actividades SSTMA con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el MAO.
- Verificar que se apliquen los procedimientos enviamos por el contratista en los componentes SSTMA en obra.
- Verificar la reutilización de material fresado en obra
- Verificar la instalación de asfalto mejorado con caucho para dar cumplimiento al decreto 265 del 2016
- Seguimiento a la implementación de los PMT aprobados por la SDM

2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. UBICACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en las diferentes UPZ de la localidad 16 de Puente Aranda; entre ellas tenemos: entre ellas tenemos: UPZ 40— CIUDAD MONTES - UPZ 41 - MUZU - UPZ 43 — SAN RAFAEL - UPZ 111 — PUENTE ARANDA

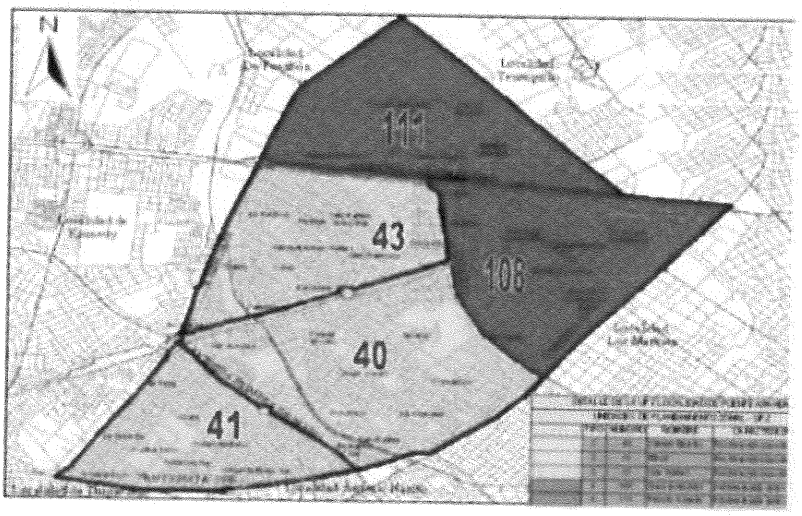figura No. 1 localidad donde de Puente Aranda.



Fuente. Alcaldía mayor de Bogotá

00000281

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto, se está desarrollando dentro del área determinada por los Pliegos de condiciones, en la localidad de Puente Aranda y en los CIV determinados en la licitación pública No. ALPA-LP-006-2087

En los tramos a intervenir en la localidad de Puente Aranda se realizarán los diagnósticos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial en cada uno de los CIV relacionados:

Tabla 1: Relación de CIV a intervenir

N	CIV	VIA	INICIO	FIN
MP	16001911	Cl 2b	Kr 41 A	Kr 42
MP	16002174	Cl 17 sur	Kr 52 A	Kr 52B
MP	16000683	Kr 56	Cl 4D	Cl 4G
MP	16003114	Cl 2	Kr 30 A	Kr 331
MP	16002882	Cl 1	Kr 8 A bis	Kr 38 Bis
MP	16000902	Kr 52 D bis	Cl 4D	Cl 4C
MP	16000618	Cl 2 B	Kr 32	Kr 32 A
RH	16001256	KR 54	CL 2B	CL 3
RH	16002174	CL 17 SUR	KR 52ª	KR 52B
RH	16003550	KR 50A	CL 33 sur	CL 32 sur
RH	16003758	KR 52B	CL 40 B Sur	CL 41
RH	16002945	CL 1 G	KR 33	KR 33 A
RH	16002769	CL 2	KR 34	KR 35
RH	16000683	KR 56	CL 4 D	CL 4 G
RH	16004097	KR 50ª	CL 39 Sur	CL 38b Sur
RH	16003273	KR 31b	CL 1D Bis	CL 1F
RH	16001283	KR 44	CL 4B	CL 4 F
RH	16003026	Cl 1 D BIS	KR 33	CALLEJON
RH	16002844	CL 1H BIS	KR 33	CALLEJON
RH	16002882	CL 1	KR 38 A BIS	KR 38 BIS
RH	16004735	KR 38 A	CL 1 D	CALLEJON

00000282

N	CIV	VIA	INICIO	FIN
MP	16001911	Cl 2b	Kr 41 A	Kr 42
MP	16002174	Cl 17 sur	Kr 52 A	Kr 52B
MP	16000683	Kr 56	Cl 4D	Cl 4G
MP	16003114	Cl 2	Kr 30 A	Kr 331
MP	16002882	Cl 1	Kr 8 A bis	Kr 38 Bis
MP	16000902	Kr 52 D bis	Cl 4D	Cl 4C
MP	16000618	Cl 2 B	Kr 32	Kr 32 A
RH	16001040	KR 53C	CL 4C	CL 4F
RH	16000629	Cl 4D	KR 57	KR 57A
RH	16003173	CL 38A SUR	KR 52C	AK 68
RH	16002026	CL 20 SUR	TV 53A	KR 58

Fuente Área Social Intersa. S.A.
MP: mantenimiento periódico RH: rehabilitación

2.3. DESCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

Tabla 2: Información Contrato

Contrato	156 de 2018
Empresa	Luis Gabriel Nieto García
Nit	11.331.006-4
Dirección	Calle 109 N° 19-36. OF. 401
Teléfono	6294150
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

00000283

Acta de inicio	08 de octubre de 2018
Fecha de terminación	07 de Febrero de 2019
Plazo de ejecución	16 meses – 2 meses Diagnostico – 14 meses Construcción
Prorroga N° 1	2 meses desde el 8 de Septiembre al 7 de Noviembre del 2019
Prorroga N° 2	4 meses desde el 8 octubre al 7 febrero del 2019
Valor de la obra	$ 8.734.000.000
Interventoría /Empresa	INTERSA S.A
Contrato	141 DE 2018
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.
Nit	860.450.644-3
Dirección	Av. 15. N° 124-29 0f. 601
Teléfono	2149645
Acta de inicio	08 de octubre de 2018
Fecha de terminación	07 de marzo de 2019
Plazo de ejecución	17 meses
Valor de la obra	$ 1.280.218.181

Fuente: elaboración propia

00000284

3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA

3.1. COMPONENTE D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1.1 COPASST O Comité de Convivencia en Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista envía soporte de la reunión mensual llevada a cabo el día 21 de noviembre 2019, en esta el contratista realiza lectura del acta anterior y se procede a realizar la capacitación que se tiene programada para el mes de noviembre, según cronograma se tenía programada capacitación sobre investigación de accidentes de trabajo.

El objetivo principal era que los representantes del COPASST entendieran la importancia de conocer la legislación y el procedimiento aplicable a todo lo referente con accidentes laborales, los comités o capacitaciones son verificadas y aprobadas.

3.1.2 Socialización Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo

Interventoría hace la verificación según los soportes enviados por el contratista, una vez el contratista reporte un ingreso nuevo, con el propósito de asegurar que el personal que ingresa a prestar sus servicios al contrato 156 de 2018, se le realicen las capacitaciones e inducciones en los siguientes temas: Políticas del SG-SST, deberes, derechos, y generalidades del contrato. Ver Anexo Formato 24 del IDU "Registro de Inducción, Capacitación y Entrenamiento".

3.1.3 Socialización Política de SST

Se evidencia por medio de formato 24 el registro de inducción y socialización de las políticas de seguridad y salud en el trabajo del contratista, el cumplimiento de las

0000285

normas contenidas en el Reglamento de salud ocupacional, junto con la inducción general del proyecto para los 3 ingresos nuevos.

3.1.4 AFILIACIONES: ARL, EPS Y AFP

Se verifica la información según lo enviado por el contratista, respecto a los soportes de afiliaciones, pagos y Aportes al sistema de Seguridad Social, esta actividad se hace a media que se vincula personal nuevo al contrato y además se evidencia que tanto los ingresos nuevos, como el personal antiguo durante el periodo reportado estén afiliados a la ARL, EPS, AFP, los soportes que demuestran esta actividad se encuentran en el anexo 1 del informe N° 14 SST el cual se radicara al FLPA dentro del periodo de noviembre, revisado y aprobado por interventoría y en el anexo 1 del presente informe se adjunta formato 17 del IDU" Afiliación al Sistema de Seguridad Social y Registro de Exámenes Médicos de Ingreso, Periódicos y Egreso, donde se relaciona el personal nuevo que ingreso para el periodo de igual forma los ingresos retiros y personal antigua del COP 156 de 2018. Dando cobertura total del personal activo del contrato mencionado.

A continuación de muestra la relación del personal activo

Tabla 3: .Relación de los ingresos nuevos y antiguos

CONDICIÓN	CANTIDAD
Nuevos	3
Antiguos	84
Retiros	6
Traslados	2
TOTAL	95

00000286

3.1.5 Pago de Parafiscales

El contratista hace el pago de la planilla general de seguridad social el día 6 del mes de noviembre de los 84 trabajadores antiguos y como soporte envía la afiliación de los 3 ingresos nuevos, retiros 6 y traslados 2, por lo cual la interventoría hace la verificación y seguimiento de los respectivos pagos de cada uno de los trabajadores directos y subcontratistas.

3.1.6 Inducción

Se evidencia por medio de formato 24, la inducción y registro de 3 ingresos nuevos, sobre política SST, Política de Alcohol y Drogas, funciones y responsabilidades, notificación al trabajador sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto, notificación de derecho a examen de egreso, Reglamento de Higiene, Seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes, elementos de Protección personal, COPASST y su funcionamiento, se notifica de sus deberes y derechos como trabajador.

3.1.7 Auditorias

Para este periodo no se exige ninguna auditoria

3.1.8 Actualización Matriz de Peligros

Para el periodo se incluye la actividad de corte de piso y el contratista realizo actualización de la matriz de Peligro

3.2 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

3.2.1 Diagnóstico de Condiciones de salud

El contratista durante este periodo informo que se presentaron 3 Ingresos, según el examen médico ocupacional realizado a cada ingreso, se observa que los ingresos no presentan restricciones, por lo tanto, se aprueba el ingreso.

3.2.2 Exámenes Médicos Ocupacionales

Para este periodo el contratista envía soportes de los exámenes médicos ocupacionales de 3 ingresos nuevos, lo cual fue revisado por interventoría mediante copia de los exámenes médicos de ingreso.

3.2.3 Reubicación laboral

Para este periodo no requiere realizar la reubicación de ningún trabajador, según lo evidenciado y lo reportado por el contratista, hasta el momento ningún trabajador que haya sufrido accidentes de trabajo o adquirido algún tipo de enfermedades profesionales, y que puedan quedar con algún impedimento para realizar las actividades normales en su área de trabajo.

00000288

4 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.1. Campamento

Para dar cumplimiento a este ítem se evidencio por medio de recorridos diarios la instalación de un campamento temporal ubicado en; Dirección transversal 53 a con calle 20, En todos los frentes de obra de rehabilitación, se contó con un campamento móvil, el cual sirve para que los trabajadores dejen sus pertenencias y tomen sus tiempos de descanso, este campamento estará dotado de Camilla, Botiquín y Extintor.

Los campamentos están ubicados dentro del cerramiento aprobado por PMT, se realizó a diario jornadas de orden aseo y limpieza.

4.2. Entrega Elementos de Protección Personal

Se evidencia la entrega de elementos de protección personal por medio de soporte de control de entrega de elementos por parte del contratista a una población de 3 ingresos nuevos y según las inspecciones diarias en obra, donde se verifica el estado de cada EPP, se evidencio la reposición de Overoles, Tapabocas, tapa oídos, Guantes de Vaqueta y Caucho, Gafas de seguridad (Lente claro y lente oscuro), Botas, etc, sin embargo, en recorridos se evidencia el no uso de la totalidad de los EPP´s

4.3. Re evaluación de EPP

El contratista informa que a la fecha no se han tenido que realizar cambios de los EPP Usados, todos los trabajadores reportan que los usados a la fecha generan comodidad y seguridad en sus labores, esta actividad es verificada por interventoría mediante recorridos diarios.

00000289

4.4. Unidades Sanitarias

Interventoría hace la verificación del estado de los baños portátiles instalados en los frentes de obra y se revisan los vales que demuestran el mantenimiento y limpieza de los mismo durante la semana, se evidencia en todos los frentes baños portátiles cumpliendo lo exigido en los pliegos de condiciones.

4.5. Suministro de Hidratación

Según lo evidenciado en recorridos de seguimiento por parte de la interventora, se observa que el contratista cumple con el suministro de agua potable para consumo e hidratación de los trabajadores, en los frentes en ejecución. Ver anexo 15

4.6. Manejo de Sustancias Químicas

Para este periodo Interventoría realizo una inspección en los frentes en ejecución verificando el acopio, manejo y las hojas de seguridad, evidenciando que el contratista cumple con lo exigido en los pliegos y en cada frente se tienen las hojas de seguridad de tres sustancias químicas existentes en obra (ACPM, CEMENTO y EMULSION ASFALTICA). Para lo cual la interventoría sugiere la identificación, rotulado y etiquetado de los productos químicos existentes en obra.

➢ ACPM	➢ Gasolina
➢ Cemento	➢ Impermeabilizante para mezclas De mortero y concreto (Toxement 1A)

00000290

➢ Emulsión Asfáltica	

4.7. Reporte e Investigación y elaboración de Informes de Accidentes de Trabajo

Durante el periodo reportado el contratista no reporto ningún accidente y en recorridos la comunidad no manifestó ningún accidente ocasionado por las actividades de obra.

Tabla 4. indicador de accidentabilidad

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASA
OCTUBRE DE 2018	7	616	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE DE 2018	16	2288	0	0	0	0		0	0
DICIEMBRE DE 2018	40	7592	0	0	0	0	0	0	0
ENERO DE 2019	45	12528	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO DE 2019	46	528	0	0	0	0	0	0	0
MARZO DE 2019	82	1896	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL DE 2019	105	19200	0	0	0	0	0	0	0
MAYO DE 2019	121	20760	1	4	9,63	38,54	0,37	4	0,83
JUNIO DE 2019	122	23546	1	9	8,49	76,45	0,65	9	0,82
JULIO DE 2019	135	24960	1	2	8,01	16,03	0,13	2	0,74
			0	14	Los días perdidos corresponden al accidente Ocurrido en el mes de Junio al Señor Elías, por valoración pendiente de especialista y programación de cirugía				
AGOSTO DE 2019	136	28040	1	1	7,13	7,13	0,05	1	0,74
				13 días perdidos accidente ocurrido en accidente ocurrido en junio	7,13	92,72	0,66	13	0,74
SEPTIEMBRE DE 2019	117	23087	2	1	17,33	8,66	0,15	0,5	171
				11 días perdidos accidente ocurrido en accidente ocurrido en Agosto	17,33	95,29	165	5,5	171
OCTUBRE DE 2019	106	23923	1	1	8,36	8,36	0,07	1	0,94
NOVIEMBRE DE 2019	95	22379	0	0	0	0	0	0	0

00000291

4.8. Ausentismo

Se verifico en recorridos diarios y en la información suministrada por el contratista en donde informa que para este periodo no se presentó ausencia del personal.

4.9. Inspecciones

Interventoría hace la revisión por medio de soportes enviados por el contratista de las inspecciones de campamentos, botiquín, extintor y herramienta menor, adicional a los soportes interventoría realiza recorridos diarios verificando el estado y la permanencia de los mencionados.

4.10. Actividades de Capacitación

Los días 27 y 28 de noviembre del 2019, se verifica la capacitación programada para este periodo según cronograma presentado y aprobado, evidenciando cobertura total del personal vinculado al contrato y por medio de formato 24, en donde se relaciona la asistencia, a continuación, se mencionan las dos capacitaciones realizadas por el contratista.

1. Autocuidado y uso de elementos de protección personal
2. Capacitación primeros auxilios básicos - Lección aprendida

4.11. Plan de emergencias y contingencias

Se verifica en cada frente en ejecución la permanencia de los elementos que hacen parte del plan de emergencia y contingencia en obra como son: camillas, botiquín, extintores, cuenta con el Medevac publicado en cada uno de los campamentos de obra.

00000292

4.12. Conformación Brigadas de Emergencia

Interventoría hace el seguimiento a las reuniones mensuales, hasta la fecha el contratista ha realizado dos sesiones de capacitación y practica sobre primeros auxilios avanzados, por parte de la ARL Sura.

Tabla 5. Los integrantes de la Brigada de Emergencias son:

NOMBRE	CEDULA
Leidi Bibiana Yas Miranda	1237688062
Wilson Alirio Linares Acosta	80724020
Yamile Merchán Contreras	1023035093
Diego Arley Galindo Panqueva	1022405981
Astrid Fabiola Maldonado Díaz	57771982

4.13. Simulacros

Para este periodo el contratista no programo esta actividad siguiendo el cronograma de actividades propuesto.

4.14. Inspección a Botiquín y Extintor

Se verifica por medio de soportes enviados a interventoría las inspecciones a los elementos botiquin y extintor), esta actividad el contratista la realiza con el fin de verificar que se encuentren en óptimas condiciones y remplazar los elementos faltantes, en caso de presentarse alguna emergencia y ser necesario hacer uso de ellos.

00000293

4.15. Emergencias Presentadas

Para este periodo no se evidencia y no se reporta ningún tipo de emergencia en obra

5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

El contratista envió los documentos del ingreso de un vibro compactador, el cual fue revisado y aprobado.

Durante el periodo evaluado se presentó el re-ingreso de una volqueta de placas TZY785,

Los vehículos y la maquinaria utilizada durante el periodo evaluado se relacionan en el Formato IDU "Listado de Vehículos" y Formato IDU "Listado de Maquinaria y Equipo".

Durante el periodo se reportaron 8 vehículos y 5 Máquinas.

6 ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

6.1. Componente A: cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales

6.1.1 A-1: Conformación del equipo de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

Para este mes el contratista mantiene el equipo SSTMA estipulado en el anexo técnico para el CPO 156 de 2018, en donde se exige un residente Ambiental y un residente SST, con dedicación del 75%, a continuación, se relacionan las personas para los cargos anteriormente mencionados

00000294

Tabla 6.residentes sstma del contratista

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Profesional Ambiental	*Bairo Guañarita Figueroa*	*75%*
Profesional SST	*Astrid Fabiola Maldonado*	*75%*

6.1.2 A-2: Capacitación ambiental

Para este periodo el contratista realizo una capacitación a una población de 47 trabajadores (personal de obra y administrativo), dando cumplimiento a lo exigido en los pliegos, y con lo presentado en el cronograma de capacitaciones, esta actividad lo registra en el formato 24 ¨Registro de inducción y capacitación, para lo cual se hacer la verificación y asistencia de la misma

Tabla 7. Relación fechas de capacitación

FECHA	CANTIDAD DE PERSONAL	LUGAR/RESPONSABLES	TEMA TRATADO
26/10/2019	47	PAC – Residentes Ambientales	**MANEJO AMBIENTAL EN OBRA**

6.2. Componente B: Manejo Ambiental en la ejecución de actividades constructivas

Para este contrato se hizo la apertura del Pin ante la Secretaria Distrital de ambiente

PIN DE LA OBRA: 15995

6.1.3 B1. Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o temporales y centros de acopio

00000295

Para este periodo se siguen evidenciando dos tipos de campamentos, el primero ubicado en la carrera Cr 53 g número 1-04 Barrio Camelia, como campamento fijo y Punto PAC y cinco (5) campamentos temporales ubicados en; frente Galán (kr 54 con calle 3), frente Bochica 3 (calle 2 con Kr 24) y se evidencio que cada uno cuenta con una carpa vestier para uso de los trabajadores, además se ubicó al interior: kit de emergencias, punto de hidratación, ubicación de carteleras informativas, herramienta menor, los campamentos también contaron con puntos ecológicos, unidades sanitarias portátiles separadas por géneros y caneca para guardar la herramienta de la Brigada de orden aseo y limpieza.

El campamento está ubicado dentro del cerramiento aprobado por PMT, se evidencio jornadas de orden aseo y limpieza. Cuenta con una unidad sanitaria, adicional el contratista cumple con lo estipulado en el anexo SISOMA, con respecto al personal de la brigada de orden aseo y limpieza, los cuales se relaciona a continuación:

Tabla 8. Relación de personal BOAL – noviembre de 2019.

Nombre	Cedula	Tramo
JOHN JAIRO SANCHEZ SUAREZ	80.858.854	Galán
JORGE ALEXANDER GIL PARRA	79.725.469	Alquería 1
JORGE OSWALDO ACELAS GALEANO	80.007.180	Calle 2

Fuente. Elaboración Propia LGNG

6.1.4 B2- Manejo de materiales de construcción

Para este mes se evidencio que el contratista cumple con los tiempos del acopio y retiro de los escombros y acopio del material granular, cumpliendo con lo estipulado en el anexo

00000296

SISOMA, se evidencio que las volquetas que transportaron los materiales llegaron a los frentes de obra debidamente carpadas.

El contratista reporta para este mes 405 m3 de materiales granulares, los cuales son verificados por el área técnica, y son los reportados ante la Secretaria Distrital de Ambiente

Tabla 9. Relación de materiales utilizados en obra mes de noviembre

Material	Proveedor	Inscripción IDU	Resolución de aprobación	Unidad	Volumen M³
SBGA	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS – CONSTRITURAR	49 DE 2002	PMA CAR Resolución 28 de 2016	M³	120
BGA	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS – CONSTRITURAR	49 DE 2002	PMA CAR Resolución 28 de 2016	M³	225
B200	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS – CONSTRITURAR	405 DE 2014	Resolución 1519 de 17/07/2030	M³	60
Total					**405 m3**
FRESADO	LGNG	No aplica	No aplica	M3	0
ASFALTO	CONCRESCOL	303 de 2012	Resolución 474 del 6/5/2016 de la SDA	M3	0
DEMOLICIONES	CONCRESCOL	303 de 2012	Resolución 474 del 6/5/2016 de la SDA	M3	15
Total				**INDETERMINADO**	

CONTROL Y REPORTE DE MATERIALES RECICLADOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS MEJORADAS CON GCR

Para este periodo el contratista no realizó aplicación del Asfalto mejorado con caucho, hasta la fecha el porcentaje de cumplimiento es del 8% el cual equivale a 109 m3 de Asfalto mejorado con caucho.

00000297

6.1.5 B3 - Manejo integral de residuos sólidos

- ***Residuos - Basuras***

Dentro de este ítem, se evidencio la permanencia de los recipientes de colores verde, gris y rojo en el frente de obra para el mes de octubre, garantizando la segregación en la fuente de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos respectivamente, además de lo anterior se observó la limpieza general en cada frente durante y al finalizar la jornada de trabajo.

- ***Escombros Generados***

Se evidencio que el contratista para dar cumplimiento a este ítem, acopio el escombro generado por las actividades de demolición y excavación, dentro del tiempo permitido (24 horas), y posteriormente fue transportado a las escombreras autorizadas por el IDU y aprobadas por esta interventoría, actividad que se verifica In Situ y por medio de los vales y certificaciones emitidas por las Escombreras. A continuación, se relaciona la cantidad (m3), del escombro generado para este mes.

Tabla 10. Relación de RCD mes noviembre.

Sitio de disposición final	Inscripción IDU	Volumen (M^3)	Material
Planta San Antonio	427 De 2017, Resolución ANLA # 01110 De 2017	510	Excavación
Total		**510 M3**	

00000298

- **Cumplimiento resolución 1115 de 2012 y plan RCDS**

Para este mes el contratista reutilizo 15 m3, de material fresado, en el CIV 16001256 hasta la fecha el contratista ha reutilizado un total de 1075 m3, equivalentes al 21.44 % del 25% exigido por la resolución.

Tabla 11 RCD´s utilizados en el mes de noviembre de 2019.

Material Utilizado	Volumen m3	Método	Lugar de aplicación
FRESADO	15	Demoliciones	Bochica
TOTAL	**15 m3**		

6.1.6 B4 – Control de emisiones atmosféricas

Se evidencio que las volquetas utilizadas en el mes evaluado no excedieran los 20 km/h dentro del frente de obra con el fin de disminuir las emisiones fugitivas y los accidentes en el área de influencia directa, se verifico con el cumplimiento de la revisión tecno mecánica y de gases para cada uno de los vehículos reportados y aprobados por esta interventoría.

No se realizaron quemas a cielo abierto. La brigada de orden aseo y limpieza ha mantenido las vías cercanas a la obra limpias de residuos que se adhieren a las llantas de las volquetas.

6.1.7 B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

El contratista reporta los sumideros existentes en cada frente en ejecución, interventoría hace la verificación del estado de la malla utilizada para proteger los sumideros evitando

00000299

el ingreso de material de construcción a la red de alcantarillado, a continuación de relacionan la cantidad de sumideros.

Tabla 12. cantidad de sumideros por frente de obra.

FRENTE	CANTIDAD
GALAN	4
ALQUERIA 1	4
BOCHICA CALLE 2	12

Fuente. Elaboración Propia LGNG.

7 COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACION Y EL PAISAJE

7.1.1 C-1: Manejo de la vegetación

Se observó la protección con malla azul de los árboles y zonas verdes existentes en los cinco (5) frentes de obra, el contratista ha cumplido con el levantamiento del inventario del arbolado urbano en cada frente y posterior radicado a la interventoría.

En los frentes en donde se terminaron actividades de obra y se afectaron las zonas verdes, el contratista realizo las mejoras de las mismas enviando registro fotográfico

8 COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

8.1.1 E-1: Manejo de Señalización

El contratista mantiene el cerramiento perimetral en buen estado, la brigada de orden aseo y limpieza realizó mantenimiento rutinario.

00000300

9 INDICADORES DE DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Indicadores Cumplimiento Resolución 01115 de 2012				
Indicador de Eficiencia =	Gastos mensuales de la implementación de PG:RCD	X 100%	9.778.2300	2,65%
	Presupuesto planeado para el PG-RCD		362.433.600	
Indicador de Eficacia=	Cantidad de residuos aprovechados en la obra	X 100%	15	3,70%
	Cantidad de material usado en la ejecución de la obra		405	
Indicador de Efectividad=	Cantidad de RCD, dispuestos en sitios autorizados durante el mes	X 100%	510	27%
	Cantidad estimada de RCD a general en el mes		1901,5	
Valoración de desempeño SSTMA del contratista				
% Desempeño SSTMA=	*Calificación Obtenida*	X 100%	95.42	95%
	Calificación Total		100	
% cumplimiento protección de árboles =	N° de árboles correctamente protegidos	X 100%	6	100%
	N° total de árboles de permanencia		6	
Indicadores de proceso o gestión				
% capacitación	N° de capacitaciones realizadas en el área	X 100%	2	100%
	N° de capacitaciones planeadas en el área		2	

00000301

10 VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA

El desempeño SSTMA que obtuvo el contratista para este periodo fue del 95,42% según las calificaciones en los diferentes componentes estipulados en las listas de chequeo, este porcentaje fue el resultado del envió de documentos e informes por el contratista y a su vez de las inspecciones, seguimientos y gestión realizada por interventoría.

El consolidado contiene siguientes semanas; semana 1 del 1 - 7, semana 2 del 8 - 14, semana 3 del 15-21, semana 4 del 22- 28, de noviembre del 2019. Ver Anexo 15

11 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST Y AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

las actividades realizadas por interventoría para este periodo fueron las siguientes:

- Recorridos diarios a los, frentes Bochica, Galán, verificando las actividades SSTMA ejecutadas en obra por parte del contratista, se deja registro en bitácora.

- Calificación de listas de chequeo para el mes de noviembre, según lo evidenciado en recorridos de seguimiento, ver anexo N ° 15

- Elaboración de informes semanales enviados al FDLPA

- Revisión documentación emitida por el contratista.

- Asistencia y acompañamiento a capacitación realizada por el contratista el día 27 y 28 de noviembre en los frentes de obra

00000302

- Asistencia a reuniones de avance el día 29 de noviembre en los frentes alquería 1 y alquería 2, reunión extraordinaria en el frente de obra fe Bochica.

- Elaboración de oficios al contratista con copia al FDLPA

11.1. Entrega de productos / aprobación de informes del contratista

Para este periodo se radico al FDLPA y al Contratista Luis Gabriel Nieto García los siguientes oficios:

- ALBO-PUAR-356, Referente a la aprobación de informes N° 11 Y 12 Ambiental del COP 156 de 2018

- ALBO-PUAR-351, Referente a respuesta radicado No: 20196620270311 de fecha 21 de octubre del 2019 del COP 156 de 2018

- ALBO-PUAR-353, Referente a la aprobación informe N° 13 SST y reporte de los RCD del COP 156 de 2018

- ALBO-PUAR-344, Referente a la aprobación PLAN DE GESTIÓN DE RCD, del COP 156 de 2018

11.2. Personal vinculado al contrato de interventoría

Para este periodo interventoría se mantiene con el mismo personal reportado en el periodo pasado, a continuación, se relaciona el personal contractual exigido.

Tabla 1. relación del personal de interventoría

Condición	Cantidad
Nuevos	0
Nuevo-ingreso-retiro	0

00000303

Condición	Cantidad
Antiguos	13
Retiros	0
Traslados	0
Total	13

Fuente. Área SSTMA Intersa

11.3. Afiliaciones y pagos al SGSST (Ver anexos 9)

Para dar cumplimiento a este ítem interventoría anexa planillas en donde se muestra que el día 2 de diciembre del 2019, se realizó el pago de la seguridad social del personal vinculado al proyecto correspondientes al mes de octubre.

11.4. Pagos de Nomina

Para el periodo de noviembre Intersa SA realizo el pago de la nómina a los profesionales contratados para el COP 141 de 2018, se anexa soporte (ver anexo 12)

11.5. Entrega y reposición de EPP

Para este periodo no se hace entrega ni cambios de EPP, se evidencia en inspecciones realizadas buenas condiciones de los mismos.

11.6. Accidentalidad

Para este periodo no se presentaron accidentes laborales.

11.7. Señalización SST

En el PAC se mantiene la señalización informativa y de seguridad, en buen estado además de las carteleras que contienen los números de emergencia, políticas SST y reglamento de higiene y seguridad industrial.

00000304

11.8. Programa de capacitación

Para este mes el día 30 se realizó capacitación sobre pausas activas,

11.9. Vehículos

Durante este periodo se registra en el formato listado de vehículos la camioneta BTC 002, el cual se encuentra al día en el SOAT y revisión tecnicomecanica.

11.10. Programa de gestión de residuos

Para dar cumplimiento a este ítem, se hace clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos generados dentro del PAC de interventoría, adicional se realizará capacitación para el próximo mes, sobre "residuos sólidos "

11.11. Programa de reciclado y uso adecuado de papel

Para dar cumplimiento a este ítem, se incentiva a reutilizar, reusar y reciclar el papel dentro de las labores diarias.

12 CONCLUSIONES

- Se inspecciono las actividades ambientales y SST desarrolladas en el mes de octubre por parte del contratista, en recorridos diarios,
- Se asistió a comités integrales y SSTMA, dando cumplimientos a los pliegos contractuales, además de las reuniones de avance de obra y de inicio.
- Se verifico en obra el cumplimiento del transporte, disposición de los RCD generados en las actividades realizadas por el contratista, para el periodo de

20190305

octubre se dispuso 510 m3 de escombro, en las escombreras autorizadas por el IDU.

- El contratista reutilizo 15 m3 de fresado, proveniente de las actividades propias del COP 156 de 2018, en el frente del Galán.

- Se verifico en campo la presencia de las personas encargadas de la brigada de Orden, aseo y Limpieza, cumpliendo con los requerimientos del apéndice SISOMA, adicional se verifica que se les realice la capacitación de sus funciones.

- Se observó la implementación del cerramiento perimetral y cerramiento tipo 3, protección del arbolado y sumideros existentes y su mantenimiento periódico

- En contratista envió oportunamente los documentos de 3 ingresos nuevos para el proyecto, igualmente envió los documentos de un vibro compactador

- Se verifico de acuerdo a los formatos entregados por el contratista las capacitaciones e inducciones al personal de 3 ingresos nuevos, también se observó que el contratista realizo las inspecciones SST de obra.

- Se verifica en conjunto con el contratista las pre actas SISOMA, de ítem relacionados en el presupuesto inicial para su respectivo pago.

- Se calificó las listas de chequeo correspondientes al mes de septiembre con un porcentaje del 95,42 %.

- Se realizó seguimiento de acuerdo al procedimiento para entibados a partir de 1.50 metros para la instalación de tubería de alcantarillado.

00000306

13 RECOMENDACIONES

- Se recomienda hacer seguimiento a las funciones de los BOAL
- Se recomienda realizar orden y aseo en los frentes en ejecución, dando cumplimiento a los pliegos
- Se recomienda la implementación de la señalización SISO, en los frentes en ejecución

00000307

➢ ANEXOS CONTRATISTA

00000308

➢ *ANEXO 1. FT-17; APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA*

00000309

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0

DILIGENCIAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2019
ECCION GENERAL: N.A.P.
CCION TECNICA: N.A.P.
ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018
INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

PERIODOD DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
	PERSONAL NUEVO																	
1	EPROJECTS SAS	CRISTIAN ALEXANDER RENZA GARZÓN	1.069.054.404	23	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 3 No 34-62	3142993361	POSITIVA	20/11/2019	N.A.P	FAMISANAR	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	16/11/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
2	EPROJECTS SAS	FABIO EMILIO CETINA BAEZ	74.020.353	37	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 30 No 35-35 ESTE	3112356046	POSITIVA	N.A.P	29/110/219	NUEVA EPS	29/110/219	PORVENIR	29/110/219	25/10/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
3	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	WILLIAM MAURICIO GUTIERREZ ORTIZ	79.767.948	43	CONDUCTOR	CARRER 151 No 58H-33 SUR	3046445486	SURA	31/10/2019	N.A.P	SALUD TOTAL	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	30/10/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
	PERSONAL ANTIGUO																	
1	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOSE MANUEL CARABALI BANGUERO	76.260.604	53	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 82B No 42B-32	3104569516	SURA	1/08/2019	6/11/2019	SALUD TOTAL	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	30/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
2	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JEISON ESTEBAN LEON CANRO	1.000.516.428	18	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 72B SUR No 98A-01	3208270678	SURA	2/08/2019	6/11/2019	ALIANSALUD	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	31/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
3	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOSE VICENTE CEDEÑO CUENCA	5.883.587	60	INSPECTOR DE OBRA	CARRERA 17D No74C-15	3125210477	SURA	9/07/2019	6/11/2019	SALUD TOTAL	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	6/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	PARA LABORES QUE IMPLIQUEN EXPOSICION A RUIDO, VALORACION POR OTORRINOLARINGOLOGO
4	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	HOWARD ANDRES MUNAR	80.123.347	37	ALMACENISTA	CALLE 54 SUR No 93E-45	3156395275	SURA	9/07/2019	6/11/2019	SALUD TOTAL	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	6/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
5	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JESUS HUMBERTO ROBAYO DÁZ	79.333.646	54	RESIDENTE DE OBRA	CALLE 156 No 92-64	3008276938	SURA	2/07/2019	6/11/2019	COMPENSAR	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019		N.A.P.	N.A.P.	
6	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	LUIS DANIEL MORALES HERNANDEZ	90.125.132.106	45	AUXILIAR DE OBRA	DIAGONAL 76 No 77H-70 SUR	3114637698	SURA	22/07/2019	6/11/2019	COMPENSAR	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	18/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
7	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	EDGAR FERNANDO RIVERA	79.468.281	52	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 66 No 176-24 SUR	3142173505	SURA	15/07/2019	6/11/2019	FAMISANAR	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	12/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
8	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	MAR ZORAIDE PAEZ BELTRAN	51.839.265	53	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 34 No 5-04	3206395732	SURA	15/07/2019	6/11/2019	FAMISANAR	6/11/2019	COLFONDOS	6/11/2019	12/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
9	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JENNIFER ANDREA SILVERA PRIETO	1.032.469.504	24	RESIDENTE DE ACTAS	CARRERA 28 No 3-28 APTO 301	3057125338	SURA	17/06/2019	6/11/2019	COMPENSAR	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	15/06/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
10	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JARRISON TANGARIFE SALDAÑA	1.128.625.511	29	AUXILIAR DE OBRA	TV 11D No 6-10 SUR	3137035827	SURA	17/06/2019	6/11/2019	NUEVA EPS	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	13/06/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
11	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JHAN FAYDER ESCOBAR LOPEZ	1.047.472.374	23	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 7 No 98-78	3022172451	SURA	19/06/2019	6/11/2019	COOMEVA	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	17/06/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
12	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JUAN MANUEL MUÑOZ BERNAL	1.010.073.451	23	AUXILIAR DE OBRA	BOSA	3164315713	SURA	2/05/2019	6/11/2019	SALUD TOTAL	6/11/2019	COLFONDOS	6/11/2019	29/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
13	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JORGE OSWALDO ACELAS GALEANO	80.007.180	39	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 50A No 41-28 SUR	3126035370	SURA	2/05/2019	6/11/2019	CAPITAL SALUD	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	29/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
14	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	SERGIO DAVID ROMERO CRUZ	103.366.870	22	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 7 No 98-78	3142463864	SURA	23/05/2019	6/11/2019	CAPITAL SALUD	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	22/05/25019	N.A.P.	N.A.P.	SIN RESTRICCIONES

0310

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0

DILIGENCIAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2019
ECCION GENERAL: N.A.P.
CCION TECNICA: N.A.P.
ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018
INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

PERIODOD DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
15	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CASTAÑEDA	1.075.627.042	27	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 42D No 87-37	3123858204	SURA	1/04/2019	6/11/2019	COMFACUNDI	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	28/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
16	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	CRISTIAN CAMILO ALVARADO SEGURA	1.104.706.065	25	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 7 ESTE No 28-06	3116593070	SURA	8/04/2019	6/11/2019	FAMISANAR	6/11/2019	COLFONDOS	6/11/2019	5/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
17	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DIEGO FERNEY PEREZ SABALA	1.077.968.398	30	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 1 No 26C-05	31213410058	SURA	8/04/2019	6/11/2019	CAPITAL SALUD	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	4/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
18	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FABIAN HUMBERTO CARDONA ARCINIEGAS	1.026.295.082	22	AUXILIAR AMBIENTAL	DIAGONAL 5A No 37B-60	3223679845	SURA	22/04/2019	6/11/2019	NUEVA EPS	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	17/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
19	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ALFONSO QUIROGA GOMEZ	5.663.494	54	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 97D No 42-20	3133780707	SURA	14/03/2019	6/11/2019	FAMISANAR	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	12/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
20	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DAVID ESTEBAN UREÑA CIFUENTES	1.070.624.079	20	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 8 No 4-16 SUR	3024686623	SURA	14/03/2019	6/11/2019	COMPENSAR	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	12/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
21	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JEFFERSON DAVID APARICIO FIERRO	1.012.402.828	25	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 38A No 101-01SUR	3134539265	SURA	23/03/2019	6/11/2019	NUEVA EPS	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	21/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
22	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JUAN SEBASTIAN RONCANCIO BECERRA	1.018.449.804	27	RESIDENTE ACTAS DE VECINDAD	CARRERA 78B No 7A-50	3203339058	SURA	1/02/2019	6/11/2019	SANITAS	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	31/01/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
23	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FRANK ORLANDO PINZON FONSECA	19.461.352	56	DIRECTOR DE OBRA	CALLE 109 No 19-36	3165271393	SURA	7/11/2018	6/11/2019	COMPENSAR	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019	3/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
24	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	YESICA AGUDELO	52.288.949	38	RESIDENTE SOCIAL	CARRERA 12 NO 72A-19	3213905517	SUTRA	2/11/2018	6/11/2019	SANITAS	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	3/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
25	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ASTRID FABIOLA MALDONADO DÍAZ	57.771.982	38	RESIDENTE SST	CALLE 20 No 2B BIS - 13	3203462906	SUTRA	2/11/2018	6/11/2019	SURA	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	31/10/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
26	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	YAMILE MERCHAN CONTRERAS	1.023.035.093	19	GUIA CIVIVO	CARRERA 1A BIS ESTE No 73A-10 SUR	3102424589	SURA	23/10/2018	6/11/2019	COMPENSAR	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	20/10/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
27	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	SANDRA MIREYA CEPEDA SANABRIA	40.049.480	36	PROFESIONAL AMBIENTAL	CARRERA 119 No 80-22	3176827941	SURA	1/11/2018	6/11/2019	SANITAS	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	1/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
28	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ANGELICA ROCIO RAMOS QUINTANA	52.351.831	40	RESIDENTE TECNICO	TRANSVERSAL 120 No 78B-55	3102481324	SURA	22/11/2018	6/11/2019	COMPENSAR	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	21/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
29	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	YOANI ROJAS BRIÑEZ	93.134.142	42	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 20C No 61B-34 SUR	3214179728	SURA	28/11/2018	6/11/2019	NUEVA EPS	6/11/2019	COFONDOS	6/11/2019	27/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
30	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOSE MIGUEL HERRERA VARGAS	77.010.993	60	AYUDANTE DE OBRA	USME	3219836456	SURA	28/11/2018	6/11/2019	SURA	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	27/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	MANIPULAR CARGAS CON REQUERIMIENTO DE FUERZA EN COLUMNA
31	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JHON ALEXANDER GOMEZ PARRA	79.854.760	40	INSPECTOR DE OBRA	CARRERA 104 No 22F-44	3112454249	SURA	29/11/2018	6/11/2019	MEDIMAS	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	29/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
32	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DIEGO SARMIENTO	1.032.404.412	30	AUXILIAR DE IMPACTO URBANO	CARRERA 64 No 94A-70	3115158839	SURA	5/10/2018	6/11/2019	CAPITAL SALUD	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019	03/10/201	N.A.P.	N.A.P.	LABORES QUE IMPLIQUEN EXIGENCIA AUDITIVA
33	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	LEIDI BIBIANA YAS MIRANDA	1.237.688.062	31	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 14A BIS No 68C-30 SUR	3115127197	SURA	5/12/2018	6/11/2019	NUEVA EPS	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
34	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FREDIS MANUEL NAVAS MARTINEZ	9.167.740	46	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 86D No 26-65	3106495315	SURA	5/12/2018	6/11/2019	MUTUAL SER	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0

DILIGENCIAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2019
ECCION GENERAL: N.A.P.
CCION TECNICA: N.A.P.
ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018
INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

PERIODOD DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
35	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ELIAS DE JESUS LIZARAZO LOPEZ	79.302.306	54	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 53 SUR No 9-16	3143546117	SURA	7/12/2018	6/11/2019	ALIANSALUD	6/11/2019	POEVENIR	6/11/2019	6/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
36	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DIEGO ARLEY GALINDO PANQUEVA	1.022.405.981	23	AUXILIAR AMBIENTAL	CARRERA 51 No 0-48 SUR	3057255240	SURA	12/12/2018	6/11/2019	MEDIMAS	6/11/2019	POEVENIR	6/11/2019	12/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
37	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DARIO ESTEBAN GALLARDO CALPA	1.075.544.568	21	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 17 SUR No 39-95	3204066934	SURA	13/12/2018	6/11/2019	MEDIMAS	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019	12/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
38	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOSE ANICETO CARREÑO RIAÑO	3.069.936	59	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 52B No 20-69 SUR	3203971548	SURA	15/12/2018	6/11/2019	SALUD TOTAL	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019	13/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
39	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ROBINSON MARIA GUETTE OSPINO	1.129.508.401	33	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 1 D N. 38A 41	3168047806	SURA	16/03/2019	6/11/2019	SALUD TOTAL	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019	14/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
40	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS	BAIRO GUAÑARITA FIGUEROA	53.093.131	46	RESIDENTE AMBIENTAL	CALLE 109 No 19-36	6294150	SURA	N.A.P.	13/11/2019	SANITAS	13/11/2019	PORVENIR	13/11/2019	8/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
41	CJMC INGENIERIA SAS	WILSON FERNANDO ROJAS ARIZA	79.767.916	42	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	TRANSVERSAL 33 No 58C-36 SUR	3004462276	POSITIVA	8/04/2019	18/11/2019	MEDIMAS	18/11/2019	COLPENSIONES	18/11/2019	6/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
42	CJMC INGENIERIA SAS	LUIS ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	79.746.752	42	CADENERO I	CARRERA AE ESTE No 25I-48	3158965991	POSITIVA	5/04/2019	18/11/2019	SALUD TOTAL	18/11/2019	PROTECCION	18/11/2019	4/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
43	CJMC INGENIERIA SAS	FREDY ARTURO ARIZA ROJAS	80.433.110	50	CADENERO	CALLE 56 SUR No 80G-05	3163333438	POSITIVA	10/07/2019	18/11/2019	FAMISANAR	18/11/2019	PROTECCION	18/11/2019	9/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
44	CJMC INGENIERIA SAS	INGRID MAYERLY JIMENEZ SILVA	1.024.498.238	29	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	DIAGONAL 65A BIS SUR No 4C-01	3213100005	POSITIVA	14/03/2019	18/11/2019	COMPENSAR	18/11/2019	PROTECCIÓN	18/11/2019	13/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
45	CJMC INGENIERIA SAS	OSCAR RUIZ VILLAMIL	79.609.261	45	CADENERO	CARRERA 80M No 72A-54	3124311128	POSITIVA	14/03/2019	18/11/2019	COMPENSAR	18/11/2019	PORVENIR	18/11/2019	14/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
46	CJMC INGENIERIA SAS	JHON GILDARDO ARIZA ARIZA	80.132.707	36	TOPOGRAFO	CALLE 52B SUR No 24D-40	3222851044	POSITIVA	5/12/2018	18/11/2019	SANITAS	18/11/2019	COLPENSIONES	18/11/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
47	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	TOMAS LEON MUÑOZ	79.208.317	47	CONTRASTISTA	CARRERA 74H No 62B-51 SUR	3208185806	POSITIVA	N.A.P.	2/11/2019	MEDIMAS	2/11/2019	PORVENIR	2/11/2019	30/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
48	EW CONSTRUCCIONES SAS	JORGE EDUARDO PADILLA RAMIREZ	1.106.453.492	29	AUXILIAR DE OBRA	LEON 13 SOACHA	3132255939	POSITIVA	11/06/2019	18/11/2019	SALUD TOTAL	18/11/2019	PORVENIR	18/11/2019	6/06/2019	N.A.P.	N.A.P.	SIN RESTRICCIONES
49	EW CONSTRUCCIONES SAS	WILSON ALEXANDER RAMIREZ ORTIZ	1.094.427.647	21	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 49 No 80D-15	3138389538	POSITIVA	9/07/2019	18/11/2019	SALUD TOTAL	18/11/2019	PORVENIR	18/11/2019	8/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
50	EW CONSTRUCCIONES SAS	ALIRIO RAMIREZ MARTINEZ	4.253.446	40	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 49 SUR No 53B-201	3124655210	POSITIVA	21/05/2019	18/11/2019	COOMEVA	18/11/2019	PORVENIR	18/11/2019	10/05/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
51	EW CONSTRUCCIONES SAS	EDUVAN CASTILLO QUINTERO	93.296.215	41	OFICIAL	CALLE 73D No 14I-10	3502828596	POSITIVA	24/04/2019	18/11/2019	FAMISANAR	18/11/2019	PORVENIR	18/11/2019	22/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
52	EW CONSTRUCCIONES SAS	WILMAR ANTONIO NIÑO BURITICA	93.011.376	37	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 73 D BIS SUR No 14-10	3212134610	POSITIVA	13/04/2019	18/11/2019	FAMISANAR	18/11/2019	PROTECCION	18/11/2019	19/06/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
53	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	HECTOR FERNANDO CUERVO ROJAS	1.010.161.008	32	CONDUCTOR	CARRERA 18 No 76-46 SUR	3168394961	SURA	N.A.P.	18/11/2019	COMPENSAR	18/11/2019	COLFONDOS	18/11/2019	13/03/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0

DILIGENCIAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2019
ECCION GENERAL: N.A.P.
CCION TECNICA: N.A.P.
ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018
INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

PERIODOD DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
54	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	EFREN MORALES HERRERA	80.050.130	43	CONDUCTOR	CARRERA 16 No 74-23 SUR	3232293367	SURA	N.A.P.	18/11/2019	SALUD TOTAL	18/11/2019	PROTECCION	18/11/2019	28/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
55	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	BLADIMIR PEREZ POLOCHE	1.118.563.003	23	OPERADOR	DIAGONAL 101 BIS SUR No 1D-63	3132311306	SURA	26/08/2019	18/11/2019	SANITAS	18/11/2019	COFINDOS	18/11/2019	24/08/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
56	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	JHONATAN BEJARANO ROA	1.147.956.744	28	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 40F SUR No 13-48	3213277122	SURA	20/07/2019	12/11/2019	NUEVA EPS	12/11/2019	PORVENIR	12/11/2019	12/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
57	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	EUCARIS ANTONIO MENA MENA	11.803.730	43	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 76A No 51-15 SUR	3113497131	SURA	11/07/2019	12/11/2019	FAMISANAR	12/11/2019	PORVENIR	12/11/2019	8/09/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
58	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	RITO CELIO MORENO ARIZA	5.601.998	41	OFICIAL	CALLE 64 BIS SUR No 1-32	3227292178	SURA	N.A.P	12/11/2019	NUEVA EPS	12/11/2019	PORVENIR	12/11/2019	10/12/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
59	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	RICARDO ANTONIO ZARATE OQUENDO	8.648.116	36	AUXILIAR DE OBRA	SAN PEDRO SUBA	3003830787	SURA	22/05/2019	12/11/2019	FAMISANAR	12/11/2019	PORVENIR	12/11/2019	1/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
60	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	LIZER DAVID MOSQUERA MOSQUERA	1.024.553.911	23	OFICIAL	CALLE 54G No 66-14	3228594619	SURA	22/05/2019	12/11/2019	FAMISANAR	12/11/2019	PORVENIR	12/11/2019	13/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
61	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	ANTHONY DE JESUS GONZALEZ AHUMADA	1.020.739.704	32	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 53D N. 5-03	3002301943	SURA	12/03/2019	12/11/2019	FAMISANAR	12/11/2019	COLPENSIONES	12/11/2019	13/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
62	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	ONORIO PALOMEQUE MOSQUERA	80.766.069	35	OFICIAL	CALLE 64F No 105D-23	3123055123	SURA	12/03/2019	12/11/2019	SALUD TOTAL	12/11/2019	PROTECCIÓN	12/11/2019	13/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
63	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	JORGE CORDOBA RENTERIA	11.807.310	41	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 131 No 96A-36	3132480502	SURA	19/06/2019	12/11/2019	FAMISANAR	12/11/2019	PORVENIR	12/11/2019	18/06/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
64	EPROJECTS SAS	ANDRES DARIO DORIA SANCHEZ	1.193.148.463	24	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 73H BIS No 75-17 SUR	3206405303	POSITIVA	N.A.P	29/11/2019	COMPARTA	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	8/08/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
65	EPROJECTS SAS	MAICOL CHAYAN CORREDOR POVEDA	1.000.467.258	24	AUXILIAR DE OBRA	BOSA	3178721355	POSITIVA	N.A.P	29/11/2019	COMFACUNDI	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	21/09/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
66	EPROJECTS SAS	CARLOS TAPASCO AZCARATE	1.115.945.364	32	INSPECTOR DE OBRA	CALLE 106 No 5-57	3132172702	POSITIVA	N.A.P	29/11/2019	FAMISANAR	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	23/08/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
67	EPROJECTS SAS	BRAYAM YESID FRIAS GONZALEZ	1.031.157.857	24	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 18A NO 68-03 SUR	3112975503	POSITIVA	27/09/2019	29/11/2019	SALUD TOTAL	29/11/2019	COLPENSIONES	29/11/2019	25/09/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
68	EPROJECTS SAS	ALIRIO FLOREZ SANCUINO	13.923.150	56	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 72 No 10-72 SUR	3225354249	POSITIVA	2/10/2019	29/11/2019	FAMISANAR	29/11/2019	COLPENSIONES	29/11/2019	1/10/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
69	EPROJECTS SAS	JOSE WILL SUAZA GOMEZ	1.033.739.220	27	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 36B No 72B-08 SUR	3223953143	POSITIVA	2/10/2019	29/11/2019	COMPENSAR	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	28/09/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
70	EPROJECTS SAS	HUMBERTO MATEUS HERNANDEZ	1.115.738.497	24	AUXILIAR DE OBRA	CARACOLI	3102144818	POSITIVA	2/10/2019	29/11/2019	NUEVA EPS	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	30/09/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
71	EPROJECTS SAS	JORGE ENRIQUE TIBATA YANQUEN	6.761.116	65	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 75B BIS No 20-31	3154054300	POSITIVA	2/10/2019	29/11/2019	NUEVA EPS	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	1/10/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0

DILIGENCIAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2019
ECCION GENERAL: N.A.P.
CCION TECNICA: N.A.P.
ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018
INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

PERIODOD DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
72	EPROJECTS SAS	WILSON HERNANDEZ REVUELTAS	91.363.748	37	OFICIAL DE COSNTRUCCION	CALLE 60B SUR No 42-69	3213595008	POSITIVA	20/07/2019	29/11/2019	SALUD TOTAL	29/11/2019	POIRVENIR	29/11/2019	17/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
73	EPROJECTS SAS	JOSE ADOLFO ROMERO BAEZ	1.048.820.483	33	OFICIAL DE COSNTRUCCION	BOSA	3212230824	POSITIVA	10/07/2019	29/11/2019	NUEVA EPS	29/11/2019	PROTECCION	29/11/2019	19/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
74	EPROJECTS SAS	LEONARDO ALBERTO LUBO ROMERO	902.138.225.091.990	29	OFICIAL DE COSNTRUCCION	CARRERA 77 No 46-27 SUR	3113209480	POSITIVA	21/08/2019	29/11/2019	SALUD TOTAL	29/11/2019	COLPENSIONES	29/11/2019	21/08/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
75	EPROJECTS SAS	JHONATAN HERNANDEZ HOYOS	1.066.568.023	25	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 73H BIS No 75-16 SUR	3102292541	SURA	N.A.P	29/11/2019	FAMISANAR	29/11/2019	PROTECCION	29/11/2019	22/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
76	EPROJECTS SAS	FABRIZIO MARTINEZ ACEVEDO	1.127.343.720	19	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 82B No 40C-51	3153973937	SURA	N.A.P	29/11/2019	NUEVA EPS	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	22/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
77	EPROJECTS SAS	MARIA NATALIA SANTAMARIA CASTRO	1.030.630.661	25	INSPECTOR OBRA	CARRERA 80I No 57G-73	3223630781	SURA	N.A.P	29/11/2019	COMPENSAR	29/11/2019	PROTECCION	29/11/2019	16/05/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
78	EPROJECTS SAS	ANGELA MARIA PEREZ JACOME	1.072.708.700	23	RESIDENTE AMBIENTAL	CALLE 191A No 11A-92	3106972387	POSITIVA	23/07/2019	29/11/2019	FAMISANAR	29/11/2019	PROTECCION	29/11/2019	22/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
79	EPROJECTS SAS	FERNEY ALEJANDRO BELTRAN MEDINA	1.016.036.085	28	CONDUCTOR	CARRERA 32 No 19A-20	3213961384	COLPATRIA	N.A.P	12/11/2019	COMPENSAR	12/11/2019	COLPENSIONES	12/11/2019	3/05/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
80	EPROJECTS SAS	ESNEHIDER RIVEROS RINCON	79.139.151	47	CONDUCTOR	TRANSVERSAL 68J No 39A-60 SUR	4260717	COLPATRIA	N.A.P	12/11/2019	COMPENSAR	12/11/2019	PORVENIR	12/11/2019	3/05/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
81	EPROJECTS SAS	DUBALIER ISAZA CUERVO	1.024.529.102	27	OPERADOR	CARRERA 77B No 60B-SUR-62	3046736185	POSITIVA	N.A.P	21/11/2019	SALUD TOTAL	21/11/2019	PORVENIR	21/11/2019	27/09/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
82	EPROJECTS SAS	JOAN MAURICIO INFANTE ABELLO	1.070.951.826	30	OPERADOR	CARRERA 6 No 3-19 ESTE	3222568799	SURA	N.A.P	13/11/2019	FAMISANAR	13/11/2019	COFONDOS	13/11/2019	29/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
83	EPROJECTS SAS	HUGO JOHANY GONZALEZ QUICAZAN	80.720.994	37	OPERADOR	CALLE 155 No 46-40	3112107524	POSITIVA	N.A.P	12/11/2019	SALUD TOTAL	12/11/2019	COLPENSIONES	12/11/2019	20/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
84	EPROJECTS SAS	JOSE ARMANDO MALAGON MARENTES	80.253.579	35	OPERADOR	TRANSVERSAL 4D No 51-62	NO TIENE	SURA	N.A.P	14/11/2019	FAMISANAR	14/11/2019	PROTECCION	14/11/2019	30/05/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
	PERSONAL RETIRADO																	
1	EW CONSTRUCCIONES SAS	LUIS FELIPE DAZA RODRIGUEZ	80.451.963	50	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 93 No 10-82	3229562947	POSITIVA	16/10/2019	18/11/2019	FAMISANAR	18/11/2019	COLPENSIONES	18/11/2019	15/10/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
2	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ RESTREPO	1.055.919.760	19	AUXILIAR DE OBRA	BOSA	3102271203	SURA	15/07/2019	6/11/2019	MEDIMAS	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	12/07/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
3	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	MISAEL ANTONIO GUATAQUIRA GUALTEROS	80.213.488	35	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 40A No 40-03 SUR	3134424824	SURA	28/05/2019	6/11/2019	SANITAS	6/11/2019	PORVENIR	6/11/2019	25/05/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
4	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ANA NICELY CASAS GERENA	30.204.199	52	RESIDENTE DE OBRA	AV CARRERA 24 No 40-19	3008800280	SURA	25/02/2019	6/11/2019	SALUD TOTAL	6/11/2019	COLPENSIONES	6/11/2019	25/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
5	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FERNEY VELASCO CALA	1.101.757.048	26	INSPECTOR DE OBRA	CARRERA 140 No 132F-20	3012211023	SURA	15/01/2019	6/11/2019	MEDIMAS	6/11/2019	PROTECCION	6/11/2019	14/01/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0

DILIGENCIAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2019
ECCION GENERAL: N.A.P.
CCION TECNICA: N.A.P.
ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018
INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

PERIODOD DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
6	EPROJECTS SAS	JORGE ELIECER PORTILLO JULIO	15.075.238	58	AUXILIAR DE OBRA	DIAGONAL 69A No 18J-2 SUR	3155486348	POSITIVA	N.A.P	29/11/2019	FAMISANAR	29/11/2019	PORVENIR	29/11/2019	225/08/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO PARA EL CARGO
	PERSONAL TRASLADADO																	
1	EPROJECTS SAS	RAFAEL EUSTAQUIO RIVERA	17.332.104	53	OPERADOR VIBRO	CALLE 69L BIS No 18P-15	3204066873	POSITIVA	N.A.P	25/11/2019	MEDIMAS	25/11/2019	PORVENIR	25/11/2019	15/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	CON RECOMENDACIONES
2	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	HENRY LEON MUÑOZ	80.270.924	55	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 24 SUR No 52-93	3202242786	POSITIVA	20/12/2018	2/11/2019	FAMISANAR	2/11/2019	COLPENSIONES	2/11/2019	20/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO

opia: Interve .A.P. : No aplica en el periodo
opia: Contracha de examen de egreso utilioce las siguientes siglas:
Oe: entrega de orden para examen de egreso
RSA: retiro sin aviso
cha: fecha en la que se realizo el examen de egreso
SOCIAL DEL CONTRATISTA RESALTARA EN VERDE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

(Firma)

ASTRID FABIOLA MALDONADO DÍAZ

Residente SST Contratista de Obra

(Firma)

CARLOS ALFONSO Y/O MONICA FAJARDO

Residente SST Interventoria

000031 5

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OBRA (48 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (48 Afiliados)

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1102[illegible]	4	LUIS GABRIEL NIÑO GARCIA	B - MENOS DE 200 DEPENDIENTES	OFICINA	CALLE 125 N. 59 - 31 PISO 4	BOGOTA-BOGOTA D.C.	6291153	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-10	2019-11	2019-10-05	84667[illegible]09	E	2019-11-05	2019-11-04	BANCO DE OCCIDENTE		$46,[illegible],700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre																	Cotiz	Mor	IBC	Aporte	Cot Pag	IBC	Aporte	Cot Pag	Tipo	IBC	Aporte	Cotiz	Mor	IBC	Aporte	Tipo	IBC	Aportes	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUENTE ARANDA (20 AFILIADOS)																			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

0000317

porvenir
más hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **WILLIAM MAURICIO GUTIERREZ ORTIZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **79,767,948**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de Octubre de 2019.

Gerente de Clientes

00000318

No de Radicación
4004359508

8. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Traslado de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o Adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para cotizar
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo regimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del inicio de prestación al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de pre Pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo (Femenino / Masculino)	Fecha de nacimiento	42. Fecha (dd/mm/aaaa)

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. [ ] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47. [ ] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.

48. [ ] Declaración de existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.

49. [ ] Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50. [ ] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51. [x] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación,del reporte de novedades, a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.

52. [x] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

53. [x] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
william G	Lina Yone

IX. ANEXOS

56. [ ] Anexo Copia del documento de identidad: CN. [ ] RC. [ ] TI. [ ] CC. [ ] PA. [ ] CE. [ ] CD. [ ] SC. [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [0]

57. [ ] Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

58. [ ] Copia registro civil de nacimiento, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

59. [ ] Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

60. [ ] Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor

61. [ ] Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

62. [ ] Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

63. [ ] Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

64. [ ] Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

65. [ ] Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consista la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Numero ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

00000319

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
40041359508	3|0|1|0|2|0|1|9

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al tromulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliacion ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual Cotizante Cabeza de familia ☒ Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
GUTIERREZ (Primer apellido)	ORTIZ (Segundo apellido)	WILLIAM (Primer nombre)	MAURICIO (Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	79795948	Femenino ☐ Masculino ☒	2|4|1|0|1|9|7|6

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos complementarios

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo: F.F-I.P.I Cualquiera T|P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresan base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A	PORVENIR PPE	328113

18.Residencia			
CL 78 A 17 P 49 SUR Dirección	Teléfono fijo	3044443480 Teléfono celular	WILLIAM@GMAIL.COM Correo electronico
BOGOTA Municipio/Distrito	Zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del conyuge o compañero(a) permanente del afiliado

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Numero documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres				25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre			Femenino	Masculino	
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad						Condición	
			C		Tipo M		V		I	P
B1										
B2										
B3										
B4										
B5										

	32. Datos de residencia					33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	V/S OLAYA UOD DENTOLAYA ASPER OLAYA	V/SOLAYA - DENTOOLAYA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	NIT	900750054	01

39.Ubicación				
CL 55 SUR 104 48 Dirección	3670004 Telefono	ISRAELGUTIERREZSAS@HOTMAIL.COM Correo electrónico	BOGOTA Municipio/distrito	BOGOTA Departamento

00000320

ARL | sura

Medellín, 30 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000002 CAMPO		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,08 %		
C79767948	GUTIERREZ ORTIZ WILLIAM MAURICIO	31/10/2019		139,IXk25	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 30/10/2019 12:09:49.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.145.155.116, 172.16.42.57

00000321

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pagado: 29/11/2019

Empresa NI901267799
EPROJECTS SAS

Planilla Nro: 10255994285

Periodo Cotización: octubre de 2019

Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	No. Horas	Días Cotizados																													Administradora	IBC $ Pensión	Aporte $ Pensión	Administradora	IBC $ Salud	Aporte $ Salud	Tarifa	IBC $ Riesgos	Aporte $ Riesgos	Administradora	CCF Caja	Aporte $ Caja	Aporte $ SENA	Aporte $ ICBF	Aporte $ ESAP	Aporte $ Min. Educación	Total
CC 1.020.811.635	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.949.868	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.951.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.952.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.953.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.954.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.955.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.956.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.957.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.958.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.959.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940
CC 1.067.960.[illegible]	[illegible]	00	03																													[illegible]	$ 1.161.000	$ 139.320	[illegible]	$ 1.161.000	$ 46.440	4,00%	$ 1.161.000	$ 5.220	[illegible]	$ 174.000	$ 6.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.940

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Descuentos Licencias a Favor EPS	Saldos, Subsidios y Otros	Incapacidades a Favor EPS	SUBTOTAL $ + INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL A PAGAR
$ 34.760.997	$ 34.760.997	$ 34.760.997	$ 34.760.997	$ 4.216.920	$ 1.512.720	$ 1.063.200	$ 638.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.431.540	$ 28.800	$ 6.244.700

2300000

Líneas de Servicio PensiSIMPLE: Bogotá 343 2948 - Cali: 554 5515 - Medellín: 514 85 69 - Bucaramanga: 643 58 80 - Cartagena: 664 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 68 50 - Resto del País: 01 8000 87 1971 - (Más que Fácil, SIMPLE)

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-11-29 11:44:26 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 10259634289

Periodo Cotización: octubre de 2019 Periodo Servicio: noviembre de 2019

PAGADO 29/11/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EPROJECTS SAS		
Documento	NI901287799	**Dirección**	CR 109A 9150 B - 79 AP 4 706
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4080345
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	LEYVA VARGAS CARLOS FRANCISCO	**Identificación**	CC 93402022
Total Afiliados	34	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Nombre y Apellidos	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		Afp Destino	IBC Pensión	Aporte Pensión	Eps Destino	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Caja Destino	IBC Caja	Tarifa Caja	Aporte Caja	Sena	ICBF	Tarifa Parafiscales	Aporte Parafiscales	
CC 1020477299	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 828,116	$ 159,000	[illegible]	$ 828,116	$ 132,500	1.044%	$ 828,116	$ 8,647	[illegible]	$ 828,116	4.000%	$ 33,100	$ 0	$ 0	0.000%	$ 0	$ 332,247
CC 1013102556	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 828,116	$ 159,000	[illegible]	$ 828,116	$ 132,500	1.044%	$ 828,116	$ 8,647	[illegible]	$ 828,116	4.000%	$ 33,100	$ 0	$ 0	0.000%	$ 0	$ 332,247
CC 1014184582	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 828,116	$ 159,000	[illegible]	$ 828,116	$ 132,500	1.044%	$ 828,116	$ 8,647	[illegible]	$ 828,116	4.000%	$ 33,100	$ 0	$ 0	0.000%	$ 0	$ 332,247
CC 1014191451	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 828,116	$ 159,000	[illegible]	$ 828,116	$ 132,500	1.044%	$ 828,116	$ 8,647	[illegible]	$ 828,116	4.000%	$ 33,100	$ 0	$ 0	0.000%	$ 0	$ 332,247
CC 1020744299

porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **CRISTIAN ALEXANDER RENZA GARZON**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía **1,069,054,404**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Noviembre de 2019.

Gerente de Clientes

00000324

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9006265085

9006265085

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presentó de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LIMITADA en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reactivar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en **www.famisanar.com.co**, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Así mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 8° Decreto 1377 de 2013).

*"**Datos sensibles**: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).*

Firma del Afiliado:

Nombres y Apellidos: CRISTIAN ALEXANDER RENZA GARZON

Identificación: CC 1069054404

AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el artículo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI [ ] NO [X]

Firma del Afiliado:

Nombres y Apellidos: CRISTIAN ALEXANDER RENZA GARZON

Identificación: CC 1069054404

"ARTICULO 15. Los mayores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cuando sean plenamente legales, autoricen su voluntad de información para la donación de órganos, por lo menos dentro de las ocho (8) horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral. El médico tratante deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ identificado (a) con el documento _____ No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

Firmante a Ruego:

Nombres y Apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos de quien no sabe o no puede firmar: _____

Huella

00000325

Famisanar

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9006265085

9006265085

No. Formulario: 18755734

19 11 2019

DATOS DEL TRÁMITE

Los dos interrogantes que se encuentran arriba al formulario, antes de diligenciarlo

1. Tipo de afiliado: A. Cotizante X
2. Régimen de la Afiliación: A. Contributivo X
3. Régimen: A. Ordinario X
4. Tipo de afiliado: A. Trabajador dependiente X
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente X
Código (a cuidado de la EPS)

II. AFILIACIÓN A. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN del cotizante y número de familia

6. Apellidos y nombres				
	RENZA	GARZON	CRISTIAN	ALEXANDER

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento		
CC	1080064404	M X F	27	03	1996

11. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos opcionales)

12. Raza	13. Nacionalidad	14. Número de hijos	15. Grupo de población especial	16. Nombre de la empresa donde labora	Actividad económica de la empresa
0		0		POLITICA COOPERATIVA DE SEGURIDAD LTDA	

17. Dirección de residencia - IBC	18. Barrio/vereda			19. Teléfono	
5626.116		CL 2 B 34 11		NT	3142093361
		BOGOTA	Otro Cuál? X	Cuál?	DISTRITO CAPITAL

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente y padres)

IV. Apellidos y nombres

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		M F	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los adicionales adicionados

24. Apellidos y nombres							

25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	Datos complementarios	30. Edad

31. Discapacidad	32. Clase de discapacidad					33. Sede de la IPS de afiliación de la cual es responsable la EPS

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la IPS	Código de la IPS (a cuidado por la EPS)
COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SANTA LIBRADA	462

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PADRE CABEZA Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE ORDEN

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante y naturaleza de participación
EPROJECTS SAS	NT	901267799	

39. Dirección de notificación	40. Teléfono	41. Correo electrónico	42. Municipio de notificación	43. Departamento de notificación
CRA109A 150B 79 APT4 706	3176898931	felix79512@hotmail.com	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

47. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento			Fecha de novedad
48. EPS cedente: NINGUNA		49. Motivo de traslado	50. Clase de cotización / cotizante o Régimen de Pensiones	10	11	2019

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

51. Declaración de veracidad y exactitud de los datos suministrados y de aceptación	X
52. Declaración de la no obligación de afiliación al Régimen Contributivo (Especial o de Excepción)	
53. Declaración de residencia, de nacionalidad y de buena fe frente a la veracidad de la información suministrada	
54. Autorización de consulta de información en bases de datos	
55. Autorización para que la EPS solicite y consulte datos y copias de la historia clínica del cotizante y demás beneficiarios a afiliarse	X
56. Autorización para que la EPS realice la verificación de la información suministrada	X
57. Autorización para que la EPS realice la consulta y reporte de información a operadores de bancos de datos de información financiera, y a las entidades vigilancia y control	X
58. Autorización para que la EPS realice la verificación de la información suministrada	X

VIII. ANEXOS

59. Anexos: copia del documento de identidad: CC CE PA RC TI AS MS

Cantidad

60. Copia del documento de identidad del cotizante ampliado al 150%

61. Copia del registro civil de nacimiento o de la Tarjeta de identidad, cuando sea requerida

62. Copia del documento que acredite la calidad de cabeza de familia, cuando sea requerida

63. Copia de la autorización de descuento por nómina de la Superintendencia Nacional de Salud

64. Certificación de vinculación a una entidad exceptuada para realizar afiliaciones colectivas

65. Copia del acta administrativa o constitutiva de las autoridades tradicionales de la que aporta la validez de identificación de la misma

X. ESPACIO A SER DILIGENCIADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código de Departamento	Código de Municipio	67. Tipo de afiliado: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de afiliación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES
71. Firma del funcionario		CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

00000326

INTERNET
