SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 05 DEL DÍA 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Realizar reunión presencial de avance del proceso que tiene como objeto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA
1	Gnna Silva	1013599793		X		CGMLTI	ginnasilva@sena.edu.co		N/A	
2	JORGE VILLAMIL	79789088				CGMLTI	jvillamil@sena.edu.co		N/A	
3	FABIO RAMIREZ	80245333		X			fabioramirez@sena.edu.co		N/A	FABIO RAMIREZ
4	Carolina Rivera	52.266.930		X		Regional	drivergve sena.edu.co		N/A	
5	Freiber N Villareal	79348648	X			CGMLTI	nfvillareal@sena.edu.co		N/A	
6	Oscar Pulido	79365719	X			CGMLTI	OPulido@sena.edu.co		N/A	
7	Elvia Zoraida Martinez Yoss	52046059	X			CGMLT	emartinm@sena.edu.co		N/A	
8	Andrea Cuellar	1030527808		X		Planeación	ycuellar@sena.edu.co	—	N/A	ANDREA CUELLAR
9	Khareen Vega.	52832111	X			Coordinación FPI CGMLTI	KVega@sena.edu.	—	N/A	
10	Edna Arias	1026565495		X		SEGAC	consorciosegac@gmail.com		N/A	
11	Yenny Cristina Lima	53090.046		X		Segac	Consorciosegac@gmail.com		N/A	
12	HAYER II CASTILLO	53133748		x		SEGAC	Consorciosegac@gmail.co		N/A	HAYER II C
13	Edwin Alvarez C.	80731559		x		Segac.	consorciosegac@gmail.com		N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 05 DEL DÍA 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Realizar reunión presencial de avance del proceso que tiene como objeto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA
14	Ángela Nava	1026569082		X		SIGA Ambiental	anava@sena.edu.co	3115430913	N/A	
15	Andres Benitez	1069741027		X		SIGA SST	ajbenitez@sena.edu	3202	N/A	
16	Edward Santos	11.201.241	X			Supervisor	e7santos@sena.edu.co	3209	N/A	
17	Darwin Bolivar	1018431229	X			Lider TIC	dbolivar@sena.edu.co	3016	N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477

Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

ORDEN DEL DIA

- LECTURA DE COMPROMISOS ANTERIOR
- PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL
- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO
- NOVEDADES STT
- NOVEDADES AMBIENTALES
- TEMAS TÉCNICOS POR RESOLVER
- PLAN DE TRABAJO SIGUIENTE SEMANA
- OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

1. Se realizará visita al frente de obra de Atención del ciudadano, por parte del Ing. Supervisor y por parte de la dirección general para definir del baño de movilidad reducida de atención del usuario.

2. Se ajustará novedades requeridas por el área SST y AMBIENTAL en el informe mensual.

3. Radicar balance de obra y APU, con el fin de realizar otrosí con las nuevas actividades y cantidades del presupuesto.

4. Realizar envió pre factura consorcio Segac al área contable del Sena

5. Realizar informe técnico en su totalidad, plazo de entrega jueves 19 de octubre del año en curso.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL

PERSONAL DE OBRA SENA CGMLTI					
SEMANA ACTUAL	7	SEMANA PENDIENTES	5	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
CONTRATISTA ADMINISTRATIVOS					
RESIDENTE DE OBRA	1	ING. YEIMI CRISTINA GOMEZ MAYORGA		4/09/2023	
AUX INGENIERIA	1	ING.EDWIN ALVAREZ		4/09/2023	
PROFESIONAL SST	1	MAYERLIN CASTILLO NARANJO		4/09/2023	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	LAURA XIMENA SUAREZ		4/09/2023	
TOTAL	4				
CONTRATISTA (PERSONAL EN OBRA)					
MAESTRO DE OBRA	2	JOSE MAURICIO BELTRAN ACOSTA		4/09/2023	
		PEDRO IGNACIO CORREA ZUÑIGA		6/09/2023	
AYUDANTES	26	HOLMAN ALVAREZ CARDONA		4/09/2023	
		GERMAN ROBERTO BOLIVAR		4/09/2023	
		CARLOS JULIO PEREZ TABIO		4/09/2023	25/09/2023
		RAMON IGNACIO PEREZ SALAZAR		4/09/2023	25/09/2023
		CRISTIAN ANDRES CAMACHO BARRETO		5/09/2023	
		EDWIN CAMILO CAMACHO BARRETO		5/09/2023	
		ROGER ERNESTO MARTINEZ CAMPOS		5/09/2023	
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS		6/09/2023	14/09/2023
		OSCAR ANDRES TORRES VIVAS		6/09/2023	14/09/2023
		DAVID ALEXANDER ALVAREZ AMAYA		21/09/2023	6/10/2023
		JAMEL MANUEL VILORIA MIRANDA		22/09/2023	
		EDGAR ALONSO CORTES LANCHEROS		22/09/2023	
		GUSTAVO HERNAN CORTES LANCHEROS		22/09/2023	
		LUIS ENRIQUE CORTES LANCEROS		22/09/2023	
		MAICOLALEJANDRO CORREA CORREA		25/09/2023	6/10/2023
		LUIS CAMACHO SALCEDO		27/09/2023	
		JOSE DAIRO SANCHEZ OTALVARO		2/10/2023	
		DIEGO FERNANDO GUTIERREZ DIMAS		2/10/2023	
		JUAN GABRIEL TORRES VIVAS		3/10/2023	
		EDWIN TRUJILLO GUARNIZO		11/10/2023	
		OMAR ANTONIO BETANCOURTH		11/10/2023	
		JONATAN JOSE JULIO ARROYO		11/10/2023	17/10/2023
		JONATAN RODRIGUEZ RICO		11/10/2023	
		SANTIAGO MORENO CERVERA		PENDIENTE	
		IVAN RENE VALENCI ABERMEJO		12/10/2023	
		JULIO CESAR CONTRERAS BUSTOS		12/10/2023	
		JHONY STEVEN TAPIAS PAREJA		17/10/2023	
		ALEJANDRO JIMENEZ CORREA		17/10/2023	
		LUIS FELIPE JIMENEZ CORREA		17/10/2023	
		ANDRES FELIPE VEGA ACEVEDO		18/10/2023	
		ALEXANDER HERNANDEZ LOPEZ		18/10/2023	
		CARLOS JULIO CIFUENTES MELO		18/10/2023	
		JEFERSON RIVERA MAYA		18/10/2023	
TOTAL PARCIAL	28				7
TOTAL EN OBRA	32				

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO

SEMANA 23 AL 27 DE OCTUBRE		AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %	VALOR AVANCE DE OBRA	VALOR FRENTE
GRUPO 1 BAÑOS INSTRUCTORES						
	PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	80%	$ 187.869.373,25	71%	$ 166.554.367,39	$ 234.836.716,56
	PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL					
	PISO 5 HOMBRES CARACAS					
	PISO 5 MUJERES CARACAS					
	PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL					
	PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL					
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO					
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO					
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO					
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO					
	PISO 1 HOMBRES ATENCION AL CIUDADANO					
	PISO 1 MUJERES ATENCION AL CIUDADANO					
	PISO 1 MUJERES ATENCION AL CIUDADANO					
	PISO 1 HOMRE ATENCION AL CIUDADANO					
GRUPO 2 BAÑOS APRENDICES						
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES	100%	$ 227.201.316,60	95%	$ 223.090.038,67	$ 234.831.619,65
	PISO 3 APRENDICES MUJERES					
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES					
	PISO 6 APRENDICES MUJERES					
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO						
	ADEUCACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	50%	$ 32.012.260,50	10%	$ 6.402.452,10	$ 64.024.521,00
GRUPO 6 CUBIERTA PISO 3						
	IMPERMEABILZIACION TERRAZA	100%	$ 44.587.234,43	100%	$ 44.587.234,43	$ 44.587.234,43
TOTAL			$ 491.670.184,78		$ 440.634.092,59	$ 578.280.091,64

AVANCE DEL CONTRATO	**43%**	**$ 491.670.184,78**	**39%**	**$ 440.634.092,59**	**$ 578.280.091,64**	**51%**

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

DIVISIONES DE BAÑOS

SEGAC







Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

INSTALACION ELEMENTOS SANITARIOS






Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

INSTALACION ELEMENTOS

SEGAC

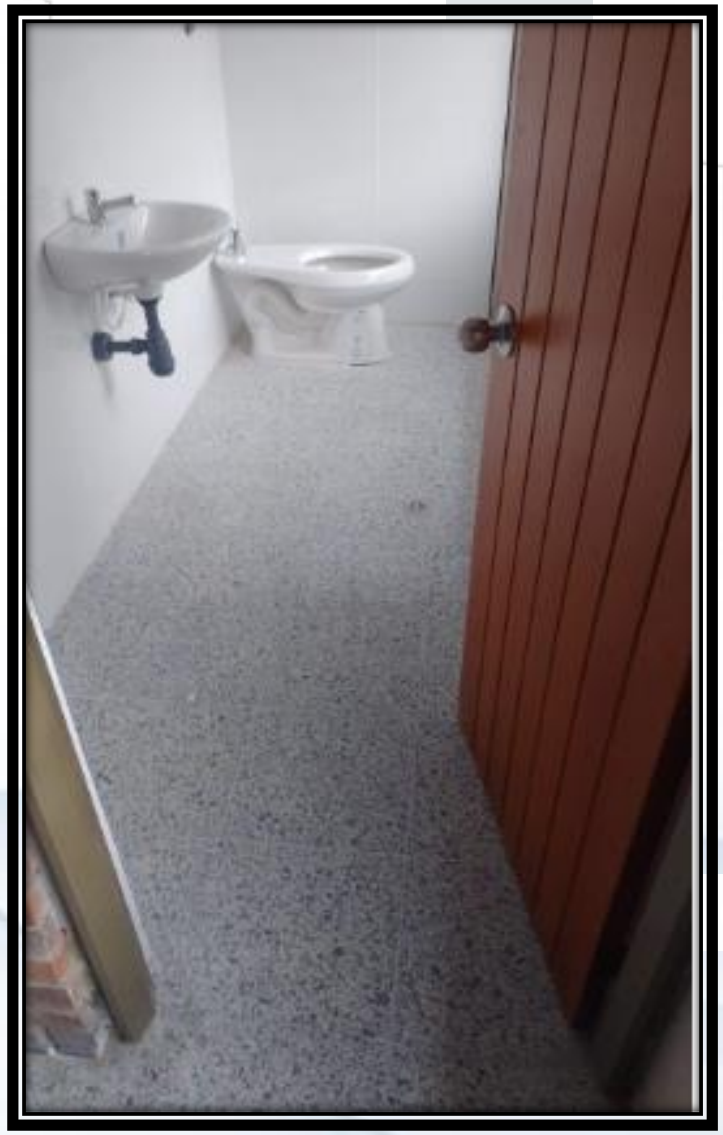






Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

INSTALACION ELEMENTOS

SEGAC

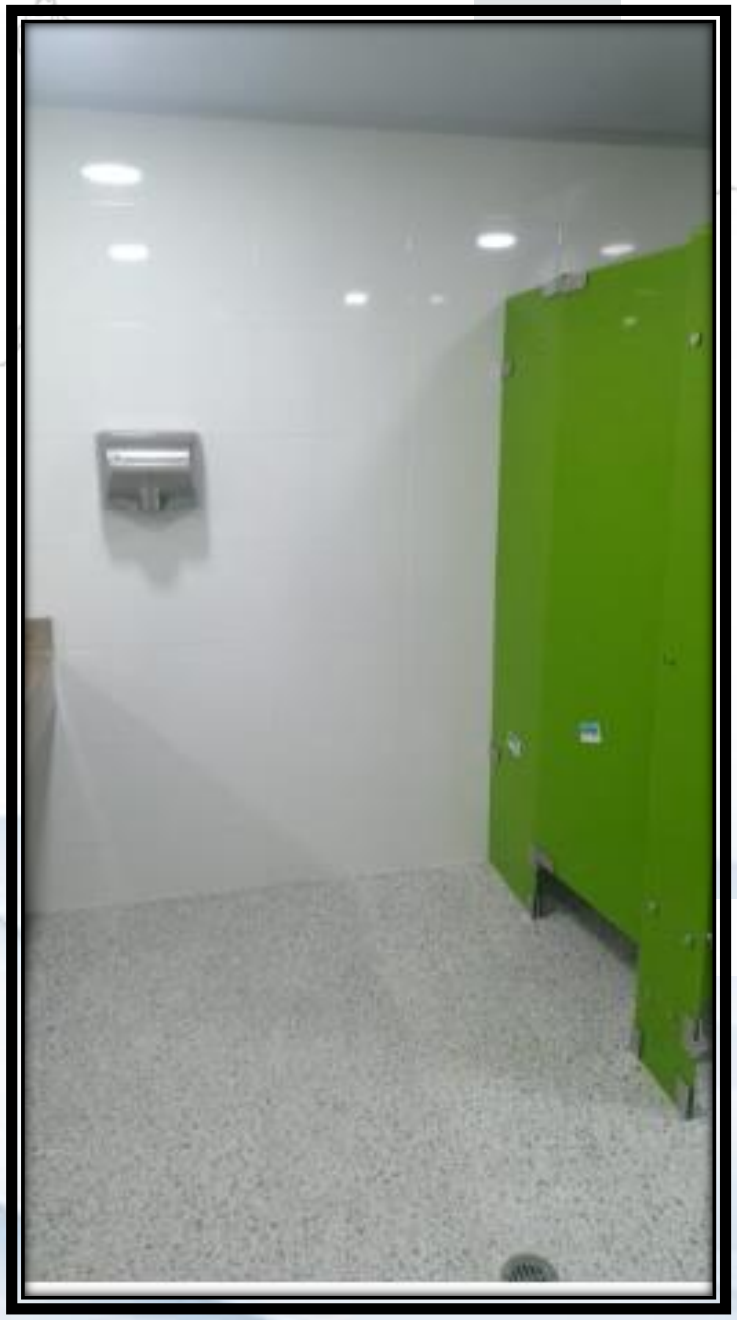





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

NOVEDADES STT Y NOVEDADES AMBIENTALES

1. Ingresos de personal y realización de respectiva inducción por parte el SENA y SEGAC
2. Señalización áreas de trabajo.
3. Suministro de EPP.
4. Charlas de seguridad, capacitaciones.
5. Se realiza envió de informe SST y AMBIENTAL del mes septiembre, y este aprobado por el área de SST y AMBIENTAL del SENA CGMLTI.
6. Se realiza segundo retiro de RCD 14 octubre 2023,certificado se adjunta próximo informe.
7. Se realizo inspección a áreas de trabajo con acompañamiento SST y AMBIENTAL SENA ,se generaron observaciones ya dándoles respuesta positiva por parte del consorcio SEGAC.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO

SEGAC







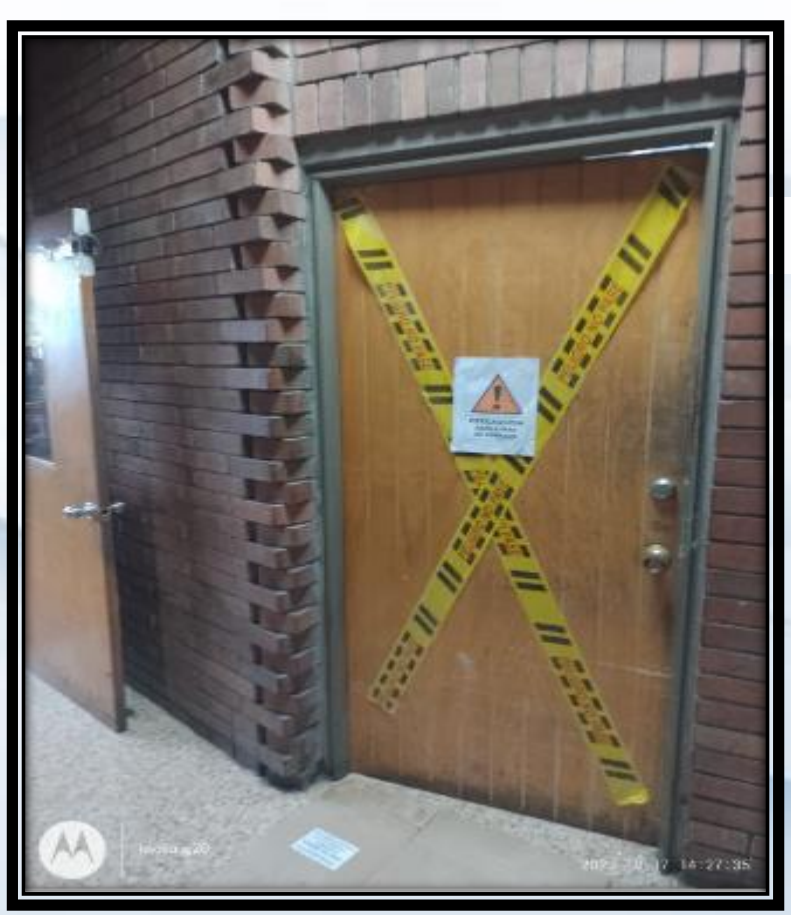






SALIDA DE RCD Y RESIDUOS APROVECHABLES

SEGAC






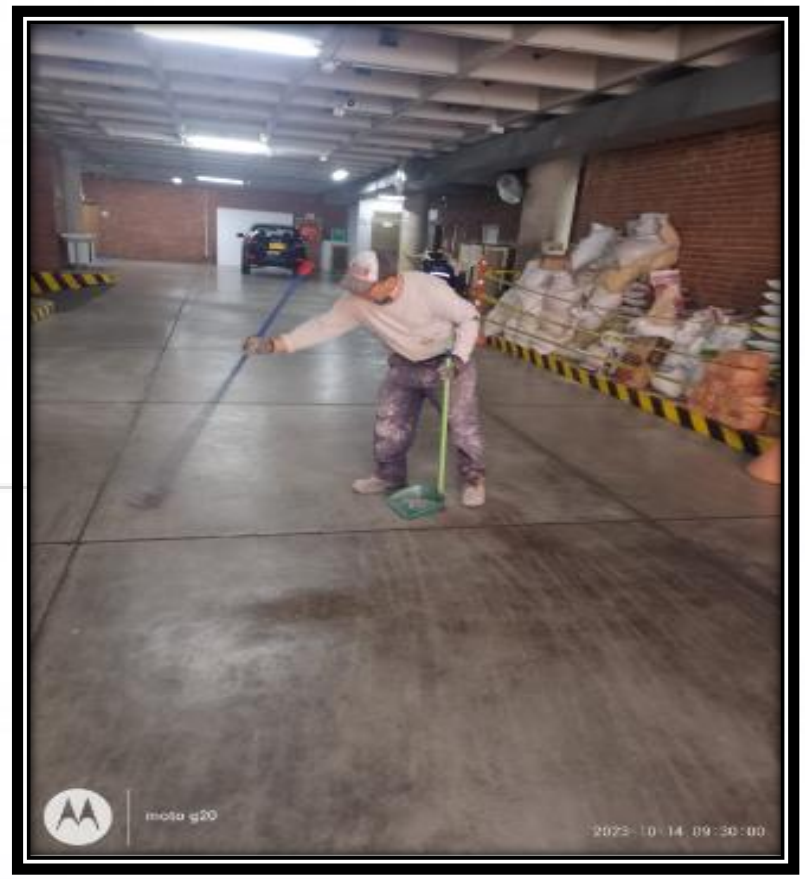







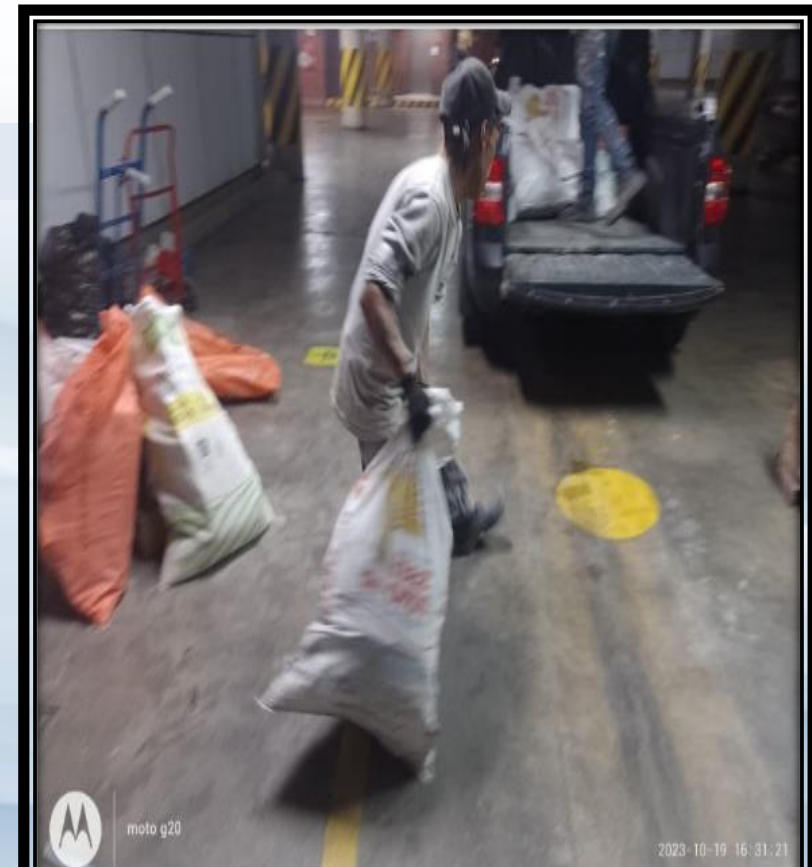

ORDEN Y ASEO


SEGAC

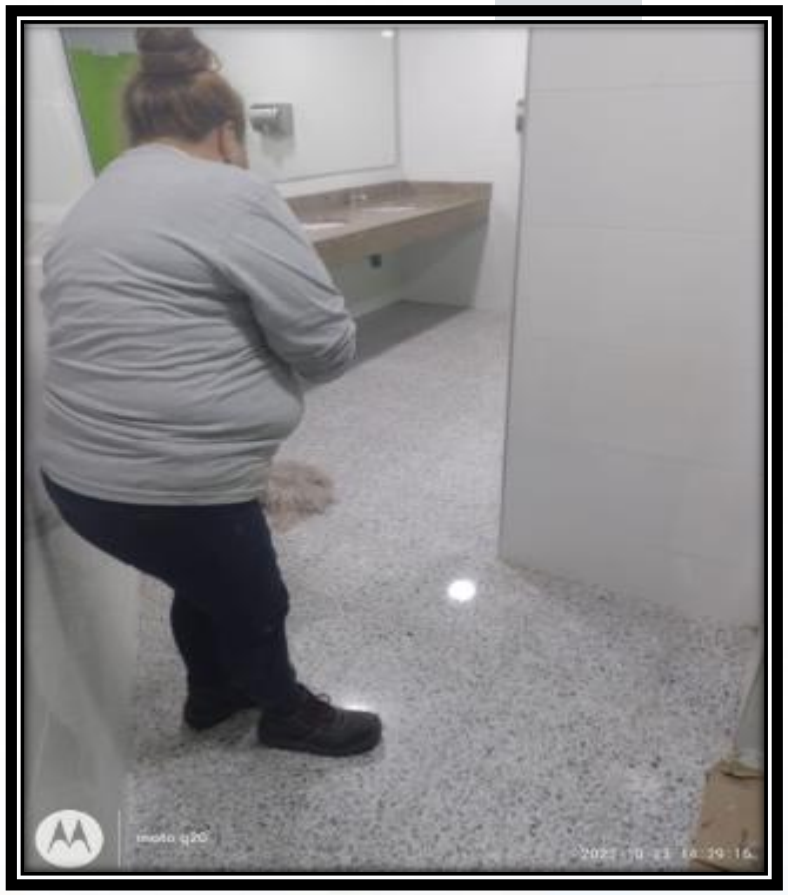

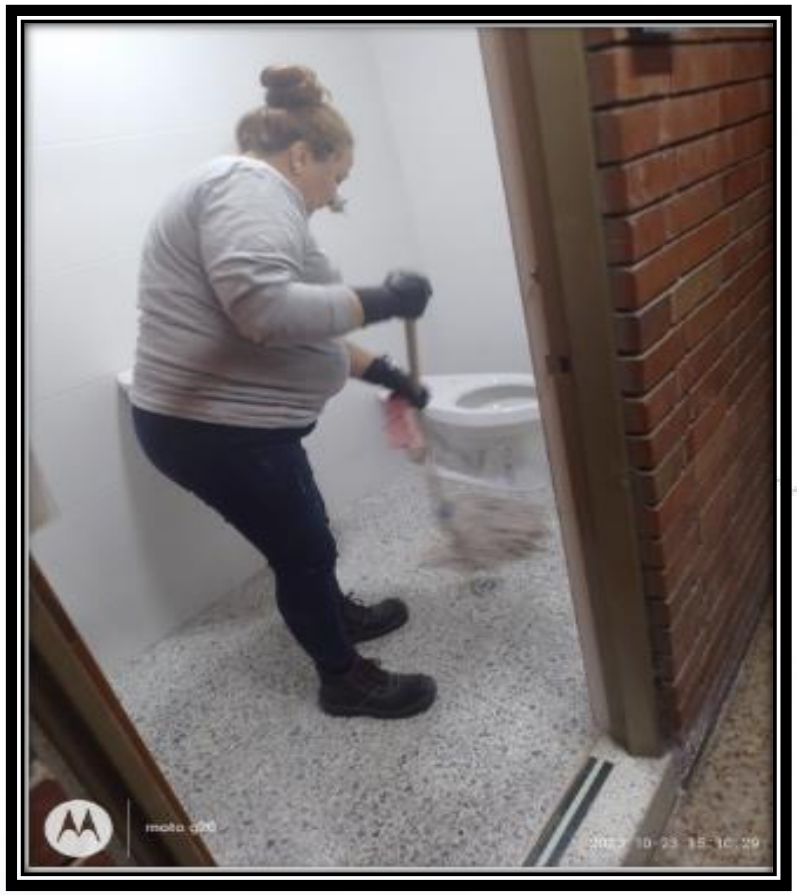





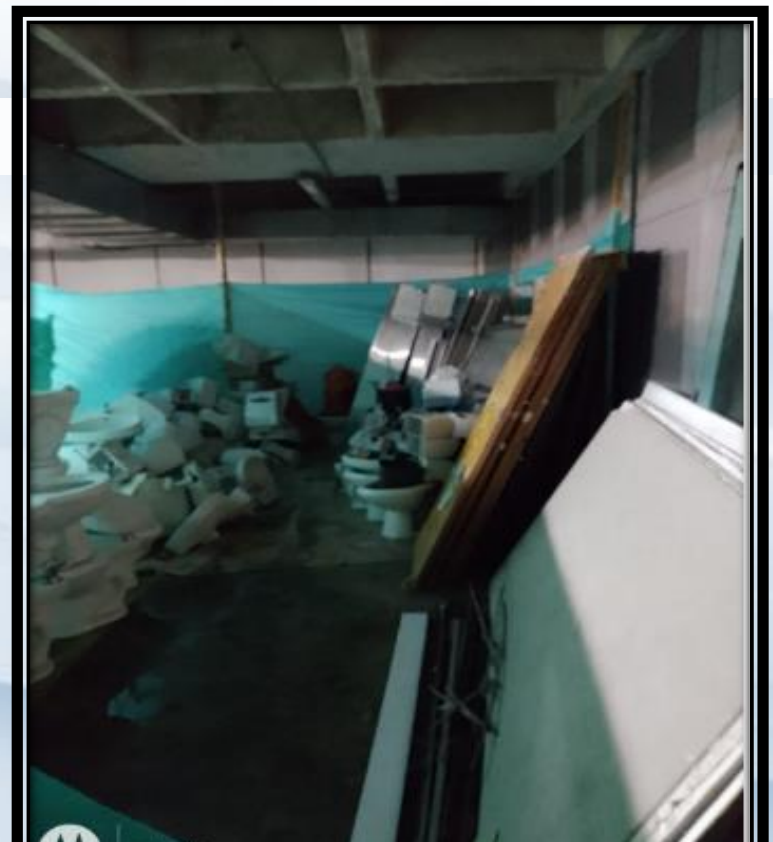



ETIQUETEADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

SEGAC












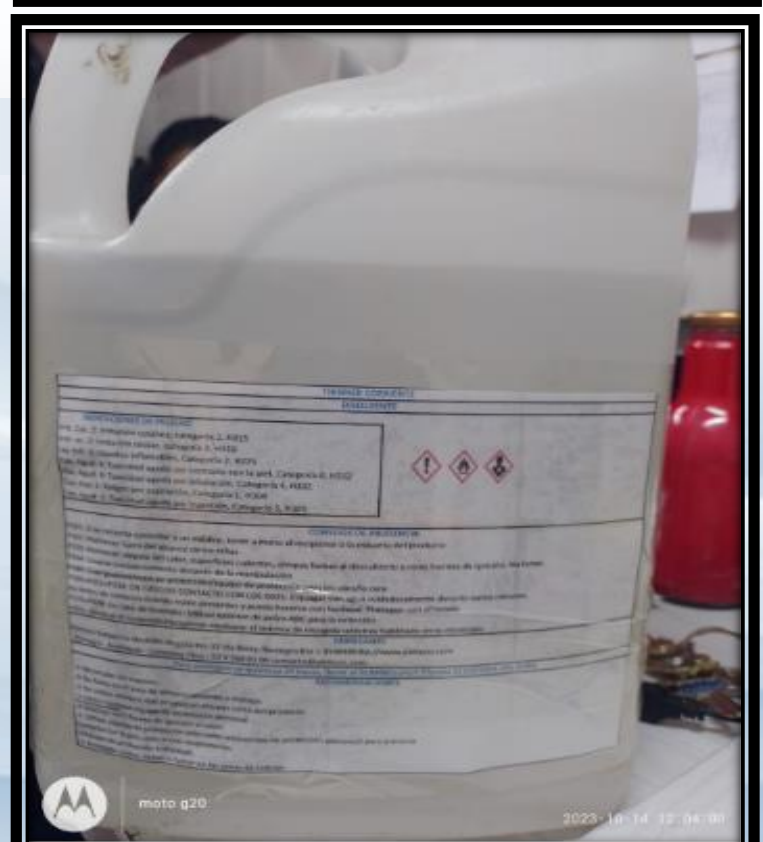

TEMAS TECNICOS POR RESOLVER

- Definición área de atención al ciudadano
  - Desmonte de canaleta de datos para poder trasladar la totalidad del mobiliario.
  - Ubicación de baño de movilidad reducida
- Diseño puerta en vidrio de ingreso

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PLAN DE TRABAJO SEMANA 30 AL 03 DE OCTUBRE

SEMANA 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 1				
	PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL	80%	ENCHAPES, PULIDA PISOS, INSTALACION CIELOS FALSOS	$ 38.682.288,86
	PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL	80%	ENCHAPES, PULIDA PISOS, INSTALACION CIELOS FALSOS	
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO	80%	ENCHAPE, INSTALACION CIELOS FALSOS INSTALACION DE SANITARIO	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO	80%	ENCHAPE, INSTALACION CIELOS FALSOS INSTALACION DE SANITARIO	
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO	80%	ENCHAPE, INSTALACION CIELOS FALSOS INSTALACION DE SANITARIO	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO	80%	ENCHAPE Y EMBOQUILLADO	
GRUPO 2				
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES	100%	ENTREGAR	$ 24.000.000,00
	PISO 6 APRENDICES MUJERES	100%	ENTREGAR	
	PISO 5 APRENDICES HOMBRES	30%	DEMOLICION E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICO	
	PISO 5 APRENDICES MUJERES	30%	DEMOLICION E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICO	
GRUPO 3				
	ADEUCACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	40%	FABRRICACION DE PUERTAS	$ 25.609.808,40
TOTAL				**$ 88.292.097,26**

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359
