REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 06 DEL DÍA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Realizar reunión presencial de avance del proceso que tiene como objeto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA
1	Edwin Alvarez	80733158		x		SEGAC	consorciosegac@gmail.com	3138386784	N/A	
2	MAYERLI CASTILLO	53133248		x		SEGAC	consorciosegac@gmail.com		N/A	MAYERLI C
3	Cristina Gomez	53090046		x		SEGAC	consorciosegac@gmail.com		N/A	
4	Fabio Ramirez	80245333		x		Sena	fabioramirez@sena.edu.co	3159788263	N/A	Fabio Ramirez
5	Vaneen Vesz	52832111	X			CGMLTI	vvjuez@sena.edu.co	16926	N/A	
6	Gabriel H. Heredia	80126180	x			CGMLTI	ghheredia@sena.edu.co	18973	N/A	Gabriel H.
7	JORGE VILLAMIL	79780664	x			CGMLTI	jvillamil@		N/A	
8	Angela Nova	1026564082		x		SIGA Ambiental	anova@sena.edu.co		N/A	
9	Andres Benitez	1069741031		x		SIGA SST.	gbenitez@sena.edu		N/A	
10	Edward Santos	11.201.241	X			Supervisor	esantos@sena	13128	N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477

Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

ORDEN DEL DIA

- LECTURA DE COMPROMISOS ANTERIOR
- PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL
- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO
- NOVEDADES STT
- NOVEDADES AMBIENTALES
- TEMAS TÉCNICOS POR RESOLVER
- PLAN DE TRABAJO SIGUIENTE SEMANA
- OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

- ✓ Se realizará envió de diseño y/o plano formal de atención al ciudadano por parte de la supervisión.

  La Supervisión y contratista realizaron ajustes a los planos y se enviaron a las áreas encargadas para su aprobación

- ✓ Radicar solicitud de presupuesto para impermeabilización de la terraza del 6 piso y ajustes a presupuesto.

  Mediante oficio 022 del 31 de octubre de 2023, se envió cotización y balance.

- ✓ Radicar actividades no previstas en atención al ciudadano

  Mediante oficio 023 del 31 de octubre de 2023, se enviaron Actividades no previstas.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL

PERSONAL DE OBRA SEMA CGMLTI				
SEMANA ACTUAL	7	SEMANA PENDIENTE	5	
CONTRATISTA ADMINISTRATIVOS			FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
RESIDENTE DE OBRA	1	ING. YEIMI CRISTINA GOMEZ MAYORGA	4/09/2025	
AUX INGENIERIA	1	ING.EDWIN ALVAREZ	4/09/2025	
PROFESIONAL SST	1	MAYERLIN CASTILLO MARANJO	4/09/2025	
AUXILIAR ADMINISTRATI	1	LAURA XIMENA SUAREZ	4/09/2025	
TOTAL	4			
CONTRATISTA |PERSONAL EN OBRA|			
MAESTRO DE OBRA	2	JOSE MAURICIO BELTRAN ACOSTA	4/09/2025	
		PEDRO IGNACIO CORREA ZUÑIGA	6/09/2025	
AYUDANTES	27	HOLMAN ALVAREZ CARDONA	4/09/2025	
		GERMAN ROBERTO BOLIVAR	4/09/2025	
		CARLOS JULIO PEREZ TAPIO	4/09/2025	25/09/2025
		RAMON IGNACIO PEREZ SALAZAR	4/09/2025	25/09/2025
		CRISTIAN ANDRES CAMACHO BARRETO	5/09/2025	
		EDWIN CAMILO CAMACHO BARRETO	5/09/2025	
		ROGER ERNESTO MARTINEZ CAMPOS	5/09/2025	
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS	6/09/2025	14/09/2025
		OSCAR ANDRES TORRES VIVAS	6/09/2025	14/09/2025
		DAVID ALEXANDER ALVAREZ AMAYA	21/09/2025	6/10/2025
		JAMEL MANUEL VILORIA MIRANDA	22/09/2025	
		EDGAR ALONSO CORTES LANCHEROS	22/09/2025	
		GUSTAVO HERNAN CORTES LANCHEROS	22/09/2025	
		LUIS ENRIQUE CORTES LANCEROS	22/09/2025	
		HAICOLALEJANDRO CORREA CORREA	25/09/2025	6/10/2025
		LUIS CAMACHO SALCEDO	27/09/2025	
		JOSE DAIRO SANCHEZ OTALVARO	2/10/2025	
		DIEGO FERNANDO GUTIERREZ DIMAS	2/10/2025	
		JUAN GABRIEL TORRES VIVAS	3/10/2025	
		EDWIN TRUJILLO GUARNIZO	11/10/2025	
		OMAR ANTONIO BETANCOURTH	11/10/2025	
		JONATAN JOSE JULIO ARROYO	11/10/2025	17/10/2025
		JONATAN RODRIGUEZ RICO	11/10/2025	
		SANTIAGO MORENO CERVERA	PENDIENTE	
		IVAN RENE VALENCI ABERMEJO	12/10/2025	
		JULIO CESAR CONTRERAS BUSTOS	12/10/2025	
		JHONY STEVEN TAPIAS PAREJA	17/10/2025	
		ALEJANDRO JIMENEZ CORREA	17/10/2025	
		LUIS FELIPE JIMENEZ CORREA	17/10/2025	
		ANDRES FELIPE VEGA ACEVEDO	18/10/2025	
		ALEXANDER HERNANDEZ LOPEZ	18/10/2025	
		CARLOS JULIO CIFUENTES MELO	18/10/2025	
		JEFERSON RIVERA MAYA	18/10/2025	
		LUCY ESPERANZA RIVERA	23/10/2025	
TOTAL PARCIAL	29			7
TOTAL EN OBRA	33			

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


➢ PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO

SEMANA 23 AL 27 DE OCTUBRE		AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %	VALOR AVANCE DE OBRA	VALOR FRENTE
GRUPO 1 BAÑOS INSTRUCTORES						
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO	100%	$ 234.836.716,56	80%	$ 187.869.373,25	$ 234.836.716,56
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO					
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO					
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO					
	PISO 1 HOMBRES ATENCION AL CIUDADANO					
	PISO 1 MUJERES ATENCION AL CIUDADANO					
	PISO 1 MUJERES ATENCION AL CIUDADANO					
	PISO 1 HOMRE ATENCION AL CIUDADANO AMPLIACION					
GRUPO 2 BAÑOS APRENDICES						
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES	100%	$ 227.201.316,60	98%	$ 230.134.987,26	$ 234.831.619,65
	PISO 3 APRENDICES MUJERES					
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES					
	PISO 6 APRENDICES MUJERES					
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO						
	ADEUCACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	80%	$ 51.219.616,80	30%	$ 19.207.356,30	$ 64.024.521,00
GRUPO 6 CUBIERTA PISO 3						
	IMPERMEABILZIACION TERRAZA	100%	$ 44.587.234,43	95%	$ 42.357.872,70	$ 44.587.234,43
TOTAL			$ 557.844.884,39		$ 479.569.589,51	$ 578.280.091,64

AVANCE DEL CONTRATO	**49%**	**$ 557.844.884,39**	**42%**	**$ 479.569.589,51**	**$ 578.280.091,64**	**51%**

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC

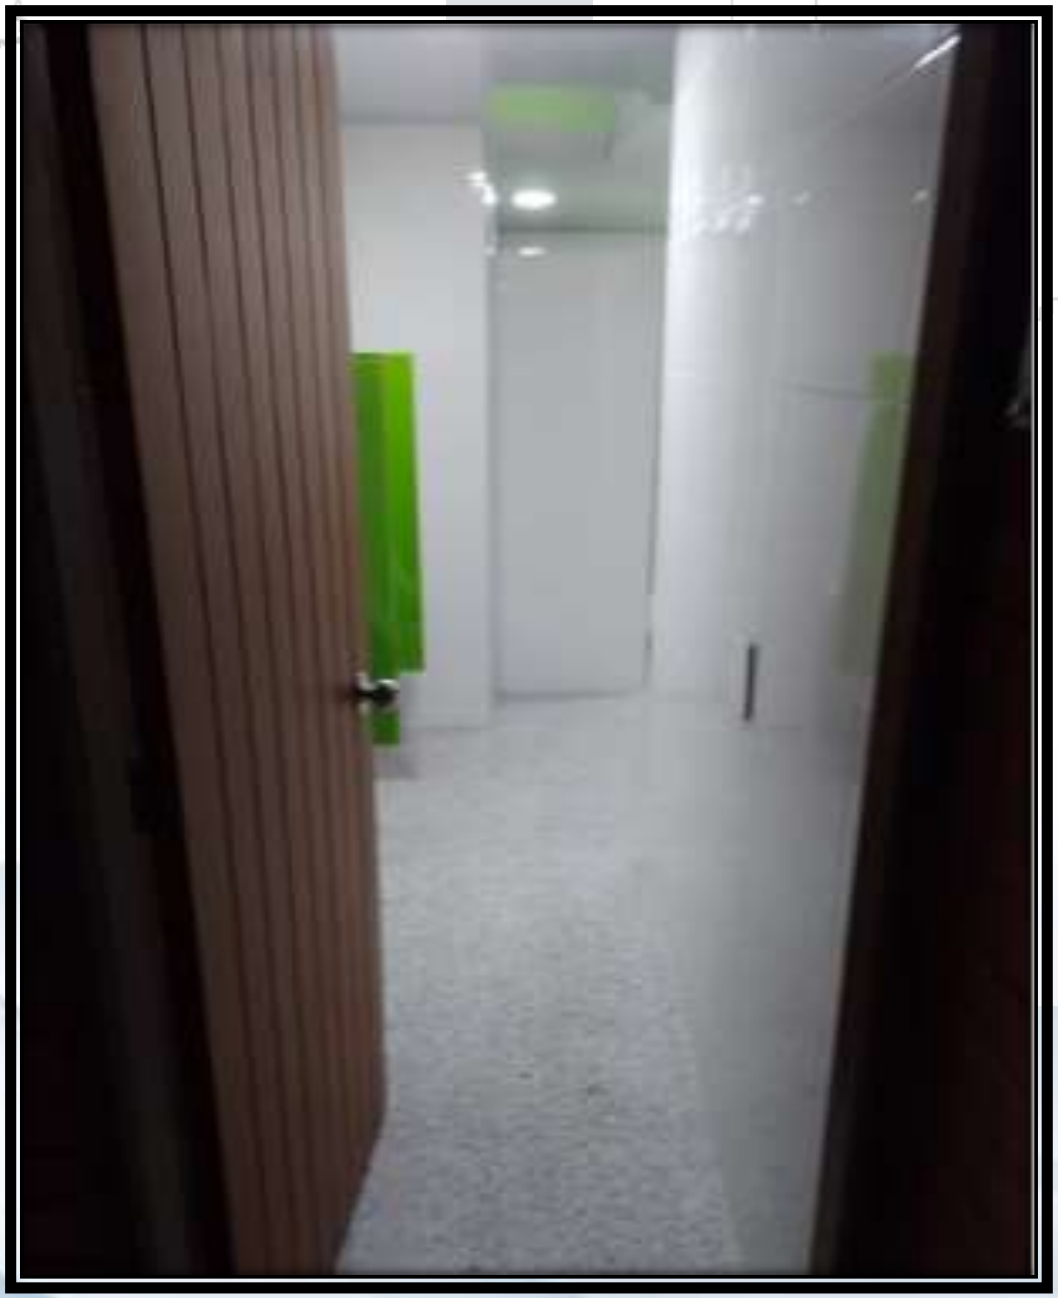



Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

NOVEDADES STT Y NOVEDADES AMBIENTALES

1. Ingresos de personal y realización de respectiva inducción por parte el SENA y SEGAC
2. Señalización áreas de trabajo.
3. Suministro de EPP.
4. Charlas de seguridad, capacitaciones.
5. Se realizara tercer retiro de RCD el día sábado 04 noviembre.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO

SEGAC










SEGAC

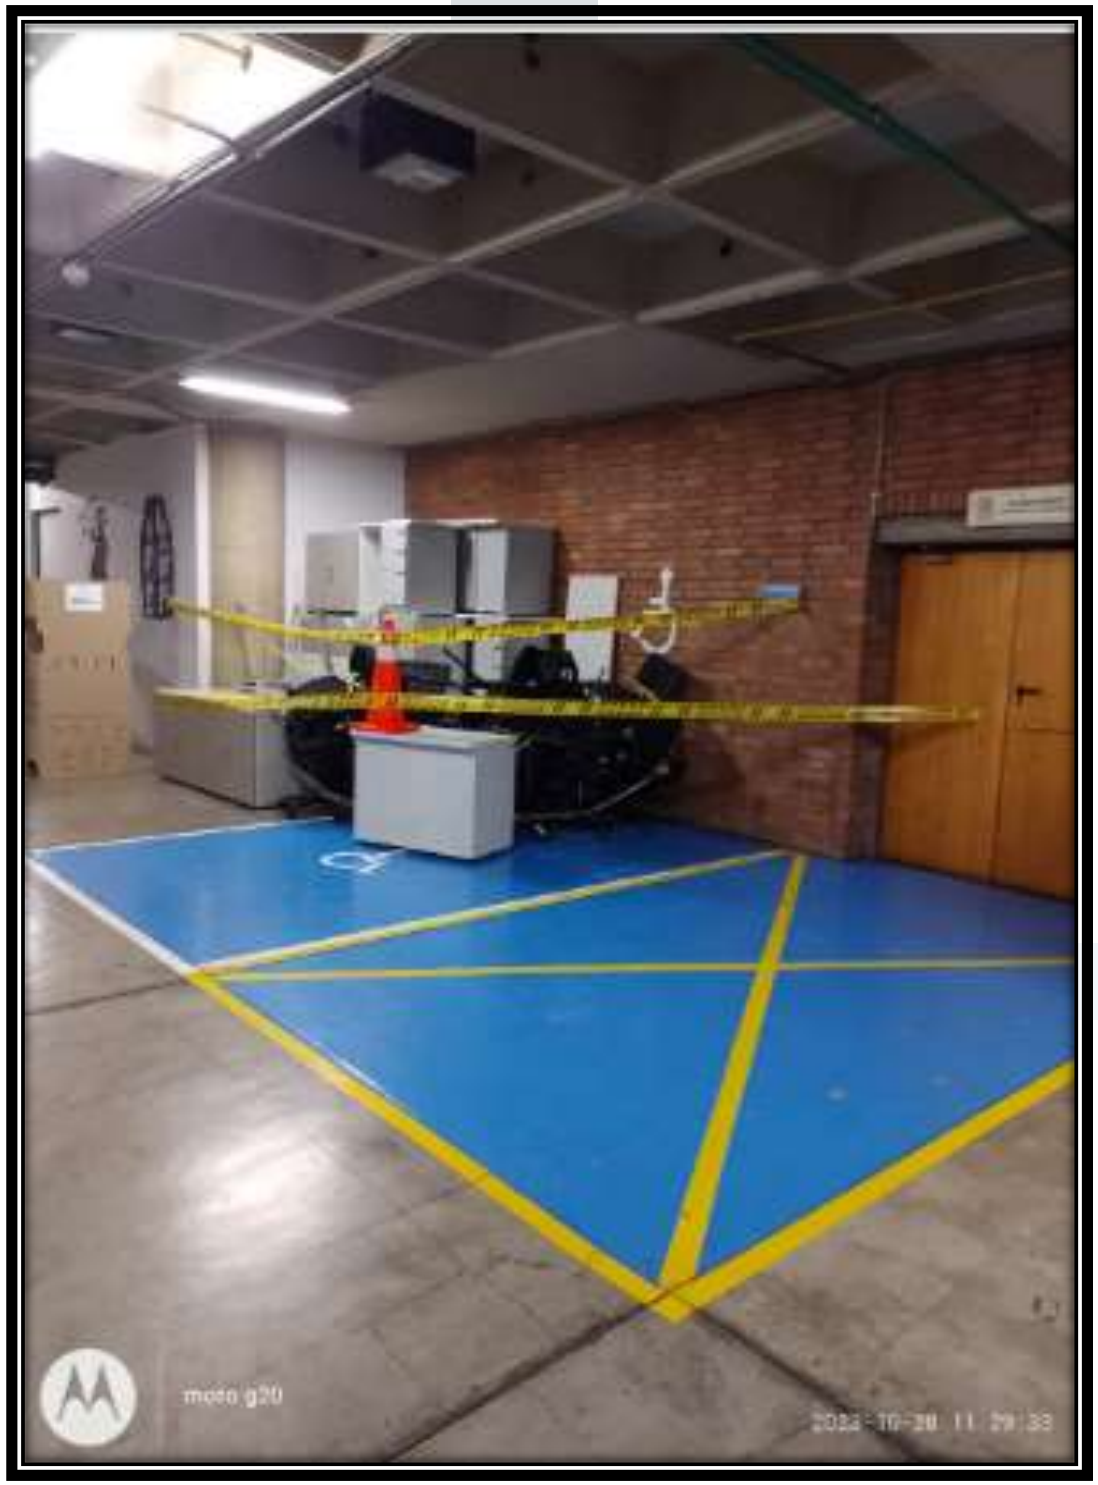



TEMAS TECNICOS POR RESOLVER

- Ajuste o aprobación del mueble de cafetería

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PLAN DE TRABAJO SEMANA 04 AL 11 DE OCTUBRE

SEMANA 04 AL 11 DE NOVIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 1				
	PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL	90%	CIELO FALSO APARATOS SANITARIOS	$ 42.000.000,00
	PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL	90%	CIELO FALSO APARATOS SANITARIOS	
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO	90%	CIELO FALSO APARATOS SANITARIOS	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO	90%	CIELO FALSO APARATOS SANITARIOS	
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO	90%	CIELO FALSO APARATOS SANITARIOS, PISO VINILO	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO	90%	CIELO FALSO APARATOS SANITARIOS PISO VINILO	
	PISO 1 HOMBRES ATENCION AL CIUDADANO	90%	PUNTOS ELECTRICOS, CIELO RASO Y PULIDA DE PISOS	
	PISO 1 MUJERES ATENCION AL CIUDADANO	80%	PUNTOS ELECTRICOS, CIELO RASO Y PULIDA DE PISOS	
	PISO 1 MUJERES ATENCION AL CIUDADANO	80%	PUNTOS ELECTRICOS, CIELO RASO Y PULIDA DE PISOS	
	PISO 1 HOMRE ATENCION AL CIUDADANO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA	60%	ADECUACION DE PLACA, PUNTO SANITARIOS,	
	PISO 4 ENFERMERIA	20%	DESMONTE Y DEMOLICION DE ENCHAPES	
	PISO 4 HOMBRES CARACAS	20%	DESMONTE Y DEMOLICION DE ENCHAPES	
	PISO 4 MUJERES CARACAS	20%	DESMONTE Y DEMOLICION DE ENCHAPES	
GRUPO 2				
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES	100%	ENTREGAR	$ 18.000.000,00
	PISO 6 APRENDICES MUJERES	100%	ENTREGAR	
	PISO 5 APRENDICES HOMBRES	30%	DESMONTE Y DEMOLICION DE ENCHAPES	
	PISO 5 APRENDICES MUJERES	30%	DESMONTE Y DEMOLICION DE ENCHAPES	
	PISO 2 APRENDICES HOMBRES	30%	DESMONTE Y DEMOLICION DE ENCHAPES	
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO				
	ADECUACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	50%	DEMOLICION DE MUROS, ADECUACION DE VANOS, FABRICACION DE PUERTA DE INGRESO	$ 23.500.000,00
GRUPO 6				
	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA 6	40%	DESMONTE DE LOSETAS, RETIRO DE MANTO	$ 19.000.000,00
	TOTAL			**$ 102.500.000,00**

ESTADO Y ENTREGAS

BAÑOS INSTRUCTORES	ESTADO			FECHA ENTREGA
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 5 HOMBRES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 5 MUJERES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL		EJECUCION		13/11/2023
PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL		EJECUCION		13/11/2023
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO		EJECUCION		16/11/2023
PISO 2 MUJERES AUDITORIO		EJECUCION		16/11/2023
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO		EJECUCION		16/11/2023
PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO		EJECUCION		16/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO ARCHIVO BAÑO SE DEBE AMPLIAR		EJECUCION		16/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA		EJECUCION		16/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO		EJECUCION		16/11/2023
PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO		EJECUCION		16/11/2023
PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA		EJECUCION		23/11/2023
PISO 4 ENFERMERIA			INICIO	27/11/2023
PISO 4 HOMBRES CARACAS			INICIO	27/11/2023
PISO 4 MUJERES CARACAS			INICIO	27/11/2023
PISO 1 VIGILANCIA			INICIO	27/11/2023
PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA			INICIO	13/12/2023
PISO 3 HOMBRES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 3 MUJERES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 6 HOMBRES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 6 MUJERES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 6 SUB DIRECCION			INICIO	13/12/2023
PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO			INICIO	13/12/2023
BAÑOS APRENDICES				
PISO 3 APRENDICES HOMBRES	ENTREGADO			
PISO 3 APRENDICES MUJERES	ENTREGADO			
PISO 6 APRENDICES HOMBRES				
PISO 6 APRENDICES MUJERES				
PISO 2 APRENDICES HOMBRES			INICIO	13/12/2023
PISO 5 APRENDICES HOMBRES			INICIO	13/12/2023
PISO 5 APRENDICES MUJERES			INICIO	13/12/2023

ESTADO Y ENTREGAS

ATENCION AL CIUDADANO				
ADECUACIONES AL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO Y PUERTAS		EJECUCION		25/11/2023
CAFETERIA				
ADECUACION AL AREA DE CAFETERIA			INICIO	13/12/2023
TERRAZA 6 PISO				
IMPERMEABILZACION TERRAZA PISO 6			INICIO	20/11/2023

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C.
Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359
