REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 06 DEL DÍA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Realizar reunión presencial de avance del proceso que tiene como objeto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA
1	Hareen Vega	52832111	x			Subdirección (e) CGMLTI	hjvega@sena.edu.co	16926	N/A	
2	Oscar Petech	76325719	X			Planeación CGMLTI	opetech@sena.edu.co	12552	N/A	
3	EDWARD SANTOS	11.201.241	X			Regional	aysantos@sena.edu.co		N/A	
4	Fabio Ramirez.	80245333		X			fabioramirez@sena.edu.co		N/A	
5	Ginna Silva	1013599793		X		CGMLTI	ginnasilva@sena.edu.co		N/A	
6	Andres Bautista	1069741007.		X		SIGA OST	gbautista@sena.edu		N/A	
7	Angela Nova	1026569092		X		SIGA Ambiental	anova@sena.edu.co		N/A	
8	Yamy Cristina	53.090.046		X		Consorcio SEGAC	Consorcio.segac@gmail.com		N/A	
9	Edna Liseth Arias	1026266545		X		Consorcio SEGAC	consorciosegac@gmail.com		N/A	
10	Andres Cuellar	1030524808		X		Planeación	ycuellar@sena.edu.co	—	N/A	
11	JORGE VILLAMIL	79789064	X			Administrativo Eléctrico	jvillamil@sena.edu.co		N/A	
12	Freilan N. Villareal	77348.168	X			Sena	jfvillareal@sena.edu.co		N/A	
13	Gabriel Heredia	80126180	X			Subdirección	ghheredia@sena.edu.co		N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 06 DEL DÍA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Realizar reunión presencial de avance del proceso que tiene como objeto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA
14	Edwin Alvarez	80733158		X		SEGAC	consorciosegac@gmail.com	-	N/A	
15	HAYERLIC	53133748		X		SEGAC	consorciosegac@gmail.com		N/A	HAYERLIC
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477

Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

ORDEN DEL DIA

- LECTURA DE COMPROMISOS ANTERIOR
- PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL
- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO
- NOVEDADES SST
- NOVEDADES AMBIENTALES
- TEMAS TÉCNICOS POR RESOLVER
- PLAN DE TRABAJO SIGUIENTE SEMANA
- OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

- Se realizará reunión el día martes 07 de noviembre, con el personal de cafetería para aprobación del diseño de los muebles.
- La supervisión deberá formalizar la entrega del diseño de Atención al Ciudadano.
- Formalizar la no ejecución de las divisiones de los baños de Costado caracas, mediante oficio.
- La supervisión sugiere la inclusión de la actividad de impermeabilización de las gradas contiguas a la terraza del piso 3, con el objetivo garantizar la estabilidad de obra de impermeabilización de la terraza del piso 3 del grupo 6.
- El contratista hará solicitud formal para la impermeabilización de las gradas contiguas a la terraza del piso 3 para mitigar la aparición de filtraciones.
- El contratista verificará si la actualización de las pólizas está acorde con las fechas del acta de inicio, y se encarga de subirlas a la plataforma SECOP para aprobación de la entidad, esta acción deberá quedar subsanada a mas tardar el día de mañana 04 de noviembre. (radicar formalmente)

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL

PERSONAL DE OBRA SENA CGMLTI					
SEMANA ACTUAL	6	SEMANA PENDIENTES	6	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
CONTRATISTA ADMINISTRATIVOS					
RESIDENTE DE OBRA	1	ING YEIMI CRISTINA GOMEZ MAYORGA		4/09/2023	
AUX INGENIERIA	1	ING EDWIN ALVAREZ		4/09/2023	
PROFESIONAL SST	1	MAYERLIN CASTILLO NARANJO		4/09/2023	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	LAURA SUAREZ		4/09/2023	
TOTAL	4				
CONTRATISTA (PERSONAL EN OBRA)					
MAESTRO DE OBRA	2	JOSE MAURICIO BELTRAN ACOSTA		4/09/2023	
		PEDRO IGNACIO CORREA ZUÑIGA		6/09/2023	
AYUDANTES	41	HOLMAN ALVAREZ CARDONA		4/09/2023	
		GERMAN ROBERTO BOLIVAR		4/09/2023	1/11/2023
		CARLOS JULIO PEREZ TABIO		4/09/2023	25/09/2023
		RAMON IGNACIO PEREZ SALAZAR		4/09/2023	25/09/2023
		CRISTIAN ANDRES CAMACHO BARRETO		5/09/2023	20/10/2023
		EDWIN CAMILO CAMACHO BARRETO		5/09/2023	
		ROGER ERNESTO MARTINEZ CAMPOS		5/09/2023	
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS		6/09/2023	14/09/2023
		OSCAR ANDRES TORRES VIVAS		6/09/2023	14/09/2023
		DAVID ALEXANDER ALVAREZ AMAYA		21/09/2023	6/10/2023
		JAMEL MANUEL VILORIA MIRANDA		22/09/2023	
		EDGAR ALONSO CORTES LANCHEROS		22/09/2023	
		GUSTAVO HERNAN CORTES LANCHEROS		22/09/2023	
		LUIS ENRIQUE CORTES LANCEROS		22/09/2023	
		MAICOL ALEJANDRO CORREA CORREA		25/09/2023	6/10/2023
		LUIS CAMACHO SALCEDO		27/09/2023	20/10/2023
		JOSE DAIRO SANCHEZ OTALVARO		2/10/2023	
		DIEGO FERNANDO GUTIERREZ DIMAS		2/10/2023	
		JUAN GABRIEL TORRES VIVAS		15/10/2023	
		EDWIN TRUJILLO GUANIZO		11/10/2023	
		OMAR ANTONIO BETANCOURTH		11/10/2023	12/10/2023
		JONATAN JOSE JULIO AROYO		11/10/2023	17/10/2023
		JONATAN RODRIGUEZ RICO		11/10/2023	26/10/2023
		SANTIAGO MORENO CERVERA			
		IVAN RENE VALENCIA BERMEJO		12/10/2023	
		JULIO CESAR CONTRERAS BUSTOS		12/10/2023	
		.JHONNY STIVER TAPIAS PAREJA		17/10/2023	
		ALEJANDRO JIMENEZ CORREA		17/10/2023	
		LUIS FELIPE JIMENEZ CORREA		17/10/2023	
		ALEXANDER HERNANDEZ LOPEZ		18/10/2023	21/10/2023
		ANDRES FELIPE VEGA ACEVEDO		18/10/2023	21/10/2023
		CARLOS JULIO CIFUENTES MELO		18/10/2023	21/10/2023
		JEFERSON RIVERA MAYA		18/10/2023	21/10/2023
		LUCY ESPERRANZA RIVERA		23/10/2023	
		NESTOR JULIO TORRES ESLAVA			
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS			
		ARIOLFO DIAZ CANO		3/11/2023	7/11/2023
		JORGE ENRIQUE CESPEDES SANCHEZ		3/11/2023	
		EDISON ANDRES CORTES MONTOYA		3/11/2023	
TOTAL PARCIAL	41				17
TOTAL EN OBRA	28				

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

- # PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO

SEMANA 03 AL 15 DE NOVIEMBRE	AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %	VALOR AVANCE DE OBRA	VALOR FRENTE
GRUPO 1 BAÑOS INSTRUCTORES					
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES	69%	$ 313.916.051,86	69%	$ 313.916.051,86	$ 457.568.526,94
PISO 3 MUJERES MULTIPLES					
PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO					
PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO					
PISO 5 HOMBRES CARACAS					
PISO 5 MUJERES CARACAS					
PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL					
PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL					
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO					
PISO 2 MUJERES AUDITORIO					
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO					
PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO					
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA					
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA					
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO					
PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA					
PISO 4 ENFERMERIA					
PISO 4 HOMBRES CARACAS					
PISO 4 MUJERES CARACAS					
PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA					
PISO 1 VIGILANCIA					
PISO 3 HOMBRES CARACAS					
PISO 3 MUJERES CARACAS					
PISO 6 HOMBRES CARACAS					
PISO 6 MUJERES CARACAS					
PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO					
PISO 5 501					
PISO 1 101					

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO

GRUPO 2 BAÑOS APRENDICES						,
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES	73%	$ 300.941.118,98	70%	$ 288.376.496,10	$ 412.248.108,19
	PISO 3 APRENDICES MUJERES					
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES					
	PISO 6 APRENDICES MUJERES					
	PISO 5 APRENDICES HOMBRES					
	PISO 5 APRENDICES MUJERES					
	PISO 2 APRENDICES MUJERES					
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO						
	ADEUCACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	85%	$ 54.420.842,85	85%	$ 54.420.842,85	$ 64.024.521,00
GRUPO 4 CAFETERIA						
	ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA	58%	$ 42.911.971,95	58%	$ 42.911.971,95	$ 73.986.158,53
GRUPO 6 CUBIERTA PISO 6						
	IMPERMEABILZIACION TERRAZA	45%	$ 57.680.670,75	45%	$ 57.680.670,75	$ 128.179.268,33
TOTAL			$ 769.870.656,39		$ 757.306.033,52	$ 1.136.006.583,00

AVANCE DEL CONTRATO	**68%**	**$ 769.870.656,39**	**67%**	**$ 757.306.033,52**	**$ 1.136.006.583,00**	**100%**

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC

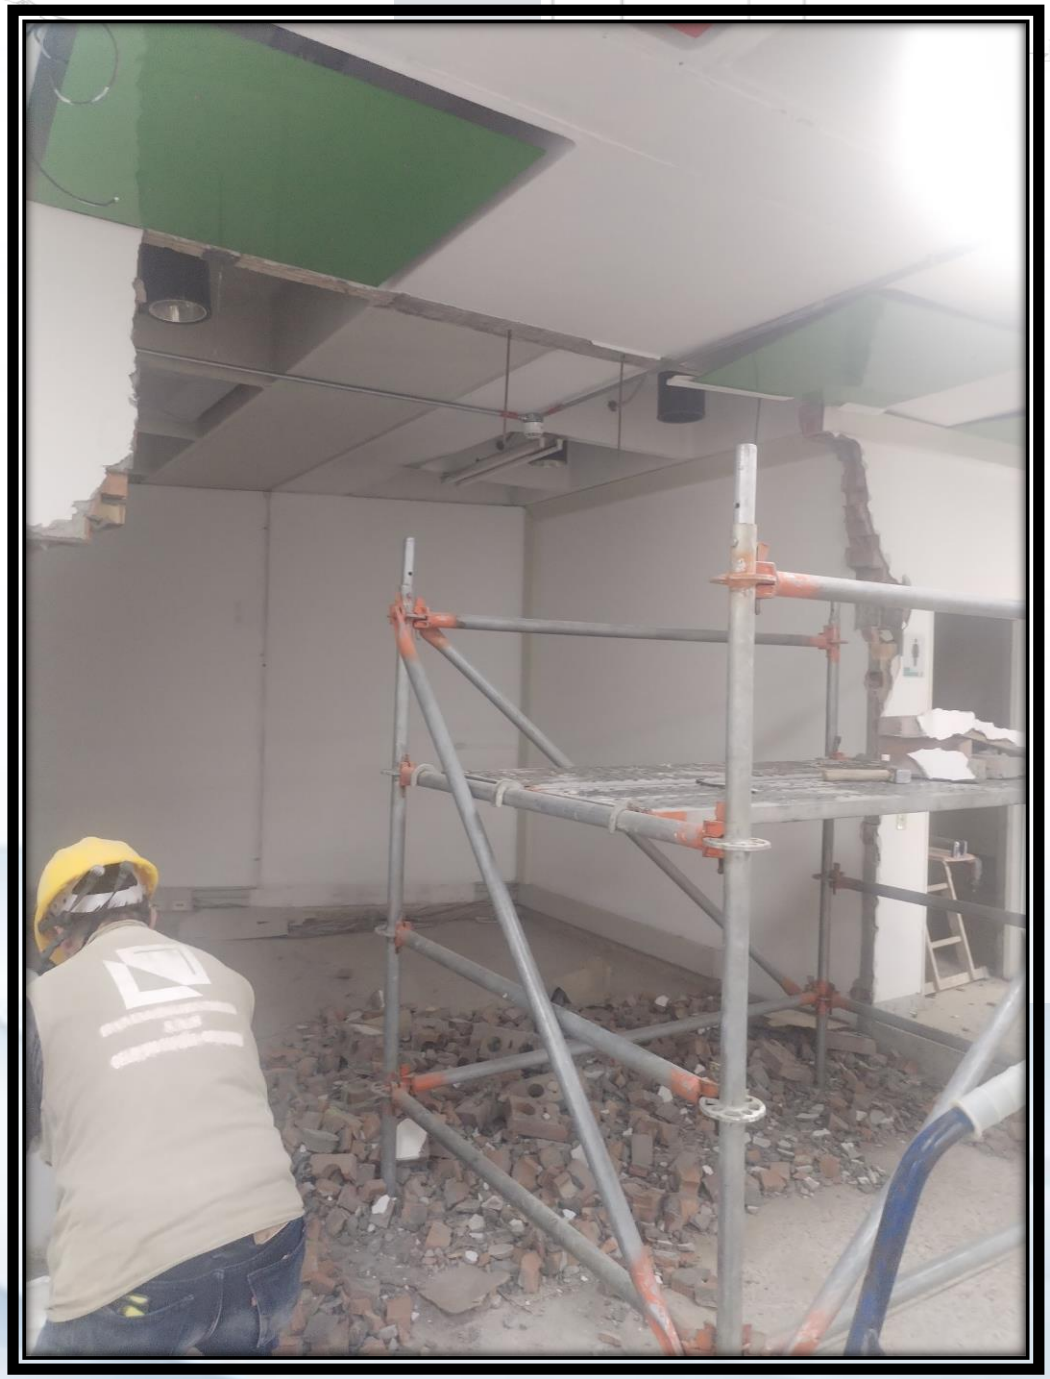




Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC



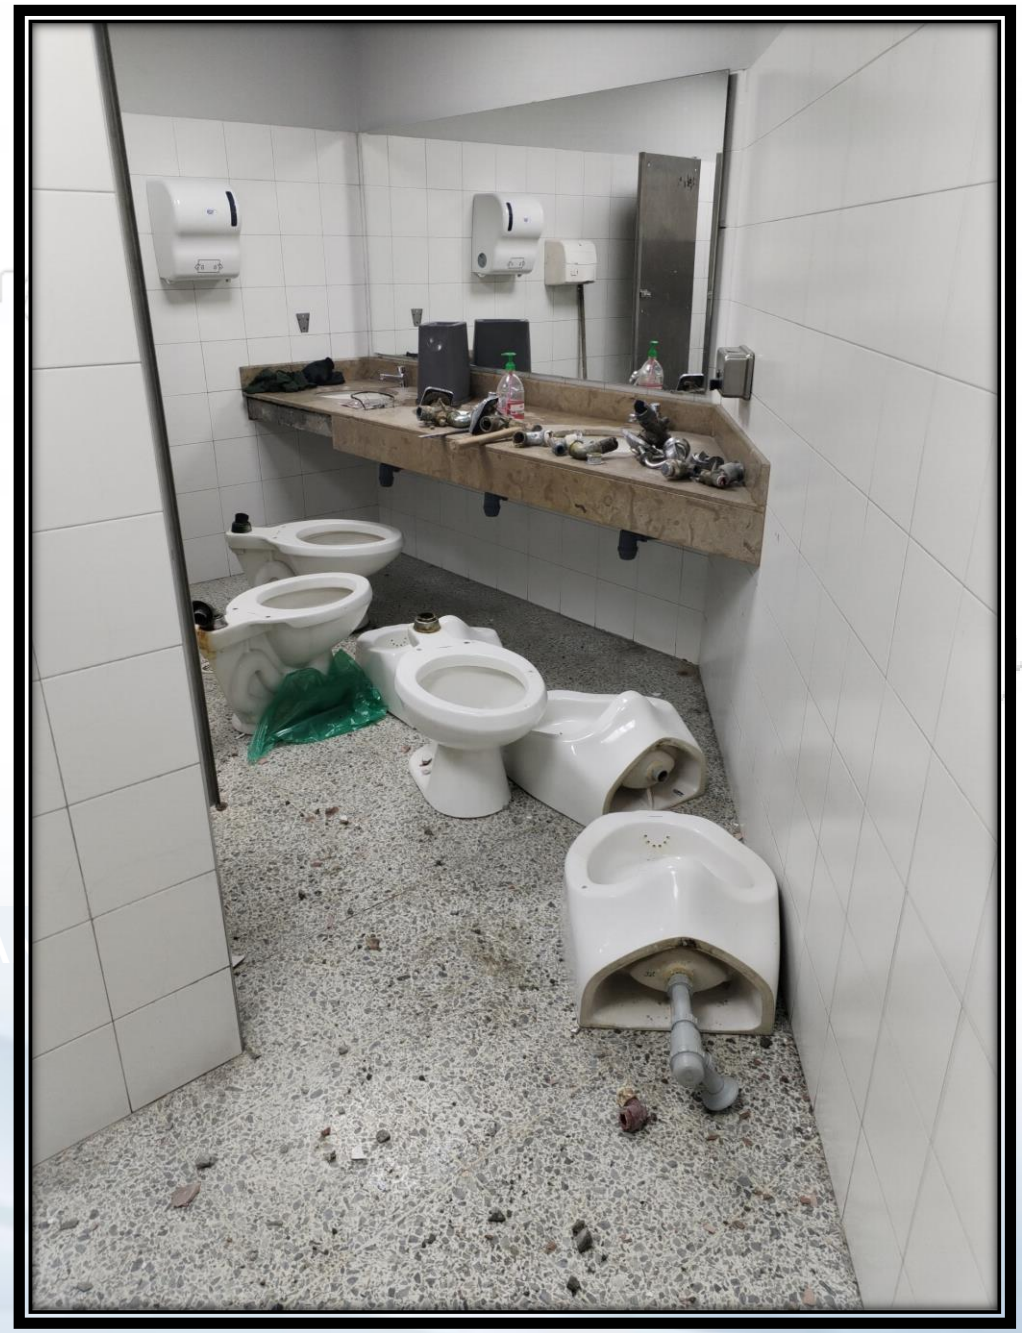

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC






Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC

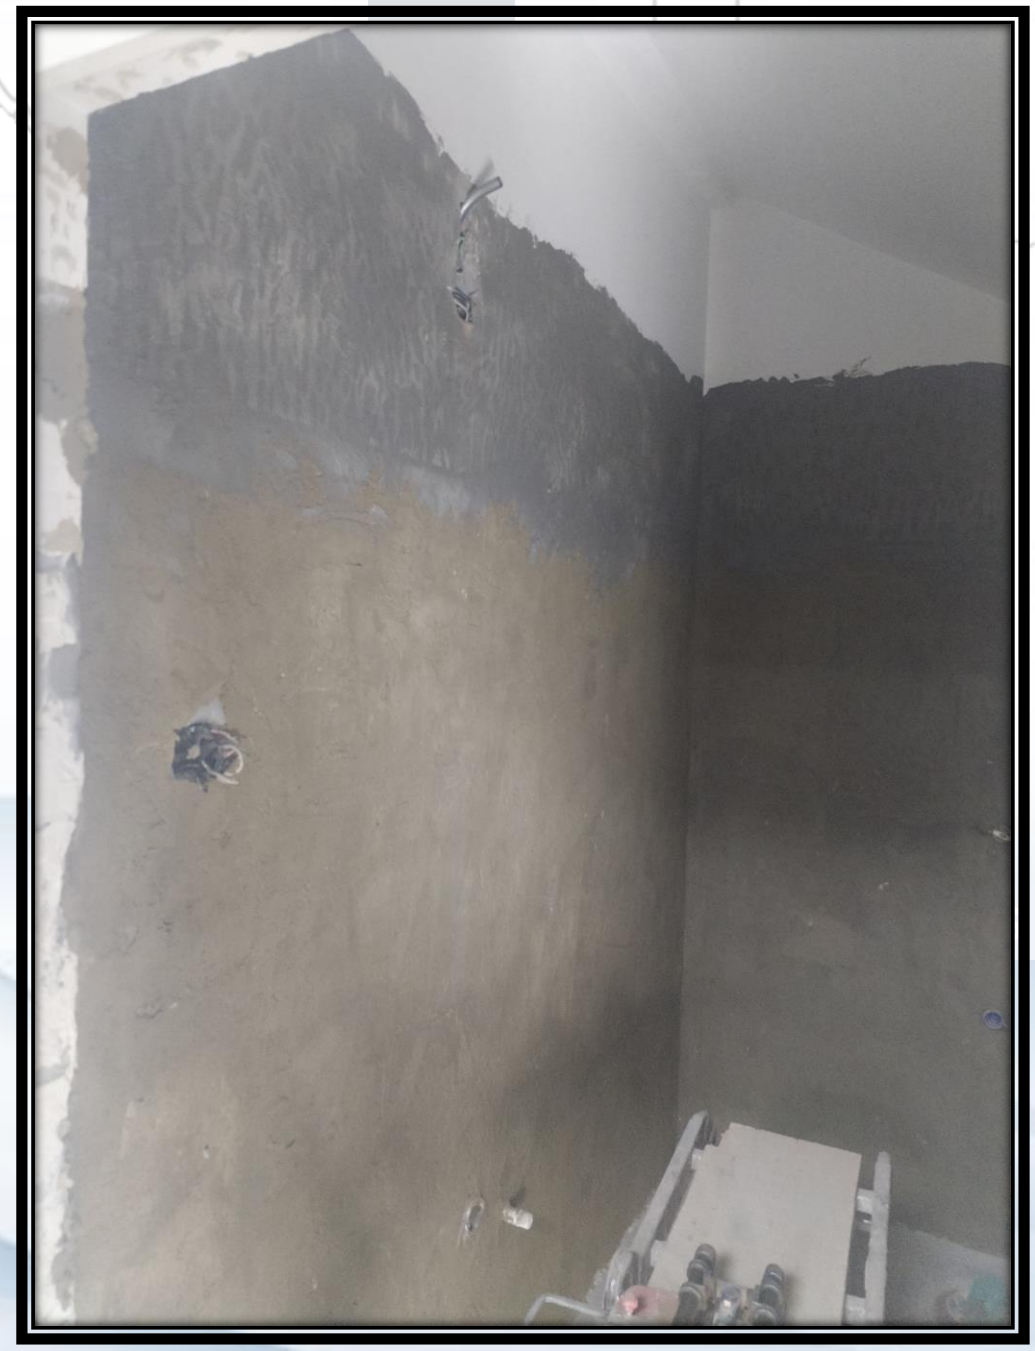

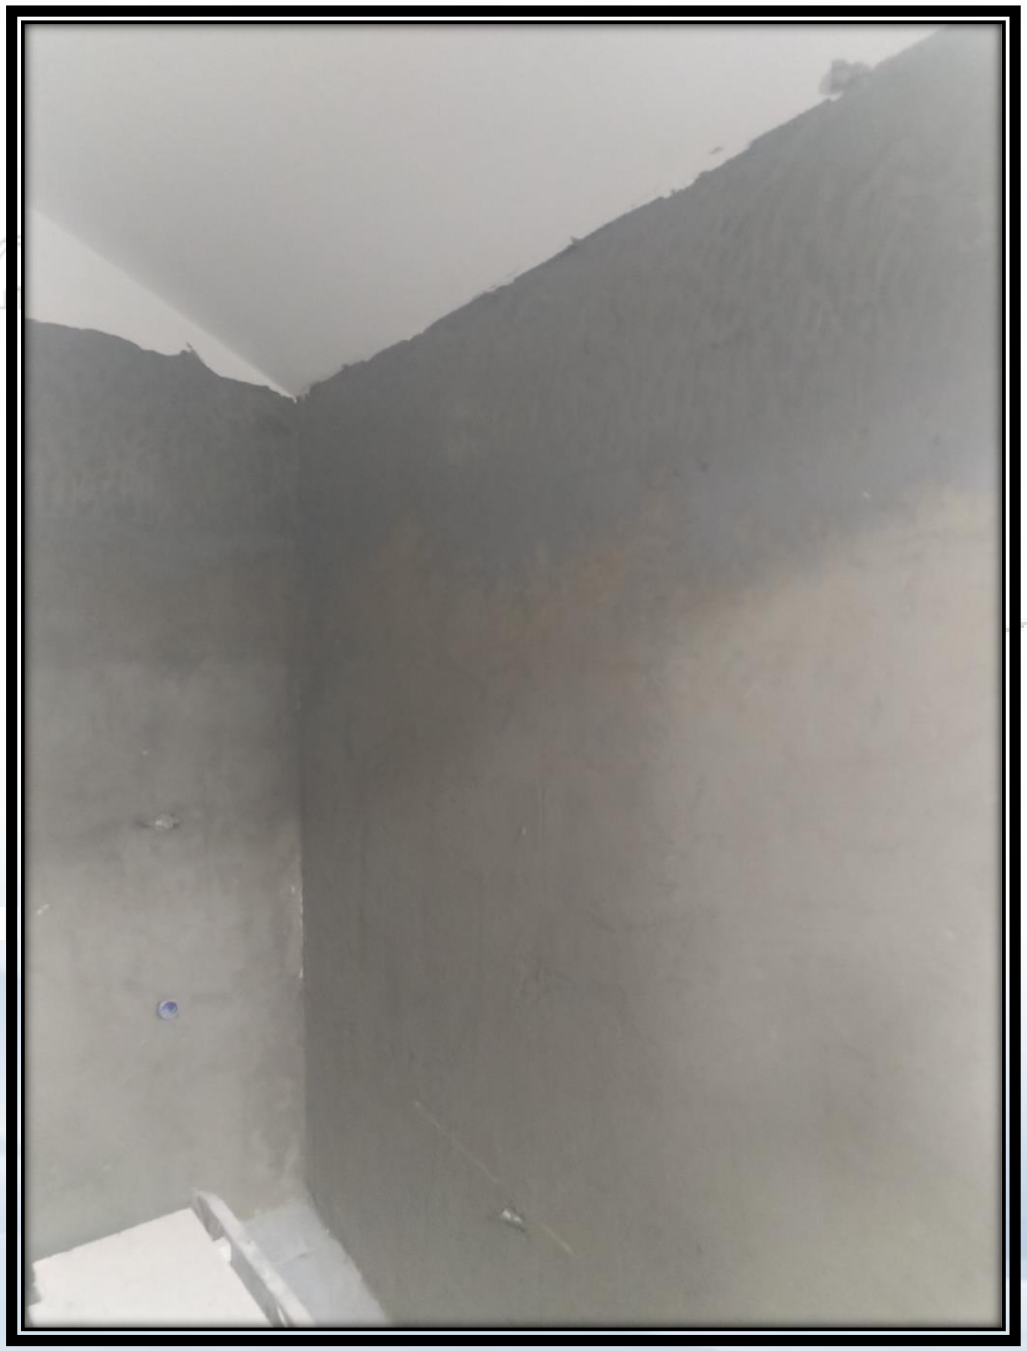

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC

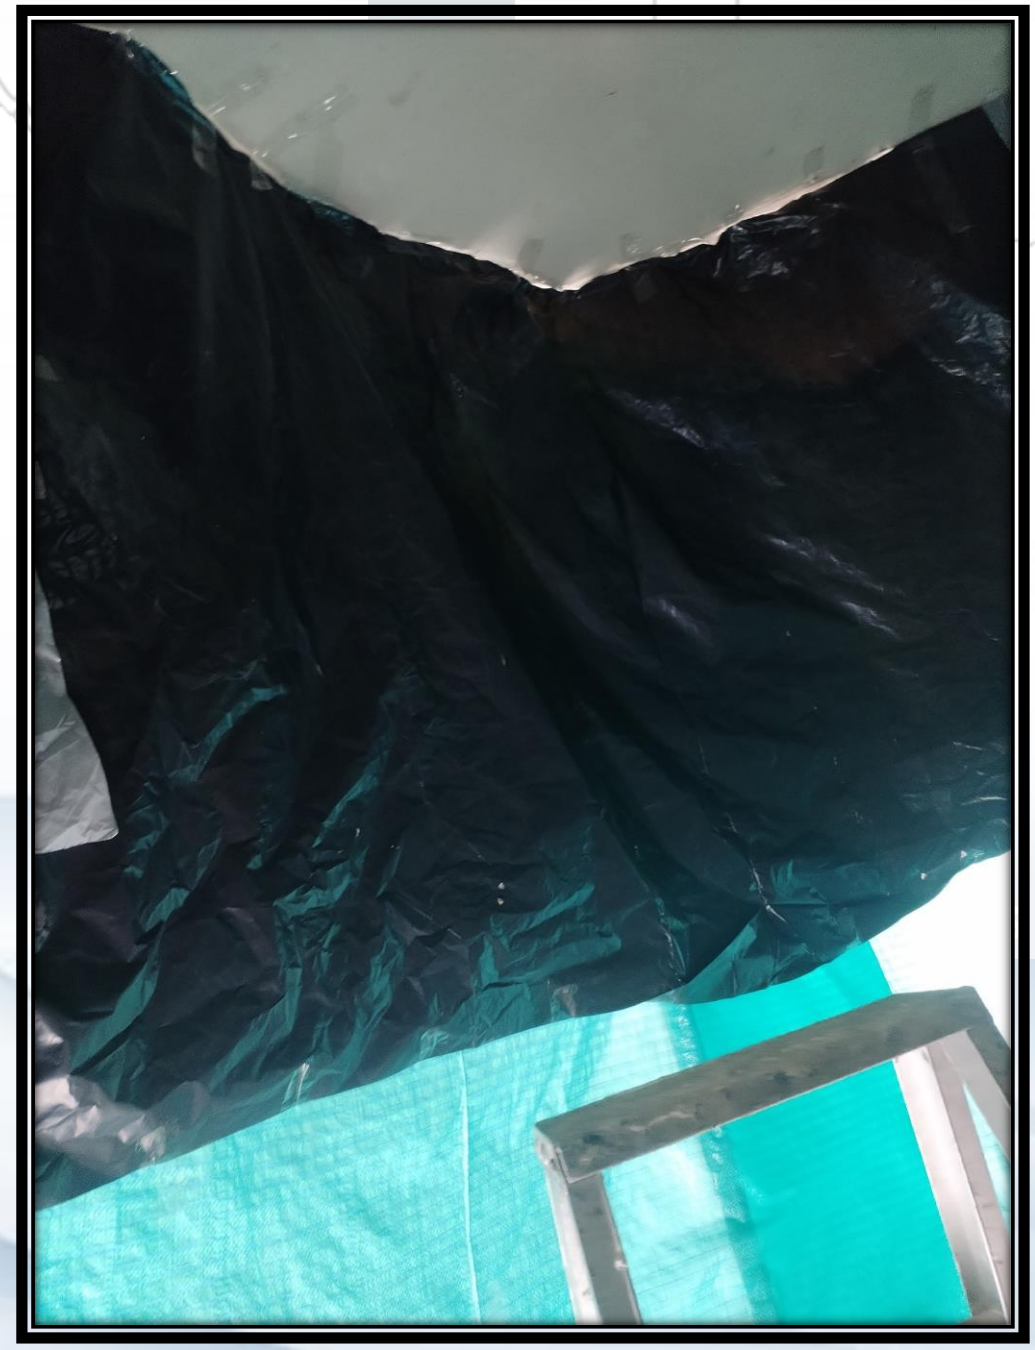



Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC

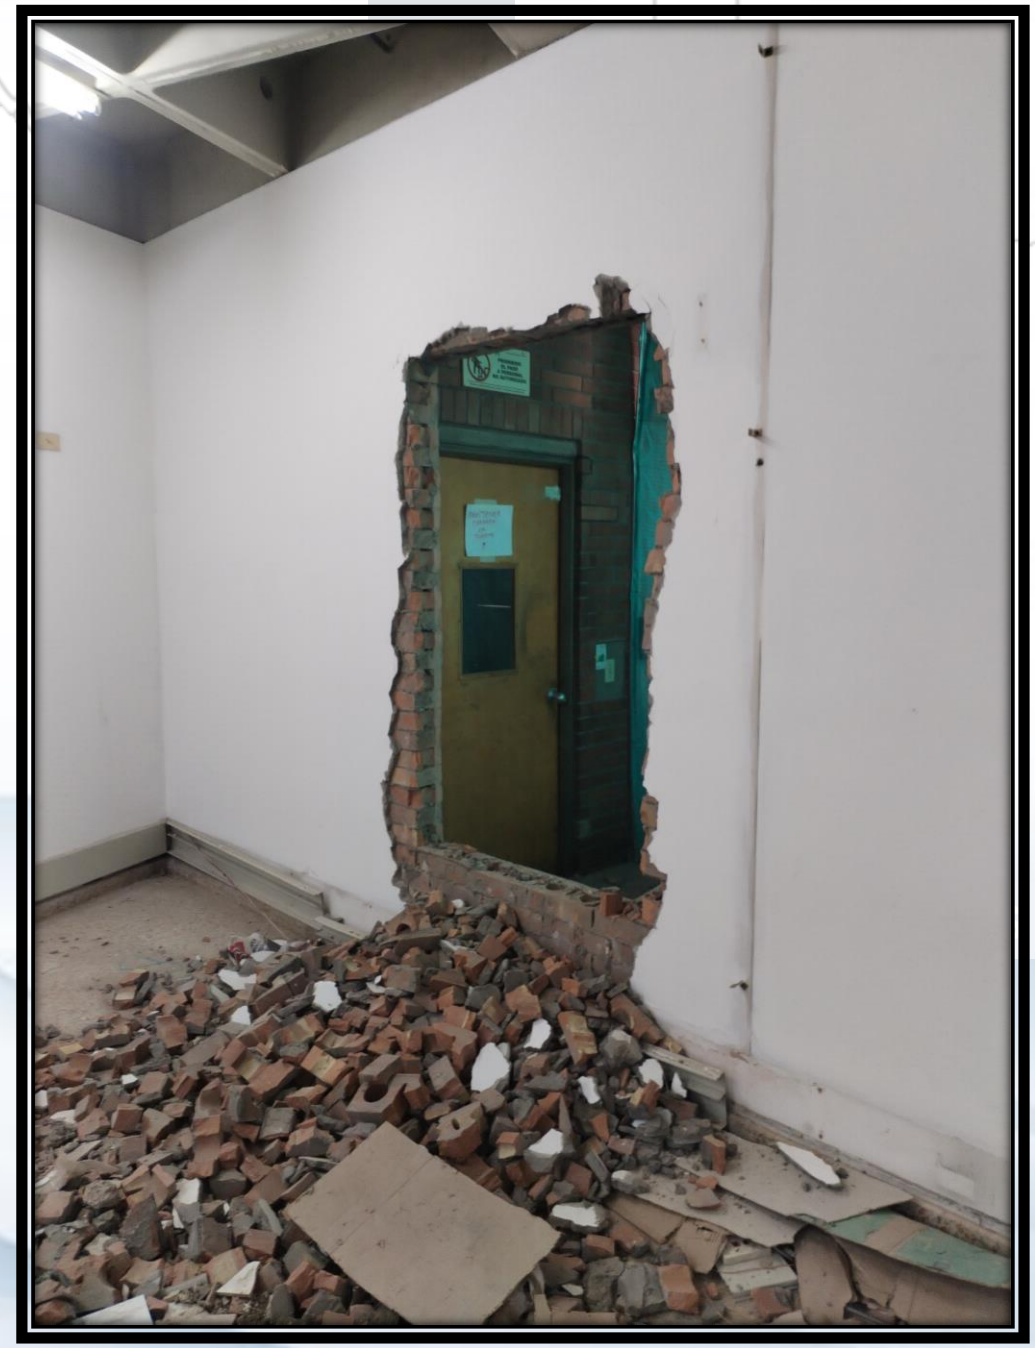



Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC

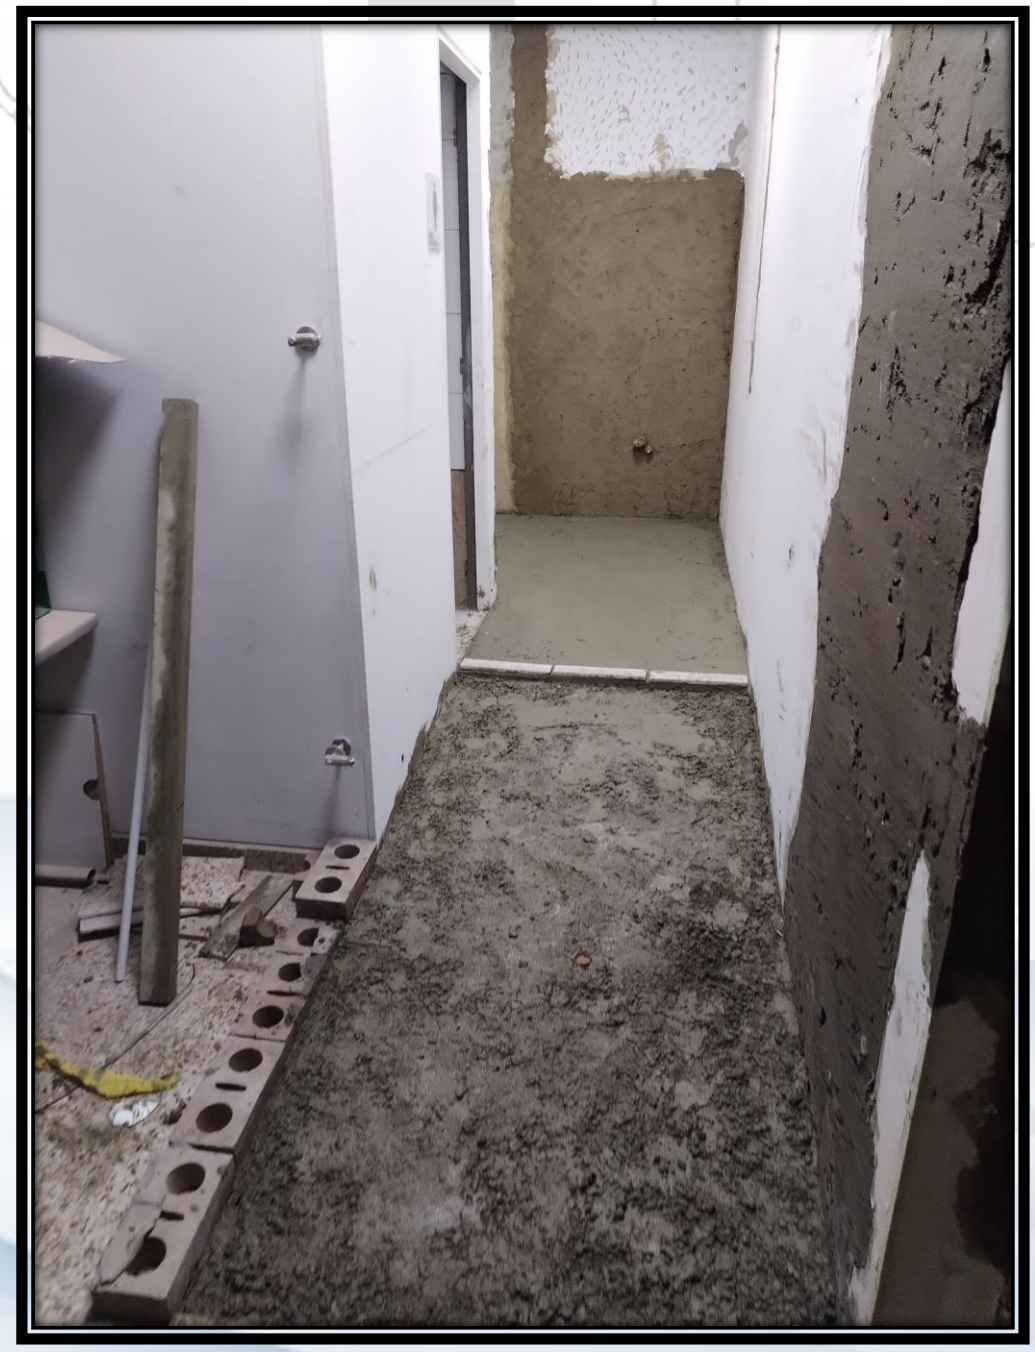




Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC

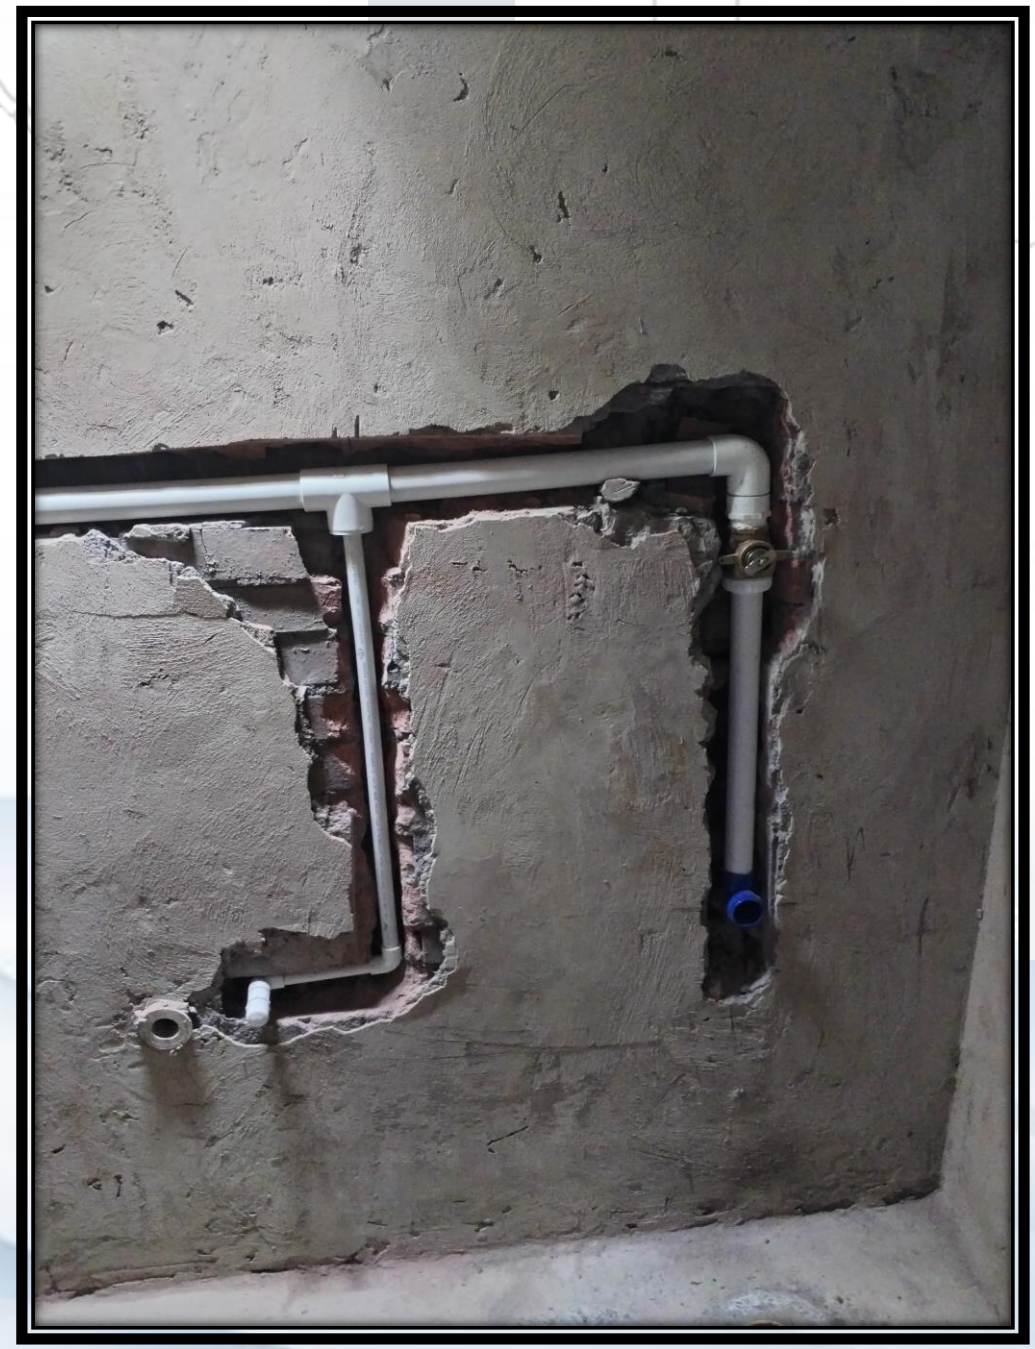


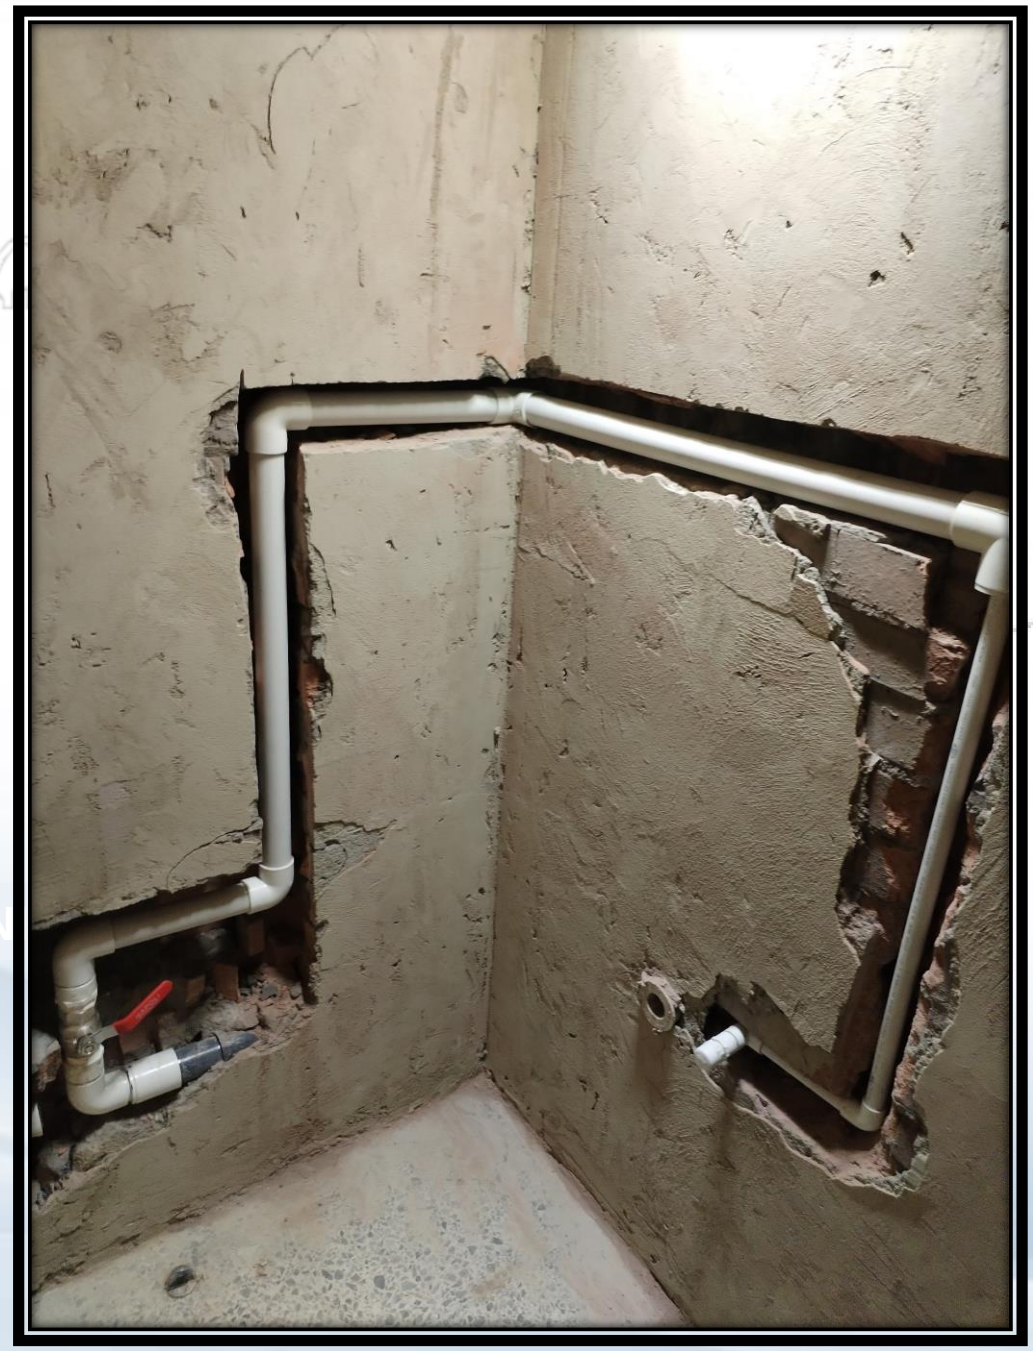

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEGAC

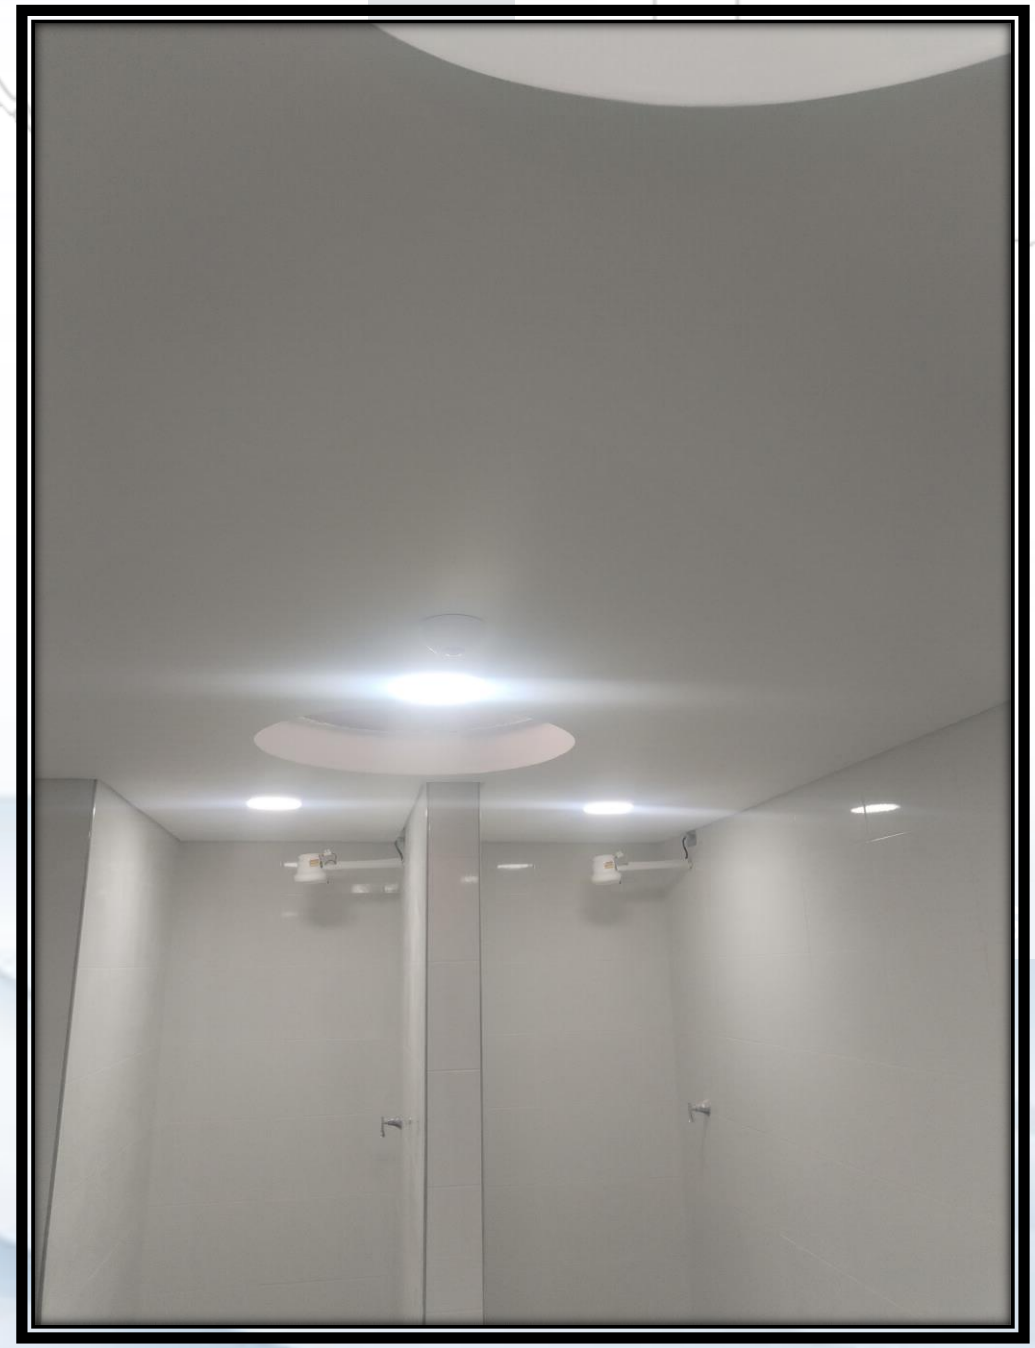

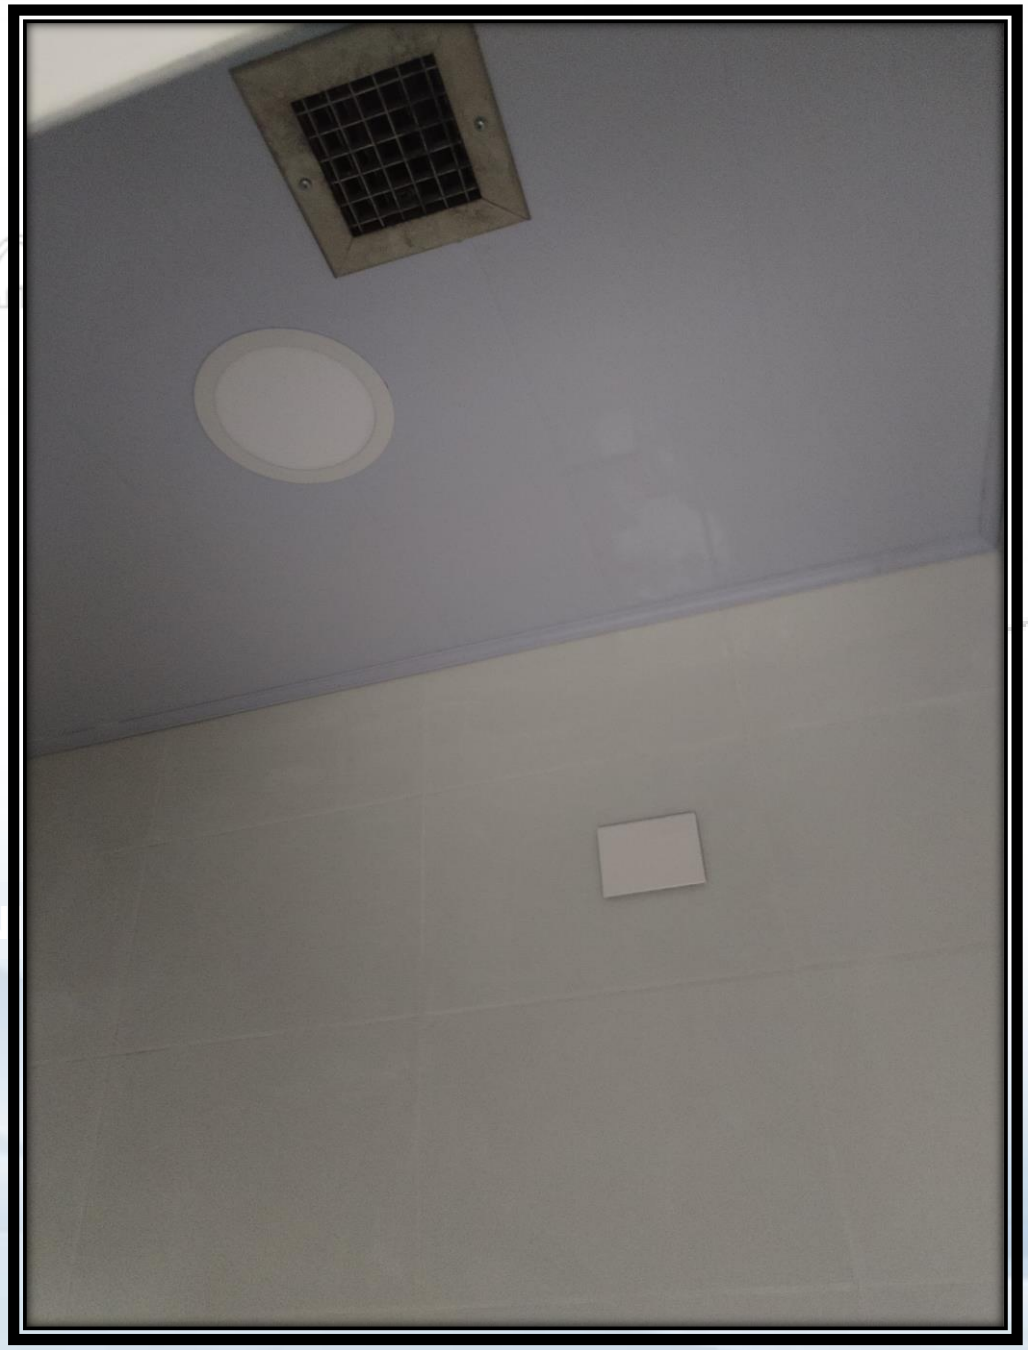

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEGAC

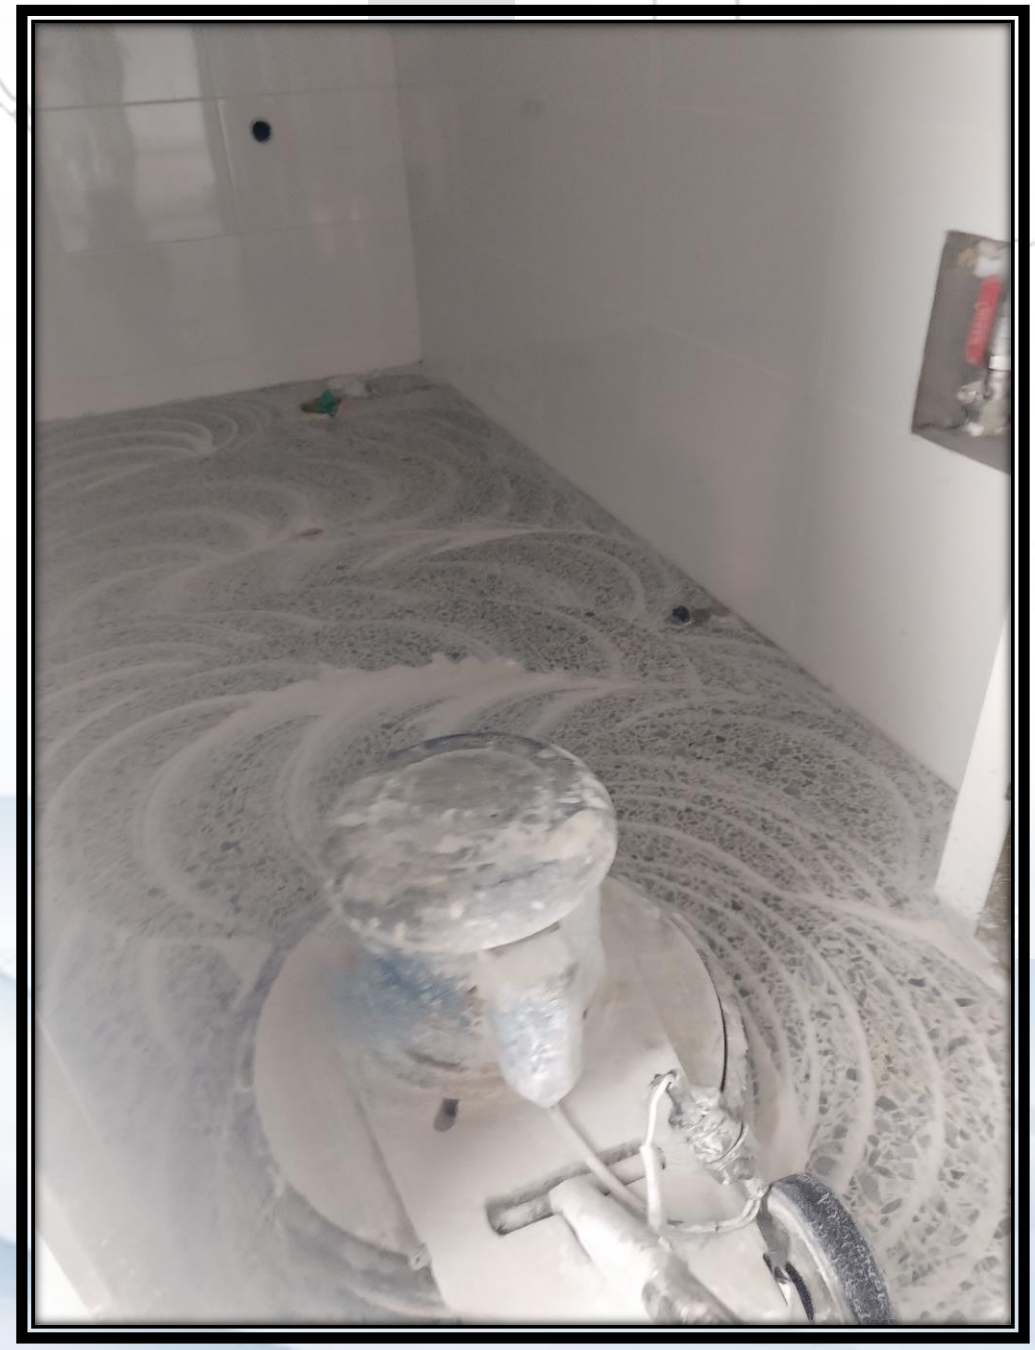



Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

NOVEDADES STT Y NOVEDADES AMBIENTALES

1. Ingresos de personal y realización de respectiva inducción por parte el SENA y SEGAC
2. Señalización áreas de trabajo.
3. Suministro de EPP.
4. Charlas de seguridad, capacitaciones.
5. Se realizara tercer retiro de RCD el día sábado 04 noviembre.


Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO

SEGAC





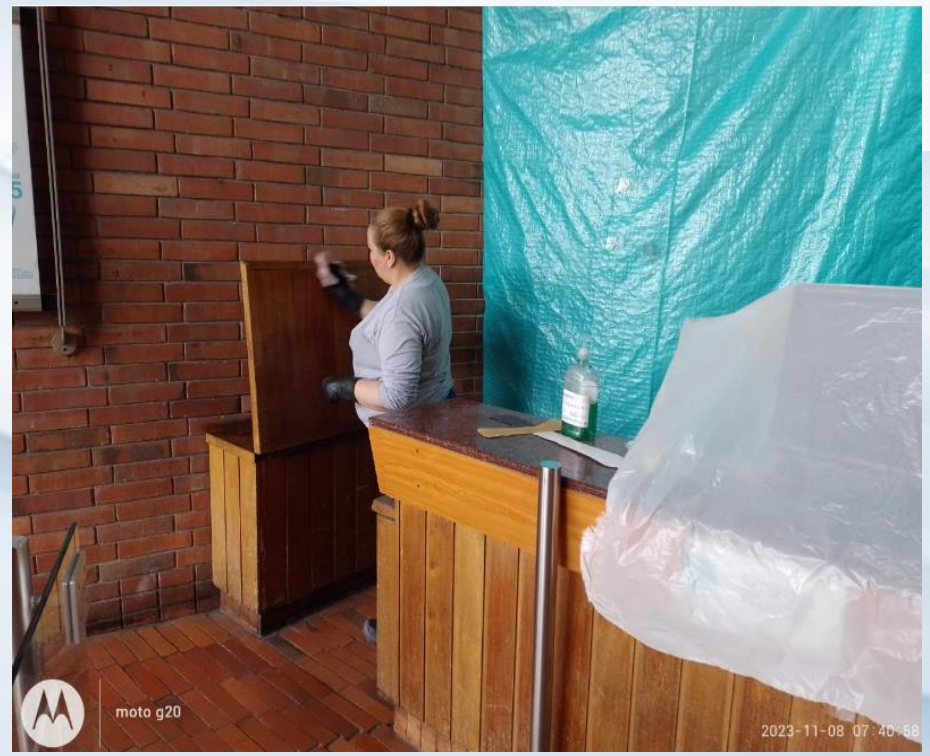

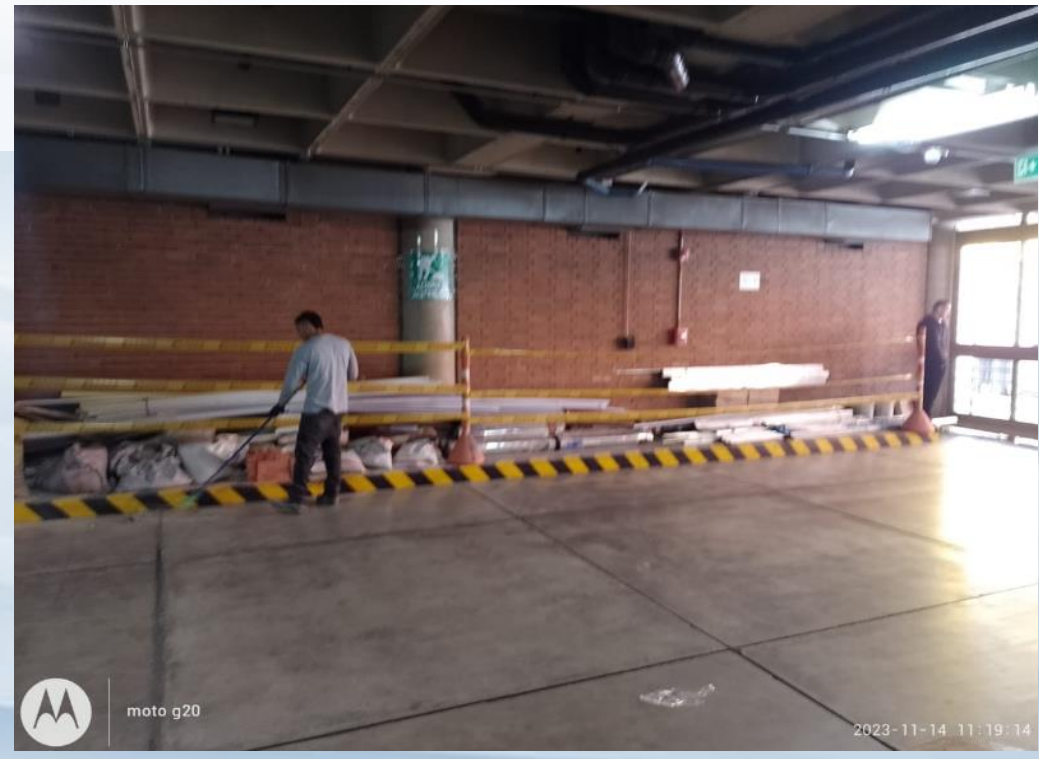


SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO







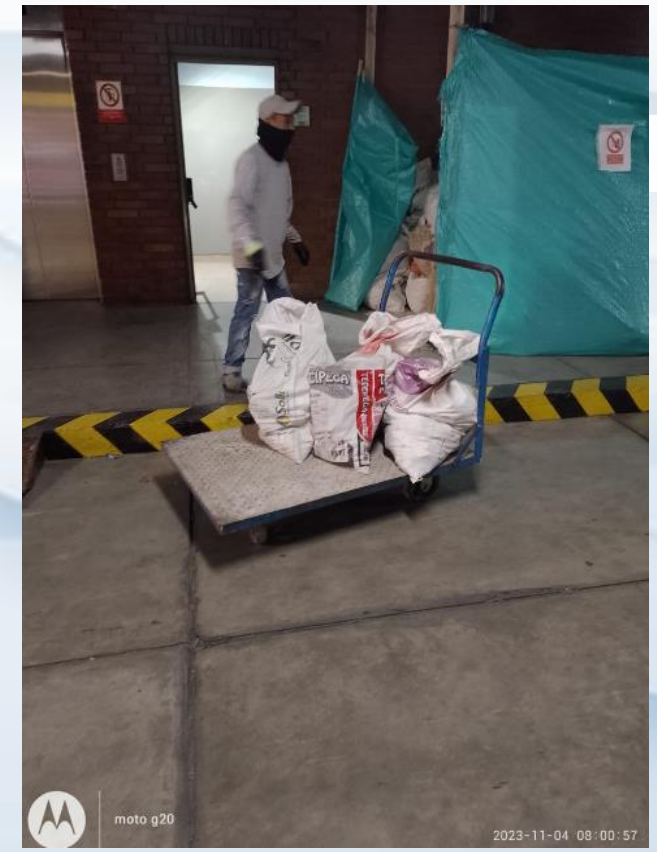



TEMAS TECNICOS POR RESOLVER

- Observaciones a espacios entregados

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PLAN DE TRABAJO SEMANA 15 AL 24 DE OCTUBRE

SEMANA 15 AL 24 DE NOVIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 2				
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES	90%	ENTREGAR PUERTAS PENDIENTES DE VIDRIO	$ 25.000.000,00
	PISO 6 APRENDICES MUJERES	90%	ENTREGAR PUERTAS PENDIENTES DE VIDRIO	
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES	100%	ENTREGADO	
	PISO 3 APRENDICES MUJERES	100%	ENTREGADO	
	PISO 5 APRENDICES HOMBRES	50%	ENCHAPE Y CIELO FALSO	
	PISO 5 APRENDICES MUJERES	50%	ENCHAPE Y CIELO FALSO	
	PISO 2 APRENDICES HOMBRES	50%	ENCHAPE Y CIELO FALSO	
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO				
	ADECUACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	100%	PULIDA DE PISO, RESANE DE PINTURA.INSTALACION DE PUERTAS	$ 12.000.000,00
GRUPO 4 CAFETERIA				
	ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA	90%	ENCHAPE DE MUROS, PULIDA DE PISO INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA, INSTALACION MESON Y CAMPANAS EXTRACTORAS	$ 18.500.000,00
GRUPO 6				
	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA 6	90%	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MANTO	$ 19.000.000,00
TOTAL				**$ 118.030.000,00**

PLAN DE TRABAJO SEMANA 15 AL 24 DE OCTUBRE

SEMANA 15 AL 24 DE NOVIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 1				
	PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	100%		
	PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL	100%		
	PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO	100%		
	PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO	100%		
	PISO 5 HOMBRES CARACAS	100%		
	PISO 5 MUJERES CARACAS	100%		
	PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL	90%	INSTALACION DE PUERTA Y ASEO	
	PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL	80%	INSTALACION DE PUERTA , ARREGLO A CIELO FALSO Y ASEO	
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO	100%	INSTALACION DE TECHOS Y PULIDA DE PISOS	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO	100%	INSTALACION DE TECHOS Y PULIDA DE PISOS	
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO	70%	INSLATALAR APARATOS SANITARIOS, RED ELECTRICA DE DUCHA	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO	70%	INSLATALAR APARATOS SANITARIOS, RED ELECTRICA DE DUCHA	
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA	100%	INSTALACION DE PUERTAS Y ENTREGA	
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA	100%	INSTALACION DE PUERTAS Y ENTREGA	
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO	100%	INSTALACION DE PUERTAS Y ENTREGA	$ 43.530.000,00
	PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD	100%	INSTALACION DE PUERTAS Y ENTREGA	
	PISO 4 ENFERMERIA	80%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 4 HOMBRES CARACAS	80%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 4 MUJERES CARACAS	80%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA	65%	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PAÑETE	
	PISO 1 VIGILANCIA	30%	DESMONTE DE APARATOS Y DEMOLICION	
	PISO 3 HOMBRES CARACAS	30%	DESMONTE DE APARATOS Y DEMOLICION	
	PISO 3 MUJERES CARACAS	30%	DESMONTE DE APARATOS Y DEMOLICION	
	PISO 6 HOMBRES CARACAS	30%	DESMONTE DE APARATOS Y DEMOLICION	
	PISO 6 MUJERES CARACAS	30%	DESMONTE DE APARATOS Y DEMOLICION	
	PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO	30%	DESMONTE DE APARATOS Y DEMOLICION	
	PISO 5 501			
	PISO 1 101			

ESTADO Y ENTREGAS

BAÑOS INSTRUCTORES	ESTADO			FECHA ENTREGA
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 5 HOMBRES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 5 MUJERES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL		EJECUCION		15/11/2023
PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL		EJECUCION		15/11/2023
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO		EJECUCION		18/11/2023
PISO 2 MUJERES AUDITORIO		EJECUCION		18/11/2023
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO		EJECUCION		30/11/2023
PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO		EJECUCION		30/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA		EJECUCION		21/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA		EJECUCION		21/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO		EJECUCION		21/11/2023
PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA		EJECUCION		21/11/2023
PISO 4 ENFERMERIA		EJECUCION		27/11/2023
PISO 4 HOMBRES CARACAS		EJECUCION		27/11/2023
PISO 4 MUJERES CARACAS		EJECUCION		27/11/2023
PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA		EJECUCION		30/11/2023
PISO 6 SUB DIRECCION		EJECUCION		30/11/2023
PISO 1 VIGILANCIA			INICIO	27/11/2023
PISO 3 HOMBRES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 3 MUJERES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 6 HOMBRES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 6 MUJERES CARACAS			INICIO	13/12/2023
PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO			INICIO	13/12/2023
PISO 501			INICIO	13/12/2023
PISO 101			INICIO	13/12/2023
BAÑOS APRENDICES				
PISO 3 APRENDICES HOMBRES	ENTREGADO			
PISO 3 APRENDICES MUJERES	ENTREGADO			
PISO 6 APRENDICES HOMBRES				21/11/2023
PISO 6 APRENDICES MUJERES				21/11/2023
PISO 2 APRENDICES HOMBRES		EJECUCION		5/12/2023
PISO 5 APRENDICES HOMBRES		EJECUCION		5/12/2023
PISO 5 APRENDICES MUJERES		EJECUCION		5/12/2023

ESTADO Y ENTREGAS

ATENCION AL CIUDADANO				
ADECUACIONES AL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO Y PUERTAS		EJECUCION		25/11/2023
CAFETERIA				
ADECUACION AL AREA DE CAFETERIA		EJECUCION		21/11/2023
TERRAZA 6 PISO				
IMPERMEABILZACION TERRAZA PISO 6		EJECUCION		21/11/2023

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359
