SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 23 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Comite Contrato CO1.PCCNTR.5309477.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Vivian Vega	52832111	X			CGMLTI	vjvega@sena.	16926	—	
2	Gabriel Heredia	80126180	X			CGMLTI	ghheredia@sena.edu.co	19873		Gabriel H.
3	Jorge Vivanco	79778906	X			CGMLTI	jvivancle@sena		—	
4	Froilan N. Villareal	79348118				CGMLTI	afvillareal@hotmail.com			
5	Fabio Ramirez	80245333		X		CGMLTI	fabioramirez@sena.edu.co		—	Fabio R.
6	Edna Arco	1026266585		X		SEGAC	consorcioseguc@gmail.com			
7	Mayerli Castillo	53153248		X		SEGAC	consorcioseguc@gmail.com			Mayerli C
8	Edwin Alvarez	80733158		X		SEGAC	consorcioseguc@gmail.com			
9	Yeimy Cristancho	53.090.046		X		SEGAC	consorcioseguc@gmail.com			
10	Andres Bonilla	1069741057		X		SST	ajbonilla@sena			

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 23 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Comite. Contrato 001. PCC-NTR. 5307477.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Angela N	1026569082		X		SIGA Ambiental	anovoa@sena.edu.co	3115430913		Angelanbaa
	EDWARD SANTOS		X			Regional	cysanjose@sena.edu.co	3284980 91		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477

Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

ORDEN DEL DIA

- LECTURA DE COMPROMISOS ANTERIOR
- PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL
- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO
- NOVEDADES SST
- NOVEDADES AMBIENTALES
- TEMAS TÉCNICOS POR RESOLVER
- PLAN DE TRABAJO SIGUIENTE SEMANA
- OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

1. EL contratista deberá subsanar las diferentes observaciones y detalles de obra y realizar actividades de mejora para evitar que se vuelvan a repetir.

- Mediante oficio 024 del 16 de noviembre se radica respuestas a observaciones presentadas en obra, asi mismo se siguen atendiendo las demás observaciones

2. Realizar recorrido de obra con la supervisión para corroborar medidas y avance de obra.

- Se realiza recorrido en obra con la supervisión el día 15 de noviembre 2023

3. El contratista debe radicar oficio de solicitud de impermeabilización de las gradas de la terraza del piso 3.

- Mediante oficio 024 del 16 de noviembre se radica respuestas a observaciones presentadas en obra, asi mismo se siguen atendiendo las demás observaciones

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

4. El contratista radicará oficio de la subsanación de las observaciones de obra

- Mediante oficio 024 del 16 de noviembre se radica respuestas a observaciones presentadas en obra, asi mismo se siguen atendiendo las demás observaciones

5. Se debe generar acta de observaciones de obra con fecha de oportunidad de respuesta

- Se esta realizando en obra

6. De acuerdo con la revisión del balance de obra realizado se pudo evidenciar un saldo a favor de la entidad de aproximadamente de $30.000.000, por lo cual la entidad solicita al contratista presentar cotización para el cambio de la puerta principal al SENA.

- El contratista se encuentra realizando ajuste de balance

7. El contratista presentara balance de obra con todas las actividades adicionales

- Se presenta acta de actividades n previstas y APU, queda aprobada por la supervisión y entidad.

4. Se cambia fecha del próximo comité para el día jueves 23 de noviembre a las 9 am

PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL

PERSONAL DE OBRA SENA CGMLTI				
SEMANA ACTUAL		SEMANA PENDIENTES	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
CONTRATISTA ADMINISTRATIVOS				
RESIDENTE DE OBRA	1	ING YEIMI CRISTINA GOMEZ MAYORGA	4/09/2023	
AUX INGENIERIA	1	ING EDWIN ALVAREZ	4/09/2023	
PROFESIONAL SST	1	MAYERLIN CASTILLO NARANJO	4/09/2023	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	LAURA SUAREZ	4/09/2023	
TOTAL	4			
CONTRATISTA (PERSONAL EN OBRA)				
MAESTRO DE OBRA	2	JOSE MAURICIO BELTRAN ACOSTA	4/09/2023	
		PEDRO IGNACIO CORREA ZUÑIGA	6/09/2023	
AYUDANTES	57	HOLMAN ALVAREZ CARDONA	4/09/2023	
		GERMAN ROBERTO BOLIVAR	4/09/2023	1/11/2023
		CARLOS JULIO PEREZ TABIO	4/09/2023	25/09/2023
		RAMON IGNACIO PEREZ SALAZAR	4/09/2023	25/09/2023
		CRISTIAN ANDRES CAMACHO BARRETO	5/09/2023	20/10/2023
		EDWIN CAMILO CAMACHO BARRETO	5/09/2023	
		ROGER ERNESTO MARTINEZ CAMPOS	5/09/2023	
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS	6/09/2023	14/09/2023
		OSCAR ANDRES TORRES VIVAS	6/09/2023	14/09/2023
		DAVID ALEXANDER ALVAREZ AMAYA	21/09/2023	6/10/2023
		JAMEL MANUEL VILORIA MIRANDA	22/09/2023	
		EDGAR ALONSO CORTES LANCHEROS	22/09/2023	
		GUSTAVO HERNAN CORTES LANCHEROS	22/09/2023	
		LUIS ENRIQUE CORTES LANCEROS	22/09/2023	
		MAICOL ALEJANDRO CORREA CORREA	25/09/2023	6/10/2023
		LUIS CAMACHO SALCEDO	27/09/2023	20/10/2023
		LUIS CAMACHO SALCEDO	27/09/2023	20/10/2023
		JOSE DAIRO SANCHEZ OTALVARO	2/10/2023	
		DIEGO FERNANDO GUTIERREZ DIMAS	2/10/2023	
		JUAN GABRIEL TORRES VIVAS	15/10/2023	
		EDWIN TRUJILLO GUANIZO	11/10/2023	
		OMAR ANTONIO BETANCOURTH	11/10/2023	12/10/2023
		JONATAN JOSE JULIO AROYO	11/10/2023	17/10/2023
		JONATAN RODRIGUEZ RICO	11/10/2023	26/10/2023
		SANTIAGO MORENO CERVERA		12/10/2023
		IVAN RENE VALENCIA BERMEJO	12/10/2023	
		JULIO CESAR CONTRERAS BUSTOS	12/10/2023	
		.JHONNY STIVER TAPIAS PAREJA	17/10/2023	
		ALEJANDRO JIMENEZ CORREA	17/10/2023	
		LUIS FELIPE JIMENEZ CORREA	17/10/2023	
		ALEXANDER HERNANDEZ LOPEZ	18/10/2023	21/10/2023
		ANDRES FELIPE VEGA ACEVEDO	18/10/2023	21/10/2023
		CARLOS JULIO CIFUENTES MELO	18/10/2023	21/10/2023
		JEFERSON RIVERA MAYA	18/10/2023	21/10/2023
		LUCY ESPERRANZA RIVERA	23/10/2023	
		NESTOR JULIO TORRES ESLAVA		17/11/2023
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS		17/11/2023
		ARIOLFO DIAZ CANO	3/11/2023	7/11/2023
		JORGE ENRIQUE CESPEDES SANCHEZ	3/11/2023	
		EDISON ANDRES CORTES MONTOYA	3/11/2023	
		JAVIER ULISES ALVAREZ OCHOA	4/11/2023	
		JORGE HUMBERTO BARRETO TRUJILLO	4/11/2023	
		JULIO ERNESTO SANCHEZ	4/11/2023	
		ROBINSON YESID MORA RUBIANO	4/11/2023	
		AXELL JAVIER DIAZ ZORRO	4/11/2023	
		FABIO ORLANDO CONTRERAS TOVAR	17/11/2023	
		KEVIN ANDRES BARRERA CHAVES	15/11/2023	
		PIERRE JAIME BARRERA OCHOA	15/11/2023	21/11/2023
		CRISTIAN DURLEY RODRIGUEZ BARON	15/11/2023	
		SON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	15/11/2023	
		VICTOR VELASCO NAVAS	15/11/2023	
		RAUL CARDENAS GONZALEZ	17/11/2023	
		ER GIOVANNY LEON PACHECO	16/11/2023	
		SON YAIR CARVAJAL RAMIREZ	17/11/2023	
		MIGUEL ANGEL MASIAS		
TOTAL PARCIAL	61			21
TOTAL EN OBRA	40			

- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO

SEMANA 15 AL 23 DE NOVIEMBRE	AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %
GRUPO 1 BAÑOS INSTRUCTORES			
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES	75%	$ 343.176.395,21	74%
PISO 3 MUJERES MULTIPLES			
PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO			
PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO			
PISO 5 HOMBRES CARACAS			
PISO 5 MUJERES CARACAS			
PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL			
PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL			
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO			
PISO 2 MUJERES AUDITORIO			
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO			
PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO			
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA			
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA			
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO			
PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA			
PISO 4 ENFERMERIA			
PISO 4 HOMBRES CARACAS			
PISO 4 MUJERES CARACAS			
PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA			
PISO 1 VIGILANCIA			
PISO 3 HOMBRES CARACAS			
PISO 3 MUJERES CARACAS			
PISO 6 HOMBRES CARACAS			
PISO 6 MUJERES CARACAS			
PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO			

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO


GRUPO 2 BAÑOS APRENDICES						,
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES PISO 3 APRENDICES MUJERES PISO 6 APRENDICES HOMBRES PISO 6 APRENDICES MUJERES PISO 5 APRENDICES HOMBRES PISO 5 APRENDICES MUJERES PISO 2 APRENDICES MUJERES	81%	$ 333.920.967,64	80%	$ 329.798.486,55	$ 412.248.108,19
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO						
	ADEUCACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	92%	$ 58.902.559,32	92%	$ 58.902.559,32	$ 64.024.521,00
GRUPO 4 CAFETERIA						
	ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA	65%	$ 48.091.003,05	65%	$ 48.091.003,05	$ 73.986.158,53
GRUPO 6 CUBIERTA PISO 6						
	IMPERMEABILZIACION TERRAZA	85%	$ 108.952.378,08	85%	$ 108.952.378,08	$ 128.179.268,33
TOTAL			$ 893.043.303,29		$ 884.345.136,94	$ 1.136.006.583,00


AVANCE DEL CONTRATO	**79%**	**$ 893.043.303,29**	**78%**	**$ 884.345.136,94**	**$ 1.136.006.583,00**	**100%**

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359



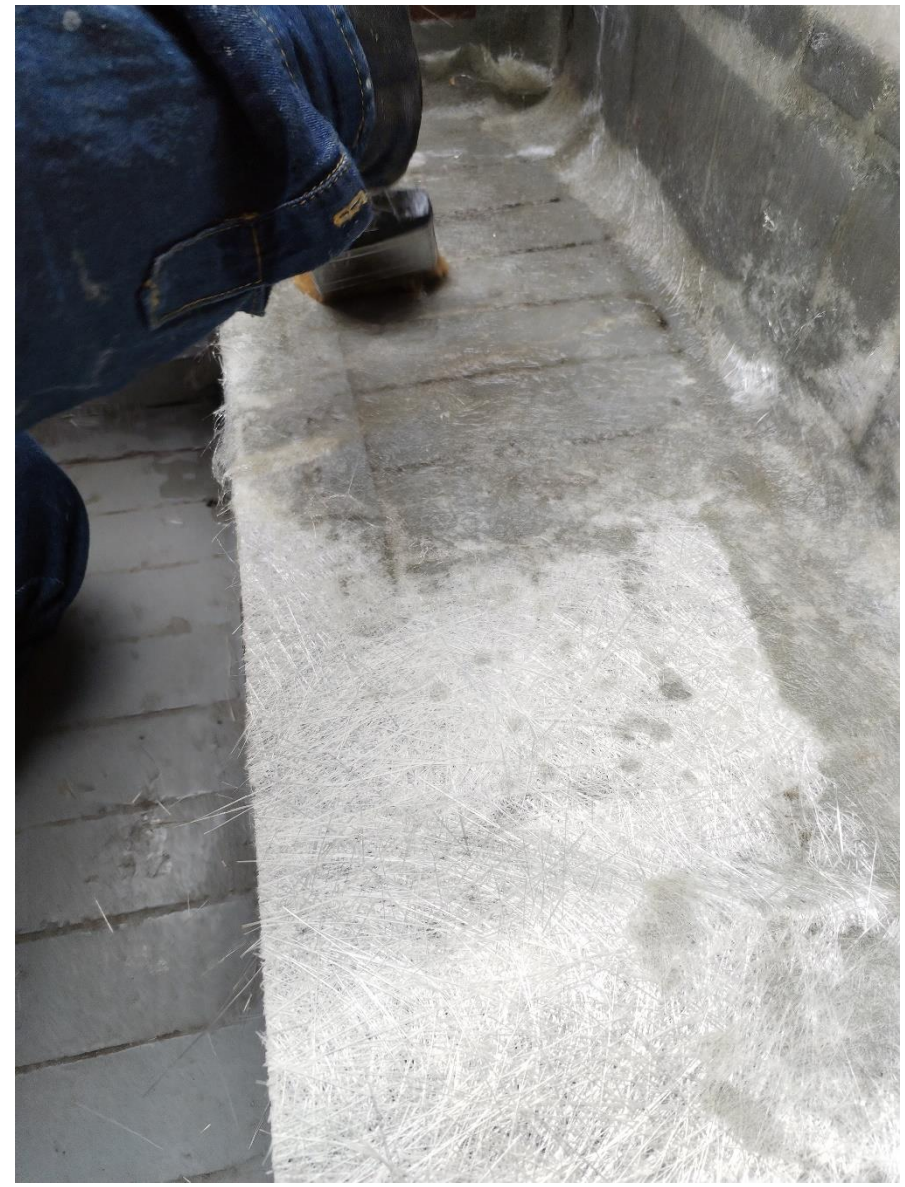

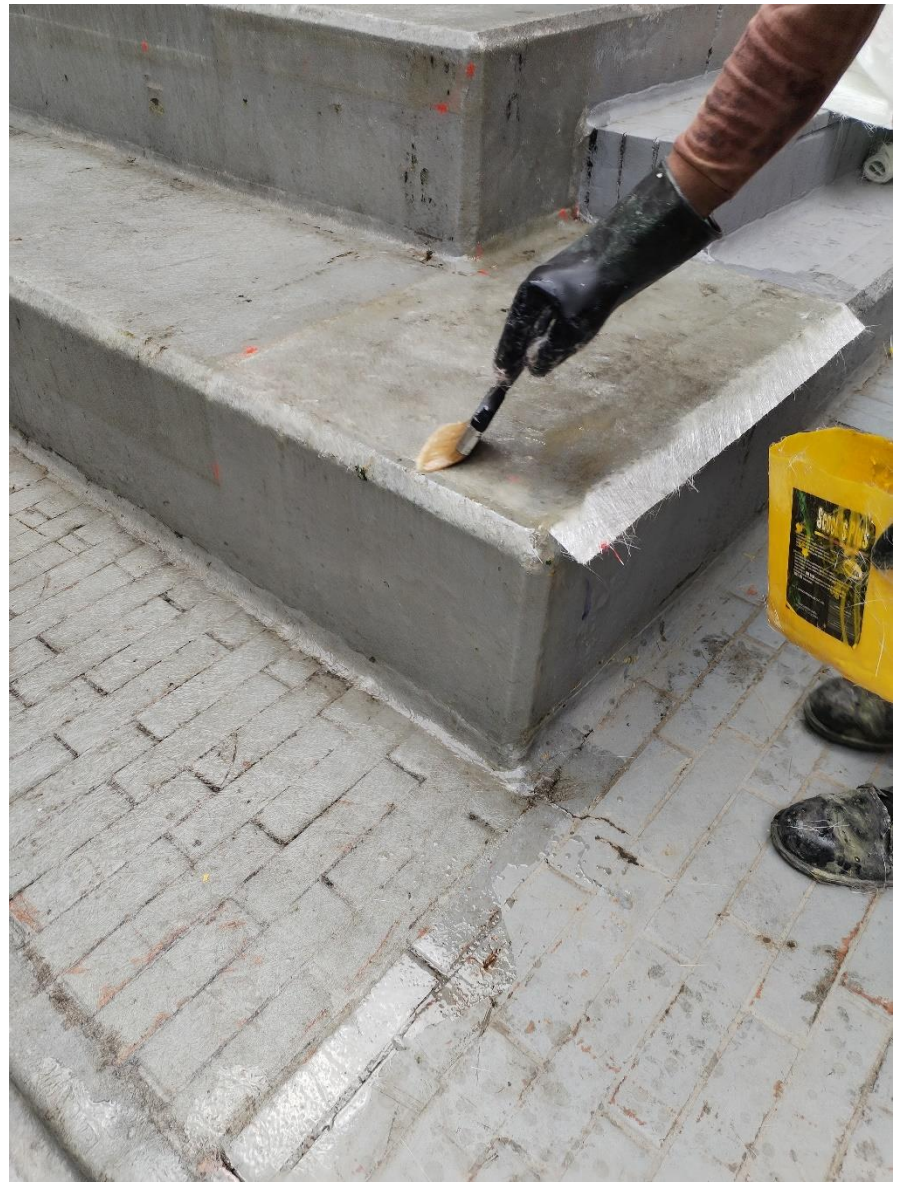

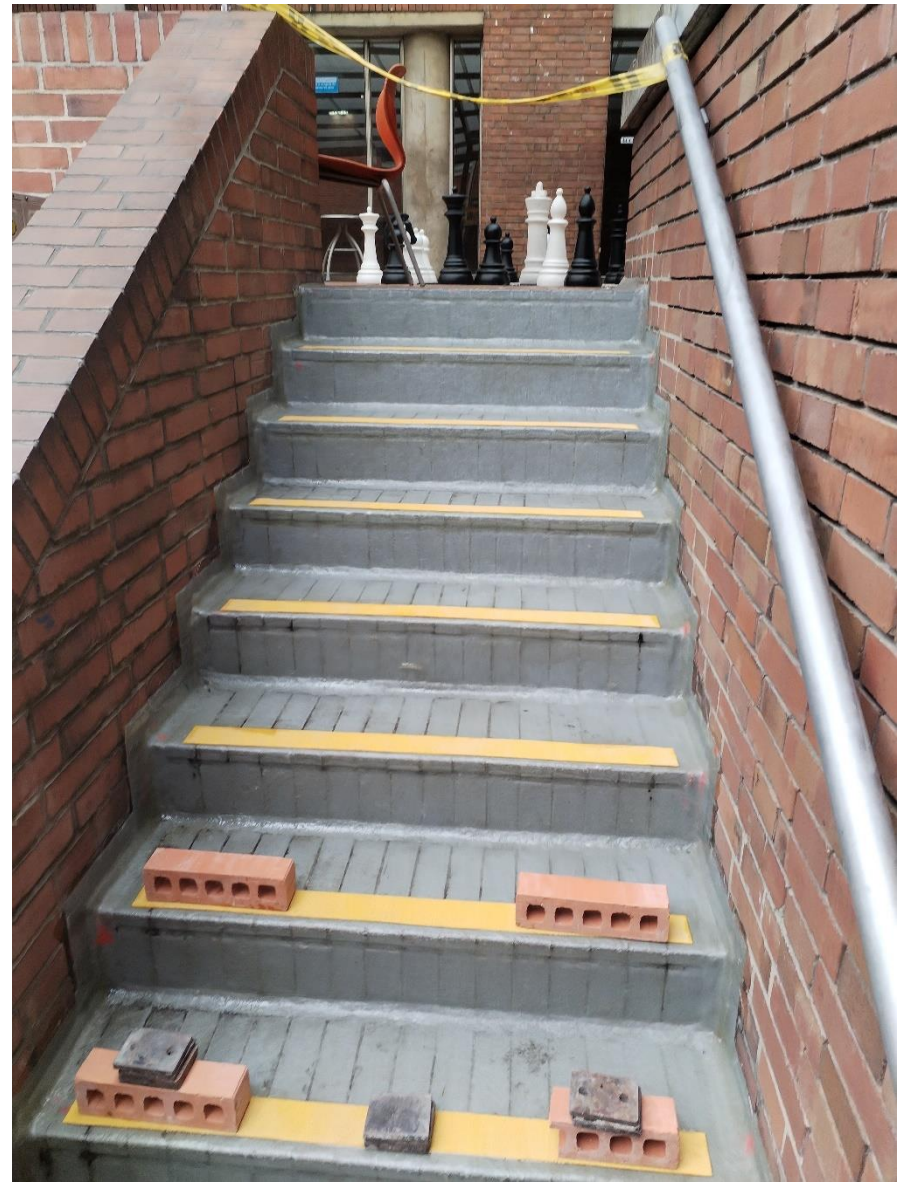








Zonas de alimentación




Zonas de alimentación


La Cooperativa de la familia SENA 2023









NAPOLI


NAPOLI



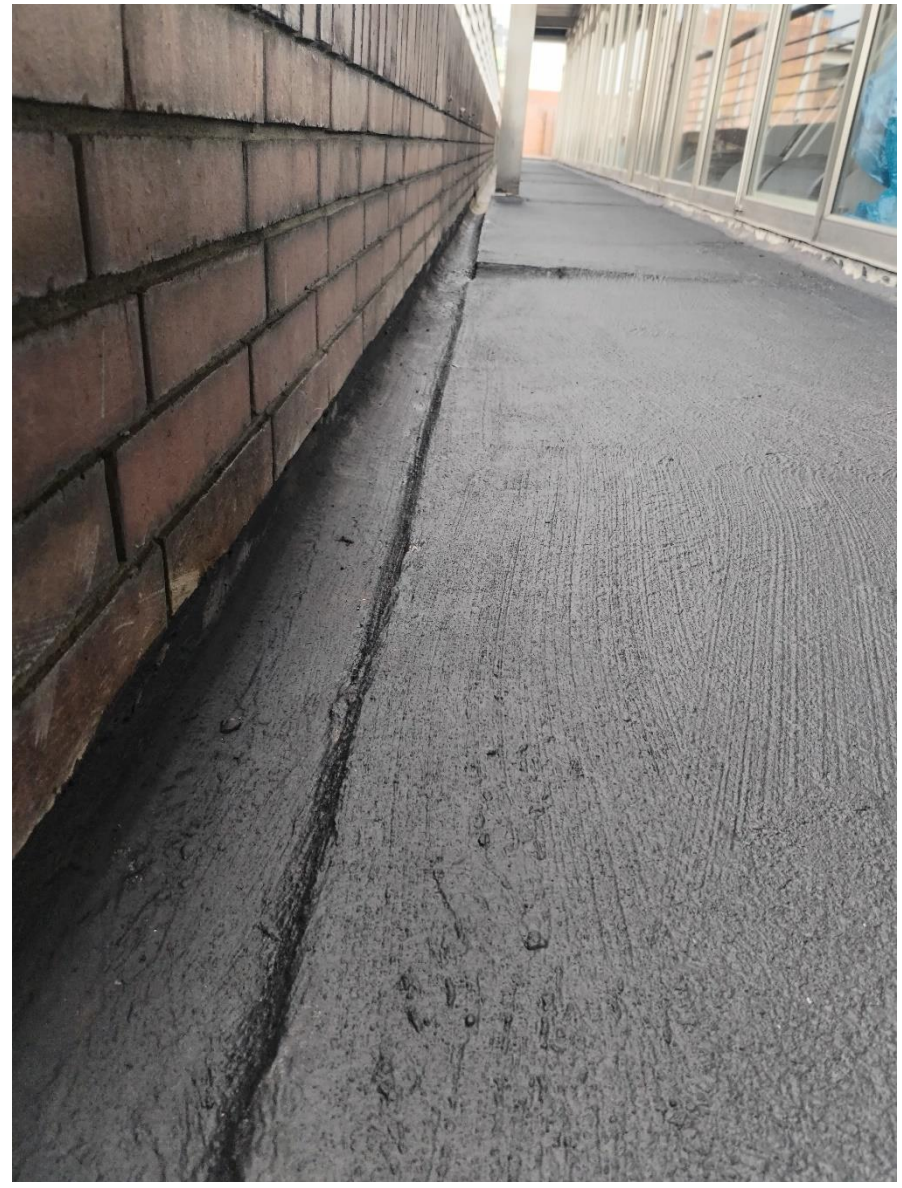














moto g20
2023-11-21 19:02:26





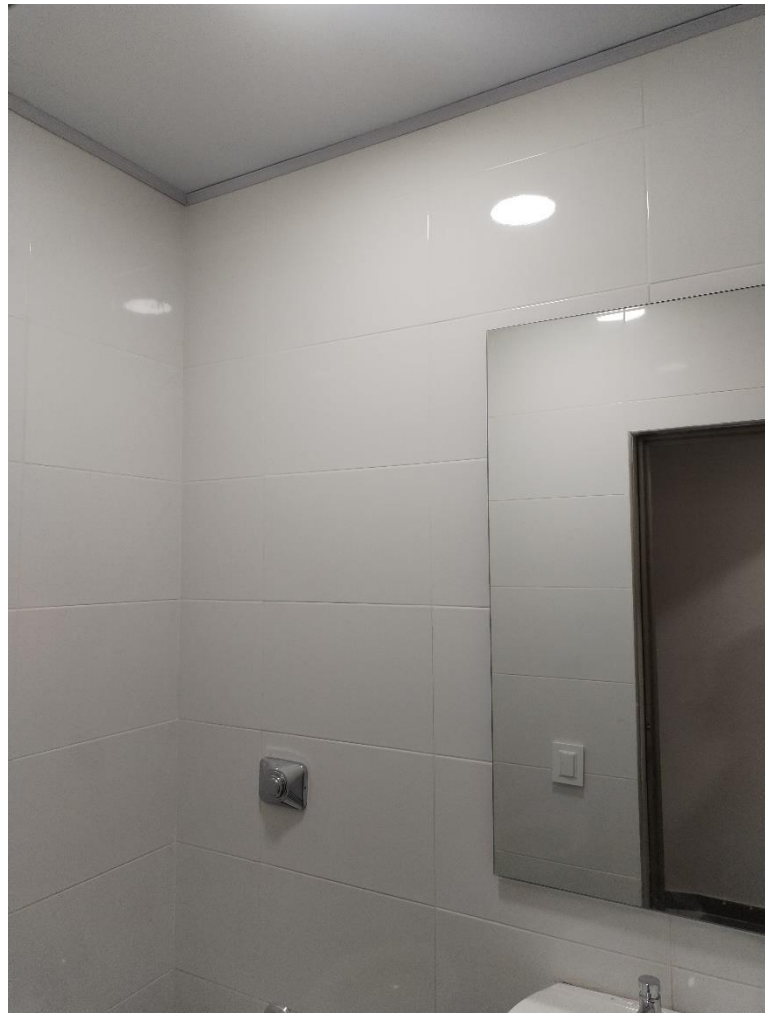

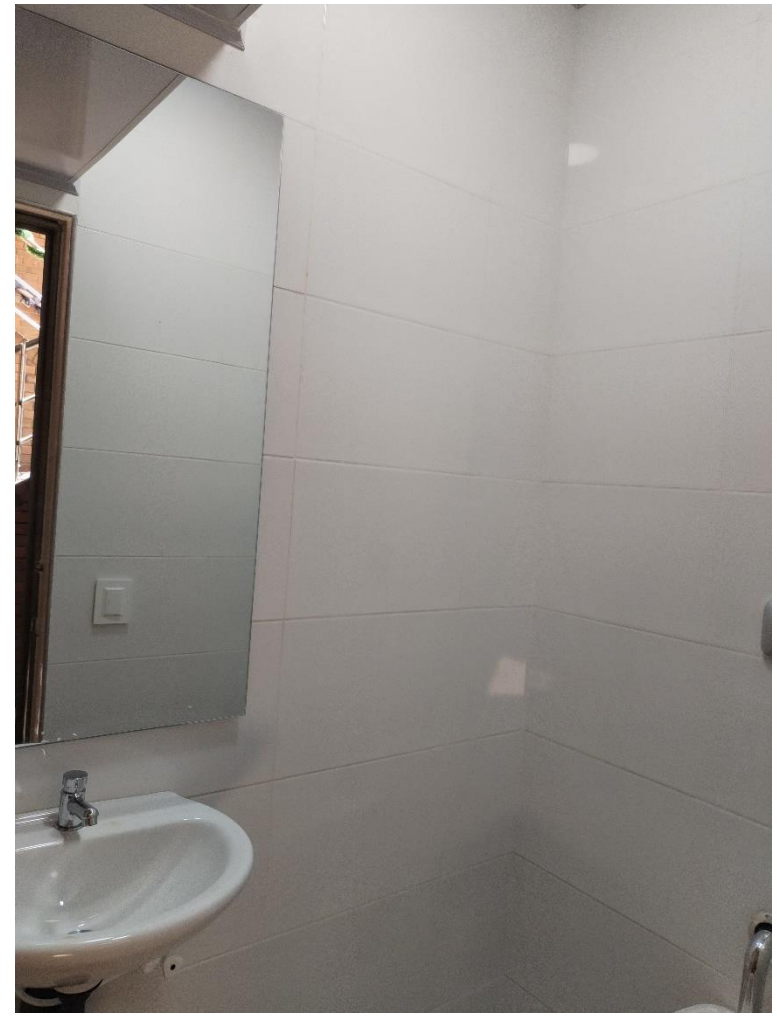





NOVEDADES SST Y NOVEDADES AMBIENTALES


1. Ingresos de personal y realización de respectiva inducción por parte el SENA y SEGAC
2. Señalización áreas de trabajo.
3. Suministro de EPP.
4. Charlas de seguridad, capacitaciones.
5. Se realizo retiro de RCD el día Sabado 14 noviembre,y se programa retiro para el 25 noviembre.


Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359


SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO





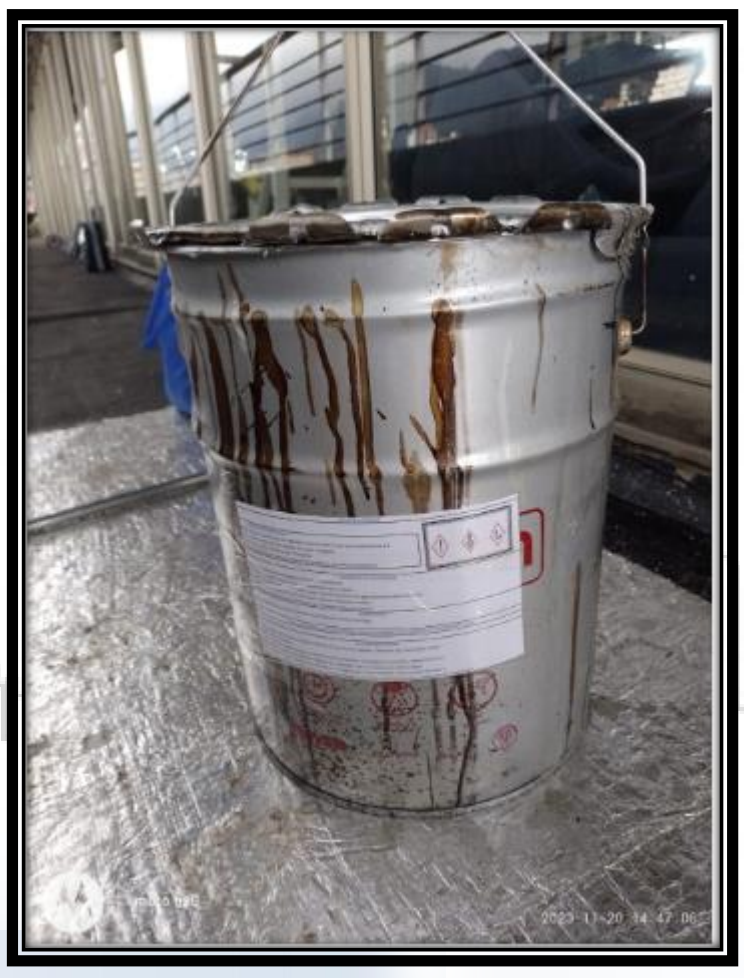


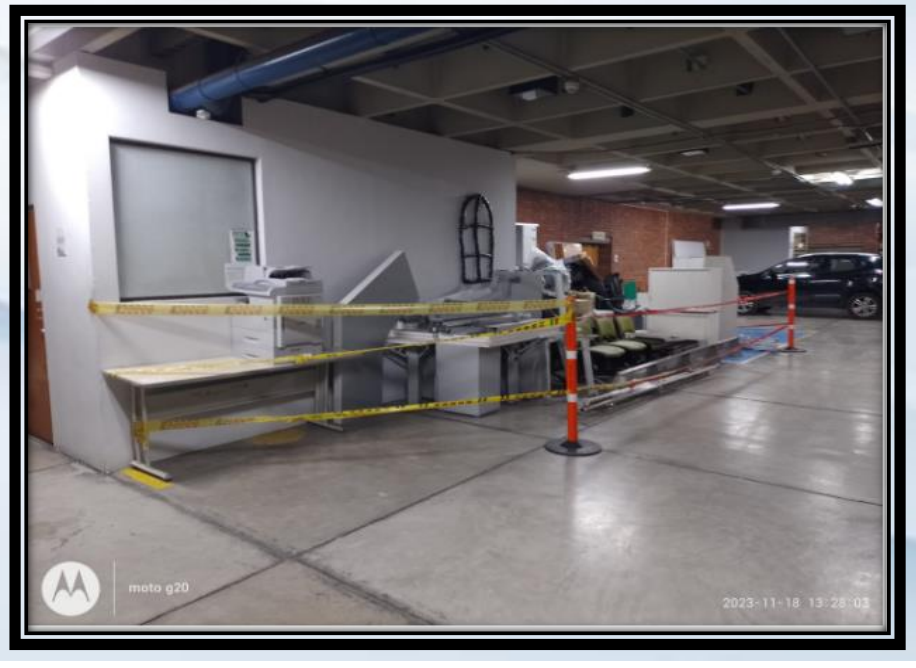


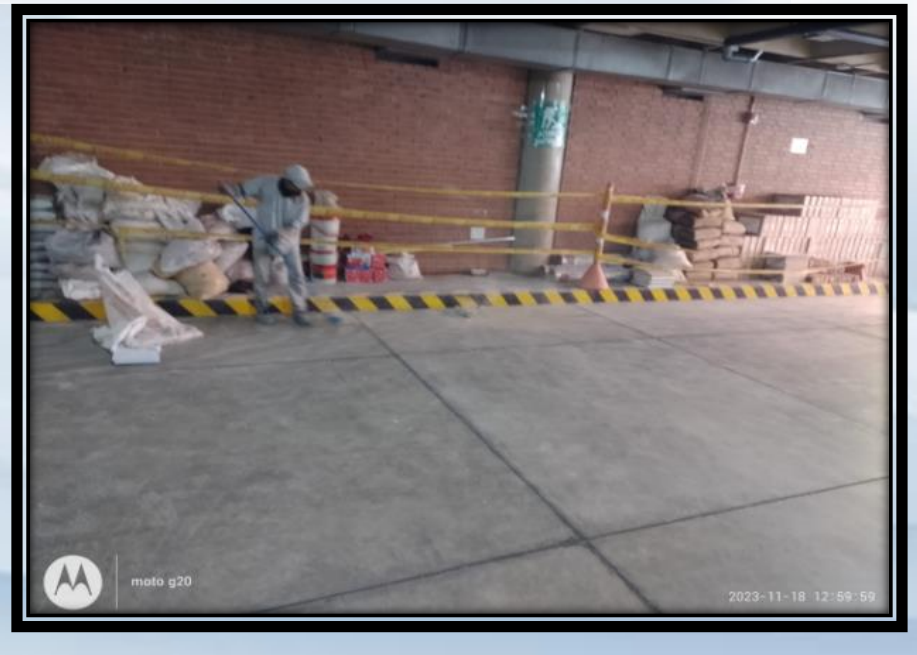

SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO




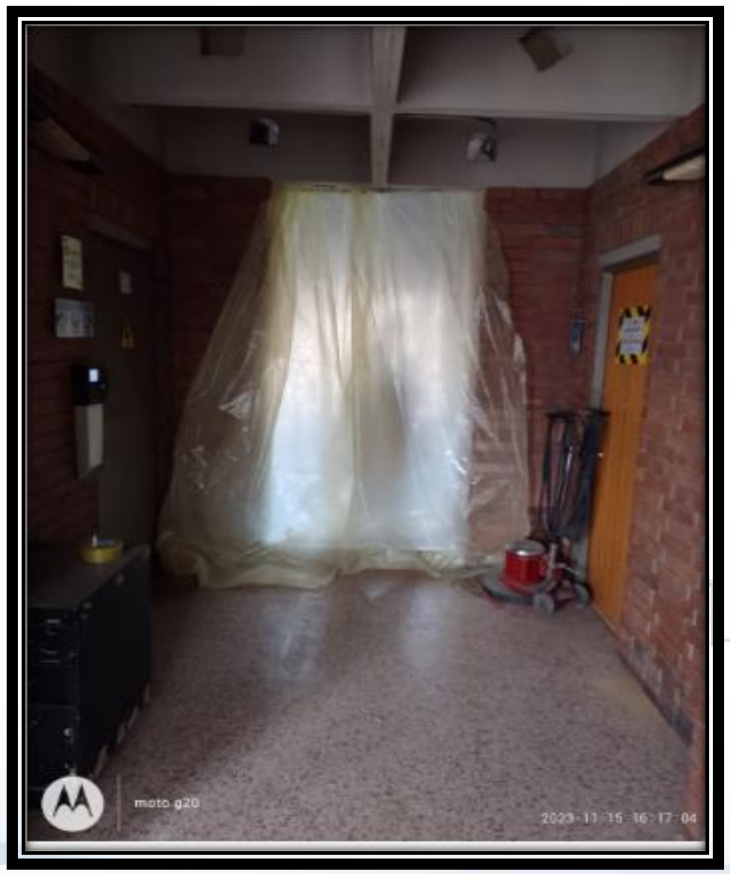

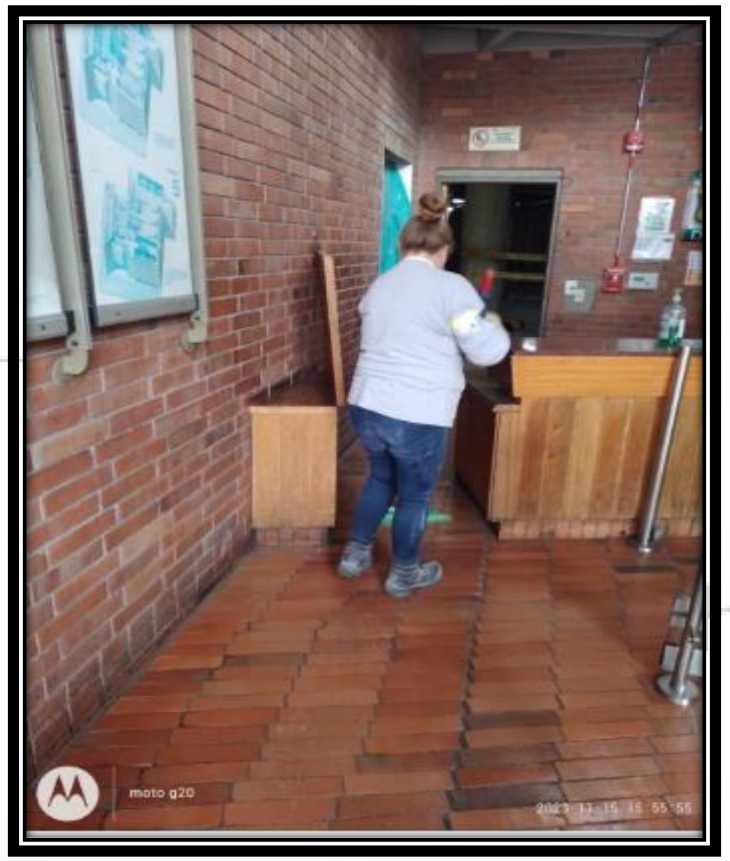





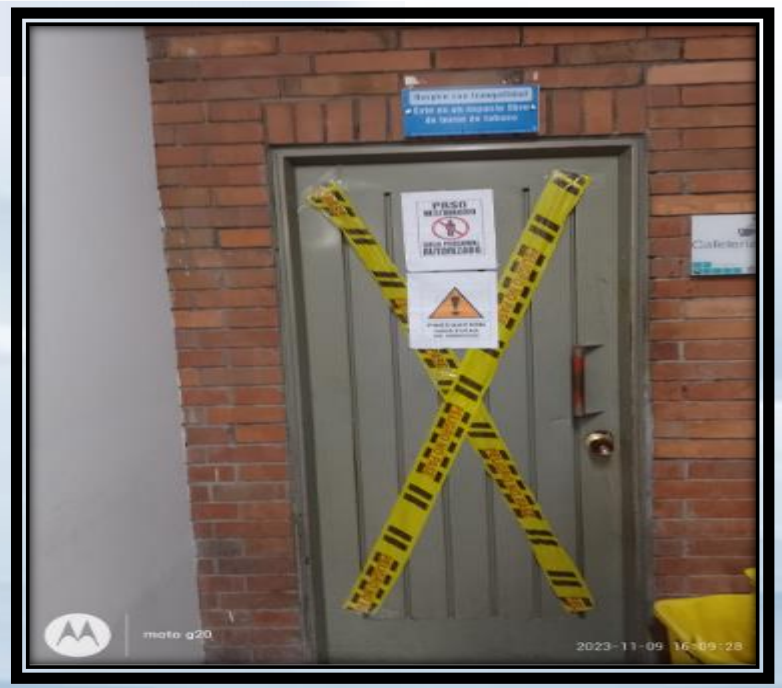

TEMAS TECNICOS POR RESOLVER

- Presentación cotización puerta de ingreso

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PLAN DE TRABAJO SEMANA 23 NOVIIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE

SEMANA 23 NOVIEMBRE 01 DE DICIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 1				
	PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	100%		
	PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL	100%		
	PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO	100%		
	PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO	100%		
	PISO 5 HOMBRES CARACAS	100%		
	PISO 5 MUJERES CARACAS	100%		
	PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL	100%		
	PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL	100%		
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO	100%		
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO	100%		
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO	85%	INSTALACION DE PISO SPC	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO	85%	INSTALACION DE PISO SPC	
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA	100%		
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA	100%		$ 48.200.000,00
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO	100%		
	PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD	100%	INSTALACION DE PUERTAS	
	PISO 4 ENFERMERIA	80%	INSTALACION DE APARATOS SANITARIO	
	PISO 4 HOMBRES CARACAS	90%	INSTALACION DE CIELO RASO Y APARATOS SANITARIOS	
	PISO 4 MUJERES CARACAS	80%	ENCHAPE Y CIELO RASO	
	PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA	72%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 1 VIGILANCIA	60%	ENCHAPE Y APARATOS SANITARIO	
	PISO 3 HOMBRES CARACAS	50%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 3 MUJERES CARACAS	50%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 6 HOMBRES CARACAS	50%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 6 MUJERES CARACAS	50%	PAÑETE Y ENCHAPE	
	PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO	30%	DESMONTE DE APARATOS Y DEMOLICION	

PLAN DE TRABAJO SEMANA 23 NOVIEMBRE A 01 DE DICIEMBRE

SEMANA 23 NOVIEMBRE 01 DE DICIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 2				
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES	90%	ENTREGAR PUERTAS PENDIENTES DE VIDRIO	
	PISO 6 APRENDICES MUJERES	90%	ENTREGAR PUERTAS PENDIENTES DE VIDRIO	
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES	100%	ENTREGADO	
	PISO 3 APRENDICES MUJERES	100%	ENTREGADO	
	PISO 5 APRENDICES HOMBRES	65%	CIELO FALSO PULIDA DE PISO	$ 18.500.000,00
	PISO 5 APRENDICES MUJERES	65%	ENCHAPE Y CIELO FALSO	
	PISO 2 APRENDICES HOMBRES	65%	CIELO FALSO PULIDA DE PISO	
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO				
	ADECUACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	100%	INSTALACION DE MOBILIARIO	$ 4.200.000,00
GRUPO 4 CAFETERIA				
	ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA	90%	PULIDA DE PISO, PINTURA DE TECHO, INSTALACION DE MBILIARIO, INSTALACION DE PUERTAS	$ 15.000.000,00
GRUPO 6				
	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA 6	100%	ARREGLO DE HUMEDAD, TERMINANCION DE MANTO	$ 4.500.000,00
TOTAL				**$ 90.400.000,00**

ESTADO Y ENTREGAS

BAÑOS INSTRUCTORES	ESTADO			FECHA ENTREGA
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 5 HOMBRES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 5 MUJERES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL	ENTREGADO			
PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL	ENTREGADO			
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO				
PISO 2 MUJERES AUDITORIO				
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO				30/11/2023
PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO				30/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA	ENTREGADO			21/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA	ENTREGADO			21/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO	ENTREGADO			21/11/2023
PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA		EJECUCION		30/11/2023
PISO 4 ENFERMERIA		EJECUCION		30/11/2023
PISO 4 HOMBRES CARACAS		EJECUCION		5/12/2023
PISO 4 MUJERES CARACAS		EJECUCION		5/12/2023
PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA		EJECUCION		5/12/2023
PISO 6 SUB DIRECCION		EJECUCION		30/11/2023
PISO 1 VIGILANCIA		EJECUCION		5/12/2023
PISO 3 HOMBRES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 3 MUJERES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 6 HOMBRES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 6 MUJERES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO			INICIO	13/12/2023

ESTADO Y ENTREGAS

BAÑOS APRENDICES				
PISO 3 APRENDICES HOMBRES	ENTREGADO			
PISO 3 APRENDICES MUJERES	ENTREGADO			
PISO 6 APRENDICES HOMBRES				21/11/2023
PISO 6 APRENDICES MUJERES				21/11/2023
PISO 2 APRENDICES HOMBRES		EJECUCION		8/12/2023
PISO 5 APRENDICES HOMBRES		EJECUCION		8/12/2023
PISO 5 APRENDICES MUJERES		EJECUCION		8/12/2023
ATENCION AL CIUDADANO				
ADECUACIONES AL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO Y PUERTAS		EJECUCION		1/12/2023
CAFETERIA				
ADECUACION AL AREA DE CAFETERIA		EJECUCION		1/12/2023
TERRAZA 6 PISO				
IMPERMEABILZACION TERRAZA PISO 6		EJECUCION		30/11/2023

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359
