REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 09 DEL DÍA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

dic	Realizar reunión presencial de avance del proceso que tiene como objeto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA
1	Khareen Vega.	52832111	X			Coordinación FPI-CGMLTI	khvega@sena.edu.	—	N/A	
2	Oscar Peñuela	76325719	X			Planeación CGMLTI	opeñuela@sena.edu.co	12552	N/A	
3	Edward Santos	11-201-241	X			Despacho Regional.	eysantos@sena.edu.co	13129	N/A	
4	Andrea Cuellar	1030.527808		X		Planeación	yacuellar@sena.edu	—	N/A	
5.	Andres Benitez	1.069.741071		X		SIGA SST	gjbenitez@sena.edu.co	—	N/A	
6	Gina silva	1013599793		X		CGMLTI	ginnasilva@sena.edu.co	—	N/A	
7	Freiden N. Villareal	79348.118	X			CGMLTI	nfvillareal@sena.edu.co		N/A	
8	JORGE VILLAMIL	79789069	X			Admon Edif	jjvillamil@sena		N/A	
9	Ángela Nova V.	1026569082		X		SIGA Ambiental	anova@sena.edu.co		N/A	
10	Edwin Alvarez	80733158				SEGAC	consorciosegac@gmail.com		N/A	
11	Nuvia C. Quiroga	23'494.125	X			Coord. Admva	ncquiroga@sena.edu.co		N/A	
12	Mayerli Castillo	53133248		X		SEGAC	segacconsorcio@gmail.com		N/A	
13	Jean [illegible]	79.948553		X		SEGAC	Jeans[illegible]@gmail.com		N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 09 DEL DÍA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

dic	Realizar reunión presencial de avance del proceso que tiene como objeto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA
	Henry Cisneros	53.090046		X		Consorcio Secax	Comercial? consorciosecax@gmail.com	3166728559	N/A	
	Edna L. Arias	1026266545		X		SEGAC	consorciosegac@gmail.com	3241766 68	N/A	
	Fabio Ramirez.	80215333		X			fabioramirez@sena.edu.co	3159788263	N/A	
	Juan Marin	1030594465		X		CGLMIT	jcmarin@sena.edu.co	3176979394	N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	
									N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477

Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

ORDEN DEL DIA

- LECTURA DE COMPROMISOS ANTERIOR
- PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL
- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO
- NOVEDADES SST
- NOVEDADES AMBIENTALES
- TEMAS TÉCNICOS POR RESOLVER
- PLAN DE TRABAJO SIGUIENTE SEMANA
- OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

1 ,EL contratista enviará cotización de actividades propuestas para ser analizado por la entidad.

2, El contratista se compromete a realizar el cambio de cerraduras de los espacios entregados por la marca sugerida por la entidad.

- Ya se realizo en baños entregados.

3 ,La entidad entregara de acuerdo a la planimetría presentada, que divisiones y mobiliario existente se debe nuevamente instalar en el área en Atención Al Ciudadano.

- No se ha entregado a la fecha

4, El contratista debe revisar de acuerdo a la norma la ubicación del sanitario evaluando el área de giro de la silla de ruedas y ubicación de las misma, en baño de movilidad reducida, atención al ciudadano, de acuerdo a observación de la Entidad

- Se verifico y la distancia que se debe tener del muro al eje del sanitario es 0,45 cm, se ajusto en obra.

5, El contratista teniendo en cuenta las observaciones presentadas en obra, propone dejar dentro del acta de entrega un compromiso de visitas de obra periódicas en los dos primeros, con el fin que las instalaciones estén en su máximo funcionamiento, y se pueda evidenciar las posibles fallas en la operación.

6, El Contratista realizara la verificación aleatoria de un orinal de acuerdo a lo indicado por parte del personal de mantenimiento el sr. Nelson Villareal

- Pendiente realziar la actividad

PERSONAL CONTRACTUAL VS PERSONAL ACTUAL

PERSONAL DE OBRA SENA CGMLTI				
SEMANA ACTUAL		SEMANA PENDIENTES	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
CONTRATISTA ADMINISTRATIVOS				
RESIDENTE DE OBRA	1	ING YEIMI CRISTINA GOMEZ MAYORGA	4/09/2023	
AUX INGENIERIA	1	ING EDWIN ALVAREZ	4/09/2023	
PROFESIONAL SST	1	MAYERLIN CASTILLO NARANJO	4/09/2023	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	LAURA SUAREZ	4/09/2023	
TOTAL	4			
CONTRATISTA (PERSONAL EN OBRA)				
MAESTRO DE OBRA	2	JOSE MAURICIO BELTRAN ACOSTA	4/09/2023	
		PEDRO IGNACIO CORREA ZUÑIGA	6/09/2023	
AYUDANTES	59	HOLMAN ALVAREZ CARDONA	4/09/2023	
		GERMAN ROBERTO BOLIVAR	4/09/2023	1/11/2023
		CARLOS JULIO PEREZ TABIO	4/09/2023	25/09/2023
		RAMON IGNACIO PEREZ SALAZAR	4/09/2023	25/09/2023
		CRISTIAN ANDRES CAMACHO BARRETO	5/09/2023	20/10/2023
		EDWIN CAMILO CAMACHO BARRETO	5/09/2023	
		ROGER ERNESTO MARTINEZ CAMPOS	5/09/2023	
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS	6/09/2023	14/09/2023
		OSCAR ANDRES TORRES VIVAS	6/09/2023	14/09/2023
		DAVID ALEXANDER ALVAREZ AMAYA	21/09/2023	6/10/2023
		EDGAR ALONSO CORTES LANCHEROS	22/09/2023	
		GUSTAVO HERNAN CORTES LANCHEROS	22/09/2023	
		LUIS ENRIQUE CORTES LANCEROS	22/09/2023	
		MAICOL ALEJANDRO CORREA CORREA	25/09/2023	6/10/2023
		LUIS CAMACHO SALCEDO	27/09/2023	20/10/2023
		JOSE DAIRO SANCHEZ OTALVARO	2/10/2023	
		DIEGO FERNANDO GUTIERREZ DIMAS	2/10/2023	
		JUAN GABRIEL TORRES VIVAS	15/10/2023	
		EDWIN TRUJILLO GUANIZO	11/10/2023	
		OMAR ANTONIO BETANCOURTH	11/10/2023	12/10/2023
		JONATAN JOSE JULIO AROYO	11/10/2023	17/10/2023
		JONATAN RODRIGUEZ RICO	11/10/2023	26/10/2023
		SANTIAGO MORENO CERVERA	NO INGRESO	12/10/2023
		IVAN RENE VALENCIA BERMEJO	12/10/2023	
		JULIO CESAR CONTRERAS BUSTOS	12/10/2023	
		.JHONNY STIVER TAPIAS PAREJA	17/10/2023	
		ALEJANDRO JIMENEZ CORREA	17/10/2023	
		LUIS FELIPE JIMENEZ CORREA	17/10/2023	
		ALEXANDER HERNANDEZ LOPEZ	18/10/2023	21/10/2023
		ANDRES FELIPE VEGA ACEVEDO	18/10/2023	21/10/2023
		CARLOS JULIO CIFUENTES MELO	18/10/2023	21/10/2023
		JEFERSON RIVERA MAYA	18/10/2023	21/10/2023
		LUCY ESPERRANZA RIVERA	23/10/2023	
		NESTOR JULIO TORRES ESLAVA	NO INGRESO	17/11/2023
		DIEGO ALEJANDRO TORRES VIVAS	NO INGRESO	17/11/2023
		ARIOLFO DIAZ CANO	3/11/2023	7/11/2023
		JORGE ENRIQUE CESPEDES SANCHEZ	3/11/2023	
		EDISON ANDRES CORTES MONTOYA	3/11/2023	
		JAVIER ULISES ALVAREZ OCHOA	4/11/2023	
		JORGE HUMBERTO BARRETO TRUJILLO	4/11/2023	
		JULIO ERNESTO SANCHEZ	4/11/2023	
		ROBINSON YESID MORA RUBIANO	4/11/2023	
		PIERRE JAIME BARRERA OCHOA	15/11/2023	21/11/2023
		CRISTIAN DURLEY RODRIGUEZ BARON	15/11/2023	
		SON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	15/11/2023	
		VICTOR VELASCO NAVAS	15/11/2023	
		RAUL CARDENAS GONZALEZ	17/11/2023	
		EDER GIOVANNY LEON PACHECO	16/11/2023	23/11/2023
		SON YAIR CARVAJAL RAMIREZ	17/11/2023	
		MIGUEL ANGEL MASIAS	NO INGRESO	
		MANUEL HERNANDEZ	30/11/2023	
TOTAL PARCIAL	59			24
TOTAL EN OBRA	34			

- # PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO

SEMANA 23 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE	AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %	VALOR AVANCE DE OBRA	VALOR FRENTE
GRUPO 1 BAÑOS INSTRUCTORES					
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES PISO 3 MUJERES MULTIPLES PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO PISO 5 HOMBRES CARACAS PISO 5 MUJERES CARACAS PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL PISO 2 HOMBRES AUDITORIO PISO 2 MUJERES AUDITORIO PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA PISO 4 ENFERMERIA PISO 4 HOMBRES CARACAS PISO 4 MUJERES CARACAS PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA PISO 1 VIGILANCIA PISO 3 HOMBRES CARACAS PISO 3 MUJERES CARACAS PISO 6 HOMBRES CARACAS PISO 6 MUJERES CARACAS PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO	85%	$ 388.933.247,90	84%	$ 384.357.562,63	$ 457.568.526,94


Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

- PORCENTAJE PROGRAMADO VS PROCENTAJE EJECUTADO

GRUPO 2 BAÑOS APRENDICES						,
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES PISO 3 APRENDICES MUJERES PISO 6 APRENDICES HOMBRES PISO 6 APRENDICES MUJERES PISO 5 APRENDICES HOMBRES PISO 5 APRENDICES MUJERES PISO 2 APRENDICES MUJERES	85%	$ 350.410.891,96	83%	$ 342.165.929,80	$ 412.248.108,19
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO						
	ADEUCACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	100%	$ 64.024.521,00	95%	$ 60.823.294,95	$ 64.024.521,00
GRUPO 4 CAFETERIA						
	ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA	90%	$ 66.587.542,68	85%	$ 62.888.234,75	$ 73.986.158,53
GRUPO 6 CUBIERTA PISO 6						
	IMPERMEABILZIACION TERRAZA	95%	$ 121.770.304,92	90%	$ 115.361.341,50	$ 128.179.268,33
TOTAL			$ 991.726.508,46		$ 965.596.363,63	$ 1.136.006.583,00

AVANCE DEL CONTRATO	**87%**	**$ 991.726.508,46**	**85%**	**$ 965.596.363,63**	**$ 1.136.006.583,00**	**100%**

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

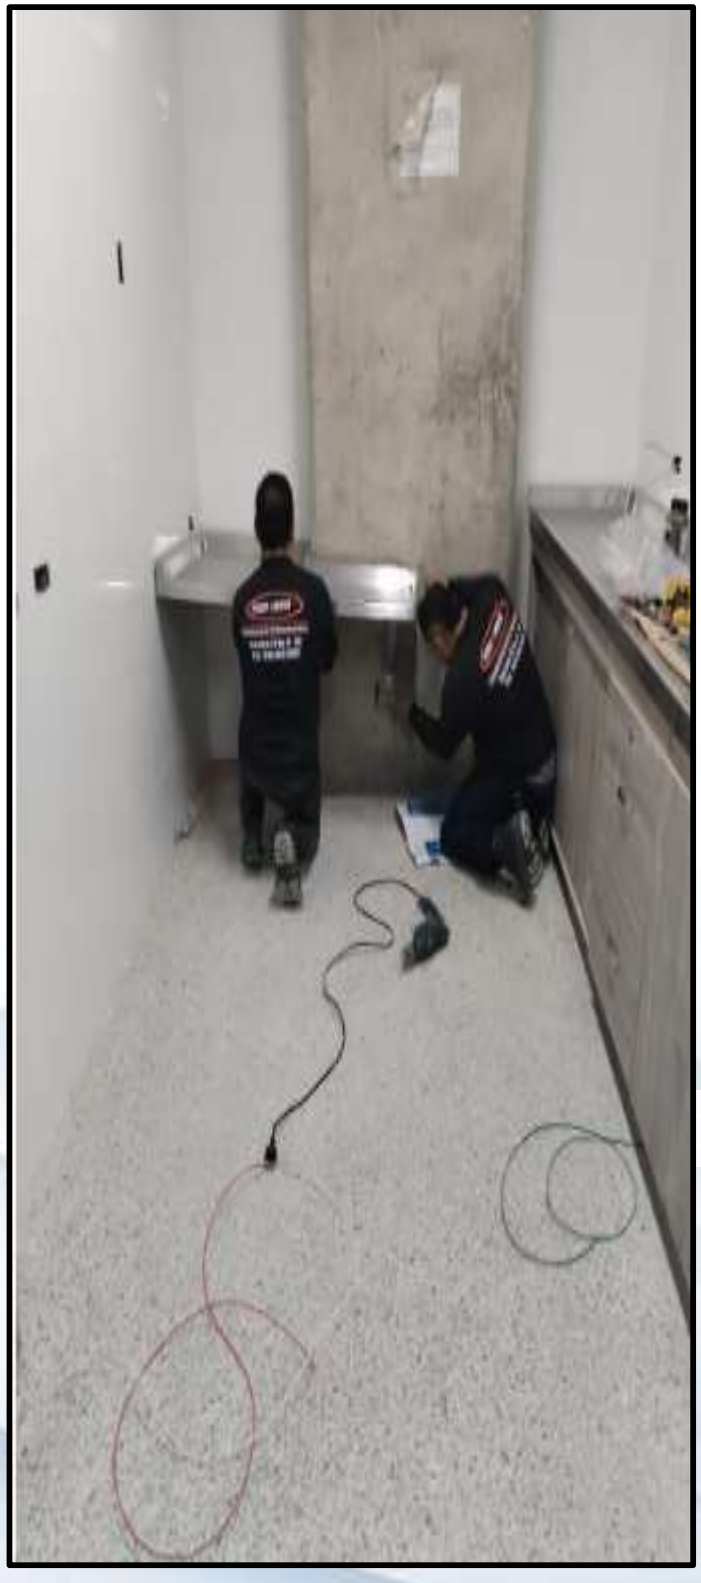





Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359









ENTOS S
BOGOTÁ D.
R: 312417660


















NOVEDADES SST Y NOVEDADES AMBIENTALES

1. Ingresos de personal y realización de respectiva inducción por parte el SENA y SEGAC
2. Señalización áreas de trabajo.
3. Suministro de EPP.
4. Charlas de seguridad, capacitaciones.
5. Se programa salida de RCD 02 diciembre en espera de validación por el área ambiental se Sena CGMLTI
6. No se reportan accidentes laborales en el periodo correspondiente.
7. Se reporta entre la semana del 23 al 30 de noviembres


   1 ingreso y 3 retiros

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO

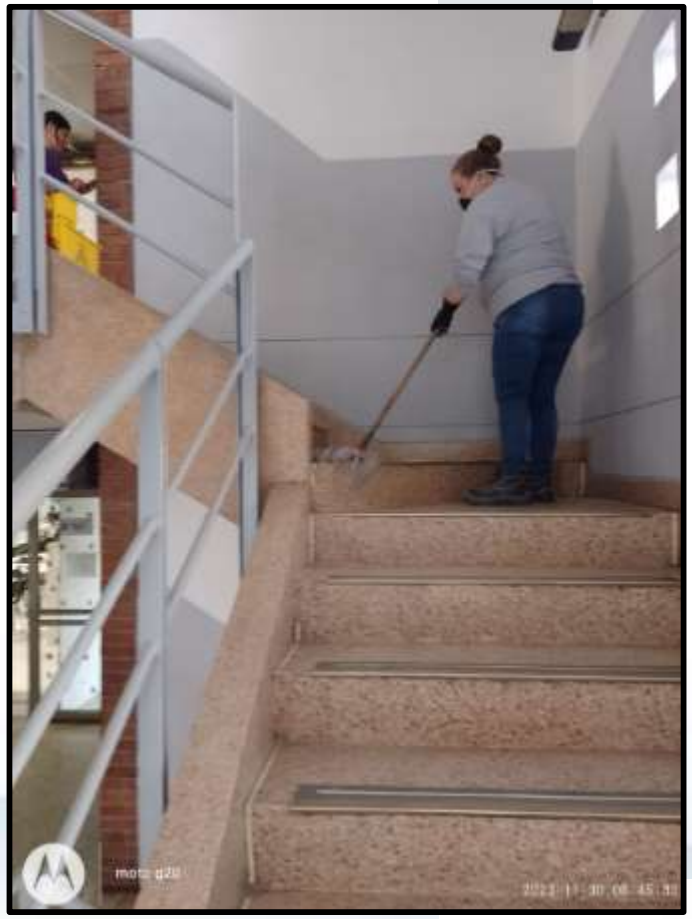



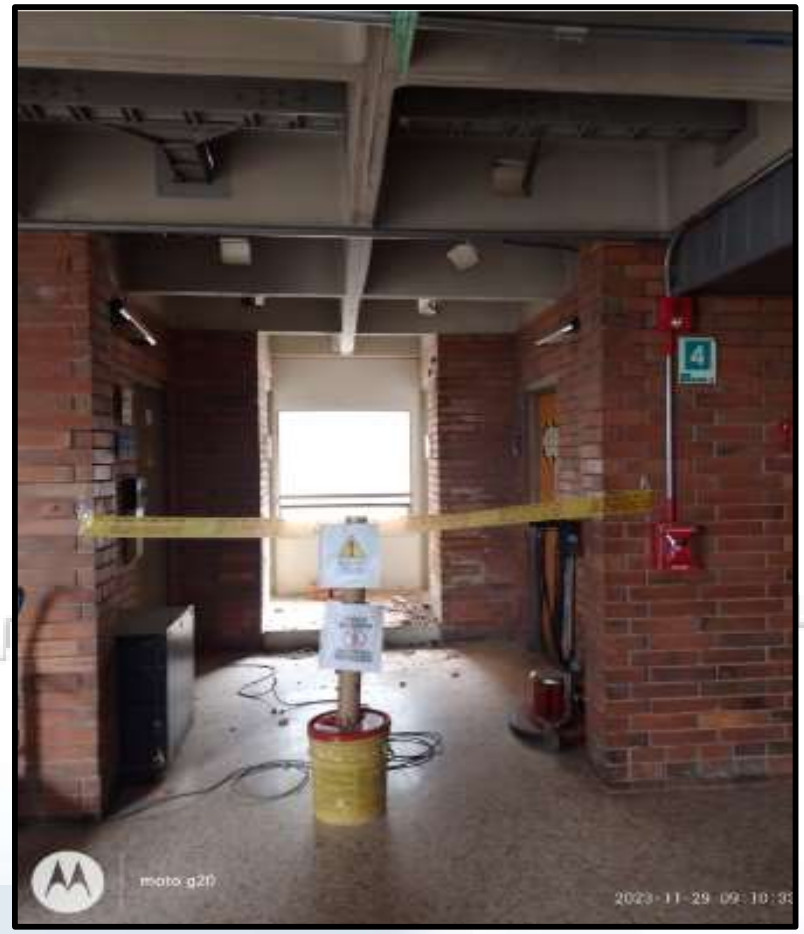







SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO


SEGAC




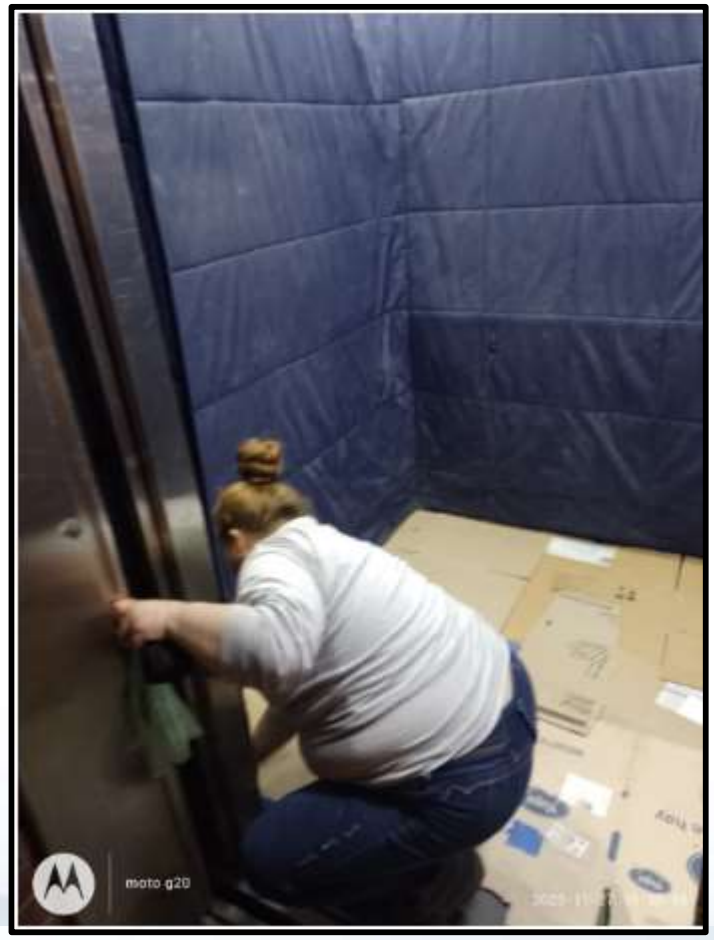

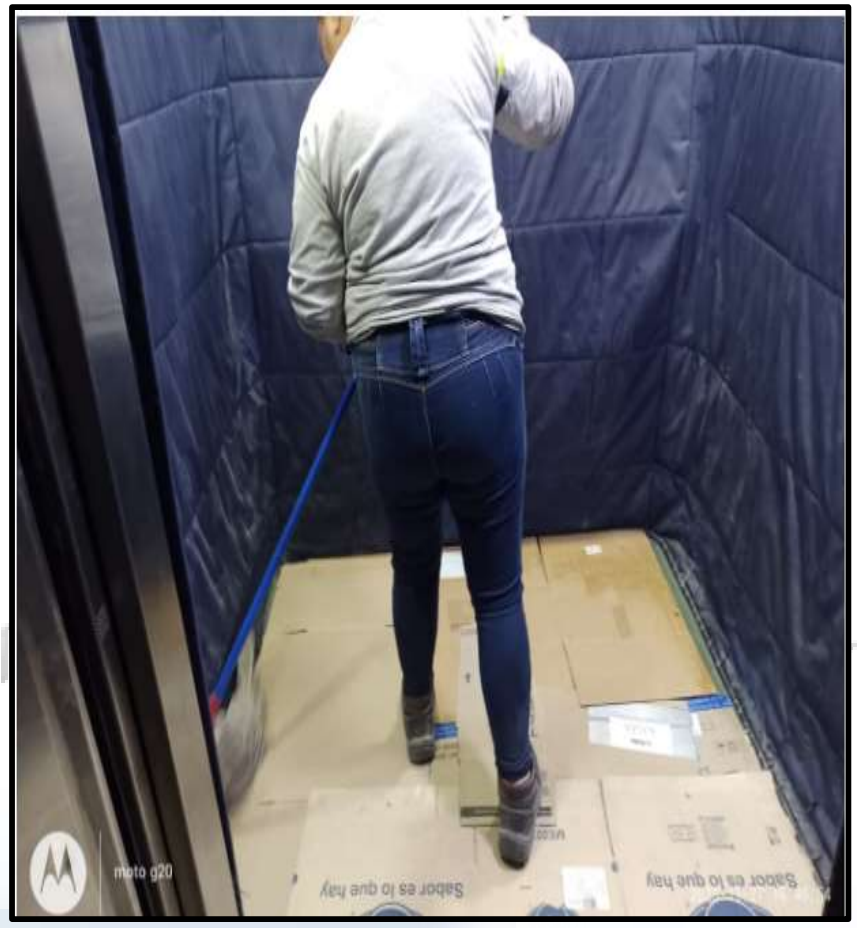



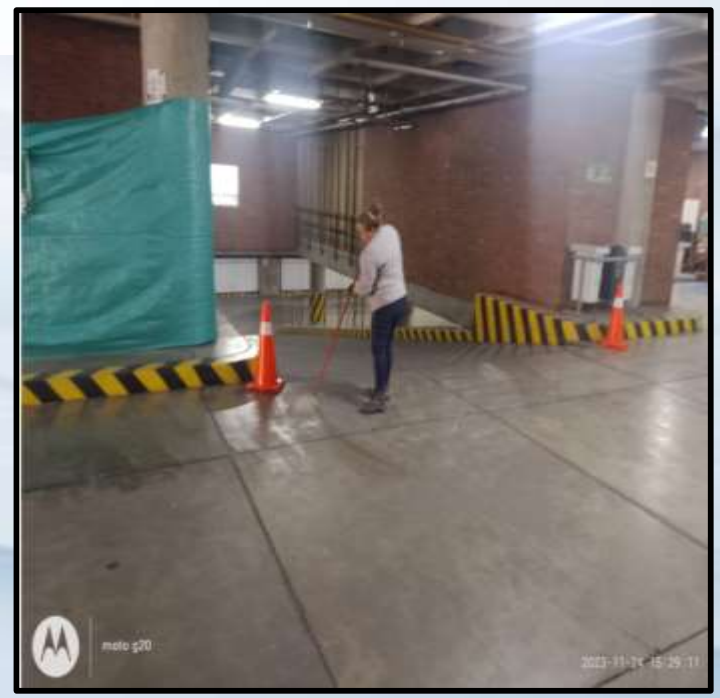

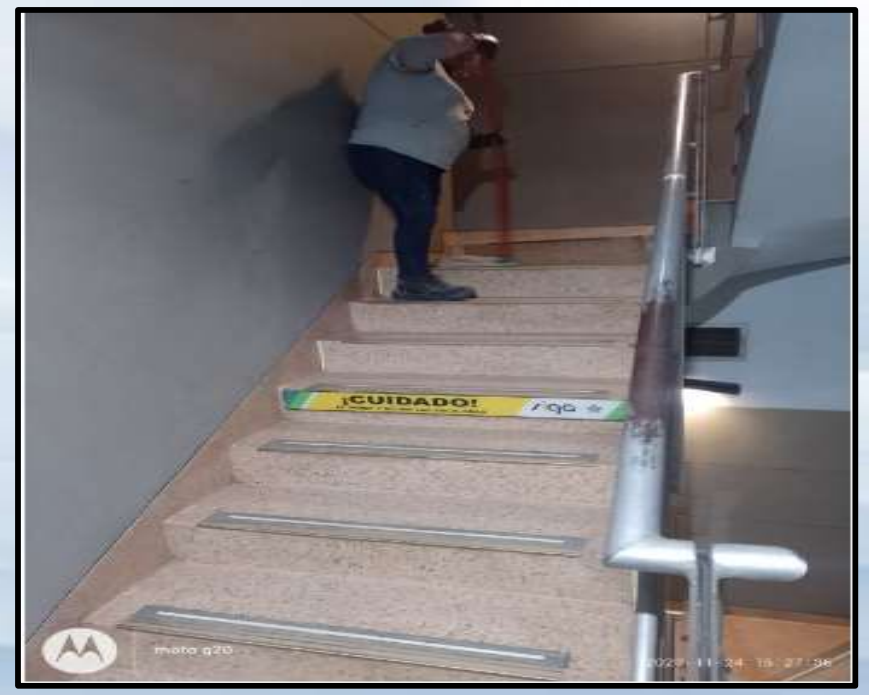


SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO










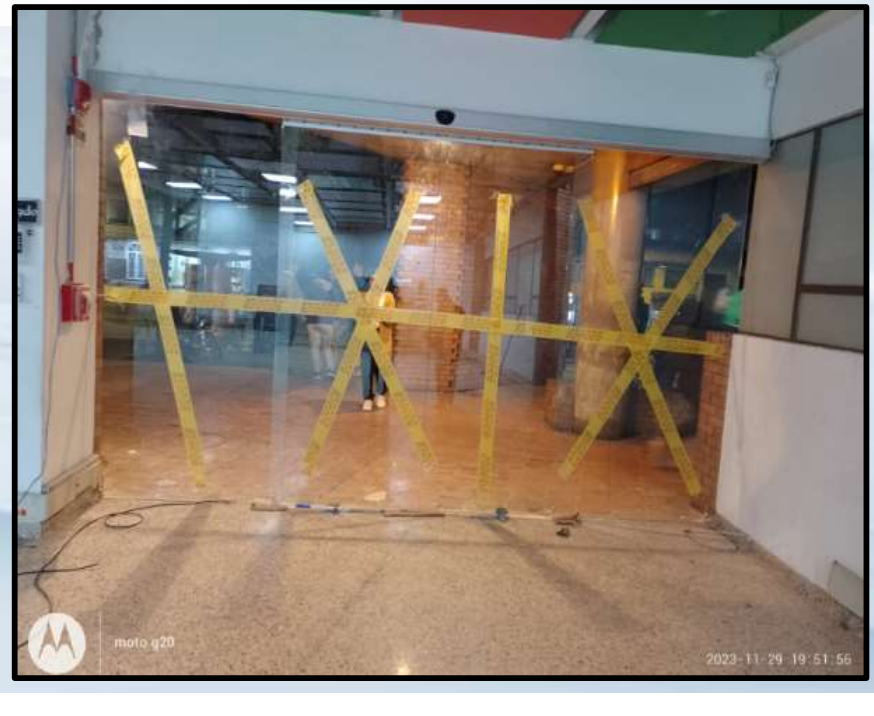




SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO



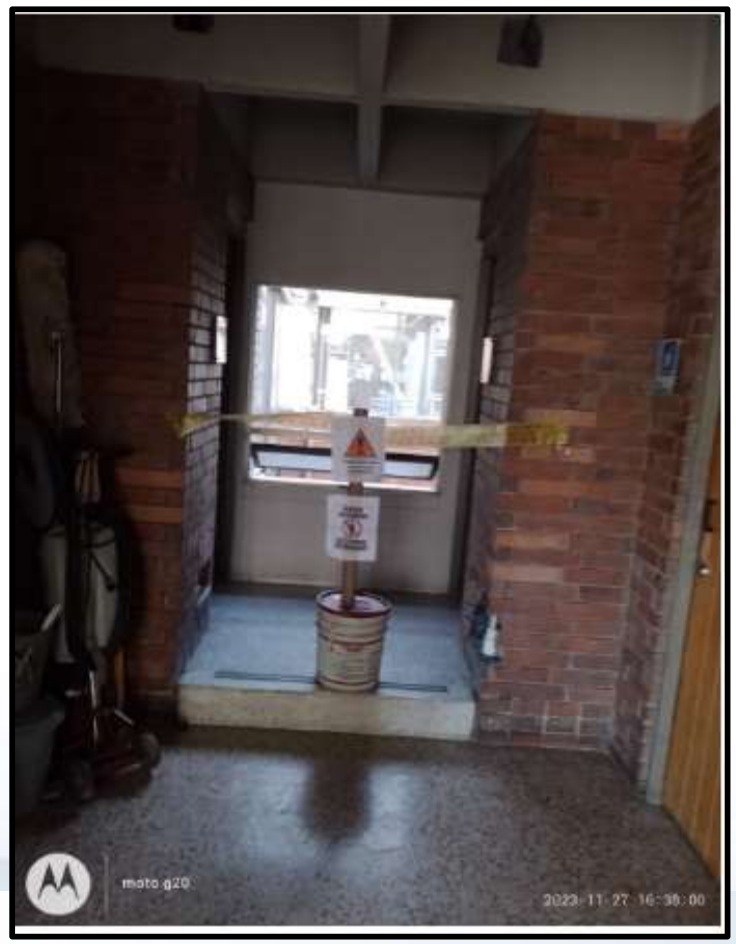

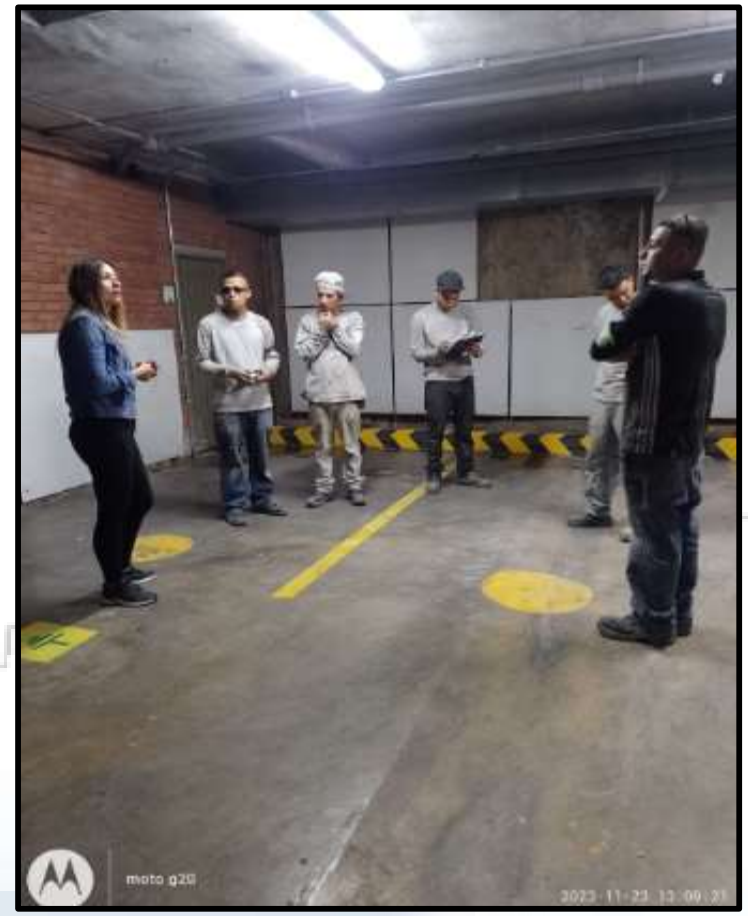





TEMAS TECNICOS POR RESOLVER

- Actividades a ejecutar saldo a favor
- Retiro de RCD

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

PLAN DE TRABAJO SEMANA 01 AL 09 DE DICIEMBRE

SEMANA 02 AL 09 DE DICIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 1				
	PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	100%		
	PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL	100%		
	PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO	100%		
	PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO	100%		
	PISO 5 HOMBRES CARACAS	100%		
	PISO 5 MUJERES CARACAS	100%		
	PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL	100%		
	PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL	100%		
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO	100%		
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO	100%		
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA	100%		
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA	100%		
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO	100%		
	PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA	95%	INSTALACION DE BARRAS Y ESPEJO	$ 43.530.000,00
	PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO	70%	PINTURA- MUEBLE- PISO SPC- DIVISIONES	
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO	70%	PINTURA- MUEBLE- PISO SPC- DIVISIONES	
	PISO 4 ENFERMERIA	80%	CIELO RASO . PULIDA DE PISO- APARATOS SANITARIOS	
	PISO 4 HOMBRES CARACAS	80%	PULIDA -APARATOS SANITARIOS- PUERTA	
	PISO 4 MUJERES CARACAS	80%	PULIDA -APARATOS SANITARIOS- PUERTA	
	PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA	80%	CIELO FALSO- PULIDA PISOS- APARATOS SANITARIOS	
	PISO 1 VIGILANCIA	60%	CIELO FALSO- PULIDA PISOS- APARATOS SANITARIOS	
	PISO 3 HOMBRES CARACAS	70%	ENCHAPE - CIELO FALSO	
	PISO 3 MUJERES CARACAS	70%	ENCHAPE - CIELO FALSO	
	PISO 6 HOMBRES CARACAS	80%	CIELO FALSO Y PULIDO DE PISO	
	PISO 6 MUJERES CARACAS	80%	CIELO FALSO Y PULIDO DE PISO	
	PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO	70%	PAÑETE, ENCHAPE Y CILO FALSO	

PLAN DE TRABAJO SEMANA 01 AL 09 DE DICIEMBRE

SEMANA 02 AL 09 DE DICIEMBRE		PROGRAMADO %	JUSTIFICACION	VALOR
GRUPO 2				
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES	100%	ENTREGAR PUERTAS PENDIENTES DE VIDRIO	$ 30.000.000,00
	PISO 6 APRENDICES MUJERES	100%	ENTREGAR PUERTAS PENDIENTES DE VIDRIO	
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES	100%	ENTREGADO	
	PISO 3 APRENDICES MUJERES	100%	ENTREGADO	
	PISO 5 APRENDICES HOMBRES	60%	CIELO FALSO- DIVISIONES	
	PISO 5 APRENDICES MUJERES	60%	CIELO FALSO- DIVISIONES	
	PISO 2 APRENDICES HOMBRES	60%	ENCHAPE Y CIELO FALSO	
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO				
	ADECUACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	100%	INSTLACION DE PUERTAS DE VIDRIO - PINTURA	$ 7.500.000,00
GRUPO 4 CAFETERIA				
	ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA	100%	INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION - PINTURA TECHO - PUERTA PINTURA ELECTROSTATICA	$ 15.500.000,00
GRUPO 6				
	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA 6	100%	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MANTO - YA SE CURARON LAS HUMEDADES	$ 5.000.000,00
TOTAL				**$ 101.530.000,00**

ESTADO Y ENTREGAS

BAÑOS INSTRUCTORES	ESTADO			FECHA ENTREGA
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL	ENTREGADO			
PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO	ENTREGADO			
PISO 5 HOMBRES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 5 MUJERES CARACAS	ENTREGADO			
PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL	ENTREGADO			
PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL	ENTREGADO			
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO	ENTREGADO			
PISO 2 MUJERES AUDITORIO	ENTREGADO			
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA	ENTREGADO			21/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA	ENTREGADO			21/11/2023
PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO	ENTREGADO			21/11/2023
PISO 6 SUB DIRECCION	ENTREGADO			30/11/2023
PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA		EJECUCION		5/12/2023
PISO 4 HOMBRES CARACAS		EJECUCION		5/12/2023
PISO 4 MUJERES CARACAS		EJECUCION		5/12/2023
PISO 1 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO		EJECUCION		13/12/2023
PISO 1 MUJERES AUDITORIO CAMERINO		EJECUCION		13/12/2023
PISO 4 ENFERMERIA		EJECUCION		5/12/2023
PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA		EJECUCION		5/12/2023
PISO 1 VIGILANCIA		EJECUCION		5/12/2023
PISO 3 HOMBRES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 3 MUJERES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 6 HOMBRES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 6 MUJERES CARACAS		EJECUCION		13/12/2023
PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO		EJECUCION		13/12/2023

ESTADO Y ENTREGAS

BAÑOS APRENDICES				
PISO 3 APRENDICES HOMBRES	ENTREGADO			
PISO 3 APRENDICES MUJERES	ENTREGADO			
PISO 6 APRENDICES HOMBRES				5/12/2023
PISO 6 APRENDICES MUJERES				5/12/2023
PISO 2 APRENDICES HOMBRES		EJECUCION		13/12/2023
PISO 5 APRENDICES HOMBRES		EJECUCION		13/12/2023
PISO 5 APRENDICES MUJERES		EJECUCION		13/12/2023
ATENCION AL CIUDADANO				
ADECUACIONES AL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO Y PUERTAS		EJECUCION		13/12/2023
CAFETERIA				
ADECUACION AL AREA DE CAFETERIA		EJECUCION		13/12/2023
TERRAZA 6 PISO				
IMPERMEABILZACION TERRAZA PISO 6		EJECUCION		6/12/2023

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359

OTROS

Cra 27 # 26-16 sur Local 2 BOGOTÁ D.C. Consorcio.segac@gmail.com
CELULAR: 3124176668 - 3146728359
