INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

INFORME SEMANAL No. 5

CONTRATO No. GGC-145-2023

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR"

PERÍODO: 18 al 24 de DICIEMBRE 2023

SUPERVISION: **ARQUITECTO CAMILO ANDRES HERNÁNDEZ ALFONSO**

DICIEMBRE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 3

1.1 FICHA TECNICA DEL CONTRATO 3

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 4

3. ALCANCES 5

3.1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O ZONAS INTERVENIDAS: 6

5. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO 7

5.1 PERSONAL OPERATIVO 7

6. VEHICULOS Y/O EQUIPOS 7

7. REGISTRO FOTÓGRAFICO: 7

8. INFORME SST: 19

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. GGC-145 -2023, en su etapa de obra presenta en siguiente contractual:

1.1 FICHA TECNICA DE OBRA

CONTRATO No. GGC-145-2023	**:** 24 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA	**:** CONSORCIO ARAGON GTD
CONTRATANTE	**:** INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -
INTERVENTOR	: CONSORCIO GINGNOVA
SUPERVISOR	: ARQ. CAMILO ANDRÉS HERNÁNDEZ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: $ 421.702.376,15
ACTA DE INICIO	: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No	: N/A
PLAZO INICIAL	: DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR.**	

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Valledupar está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los ríos Cesar y Guatapurí, en la Costa Caribe colombiana.

Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. La ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, siendo la altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m.

Extensión total: 4.493 Km2
Extensión área urbana: El casco urbano tiene una longitud norte-sur de 8.3 km y este-oeste de 6.2 km


Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): la ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m. al norte y 150 m. a sur, siendo la altitud media de 168 m.

Temperatura media: la temperatura Media Anual es de 28,4 ºC, con máximas y mínimas de 22ºC y 34ºC respectivamente, la temperatura máxima histórica registrada es de 41.5ºC y la mínima de 16ºC. El mes más caluroso es abril con un promedio de 30ºC y el más fresco octubre.

Como lugar de ejecución del objeto del contrato se ha establecido el sitio de la obra en la cabecera municipal específicamente en el barrio 12 de Octubre en la Calle 22 número 14-30.





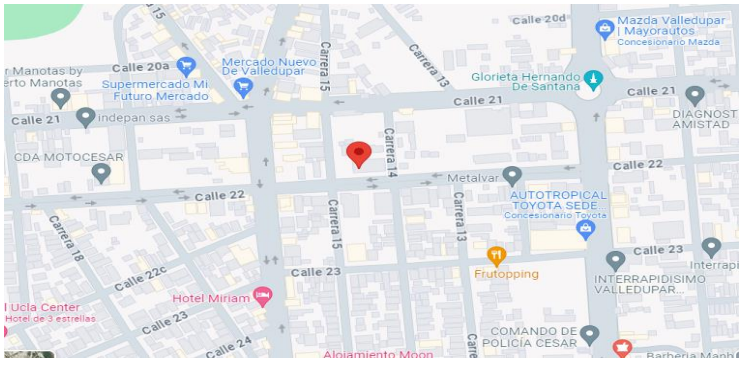

3. ALCANCES

La valoración de actividades a ejecutar y áreas a intervenir en este establecimiento, se encuentran enmarcadas dentro de los alcances contenidos en el anexo técnico según lo siguiente:

La actividades y cantidades contractuales iniciales para ejecución dentro de la seccional Valledupar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1,00	PRELIMINARES	M2	939,51
2.00	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ML	119,13
3,00	MAMPOSTERIA	M2	101,70
4,00	DIVISIONES DE MUROS	ML/M2	40,00
5,00	PISOS	ML/M2	443,00
6,00	ENCHAPE	ML/M2	119,00
7,00	CIELO RASO	M2	88,00
8,00	PUERTAS	UND	8,00
9,00	APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES	UND	53,00
10,00	PAÑETE ESTUCO Y PINTURA	M2	325.63
11,00	MESONES	ML	48,13
12,00	VENTANAS	M2	44,51
14,00	MUEBLES	UND	15,00
15,00	CUBIERTAS	ML/M2	1530,74
16,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	ML/UND	224,00
17,00	VARIOS	M2	1342,00
19,00	APARATOS ELECTRICOS	ML/UND	209,50

3.1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

% EJECUTADO EN LA SEMANA	16,40%
VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 69.140.270
% EJECUTADO ACUMULADO	73,83%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 311.330.778
% DE ADELANTADO	0.00%
VALOR DEL % ADELANTADO	$ 0.00

BALANCE DE CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	**$ 421.702.376,15**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1. (COBRADO)		**$ 84.340.475,23**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2. (En trámite)		**$ 210.961.520,27**
SALDO POR COBRAR		**$ 126.400.381**
SUMAS IGUALES	**$ 421.702.376,15**	**$ 421.702.376,15**

PORCENTAJE DE EJECUCION FASE V **73,83 %**

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O ZONAS INTERVENIDAS:

Frentes Intervenidos:

- Laboratorio Mosca de la Fruta
- Respel
- Depósitos
- Primer Piso Edificio de Oficinas
- Exteriores
- Segundo Piso Edificio de Oficinas
- Cuarto Planta Eléctrica
- Laboratorio Semillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA MOSCA DE LA FRUTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,2	suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	7,83
10,3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo KORAZA para exteriores color blanco, 2 manos, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	3,99

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA RESPEL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5	**PISOS**		
5,3	Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:4 de 5 cm de espesor; incluye acabado tipo concreto quemado manual para pintura	M2	33,06
5,4	mediacaña en mortero 1:4; incluye acabado tipo concreto quemado manual para pintura	ML	34,07
9	**APARATOS SANITARIOS E INSCRUSTACIONES**		
9,1	Suministro e instalación de rejilla rectangular en aluminio 3 x 2"	UND	2
9,2	Suministro e instalación de llave jardín de 1/2"	UND	1
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,2	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo EPOXICA color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	33,62

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA DEPOSITOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5	**PISOS**		
5,3	Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica de 10 cm de color semimate tráfico medio marca corona	ML	44,9
8	**PUERTAS**		
8,2	Suministro e instalación de puerta entamborada - chapilla tipo roble en madera (1,00x2,20) con marco madera; incluye cerradura tipo pesado cuadrado color satinado y/o similar	UND	2
9	**APARATOS SANITARIOS E INSCRUSTACIONES**		
9,1	Suministro e instalación de combo sanitario acuaplus ultra CORONA, incluye conexión de desagüe, grifería y todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	2
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,2	suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	48,36
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		
16,1	Instalación de tubería PVCS 4", incluye accesorios, abrazaderas, pintura y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	8
19	**APARATOS ELECTRICOS**		
19,1	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 48w, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA OFICINAS PRIMER PISO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Demolición de mediacaña en granito pulido Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	ML	34,00
1,3	Desinstalación de aparatos sanitarios, incluye revisión y destaponaminiento de redes	UND	4
1,5	Demolición de enchape en cerámica muros formato 20x20 área de mesones de laboratorio. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	M2	23,87
5	**PISOS**		
5,1	Suministro, transporte e instalación de Piso Baldosa Granito De Mármol Nube 30x30 Cm, tráfico comercial, incluye destronque y brillado	ML	20
6	**ENCHAPE**		
6,1	Suministro e instalación de pared en cerámica de 20.5 x 20.5 cm tipo natal blanco marca corona	M2	25,1
6,2	Suministro e instalación de mediacaña en granito pulido de 10 cm de espesor, incluye dilatación, pulida, brillado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	32,68
9	**APARATOS SANITARIOS E INSCRUSTACIONES**		
9,1	Instalación de aparatos sanitarios, incluye suministro de acoples y sifones para su correcto funcionamiento	UND	8
19	**APARATOS ELECTRICOS**		
NP - 3	Salida punto eléctrico para suministro de iluminación perimetral	UND	4

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA OFICINAS SEGUNDO PISO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINAR**		
1,1	Desmonte de ventana incluye resane de vano y pintura. Incluye botadero certificado	M2	1,9
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,1	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	m2	193,20
12	**VENTANAS**		
12,1	Suministro y mantenimiento de ventana en perfil proyectante 38-31 vidrio crudo incoloro de 4mm, incluye sello perimetral y manijas. (no incluye marco de aluminio)	M2	1,90
14	**MUEBLES**		

14,1	Suministro e instalación de mueble estantería para archivo, incluye adecuación e instalación en sitio donde va a utilizarse (200x100x40 cm)	UND	12,00
19	**APARATOS ELECTRICOS**		
19,1	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 48w, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	3

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA EXTERIORES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
8	**PUERTAS**		
8,1	Mantenimiento de portón metálico, lijada y pintada; engrase y mantenimiento de marco metálico existente, incluye chapa y recuperación de láminas en mal estado medidas de portón 3,00 X 3,00 M	UND	1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA PLANTA ELECTRICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,2	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color Blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	44,51
10,3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo KORAZA para exteriores color blanco, 2 manos, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones.	M2	51,84
12	**VENTANAS**		
12,1	Suministro e instalación de ventana fija tipo persiana, perfil tipo lenteja; incluye sello perimetral	M2	2
15	**CUBIERTAS**		
15,4	suministro e instalación de canal en lámina galvanizada sección promedio de 25cm, incluye soportes pie de amigo para canal, pintura, soscos y gárgolas.	ML	3,5
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		
16,2	Instalación de tubería PVCS 4" subterránea, incluye demolición si es necesario, accesorios, excavación manual (con disposición a botadero), lleno en recebo, cama de arena y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	17
16,3	Caja de inspección de 80x80x80 cm en concreto, incluye suministro de material, excavación (con botadero certificado) y tapa en concreto con marco metálico.	UND	1
17	**VARIOS**		
17,1	Realización de anden en concreto 10 CM de espesor, con acabado gualiado perimetral y centro escobillado con dilatación cada 1,2m, incluye materiales para concreto, excavación (botadero certificado), mejoramiento en recebo, acero, formaletiado y vaciado	M2	6,84
19	**APARATOS ELECTRICOS**		
19,8	Suministro e instalación de proyector led de 100 W, 6500K, IP65. eficiencia no menor a 90%. 120 - 240 V, 60 Hz. Incluye elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Certificado de conformidad de producto.	UND	2

19,8	Suministro e instalación de circuito monofásico para salida de toma o iluminación, incluye tubo Conduit PVC 3/4", cable de cobre HF #12 AWG THHN-THWN (F-N-T), incluye elementos de fijación, accesorios de tubería, regatas y demás elementos para su correcta instalación. Certificado de conformidad.	UND	7,5

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA LABORATORIO SEMILLAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINAR**		
1,2	Desmonte de ventana incluye resane de vano y pintura. Incluye botadero Certificado	M2	0,49
1,3	Desinstalación de aparatos sanitarios, incluye revisión y destaponaminiento de redes	UND	6
9	**APARATOS SANITARIOS E INSCRUSTACIONES**		
9,1	Instalación de aparatos sanitarios, incluye suministro de acoples y sifones para su correcto funcionamiento	UND	6
9,2	Suministro e instalación de poceta, incluye instalación en mesón y conexión de desagüe, grifería y todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	2
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,2	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color Blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	105,4
10,3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo KORAZA para exteriores color blanco, 2 manos, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones.	M2	20
11	**MESONES**		
11,1	Suministro e instalación de mesón en quarstone blanco polar, incluye apertura para poceta y aparatos sanitario, salpicadero 10cm y faldón 10cm	ML	16,78
12	**VENTANAS**		
12,1	Suministro e instalación de ventana en perfil proyectante 38-31 vidrio crudo incoloro de 4mm, incluye sello perimetral y manijas	M2	0,49
1,2	Mantenimiento de puerta ventana, engrase, cambio de rieles, ajuste de perfiles y cambio de piezas para su correcto funcionamiento; incluye monte y desmonte	M2	6,3
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		
16,1	Instalación de tubería PVCS 4", incluye accesorios, abrazaderas, pintura y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	22
16,2	Instalación de tubería PVCS 4" subterránea, incluye demolición si es necesario, accesorios, excavación manual (con disposición a botadero), lleno en recebo, cama de arena y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	14

5. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO

- **DIRECTOR DE OBRA:** Ingeniero Alex Oliveros
- **RESIDENTE DE OBRA:** Arquitecta Sharon Danay Chaparro Secue
- **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL:** Adíela Martínez

5.1 PERSONAL OPERATIVO

- **MAESTRO DE OBRA:** Elkin Rodríguez
- **AYUDANTES:**

1. Jose Avila
2. Martin Barrios
3. Jose Beleño
4. Pedro Puerta
5. Jesús Silva


6. VEHICULOS Y/O EQUIPOS:


Mezcladora
Pulidora
Taladro Percutor
Herramienta Menor


7. REGISTRO FOTÓGRAFICO:

	
Descripción: reforma de antepechos de mesones en semillas.	Descripción: reforma de antepechos de mesones en semillas.

	
Descripción: aplicación de estuco y pintura para interiores en semillas.	Descripción: aplicación de estuco y pintura para interiores en semillas.
	
Descripción: cambio de sifón en semillas.	Descripción: cambio de grifería en semillas.
	
Descripción: recuperación de portón en exteriores.	Descripción: recuperación de portón en exteriores.

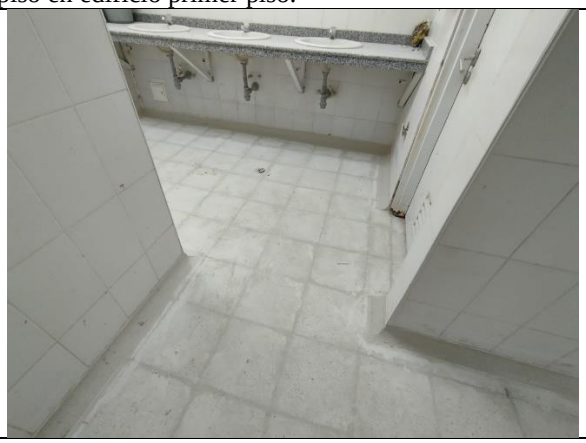
	
Descripción: aplicación de pintura epoxica para piso en respel.	Descripción: aplicación de pintura epoxica para piso en respel.
	
Descripción: instalación de llave jardín en respel.	Descripción: instalación de baldosa en mármol para piso en edificio primer piso.
	
Descripción: instalación de baldosa en mármol para piso en edificio primer piso.	Descripción: instalación de baldosa en mármol para piso en edificio primer piso.

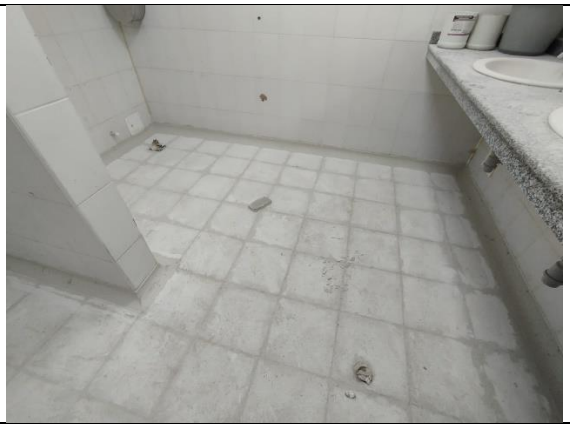	
Descripción: instalación de baldosa en mármol para piso en edificio primer piso.	Descripción: instalación de tubería de 4” bajante de agua lluvias en depósitos.
	
Descripción: instalación de tubería de 4” bajante de agua lluvias en depósitos.	Descripción: suministro de estantes en oficinas primer piso.
	
Descripción: aplicación de estuco y pintura para exteriores en depósitos.	Descripción: instalación de tubería de 4” bajante de agua lluvias en semillas.

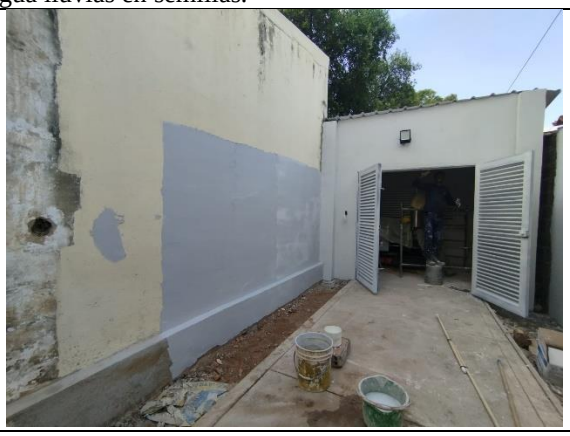	
Descripción: instalación de tubería de 4” bajante de agua lluvias en semillas.	Descripción: instalación de tubería de 4” bajante de agua lluvias en semillas.
	
Descripción: aplicación de estuco y pintura para exteriores en planta eléctrica.	Descripción: instalación de mesón en quarsone en semillas.
	
Descripción: instalación de ventana tipo persiana en planta eléctrica.	Descripción: instalación de puntos para salidas de luminaria e instalación de reflectores en primer y segundo piso oficinas.

	
Descripción: instalación de puntos para salidas de luminaria e instalación de reflectores en primer y segundo piso oficinas.	Descripción: pulida de piso en baldosa mármol en segundo piso.
	
Descripción: Desinstalación de aparatos sanitarios en oficinas primer piso.	Descripción: Desinstalación de aparatos sanitarios en oficinas primer piso.
	
Descripción: instalación de tubería subterránea 4” en planta eléctrica.	Descripción: instalación de tubería subterránea 4” en planta eléctrica.

	
Descripción: instalación de tubería subterránea 4” en planta eléctrica.	Descripción: instalación de tubería subterránea 4” en planta eléctrica.
	
Descripción: demolición de enchapes en oficinas primer piso.	Descripción: demolición de enchapes en oficinas primer piso.
	
Descripción: suministro e instalación de baldosa 20.5x20.5 para enchapes en oficinas primer piso.	Descripción: suministro e instalación de baldosa 20.5x20.5 para enchapes en oficinas primer piso.

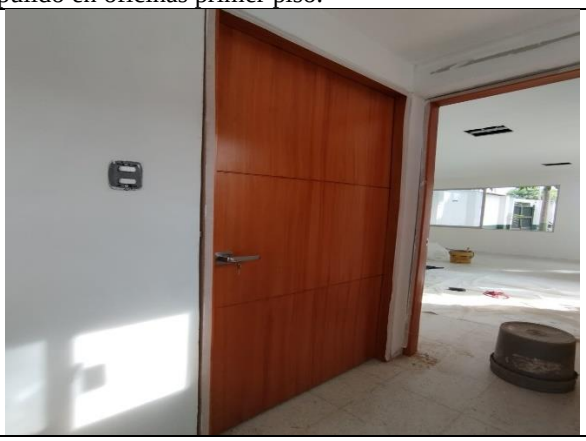	
Descripción: realización de mediacaña en granito pulido en oficinas primer piso.	Descripción: realización de mediacaña en granito pulido en oficinas primer piso.
	
Descripción: aplicación de estuco para interiores en planta eléctrica.	Descripción: instalación de puertas en madera en depósitos.

8. N_2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ICA VALLEDUPAR

Dentro del entorno laboral, los trabajadores se enfrentan a múltiples condiciones que repercuten en la salud del trabajador de manera positiva o negativa. El trabajo puede interactúan con diversas condiciones que pueden influir de manera positiva o negativa en su salud. Por ende, Consorcio Aragón GTD quiere convertir esas influencias de manera positiva, creando medidas y utilizando estrategias que permitan la preservación de la salud y disminuir la probabilidad de un accidente o peor aún, una enfermedad laboral.

DEFINICIONES:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: conjunto de medidas, políticas, procedimientos y condiciones diseñados y aplicados en un entorno laboral para proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores. Este concepto busca prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y promover el bienestar general de quienes desempeñan sus labores en un lugar determinado.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso que causa una lesión o alteración en la salud del trabajador por causa o con ocasión del trabajo que realiza.

ENFERMEDAD LABORAL: Es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

EXPOSICIÓN: Situación de exposición a un peligro que se presenta durante un tiempo determinado durante la jornada laboral.

PELIGRO: Todo acto o suceso que tiene potencial de hacer daño**.**

RIESGO: Es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el peligro.

PROBABILIDAD. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que ha criterio de la organización por su baja frecuencia de ejecución la determine como no rutinaria.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACABADOS:







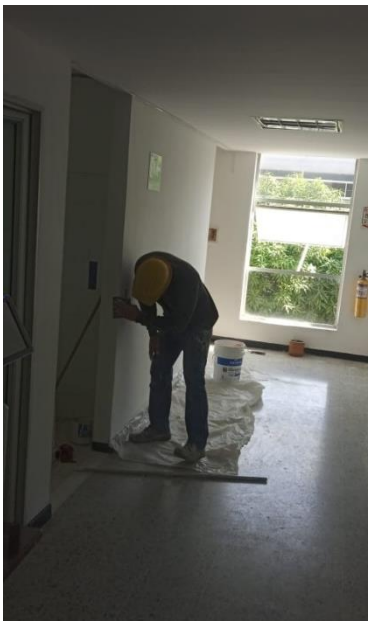

RELACIÓN DEL PERSONAL:

En la ejecución de la obra, en la semana comprendida entre el 18 de diciembre al 23 de diciembre fue el que se relaciona a continuación:

Director de obra (1), Ingeniera Residente (1), Maestro de obra (1), Inspector Siso (1), residentes Interventoría (2) Oficiales de Obra (3) Ayudantes de Obra (5) Auxiliar administrativo de contratista (1)

LISTADO DE PERSONAL EN OBRA.

INDUCCIONES:

El proyecto **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR"** se encuentra en fase final, por lo tanto, no hay ingreso de personal.

CHARLAS DE SEGURIDAD:

Durante la semana 5 y en pro de continuar la sensibilización del personal en materia de seguridad, se realizaron las siguientes charlas de seguridad:

El orden en la Obra

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.


Todo trabajador, cuenta con los elementos de protección personal.

Casco de seguridad
Mono gafas, (claras y oscuras)
Barbiquejo
Escafandra
Guantes: Tipo ingeniero o caucho
Tapa oído: inserción y tipo copa

ORDEN Y ASEO:

El orden y el aseo en una obra de construcción son fundamentales para garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad en el desarrollo de los trabajos.



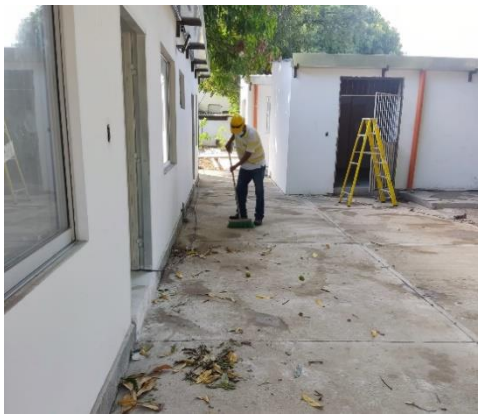

PUNTO ECOLÓGICO:

Este sistema de gestión de residuos tiene como objetivo fomentar y facilitar la separación adecuada de los desechos en diferentes categorías para su posterior reciclaje o tratamiento adecuado.

Seguimos trabajado en la recolección de residuos, para mantener los espacios de trabajo limpios.



EQUIPOS DE EMERGENCIAS:

Estos equipos, están diseñados para ayudar en la gestión y resolución de emergencias, minimizando sus efectos y protegiendo a las personas, propiedades y el medio ambiente. Hasta la fecha estos equipos se mantienen bien ubicados, limpios y señalizados.








AUSENTISMO LABORAL:


El ausentismo laboral se refiere a la ausencia no planificada o la falta de un empleado en su lugar de trabajo durante el horario laboral. Puede ser resultado de diversas razones, como enfermedad, lesiones, emergencias familiares, citas médicas, estrés, agotamiento, falta de motivación, entre otros motivos personales o profesionales.

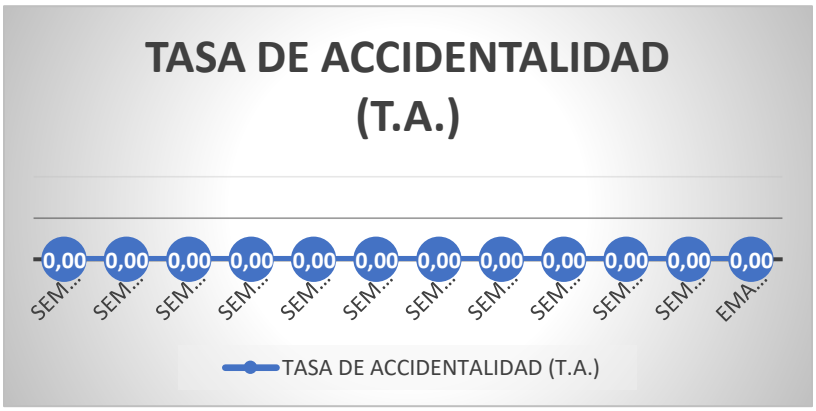

ACCIDENTES LABORALES:

Un accidente de trabajo se define como un evento inesperado, repentino y no deseado que ocurre durante el ejercicio del trabajo o como consecuencia directa del mismo, y que causa una lesión física, enfermedad ocupacional, daño psicológico o la muerte del trabajador.


Hasta la fecha, no se ha presentado ningún evento.

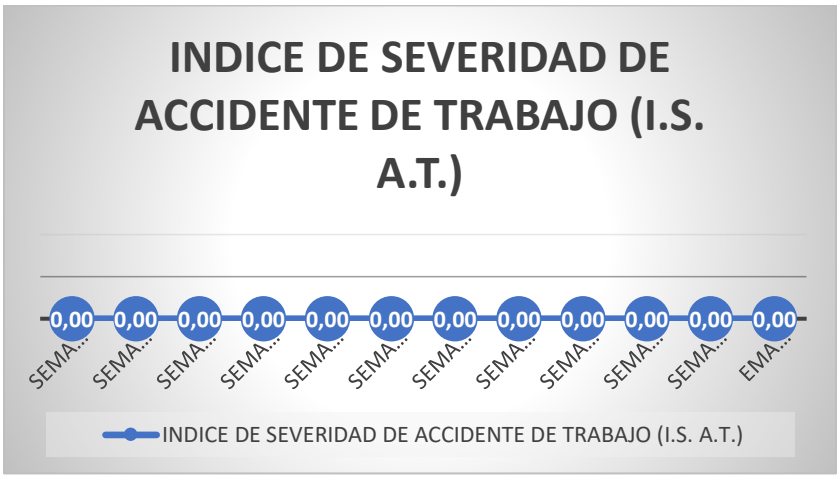


TASA DE ACCIDENTABILIDAD:

La tasa de accidentalidad es un indicador que se utiliza para medir la frecuencia de los accidentes laborales dentro de un entorno de trabajo específico durante un período determinado.

En este período completamos 5 semanas cero accidentes.

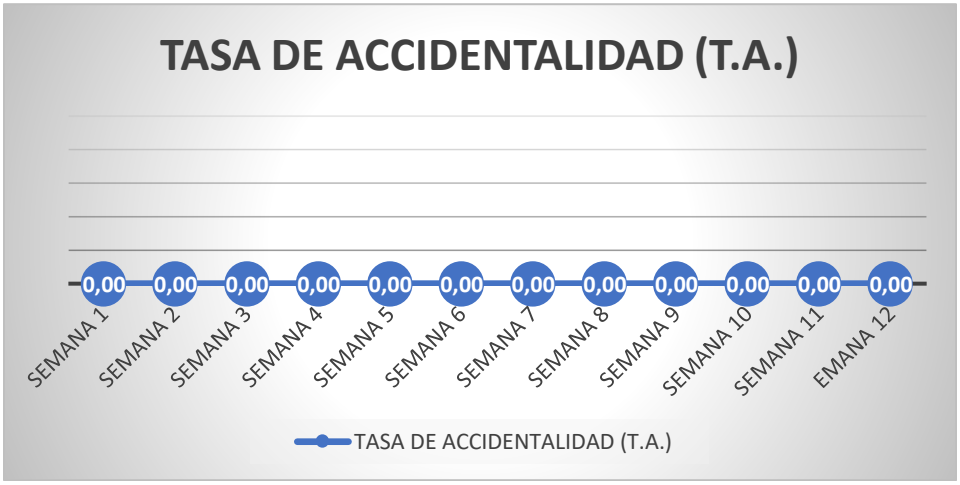

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD:
El ausentismo por enfermedad se refiere a las ausencias de los empleados en el lugar de trabajo debido a enfermedades, ya sean temporales o prolongadas. Estas ausencias pueden ser ocasionadas por diversas razones de salud, como resfriados, gripe, problemas médicos crónicos, enfermedades contagiosas, condiciones de salud mental, entre otras.

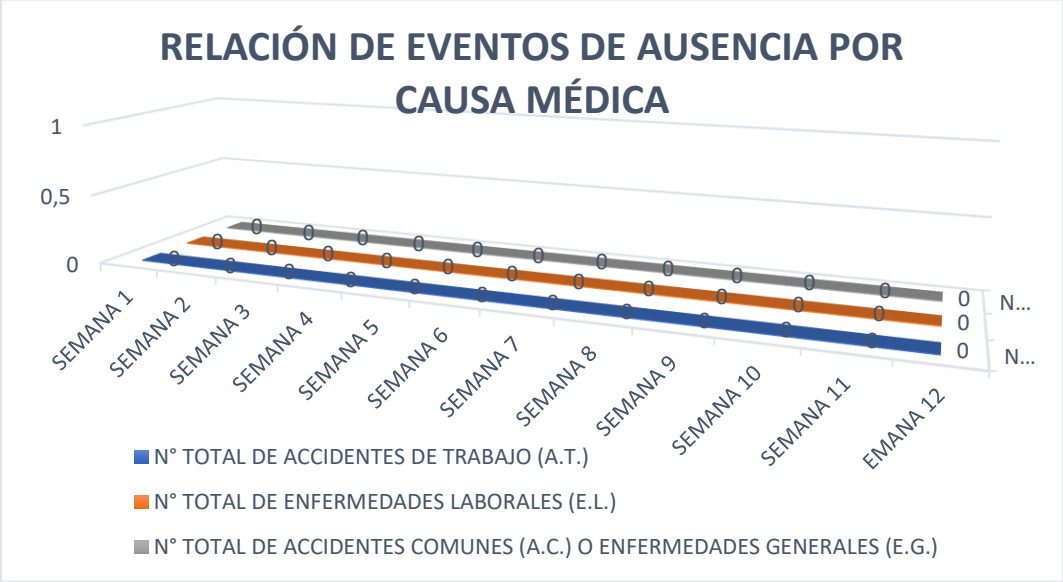

HORAS HOMBRE TRABAJADAS:


CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6	REPORTE DE HORAS H(

NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	HORAS TRABAJADAS POR DÍA							TOTAL HORAS SEMANA
			L	M	M	J	V	S	D	
ALEX OLIVEROS	18972629	Director de obra	8	8	8	8	8	4	0	44
MARJITH SANTAMARÍA	1065816051	Residente de obra	8	8	8	8	8	4	0	44
ELKIN RODRIGUEZ	12.646.815	Maestro de obra	8	8	8	8	8	4	0	44
ADIELA MARTINEZ	49.606.023	Inspector Siso	5	5	5	5	5	4	0	29
JHON FREDY VALDERRAMA	80.226.043	Tec. Electrico	8	8	8	0	0	0	0	24
KAREN RODRIGUEZ	1.010.005.296	Aux. Admin	8	8	8	0	0	0	0	24
YEEIRO FONTALVO	77.030.808	aux de obra	8	8	8	0	0	0	0	24
PEDRO LUIS PUERTA	1.065.852.365	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4	0	44
DARWIN DURAN	17.481.790	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4	0	44
JESUS ALBERTO SILVA	7.639.141	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4	0	44
FRANCISCO PUSHAINA	1.124.001.466	aux de obra	8	0	0	0	0	0	0	8
RICARDO CARRASCAL	18.971.902	Oficial de obra	8	8	8	0	0	0	0	24
JAIDER DE JESUS FONSECA	1.065.650.386	aux de obra	8	8	8	0	0	0	0	24
JOSE LUIS ZAMBRANO	12.621.086	aux de obra	8	8	8	8	8	4	0	44
ALEXANDER JAVIER BERNAL	7.574.730	Oficial de obra	4	0	8	0	0	0	0	12
HEIDER CAMACHO	17.904.433	Oficial de obra	0	4	8	8	8	4	0	32
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
										0
									TOTAL HORAS SEMANAL	509
									TOTAL HORAS MENSUAL	509

ANEXOS

CHARLAS DE SEGURIDAD



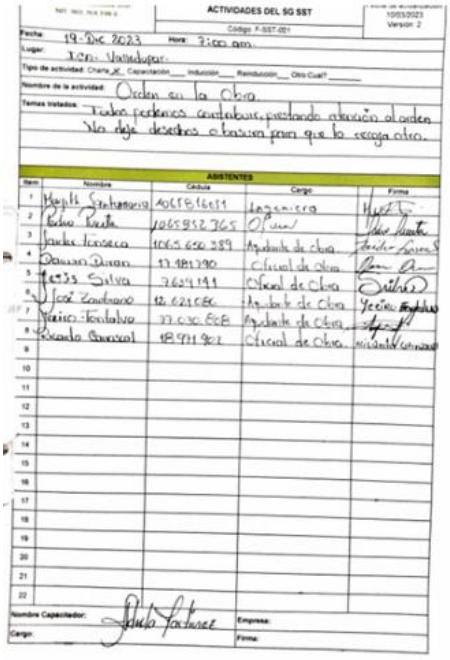

ACTIVIDADES DEL SG SST

Fecha: 19-Dic 2023 Hora: 7:00 am

Lugar: Ccto. Valledupar

Tipo de actividad: Charla X Capacitación ___ Inducción ___ Reinducción ___ Otro Cual? ___

Nombre de la actividad: Orden en la Obra.

Temas tratados: Todos pedemos contribuir, prestando atención al orden No deje desechos o basuras para que lo recoja otro.

ASISTENTES

Item	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
1	Hayth Santamaria	1065956911	Ingeniero	
2	Pedro Pinto	1065952365	Oficial	
3	Jaider Fonseca	1065650289	Ayudante de obra	
4	Damian Duran	77.181.790	Oficial de Obra	
5	Jesus Silva	7654141	Oficial de Obra	
6	José Contreras	12.621.681	Ayudante de Obra	
7	Mario Fontalvo	77.030.868	Ayudante de obra	
8	Ricardo Guerrero	18.971.902	Oficial de Obra	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nombre Capacitador: Adiela Martinez Empresa:

Cargo: Firma:

INSPECCIONES:

CONSORCIO ARAGON GTD
NIT: 901.764.198-6

PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS

FECHA: 10-03-2023 | CODIGO: SG- F-61 | VERSION: 003 | PAGINA: 1 DE 1

PERÍODO: DEL 18 Dic AL 23 de Dic DEL 2023.

PULIDORA N° 001

MARCA : Dewalt. MODELO:

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		ERCOLI		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LAS RPM (6.800)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA INSPECTOR HSE: Adiela Martinez

FUERA DE SERVICIO: SI ___ NO X

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6	PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS			
	FECHA: 10-03-2023	CODIGO: SG- F-61	VERSION: 003	PAGINA: 1 DE 1

PERÍODO: DEL 18 de Dic AL 23 de Dic DEL 2023.

PULIDORA N° 002

MARCA: Makita. MODELO:

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		ERCOLI		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LAS RPM (6.800)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA INSPECTOR HSE: Fabiola Martinez.

FUERA DE SERVICIO: SI ___ NO ✓

OBSERVACIONES: Equipo en buen estado, apto para su uso.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA:

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha de actualización: 10/03/2023
	Código: F-SST-066	Versión: 02


1. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN

MARQUE BAJO LA COLUMNA ESTADO, LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: Bueno=1 Regular=0,5 Malo=0 No aplica=1

COMPONENTE A EVALUAR	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO
FECHA DE INSPECCIÓN	21-Dic /2023.				
Ubicación:	Almacen.				
Extintor No	001-				
Fecha proxima recarga	Enero 2024				
Agente extintor:	Multipropósito_ Solkaflam _ CO2 X Agua _ Otro_	Multipropósito_ Solkaflam _ CO2_ Agua _ Otro_	Multipropósito_ Solkaflam _ CO2_ Agua _ Otro_	Multipropósito_ Solkaflam _ CO2_ Agua _ Otro_	Multipropósito_ Solkaflam _ CO2_ Agua _ Otro_
Clase de extintor:	ABC_ A_ BC_ K_	ABC_ A_ BC_ K_	ABC_ A_ BC_ K_	ABC_ A_ BC_ K_	ABC_ A_ BC_ K_
Capacidad:	10 Libras.				
Pasador de seguridad	Bueno				
Palanca de descarga	Bueno				
Manija de transporte	Bueno				
Indicador de presión (manómetro)	Bueno				
Cuerpo metálico (golpes, pintura)	Bueno				
Etiqueta con fecha de última y próxima recarga	Bueno				
Etiqueta de identificación y tipo de extintor	Bueno				
Boquilla	Bueno				
Manguera	Bueno				
Ubicación del extintor (visible)	Bueno				
Accesibilidad	Bueno				
Señalización	Bueno				
Soporte	Bueno.				
No total de hallazgos:					

2. OBSERVACIONES



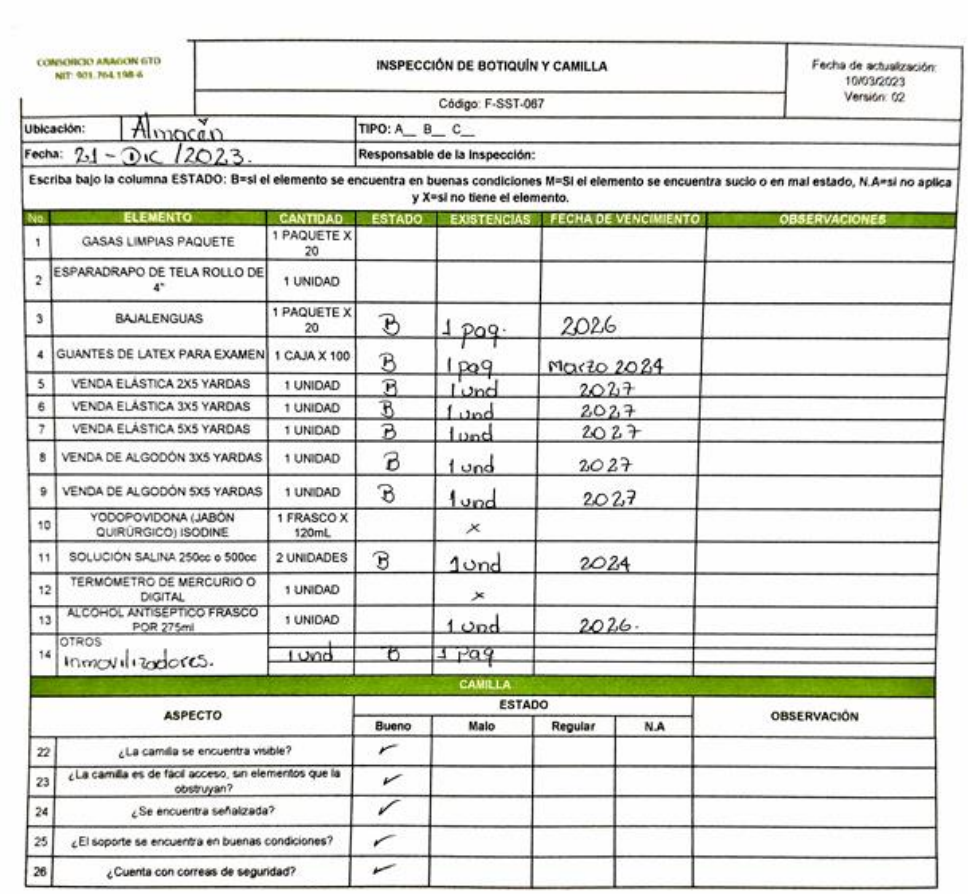

CONSORCIO ARAGON GTD
NIT: 901.764.198-6

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

Código: F-SST-067

Fecha de actualización: 10/03/2023
Versión: 02

Ubicación: Almacen — TIPO: A__ B__ C__

Fecha: 2-1 - Dic /2023. — Responsable de la inspección:

Escriba bajo la columna ESTADO: B=si el elemento se encuentra en buenas condiciones M=SI el elemento se encuentra sucio o en mal estado, N.A=si no aplica y X=si no tiene el elemento.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	EXISTENCIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	1 PAQUETE X 20				
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	1 UNIDAD				
3	BAJALENGUAS	1 PAQUETE X 20	B	1 paq.	2026	
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1 CAJA X 100	B	1 paq	Marzo 2024	
5	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
6	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
7	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) ISODINE	1 FRASCO X 120mL		x		
11	SOLUCIÓN SALINA 250cc o 500cc	2 UNIDADES	B	1 und	2024	
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 UNIDAD		x		
13	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275ml	1 UNIDAD		1 und	2026.	
14	OTROS Inmovilizadores.	1 und	B	1 paq		

CAMILLA

	ASPECTO	ESTADO				OBSERVACIÓN
		Bueno	Malo	Regular	N.A	
22	¿La camilla se encuentra visible?	✓				
23	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
24	¿Se encuentra señalizada?	✓				
25	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
26	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				

RELACIÓN DEL PERSONAL (INGRESO –EGRESO)


Control Ingreso de Personal Obras.

Datos Generales

Nombre Completo	CC	Contratista	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
RICHARD LOPEZ	77.170.914	CONSORCIO ARAGON	DIRECTOR DE OBRA	21/11/2023	6/12/2023
ALEX ADRIAN OLIVERO	18.972.629	CONSORCIO ARAGON	DIRECTOR DE OBRA	9/12/2023	
MARJITH SANTAMARÍA	1.065.816.051	CONSORCIO ARAGON	RESIDENTE DE OBRA	9/12/2023	
DANA CASTILLO	1.121.336.363	CONSORCIO ARAGON	RESIDENTE DE OBRA	21/11/2023	7/12/2023
ADIELA MARTINEZ	49.606.023	CONSORCIO ARAGON	SISOMA	2/11/2023	
JHON FREDI VALDERRAMA	80.226.043	EXTERNO	TÉCNICO ELÉCTRICO	21/11/2023	21/12/2023
ELKIN RODRIGUEZ	12.646.815	ROZAN	MAESTRO DE OBRA	2/11/2023	
PEDRO LUIS PUERTA	1.065.852.365	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	
DARWIN DURAN	17.481.790	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	
JESUS SILVA	7.639.141	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2013	
MARTIN ESCORCIA	84.049.181	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	27/11/2023	2/12/2023
HERMES GRANADOS	1.065.843.568	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	27/11/2023	27/11/2023
LUIS JESÚS CARRASCAL	1.065.849.356	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	4/12/2023	9/12/2023
RICARDO CARRASCAL	18.971.902	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	4/12/2023	22/12/2023
LUIS RAMIREZ	1.065.567.513	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	27/11/2023	4/12/2023
KAREN RODRIGUEZ	1.010.005.296	ROZAN	AUXI. ADMINISTRATIVA	2/11/2023	20/12/2023
FRANCISCO PUSHAINA	1.124.001.466	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
YEEIRO FONTALVO	77.030.808	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	22/12/2023
JOSE JAVIER BELEÑO	1.064.718.608	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	4/12/2023
JOSE MARIO MARTINEZ	1.065.564.629	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
LUIS ALBERTO BLANCHAR	1.065.650.702	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
JAIDER DE JESUS FONSECA	1.065.650.386	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	20/12/2023
JOSE LUIS ZAMBRANO	12.621.086	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	
ALEXANDER JAVIER BERNAL	7.574.730	MACROSUMINISTRO EXTERNO	OFICIAL DE OBRA	23/11/2023	
HEIDER CAMACHO	17.904.433	MACROSUMINISTRO EXTERNO	OFICIAL DE OBRA	23/11/2023	18/12/2023
JUAN CANTILLO	1.065.831.699	MACROSUMINISTRO EXTERNO	AUXILIAR DE OBRA	NUNCA INGRESÓ A OBRA	SE MANTUVO EN REGISTRO POR SOLICITA EXPLÍCITA DEL CONTRATISTA.

Dentro del personal relacionado se encuentra el señor Juan Cantillo, quien es parte de la empresa Macro suministros, siempre se mantuvo en planilla, en caso de ser requerido como apoyo en una jornada diferente a la laborada por el inspector, pero, este nunca ingresó a obra.

Cordialmente,



CONSORCIO ARAGON GTD
Nit. 901.764.198-6
GUSTAVO TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988
Representante Legal
