INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

INFORME SEMANAL No. 6

CONTRATO No. GGC-145-2023

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR"

PERÍODO: 25 al 29 de DICIEMBRE 2023

SUPERVISION: **ARQUITECTO CAMILO ANDRES HERNÁNDEZ ALFONSO**

DICIEMBRE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 3

1.1 FICHA TECNICA DEL CONTRATO 3

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 4

3. ALCANCES 5

3.1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O ZONAS INTERVENIDAS: 6

5. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO 10

5.1 PERSONAL OPERATIVO 10

6. VEHICULOS Y/O EQUIPOS 10

7. REGISTRO FOTÓGRAFICO: 11

8. INFORME SST: 20

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. GGC-145 -2023, en su etapa de obra presenta en siguiente contractual:

1.1 FICHA TECNICA DE OBRA

CONTRATO No. GGC-145-2023	**:** 24 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA	**:** CONSORCIO ARAGON GTD
CONTRATANTE	**:** INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -
INTERVENTOR	: CONSORCIO GINGNOVA
SUPERVISOR	: ARQ. CAMILO ANDRÉS HERNÁNDEZ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: $ 421.702.376,15
ACTA DE INICIO	: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No	: N/A
PLAZO INICIAL	: DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR.**	

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Valledupar está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los ríos Cesar y Guatapurí, en la Costa Caribe colombiana.

Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. La ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, siendo la altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m.

Extensión total: 4.493 Km2
Extensión área urbana: El casco urbano tiene una longitud norte-sur de 8.3 km y este-oeste de 6.2 km


Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): la ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m. al norte y 150 m. a sur, siendo la altitud media de 168 m.

Temperatura media: la temperatura Media Anual es de 28,4 ºC, con máximas y mínimas de 22ºC y 34ºC respectivamente, la temperatura máxima histórica registrada es de 41.5ºC y la mínima de 16ºC. El mes más caluroso es abril con un promedio de 30ºC y el más fresco octubre.

Como lugar de ejecución del objeto del contrato se ha establecido el sitio de la obra en la cabecera municipal específicamente en el barrio 12 de Octubre en la Calle 22 número 14-30.





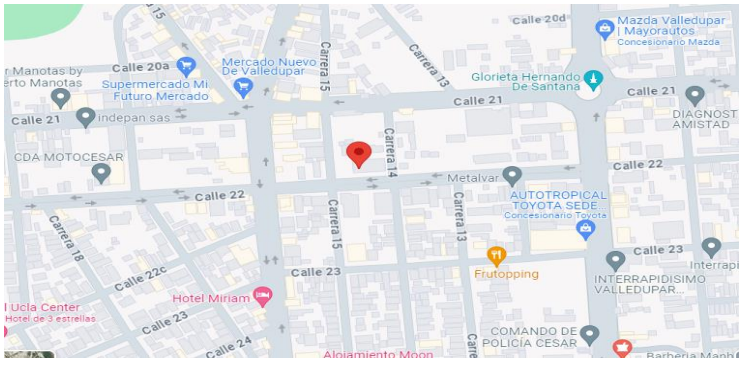

3. ALCANCES

La valoración de actividades a ejecutar y áreas a intervenir en este establecimiento, se encuentran enmarcadas dentro de los alcances contenidos en el anexo técnico según lo siguiente:

La actividades y cantidades contractuales iniciales para ejecución dentro de la seccional Valledupar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1,00	PRELIMINARES	M2	939,51
2.00	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ML	119,13
3,00	MAMPOSTERIA	M2	101,70
4,00	DIVISIONES DE MUROS	ML/M2	40,00
5,00	PISOS	ML/M2	443,00
6,00	ENCHAPE	ML/M2	119,00
7,00	CIELO RASO	M2	88,00
8,00	PUERTAS	UND	8,00
9,00	APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES	UND	53,00
10,00	PAÑETE ESTUCO Y PINTURA	M2	325.63
11,00	MESONES	ML	48,13
12,00	VENTANAS	M2	44,51
14,00	MUEBLES	UND	15,00
15,00	CUBIERTAS	ML/M2	1530,74
16,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	ML/UND	224,00
17,00	VARIOS	M2	1342,00
19,00	APARATOS ELECTRICOS	ML/UND	209,50

3.1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

% EJECUTADO EN LA SEMANA	13.17%
VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 55.538.729,7
% EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 363.240.117,46
% DE ADELANTADO	0.00%
VALOR DEL % ADELANTADO	$ 0.00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	**$ 421.702.376,15**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1 (COBRADO)		**$ 84.340.475,23**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2 (COBRADO)		**$ 210.851.188**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		**$ 68.048.454,22**
SALDO POR COBRAR		**$ 0,00**
SUMAS	**$ 421.702.376,15**	**$ 363.240.117,46**

PORCENTAJE DE EJECUCION FASE VI **100,00 %**

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O ZONAS INTERVENIDAS:

Frentes Intervenidos:

- Laboratorio Mosca de la Fruta
- Respel
- Depósitos
- Primer Piso Edificio de Oficinas
- Exteriores
- Segundo Piso Edificio de Oficinas
- Cuarto Planta Eléctrica
- Laboratorio Semillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA MOSCA DE LA FRUTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
9,0	**APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES**		
9,1	suministro e instalación de poceta, incluye instalación en mesón y conexión de desagüe, grifería y todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	1,00
10,0	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,1	Suministro y aplicación de pañete 1:4 impermeabilizado, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	5,3
10,2	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	5,3

11,0	**MESONES**		
11,1	Suministro e instalación de mesón en quarstone blanco polar, incluye apertura para poceta y aparatos sanitario, salpicadero 10cm y faldón 10cm	ML	0,32
17	**VARIOS**		
17,2	Aseo grueso y fijo para entrega de áreas intervenidas o afectadas	M2	40,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA RESPEL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5	**PISOS**		
5,3	Suministro e instalación de pintura epoxica tráfico pesado para piso	M2	6,40
12	**VENTANAS**		
12,1	Instalación y suministro de malla tipo angeo para protección en ventanas y puertas, incluye perfil perimetral	M2	4,12
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		
10,2	Elaboración e instalación rejilla metálica (marco y contra marco en ángulo de 3/161 1/2") para cárcamo en platina de 1 x 3/16", incluye instalación en cárcamo de concreto	M2	8,54
17	**VARIOS**		
17,2	Aseo grueso y fijo para entrega de áreas intervenidas o afectadas	M2	250,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA DEPOSITOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,1	suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	23,16
17	**VARIOS**		
17,2	Aseo grueso y fijo para entrega de áreas intervenidas o afectadas	M2	90,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA OFICINAS PRIMER PISO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Demolición de mediacaña en granito pulido Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	ML	2,36

4	**DIVISIONES DE MUROS**		
4,2	Suministro e instalación de muro en drywall 1cm base 9, incluye reformas, instalación y acabado	M2	2,10
6	**ENCHAPE**		
6,2	Suministro e instalación de mediacaña en granito pulido de 10 cm de espesor, incluye dilatación, pulida, brillado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	17,8
9	**APARATOS SANITARIOS E INSCRUSTACIONES**		
9,1	instalación de aparatos sanitarios, incluye suministro de acoples y sifones para su correcto funcionamiento	UND	4
9,2	suministro e instalación de rejilla rectangular en aluminio 3 x 2"	UND	2
9,3	suministro e instalación de griferia para lavamanos, incluye conexiones hidráulicas, y todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	2
9,4	suministro e instalación de ORINAL, incluye conexiones hidráulicas, conexiones sanitarias y todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	1
9,5	suministro e instalación de TAPAS Y ARBOL para sanitario, incluye todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	2
9,6	suministro e instalación de tapa registro, incluye resane interno, pintura blanca interna y todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	2
9,7	recuperación de puerta en acero inoxidable, lijada y pintada; engrase y mantenimiento de marco.	M2	8,14
10,0	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,1	suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	510,18
10,2	suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para techos, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	160,40
17	**VARIOS**		
17,2	Aseo grueso y fijo para entrega de áreas intervenidas o afectadas	M2	358,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA OFICINAS SEGUNDO PISO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINAR**		
1,3	desinstalación de aparatos sanitarios, incluye revisión y destaponamiento de redes	UND	4,00
9	**APARATOS SANITARIOS E INSCRUSTACIONES**		
9,2	instalación de aparatos sanitarios, incluye suministro de acoples y sifones para su correcto funcionamiento	UND	4,00
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,1	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	121,9

17	**VARIOS**		
17,2	Aseo grueso y fijo para entrega de áreas intervenidas o afectadas	M2	120,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA PLANTA ELECTRICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
17	**VARIOS**		
17,2	poyo de 20x15 cm en concreto, incluye suministro de material, anclajes a placa y acabado quemado para pintura. (tabique antiderrame)	ML	16,00
17,3	pintura señalética para piso, según aplique normativa	M2	47,30
17,4	Aseo grueso y fijo para entrega de áreas intervenidas o afectadas	M2	100,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA LABORATORIO SEMILLAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
9	**APARATOS SANITARIOS E INSCRUSTACIONES**		
9,1	Instalación de aparatos sanitarios, incluye suministro de acoples y sifones para su correcto funcionamiento	UND	4
10	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA**		
10,2	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color Blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	2,03

5. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO

- **DIRECTOR DE OBRA:** Ingeniero Alex Oliveros
- **RESIDENTE DE OBRA:** Arquitecta Sharon Danay Chaparro Secue
- **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL:** Adíela Martínez

5.1 PERSONAL OPERATIVO

- **MAESTRO DE OBRA:** Elkin Rodríguez
- **AYUDANTES:**

1. Jose Avila
2. Martin Barrios
3. Jose Beleño
4. Pedro Puerta
5. Jesús Silva

6. VEHICULOS Y/O EQUIPOS:

Mezcladora
Pulidora
Taladro Percutor
Herramienta Menor


7. REGISTRO FOTÓGRAFICO:

ANTES	DESPUES
	
	








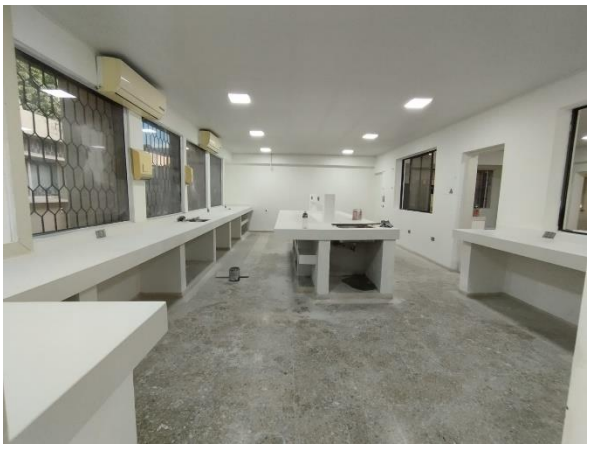



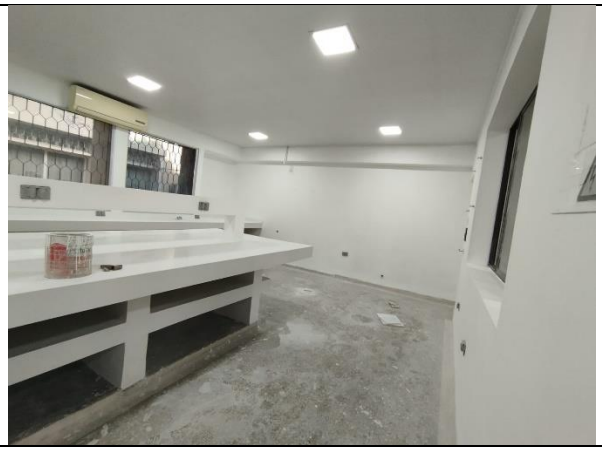

CALLE 99 No. 49-38 OF 509 TEL: 601 – 7458097 BOGOTA, D.C.
g.torres.d@hotmail.com

























CALLE 99 No. 49-38 OF 509 TEL: 601 – 7458097 BOGOTA, D.C.
g.torres.d@hotmail.com

8. N_2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ICA VALLEDUPAR

Dentro del entorno laboral, los trabajadores se enfrentan a múltiples condiciones que repercuten en la salud del trabajador de manera positiva o negativa. El trabajo puede interactúan con diversas condiciones que pueden influir de manera positiva o negativa en su salud. Por ende, Consorcio Aragón GTD quiere convertir esas influencias de manera positiva, creando medidas y utilizando estrategias que permitan la preservación de la salud y disminuir la probabilidad de un accidente o peor aún, una enfermedad laboral.

DEFINICIONES:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: conjunto de medidas, políticas, procedimientos y condiciones diseñados y aplicados en un entorno laboral para proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores. Este concepto busca prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y promover el bienestar general de quienes desempeñan sus labores en un lugar determinado.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso que causa una lesión o alteración en la salud del trabajador por causa o con ocasión del trabajo que realiza.

ENFERMEDAD LABORAL: Es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

EXPOSICIÓN: Situación de exposición a un peligro que se presenta durante un tiempo determinado durante la jornada laboral.

PELIGRO: Todo acto o suceso que tiene potencial de hacer daño**.**

RIESGO: Es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el peligro.

PROBABILIDAD. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que ha criterio de la organización por su baja frecuencia de ejecución la determine como no rutinaria.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Aseo
Retiro de Señalizaciones y equipos.

RELACIÓN DEL PERSONAL:

En la ejecución de la obra, en la semana comprendida entre el 26 de diciembre al 29 de diciembre fue el que se relaciona a continuación:

Director de obra (1), Ingeniera Residente (1), Maestro de obra (1), Inspector Siso (1), residentes Interventoría (2) Oficiales de Obra (2) Ayudantes de Obra (2)

El proyecto **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR"** Nos encontramos en entrega. Se han logrado los objetivos propuestos en las fechas establecidas.

CHARLAS DE SEGURIDAD:

Durante la semana 6, ya en los finales, la última reunión:
No hubo charla, se elevó una oración de agradecimiento a los trabajadores, al maestro, al señor de vigilancia y los pocos que aún nos encontramos en el proceso de culminación, por su dedicación, trabajo y esfuerzo se lograron los objetivo en común, destacando que el compromiso fue tanto que llegamos a la meta con estadísticas en cero.

ORDEN Y ASEO:

El orden y el aseo de esta semana, es bajo la premisa de entregar unas instalaciones locativas sin afectación, para aquellas que nos fueron prestadas por parte de la institución y terminadas aquellas áreas intervenidas.









PUNTO ECOLÓGICO:

Este sistema de gestión de residuos tiene como objetivo fomentar y facilitar la separación adecuada de los desechos en diferentes categorías para su posterior reciclaje o tratamiento adecuado.

Dado que estamos en final de obra, procedemos a retirar todos los equipos y artículos dispuesto en diferentes puntos de la seccional, para realizar una entrega de obra limpia y con aquellos espacios utilizados entregarlos de la manera posible.





EQUIPOS DE EMERGENCIAS:

Estos equipos, están diseñados para ayudar en la gestión y resolución de emergencias, minimizando sus efectos y protegiendo a las personas, propiedades y el medio ambiente.






Estos equipos, también se disponen dentro de almacén y se retira señalización de las paredes.



AUSENTISMO LABORAL:


El ausentismo laboral se refiere a la ausencia no planificada o la falta de un empleado en su lugar de trabajo durante el horario laboral. Puede ser resultado de diversas razones, como enfermedad, lesiones, emergencias familiares, citas médicas, estrés, agotamiento, falta de motivación, entre otros motivos personales o profesionales.

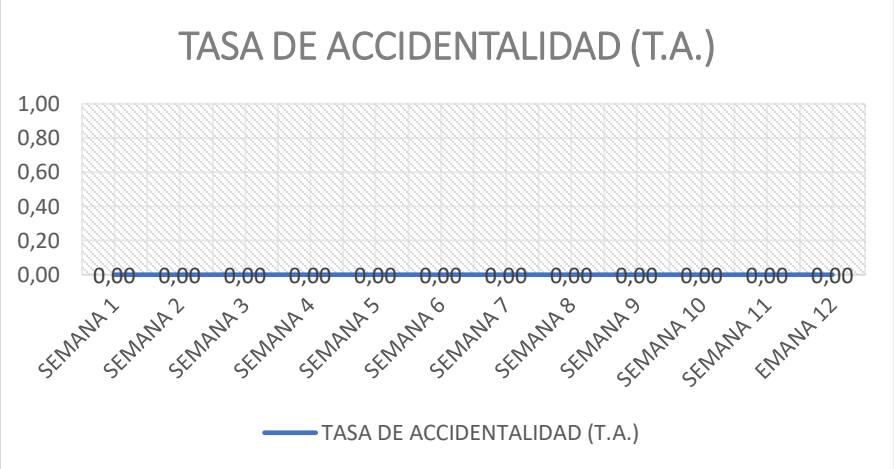

ACCIDENTES LABORALES:

Un accidente de trabajo se define como un evento inesperado, repentino y no deseado que ocurre durante el ejercicio del trabajo o como consecuencia directa del mismo, y que causa una lesión física, enfermedad ocupacional, daño psicológico o la muerte del trabajador.


¡Terminando, actividades cero accidentes!

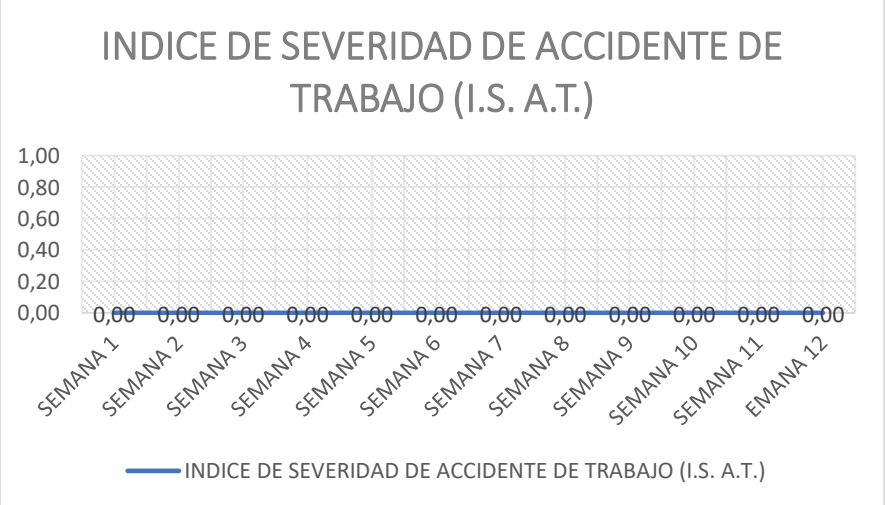

TASA DE ACCIDENTABILIDAD:


La tasa de accidentalidad es un indicador que se utiliza para medir la frecuencia de los accidentes laborales dentro de un entorno de trabajo específico durante un período determinado.

Estamos en etapa final. Terminando actividades sin un solo accidente. ¡Qué equipo de trabajo!

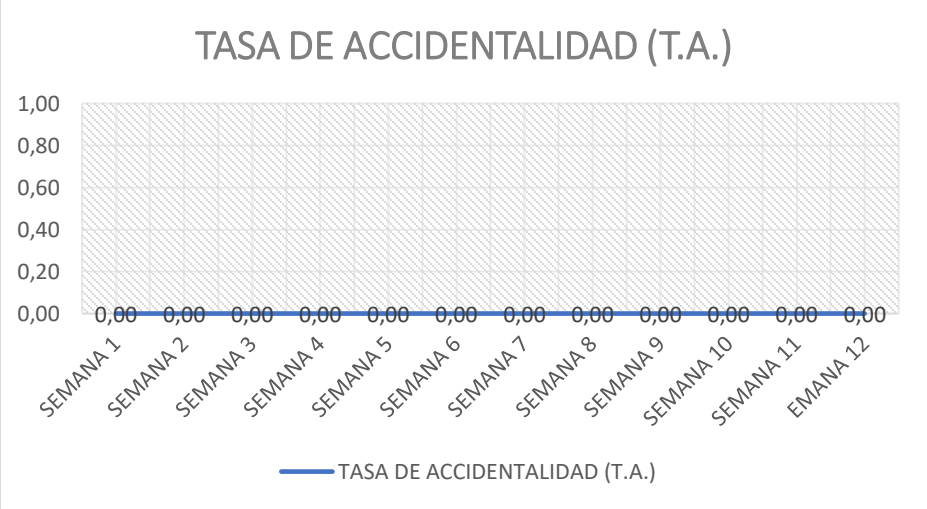

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD:

Fue un tiempo de muchas experiencias, pero hoy podemos asegurar que cuando se trabaja en equipo, la carga se hace más ligera, se logran objetivos y llegamos a la meta sin nada que lamentar; todo, gracias al compromiso dispuesto por parte de todos los involucrados.

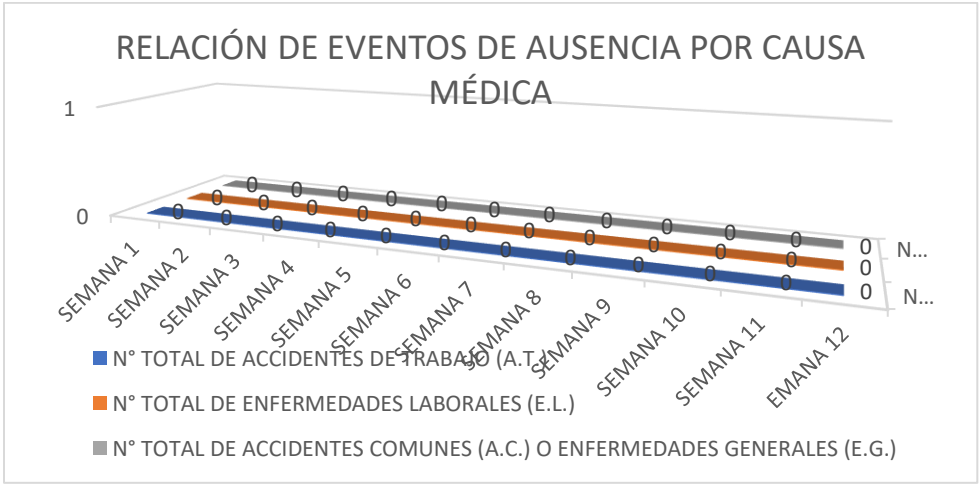

HORAS HOMBRE TRABAJADAS:

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6	EPORTE DE HORAS HOMBRE TRABAJADA

NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	HORAS TRABAJADAS POR DÍA							TOTAL HORAS SEMANA
			L	M	M	J	V	S	D	
ALEX OLIVEROS	18972629	Director de obra	0	8	8	8	8	0	0	32
MARJITH SANTAMARÍA	1065816051	Residente de obra	0	8	8	8	8	0	0	32
ELKIN RODRIGUEZ	12.646.815	Maestro de obra	0	8	8	8	8	0	0	32
ADIELA MARTINEZ	49.606.023	Inspector Siso	0	5	5	5	5	0	0	20
PEDRO LUIS PUERTA	1.065.852.365	aux de obra	0	8	8	8	8	0	0	32
DARWIN DURAN	17.481.790	Oficial de obra	0	8	8	8	8	0	0	32
JESUS ALBERTO SILVA	7.639.141	Oficial de obra	0	8	8	8	8	0	0	32
JOSE LUIS ZAMBRANO	12.621.086	aux de obra	0	8	8	8	8	0	0	32
ALEXANDER JAVIER BERNAL	7.574.730	soldador	0	8	8	8	8	0	0	32
HEIDER CAMACHO	17.904.433	soldador	0	8	8	8	8	0	0	32
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
										0
									TOTAL HORAS SEMANAL	308
									TOTAL HORAS MENSUAL	308

INSPECCIONES:



CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6

PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS

FECHA: 10-03-2023 | CODIGO: SG- F-61 | VERSION: 003 | PAGINA: 1 DE 1

PERÍODO: DEL 26 de Dic AL 29 de Dic DEL 2023

PULIDORA N° 001

MARCA: Dewalt. MODELO:


DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LAS RPM (6.600)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL DISCO			✓		✓		✓		✓					

FIRMA INSPECTOR HSE: Adiela Martinez.

FUERA DE SERVICIO: SI | NO ✓

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA:

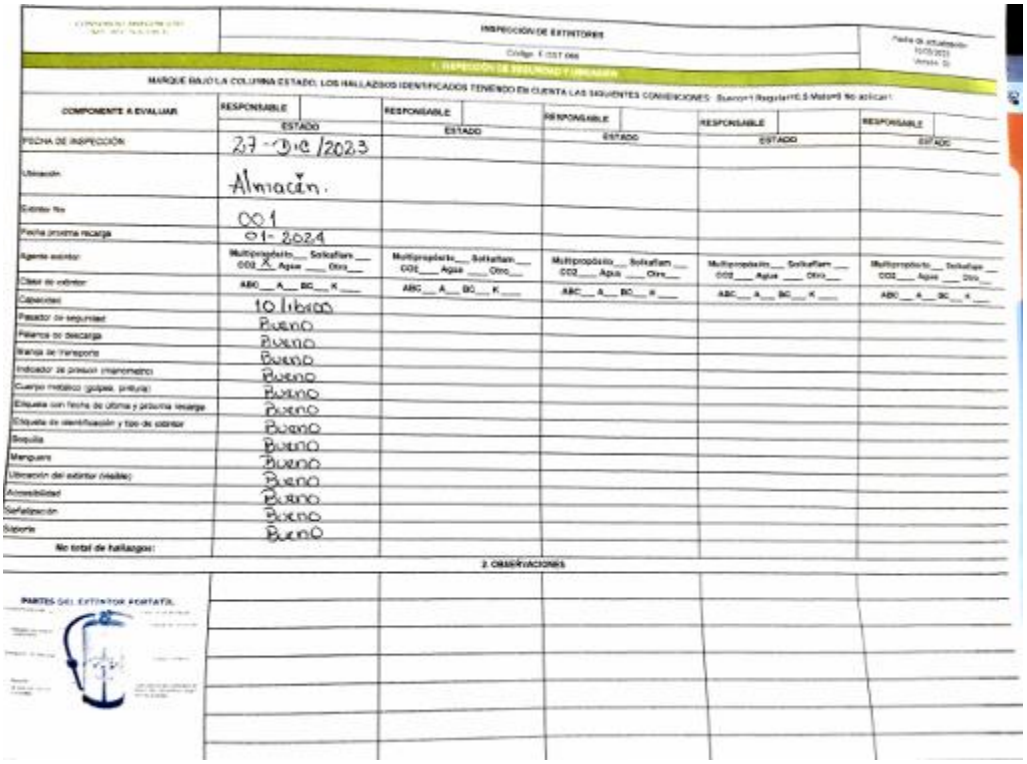

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: F-SST-066

Fecha de actualización: 10/03/2023

Versión: 02


1. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

MARQUE BAJO LA COLUMNA ESTADO: LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: Bueno=B Regular=R M=Malo=M No aplica=A

COMPONENTE A EVALUAR	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO	RESPONSABLE / ESTADO
FECHA DE INSPECCIÓN	27-Dic/2023				
Ubicación	Almacén.				
Extintor No.	001				
Fecha próxima recarga	01-2024				
Agente extintor	Multipropósito___ Solkaflam___ CO2 X Agua___ Otro___	Multipropósito___ Solkaflam___ CO2___ Agua___ Otro___	Multipropósito___ Solkaflam___ CO2___ Agua___ Otro___	Multipropósito___ Solkaflam___ CO2___ Agua___ Otro___	Multipropósito___ Solkaflam___ CO2___ Agua___ Otro___
Clase de extintor	ABC__ A__ BC__ K__	ABC__ A__ BC__ K__	ABC__ A__ BC__ K__	ABC__ A__ BC__ K__	ABC__ A__ BC__ K__
Capacidad	10 libras				
Pasador de seguridad	Bueno				
Palanca de descarga	Bueno				
Manija de transporte	Bueno				
Indicador de presión (manómetro)	Bueno				
Cuerpo metálico (golpes, pintura)	Bueno				
Etiqueta con fecha de última y próxima recarga	Bueno				
Etiqueta de identificación y tipo de extintor	Bueno				
Boquilla	Bueno				
Manguera	Bueno				
Ubicación del extintor (visible)	Bueno				
Accesibilidad	Bueno				
Señalización	Bueno				
Soporte	Bueno				
No total de hallazgos:					

2. OBSERVACIONES

PARTES DEL EXTINTOR PORTATIL

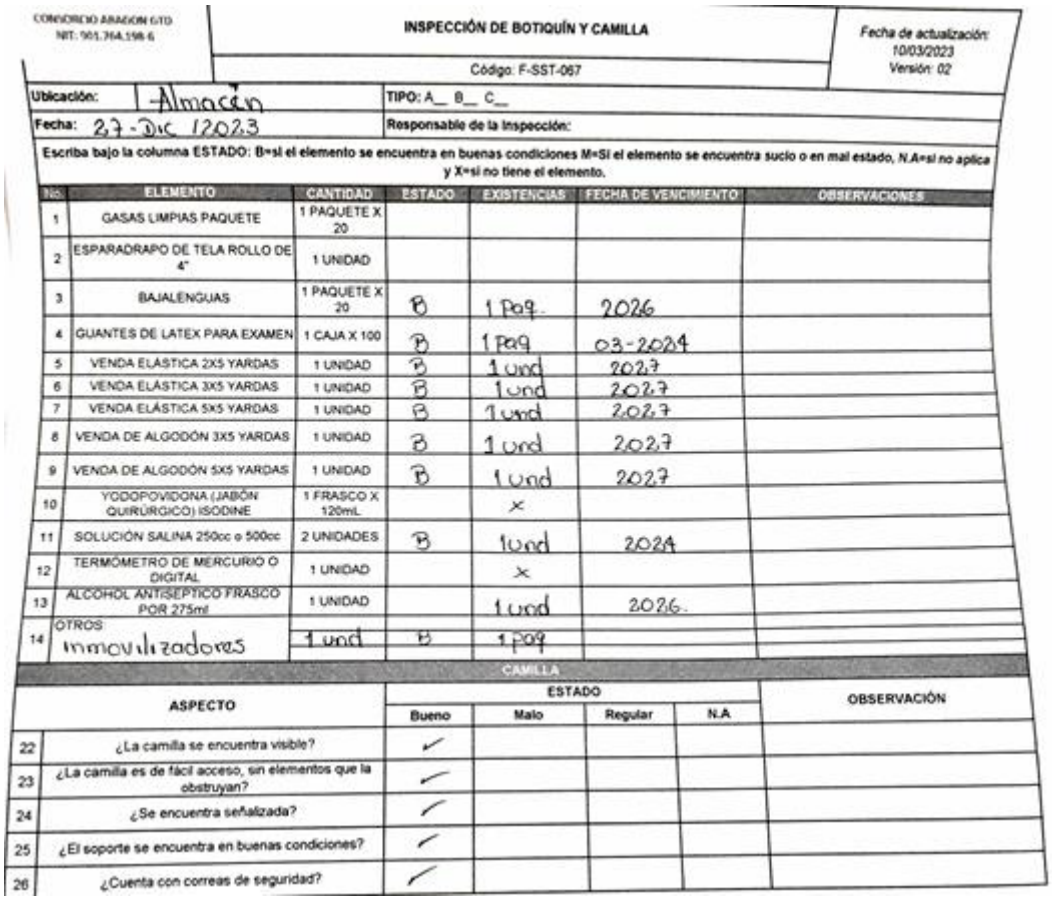

CONSORCIO ARAGON GTD
NIT: 901.764.198-6

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

Código: F-SST-067

Fecha de actualización: 10/03/2023
Versión: 02

Ubicación: Almacén

Fecha: 27-Dic /2023

TIPO: A__ B__ C__

Responsable de la inspección:

Escriba bajo la columna ESTADO: B=si el elemento se encuentra en buenas condiciones M=Si el elemento se encuentra sucio o en mal estado, N.A=si no aplica y X=si no tiene el elemento.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	EXISTENCIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	1 PAQUETE X 20				
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	1 UNIDAD				
3	BAJALENGUAS	1 PAQUETE X 20	B	1 Paq.	2026	
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1 CAJA X 100	B	1 Paq	03-2024	
5	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
6	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
7	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2027	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) ISODINE	1 FRASCO X 120mL		X		
11	SOLUCIÓN SALINA 250cc o 500cc	2 UNIDADES	B	1 und	2024	
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 UNIDAD		X		
13	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275ml	1 UNIDAD		1 und	2026.	
14	OTROS: inmovilizadores	1 und	B	1 paq		

CAMILLA

	ASPECTO	ESTADO: Bueno	Malo	Regular	N.A	OBSERVACIÓN
22	¿La camilla se encuentra visible?	✓				
23	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
24	¿Se encuentra señalizada?	✓				
25	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
26	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				

RELACIÓN DEL PERSONAL (INGRESO –EGRESO)

Hoy hacemos una relación de personal que se encuentra realizando actividades menores (detalles) para la entrega formal.

Control Ingreso de Personal Obras.

Datos Generales					
Nombre Completo	CC	Contratista	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
RICHARD LOPEZ	77.170.914	CONSORCIO ARAGON	DIRECTOR DE OBRA	21/11/2023	6/12/2023
ALEX ADRIAN OLIVERO	18.972.629	CONSORCIO ARAGON	DIRECTOR DE OBRA	9/12/2023	
MARJITH SANTAMARÍA	1.065.816.051	CONSORCIO ARAGON	RESIDENTE DE OBRA	9/12/2023	
DANA CASTILLO	1.121.336.363	CONSORCIO ARAGON	RESIDENTE DE OBRA	21/11/2023	7/12/2023
ADIELA MARTINEZ	49.606.023	CONSORCIO ARAGON	SISOMA	2/11/2023	
JHON FREDI VALDERRAMA	80.226.043	EXTERNO	TÉCNICO ELÉCTRICO	21/11/2023	21/12/2023
ELKIN RODRIGUEZ	12.646.815	ROZAN	MAESTRO DE OBRA	2/11/2023	
PEDRO LUIS PUERTA	1.065.852.365	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	
DARWIN DURAN	17.481.790	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	
JESUS SILVA	7.639.141	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2013	
MARTIN ESCORCIA	84.049.181	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	27/11/2023	2/12/2023
HERMES GRANADOS	1.065.843.568	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	27/11/2023	27/11/2023
LUIS JESÚS CARRASCAL	1.065.849.356	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	4/12/2023	9/12/2023
RICARDO CARRASCAL	18.971.902	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	4/12/2023	22/12/2023
LUIS RAMIREZ	1.065.567.513	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	27/11/2023	4/12/2023
KAREN RODRIGUEZ	1.010.005.296	ROZAN	AUXI. ADMINISTRATIVA	2/11/2023	20/12/2023
FRANCISCO PUSHAINA	1.124.001.466	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
YEEIRO FONTALVO	77.030.808	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	22/12/2023
JOSE JAVIER BELEÑO	1.064.718.608	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	4/12/2023
JOSE MARIO MARTINEZ	1.065.564.629	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
LUIS ALBERTO BLANCHAR	1.065.650.702	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
JAIDER DE JESUS FONSECA	1.065.650.386	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	20/12/2023
JOSE LUIS ZAMBRANO	12.621.086	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	
ALEXANDER JAVIER BERNAL	7.574.730	MACROSUMINISTRO EXTERNO	OFICIAL DE OBRA	23/11/2023	
HEIDER CAMACHO	17.904.433	MACROSUMINISTRO EXTERNO	OFICIAL DE OBRA	23/11/2023	
JUAN CANTILLO	1.065.831.699	MACROSUMINISTRO EXTERNO	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023


De acuerdo con el informe técnico 6 de avance de obras, del periodo transcurrido del 23 de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2023, se presenta un avance físico ejecutado del 100,00%, interviniéndose las actividades que cubren las áreas, depósitos, respel, mosca de la fruta, planta eléctrica, laboratorio semillas y oficinas primer y segundo piso.

El contratista en este periodo correspondiente desde el 23 de diciembre del 2023 al 29 de diciembre del 2023 da por realizadas y finalizadas las actividades, logrando cumplir con los compromisos pactados dentro del contrato.

La finalización exitosa del proyecto de construcción ha sido el resultado de la colaboración, dedicación y esfuerzo conjunto de todo el equipo involucrado. A lo largo de este proceso, hemos logrado cumplir con los objetivos establecidos, entregando una estructura de alta calidad dentro del plazo acordado.

Si bien enfrentamos desafíos predecibles e imprevistos durante el camino, pudimos superarlos gracias a la planificación detallada, la gestión eficiente de recursos y la resolución creativa de problemas.

Cordialmente,



CONSORCIO ARAGON GTD
Nit. 901.764.198-6
GUSTAVO TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988
Representante Legal
