FUNDACION
Vida Nueva

Santiago de Cali, 16 de diciembre de 2019

Ingeniero
FERNANDO PADILLA
interventor
Secretaria de Deporte y recreación
Alcaldía de Santiago de Cali
Ciudad


Asunto.: Solicitud Prorroga contrato No. 4146.0.26.1.5242.2019

Cordial saludo,

Me permito remitir a esta interventoría las causa por las cuales es imposible entregar la obra del asunto en los tiempos contractuales:

- Al realizar la visita al sitio de la obra se pudo observar que las condiciones topográficas de la zona impedían el desarrollo normal de la obra ya que la pendiente es muy alta y el acarreo de materiales se dificulta debido a la temporada de lluvias, del cual se anexan los soportes del IDEAM con las precipitaciones de esta época.

Precipitación de diciembre de 2019
Estación APTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN [26075040]
CALI - VALLE DEL CAUCA | 970 m.s.n.m.

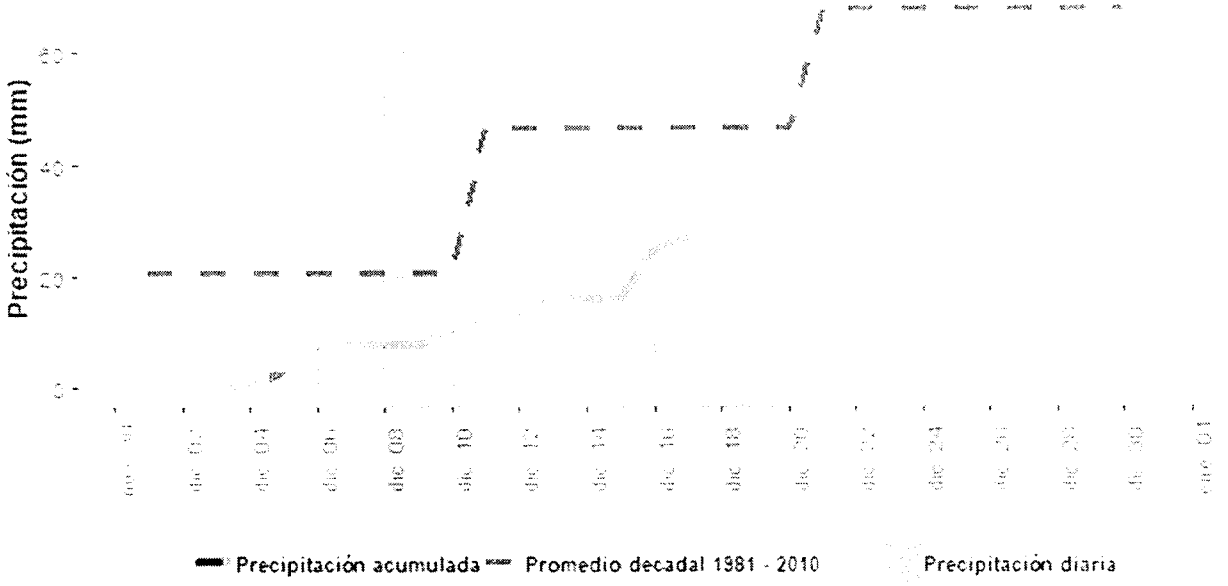

fvidanueva1@gmail.com
Cll 10 # 3-23 LC 108
Cali, Colombia

FUNDACION
Vida Nueva

- Una vez terminada el área en concreto donde se ubican los equipos biosaludables, se procede a instalar el pavimento de seguridad, dicho pavimento requiere para su instalación un fraguado de 28 días, así el proveedor garantiza la estabilidad y calidad de el material; posteriormente se instala el equipo biosaludable correspondiente y se podría hacer a entrega a la comunidad del parque.

En este orden de ideas, para poder realizar las actividades correspondientes no es suficiente el tiempo se **solicita una prorroga de 45 días** para poder hacer entrega de esta zona.

ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ
Ingeniera De Proyectos
FUNDACION VIDA NUEVA

fvidanueva1@gmail.com
Cll 10 # 3-23 LC 108
Cali, Colombia
