Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	12	2023	al	19	1	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 692.999.995	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 693.211.736	Número CDP	3092 -2023	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
			Valor RP	$ 692.999.995	Número RP	9140 -2023	Fecha RP	13/02/2023		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	14		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Valor Total	$ 692.999.995							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 692.999.995							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial +	$ 692.999.995							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	14	**Valor Total**	$ 692.999.995							

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	12	2023	al	19	1	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 692.999.995	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	14

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	12	2023	al	19	1	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1. 20 de feb al 19 de marzo 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
2. 20 de marzo al 19 de abril 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
3. 20 de abril al 19 de mayo 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
4. 20 de mayo al 19 de junio 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
5. 20 de junio al 19 de julio 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
6. 20 de julio al 19 de agosto 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
7. 20 de agosto al 19 de septiembre	13 de diciembre 2023	24.254.998	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
8. 20 de septiembre al 19 del octubre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
9. 20 de octubre al 19 de noviembre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Mensual 1	24.254.999	OP 23296 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
Mensual 2	24.254.999	OP 23298 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
Mensual 3	24.254.999	OP 23672 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
Mensual 4	24.254.999	OP 23671 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
Mensual 5	24.254.999	OP-23971 (27-10-2023)	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
Mensual 6	24.254.999	OP-23968 (25-10-2023)	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
Mensual 7	24.254.998	OP-24558 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
Mensual 8	24.254.999	OP-24560 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
Mensual 9	24.254.999	OP-24561 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
	-		
TOTALES	**218.294.990**		

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	12	2023	al	19	1	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	20/04/2025	9/03/2023	138.599.999
Pago de salarios			20/02/2023	20/04/2027	9/03/2023	34.650.000
Calidad del servicio			20/02/2023	20/042027	9/03/2023	138.599.999
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	20/04/2024	9/03/2023	232.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato						
Pago de salarios						
Calidad del servicio						
Responsabilidad civil extra contractual						

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Período del Informe:	20	12	2023	al	19	1	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el período)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el período)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual:									
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X
Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	12	2023	al	19	1	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual:									
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

Resumen del desarrollo del contrato

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2023 al 19 de enero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo primer mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 79% del tiempo de ejecución del contrato. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y la aprobación del cronograma del plan de contingencia y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría :62.50% Avance Real Consultoría 28.90%.

La interventoría informa "que los avances presentados durante el periodo del informe son poco significativos dada la época de ejecución, en donde no se presentaron aprobaciones adicionales a los documentos y productos remitidos por la consultoría.

Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.
Resumen financiero:

Técnicos	29%	**Técnico**	29%
Financieros consultoría	10%	**Financieros Interventoría**	32%

Se anexa el informe de supervisión correspondiente

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	12	2023	al	19	1	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio Garcia García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	**26**	**1**	**2024**

Firma

Pilar del Rocio Garcia Garcia
Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado): Sin personal Asignado

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

Fecha de elaboración del informe	26 de enero de 2024
Periodo de seguimiento	20 de diciembre de 2023 al 19 de Enero de 2024
Fecha de inicio	20 de febrero de 2023
Fecha de terminación	19 de abril de 2024
Valor del Contrato	$ 692.999.995
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE
Nombre de contratista	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Nombre del Supervisor	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses

Avance


(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2023 al 19 de enero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo primer mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 79% del tiempo de ejecución del contrato. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y la aprobación del cronograma del plan de contingencia y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría :62.50% Avance Real Consultoría 28.90%.

La interventoría informa "*que los avances presentados durante el periodo del informe son poco significativos dada la época de ejecución, en donde no se presentaron aprobaciones adicionales a los documentos y productos remitidos por la consultoría.* "

Figura 4-1 Avance real vs programado.

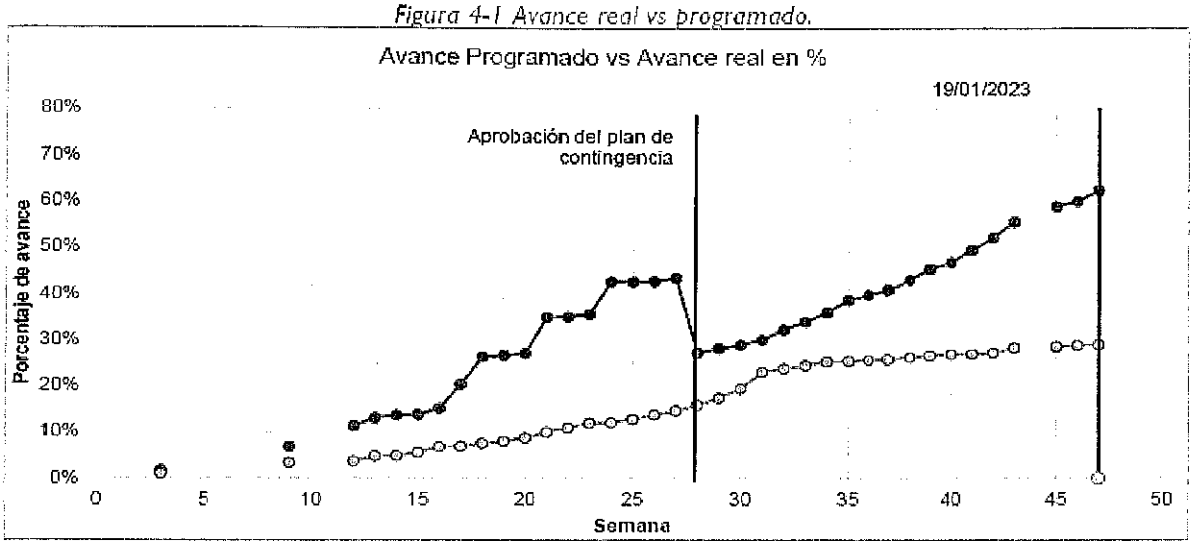

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente SAS

Técnicos	29%	**Técnico**	29%
Financieros consultoría	10%	**Financieros Interventoría**	32%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Fecha	Actividad	Soporte
15/12/2023	Respuesta de la entidad al derecho de petición radicado por la consultoría (presuntas controversias)	Comunicación 2023EE25297 RO-143045
19/12/2023	Solicitud de segundo incumplimiento por parte de interventoría	Comunicación 2023ER28619
19/12/2023	Reunión Técnica Componente Hidrológico mar 19 de dic de 2023 7:30am - 8:30am	Acta
21/12/2023	Solicitud Suspensión al contrato de consultoría No. FONDIGER010-2023 por un término de treinta (30) días calendario	Comunicación 2023ER28870
22/12/2023	Remisión de la solicitud del segundo incumplimiento a la oficina jurídica	Comunicación 2023IE6248
26/12/2023	Respuesta de interventoría al oficio RO-143045. Radicado IDIGER 2023ER27205 – Derecho de petición contrato FONDIGER 010-2023, de la posición de interventoría sobre las presuntas controversias	Comunicación - 2023ER28952
26/12/2023	Derecho de Petición radicado por la consultoría y se reiterar la suspensión	Comunicación 2023ER28945 – 2023ER29123

26/12/2023	Remisión del informe semanal interventoría del 4 al 10 de diciembre de 2023	2023ER28951
26/12/2023	Respuesta de la entidad a los radicado 2023ER27875 - 2023ER28071 Solicitud información de Estaciones de bombeo ubicadas en Río Tunjuelo	Comunicación RO-143205 - 2023EE25627
27/12/2023	COMITÉ TÉCNICO RIO TUNJUELO - VIRTUAL mié 27 de dic de 2023 2:30pm - 4pm	Acta
29/12/2023	Remisión del informe semanal del 18 al 24 de diciembre de 2023	Comunicación 2024ER10
28/12/2023	Respuesta de la entidad al radicado IDIGER 2023ER28870 - Solicitud de Suspensión - Donde se da claridad a las controversias y se da clariada a la no viabilidad de la suspensión	Comunicación RO-143218 2023EE25811
29/12/2023	Continuidad de Audiencia incumplimiento contrato FONDIGER-010 de 2023 (póliza No. 14-44-101175222)	Acta
2/01/2024	Solicitud a la interventoría Matriz Observaciones Metodologías - Estudio Río Tunjuelo	Correo electrónico
3/01/2024	Respuesta de la entidad al radicado IDIGER 2023ER28619 - Solicitud de Presunto Incumplimiento 2, se informa el inicio del tramite con oficina jurídica	Comunicación RO-143360 - 2024EE31
10/01/2024	Respuesta de la entidad al Derecho de Petición - Contrato de Consultoría FONDIGER 010-2023 - Se aclara de manera técnica las presuntas controversias	Comunicación RO-143448 - 2024EE299
10/01/2024	Reunión de Seguimiento CTO Río Tunjuelo mié 10 de ene de 2024 2:30pm - 4pm	Acta
10/01/2024	Prueba piloto Modelación Hidráulica mié 10 de ene de 2024 8am - 10am	Acta
11/01/2024	envió de la Matriz Observaciones Metodologías hidrología e hidráulica - por parte de Interventoría	Correo electrónico
12/01/2024	Remisión por parte de interventoría del informe mensual 10 correspondientes al periodo entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre	Comunicación 2024ER573
15/01/2024	Remisión del informe semanal del 25 al 31 de diciembre de 2023	Comunicación 2024ER581

15/01/2024	Solicitud de la entidad la programación de mesas de trabajo acorde con lo establecido en la reunión de seguimiento en donde se acordó " desarrollar mesas de trabajo para revisar las diferencias y llegar a acuerdos, en donde se garantice el acompañamiento de los profesionales de cada área.".	Correo electrónico
16/01/2024	Reunión de seguimiento Estudio río Tunjuelo - Presencial mar 16 de ene de 2024 2:30pm - 4:30pm	Acta
18/01/2024	Desde la supervisión se solicita a jurídica dar Continuidad Audiencia de presunto incumplimiento - Río Tunjuelo	Correo electrónico
18/01/2024	Mesa de trabajo - Modelación Hidráulica jue 18 de ene de 2024 2:30pm - 4pm	Acta
18/01/2024	Se da claridad a la consultoría del tramite requerido para la solicitud de modificación APU	Correo electrónico

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Producto	Fecha	Actividad	Soporte
Informes Mensual	*12/01/2024*	Informe Mensual 10 de interventoría para revisión	Comunicación 2024ER573

PROFESIONAL RESPONSABLE

PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA - SUPERVISORA DEL CONTRATO
