CONSORCIO INTER 1	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	7/01/2024	**PERIODO No.**	3	DEL	**1/01/2024**	AL	**7/01/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CIN-456-2023		CONTRATO No.:	COP-452-2023	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	89		PLAZO ACTUALIZADO:	89	
PLAZO TRANSCURRIDO:	19 EQUIVALE AL	21.35%	PLAZO TRANSCURRIDO:	19 EQUIVALE AL	21.35%
VALOR INICIAL :	$	136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$	509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$	-	VALOR ADICION(ES):	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$	509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$	-	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$	509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024		no iniciado
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024		no iniciado
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024		no iniciado
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024		no iniciado
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024		no iniciado
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024		no iniciado
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024		no iniciado
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024		no iniciado
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39		#¡VALOR!

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la tercera semana de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

Dentro de la programación se tiene previsto para la siguiente semana la realización de un Preliminar de la revisión y análisis de los Estudios y Diseños Existente, se tiene previsto que el Contratista de Obra entregue este informe preliminar el dia 08 de Enero de 2024, por ende a la fecha no se registra alguna problemática identificada en la ejecución del contrato.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	7/01/2024	**PERIODO No.**	3	DEL	**1/01/2024**	AL	**7/01/2024**

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Se realizo comité de seguimiento técnico de los avances de la etapa I relacionadas al componente técnico, en los cuales los profesionales de obra presentaron las propuestas de intervención en cada sistema, los especialistas de la interventoría realizaron comentarios de carácter técnico.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>









FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	14/01/2024	**PERIODO No.**	4	DEL	**8/01/2024**	AL	**14/01/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CIN-456-2023		CONTRATO No.:	COP-452-2023	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	89		PLAZO ACTUALIZADO:	89	
PLAZO TRANSCURRIDO:	26 EQUIVALE AL	29.21%	PLAZO TRANSCURRIDO:	26 EQUIVALE AL	29.21%
VALOR INICIAL :	$	136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$	509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$	-	VALOR ADICION(ES):	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$	509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$	-	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$	509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024		no iniciado
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024		no iniciado
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024		no iniciado
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024		no iniciado
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024		no iniciado
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024		no iniciado
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024		no iniciado
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024		no iniciado
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39		#¡VALOR!

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la segunda semana de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

Dentro de la programación se tenia previsto para esta semana la realización de un informe Preliminar de la revisión y análisis de los Estudios y Diseños Existente, sin embargo en comité de seguimiento del dia 10 de enero 2024 se llego al acuerdo de la entrega del mismo para el proximo 16 de enero de 2024,por ende a la fecha no se registra alguna problemática identificada en la ejecución del contrato.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**


FECHA	14/01/2024	**PERIODO No.**	4	DEL	**8/01/2024**	AL	**14/01/2024**

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Se realizo comité de seguimiento técnico de los avances de la etapa I relacionadas al componente técnico el día 10 de enero de 2024, en los cuales los profesionales de obra presentaron las propuestas de intervención en cada sistema, los especialistas de la interventoría realizaron comentarios de carácter técnico.
El 12 de enero de 2024 mediante comunicado INT-SUMA-07-2024 se solicitó por parte de la interventoría el plan de ejecución y el cumplimiento del anexo técnico establecido al contratista de obra.


7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>

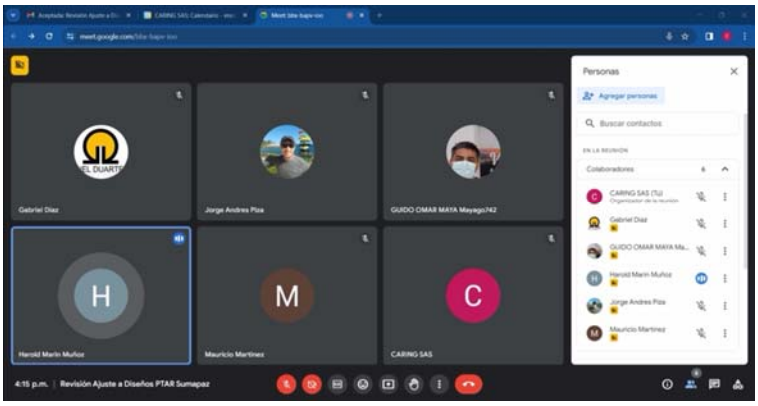





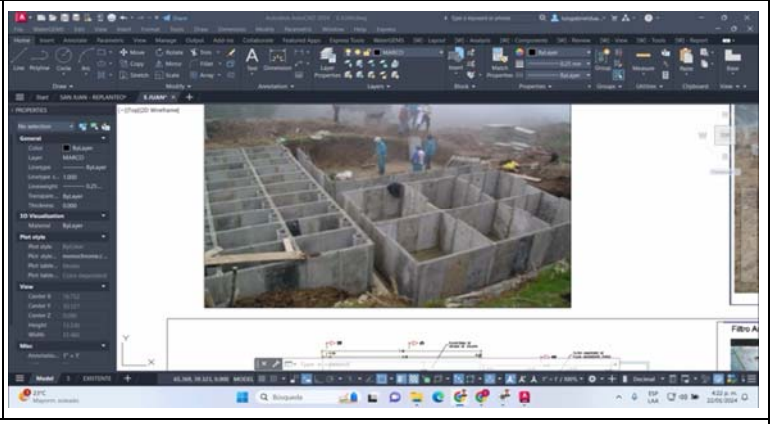

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUÁRTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	21/01/2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**15/01/2024**	AL	**21/01/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CIN-456-2023		CONTRATO No.:	COP-452-2023	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	89		PLAZO ACTUALIZADO:	89	
PLAZO TRANSCURRIDO:	33 EQUIVALE AL	37.08%	PLAZO TRANSCURRIDO:	33 EQUIVALE AL	37.08%
VALOR INICIAL :	$	136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$	509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$	-	VALOR ADICION(ES):	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$	509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$	-	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$	509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024	16/01/2024	-8
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024	16/01/2024	-8
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024		no iniciado
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024		no iniciado
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024	16/01/2024	0
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024		no iniciado
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024		no iniciado
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024		no iniciado
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39		#¡VALOR!

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la segunda semana de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

Dentro de la programación se tenia previsto para esta semana la realización de un informe Preliminar de la revisión y análisis de los Estudios y Diseños Existente, sin embargo en comité de seguimiento del dia 10 de enero 2024 se llego al acuerdo de la entrega del mismo para el proximo 16 de enero de 2024.

El contratista el dia 16 de enero de 2024 mediante oficio CGHW_005_23 realizo entrega del informe hidraulico,por ende a la fecha no se registra alguna problemática identificada en la ejecución del contrato.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER 1	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	21/01/2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**15/01/2024**	AL	**21/01/2024**

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El día 17 de enero de 2024 se realizó la socialización del proyecto en la comunidad de La Unión y Betania, la cual conto con la participación de la comunidad y el presidente de JAL, se estableció como comprimo realizar la socialización puntal en las demás comunidades in situ en la obra previo inicio de las intervenciones en las mismas.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>









FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	28/01/2024	**PERIODO No.**	6	DEL	**22/01/2024**	AL	**28/01/2024**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CIN-456-2023		CONTRATO No.:	COP-452-2023	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	89		PLAZO ACTUALIZADO:	89	
PLAZO TRANSCURRIDO:	40 EQUIVALE AL	44.94%	PLAZO TRANSCURRIDO:	40 EQUIVALE AL	44.94%
VALOR INICIAL :	$	136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$	509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$	-	VALOR ADICION(ES):	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$	509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$	-	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$	509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024	16/01/2024	-8
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024	16/01/2024	-8
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024	24/01/2024	-8
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024	24/01/2024	-8
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024	16/01/2024	0
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024		no iniciado
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024		no iniciado
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024		no iniciado
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39		#¡VALOR!

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la segunda semana de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

Dentro de la programación se tenia previsto para esta semana la realización de un informe Preliminar de la revisión y análisis de los Estudios y Diseños Existente, sin embargo en comité de seguimiento del dia 10 de enero 2024 se llego al acuerdo de la entrega del mismo para el proximo 16 de enero de 2024.

El contratista el dia 16 de enero de 2024 mediante oficio CGHW_005_23 realizo entrega del informe hidraulico,por ende a la fecha no se registra alguna problemática identificada en la ejecución del contrato.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER 1	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**


FECHA	28/01/2024	**PERIODO No.**	6	DEL	**22/01/2024**	AL	**28/01/2024**

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Nuevamente se realizó comité de seguimiento de avance de la etapa I el día 22 de enero de 2024 del componente técnico en la etapa de revisión y apropiación de los diseños, en los cuales el profesional hidráulico de la interventoría realizo las observaciones técnicas pertinentes del caso.
El 22 de enero de 2024 mediante oficio INT-SUMA-09-2024 se realizaron observaciones al componente presupuestal y algunas recomendaciones para la entrega de los APUs de los ítems contractuales y de los ítems no previstos.
El mismo 22 de enero mediante oficio INT-SUMA-10-2024 se realizaron observaciones de caracter tecnico, especificamente del componente hidraulico y de procesos de las PTARs.
Mediante comunicado INT-SUMA-10-2024 se solicitó la entrega del informe mensual de obra, comprendido entre el 19/12/2023 al 31/12/2023.
El 24 de enero de 2024 mediante oficio INT-SUMA-11-2024 se realizó la aprobación del PIPMA del contratista de obra (Programa de implementación del Plan de Manejo Ambiental) como requisito previo del inicio de obras.
Mediante oficio INT-SUMA-13-2024 del 25 de enero de 2024 se le solicito al contratista de obra el cumplimiento de obligaciones especificas tales como: plan de trabajo y programación con las debidas recomendaciones, así como un llamado de atención al cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de seguimiento (entrega de los productos para revisión y aprobación de la interventoría).

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>

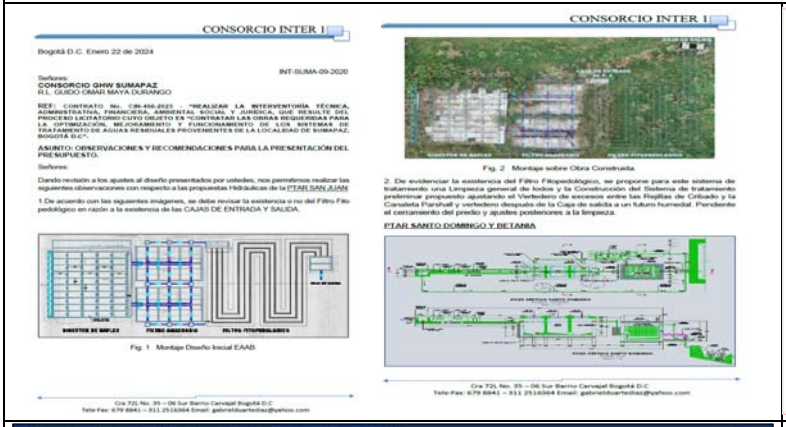
CONSORCIO INTER 1

Bogotá D.C. Enero 22 de 2024

INT-SUMA-09-2020

Señores:
CONSORCIO GHW SUMAPAZ
R.L. GUIDO OMAR MAYA DURANGO

REF: CONTRATO No. CIN-466-2023 - "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".

ASUNTO: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Señores:

Dando revisión a los ajustes al diseño presentados por ustedes, nos permitimos realizar las siguientes observaciones con respecto a las propuestas Hidráulicas de la PTAR SAN JUAN

1.De acuerdo con las siguientes imágenes, se debe revisar la existencia o no del Filtro Fito pedológico en razón a la existencia de las CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA.

Fig. 1 Montaje Diseño Inicial EAAB.

Cra 72L No. 35 – 06 Sur Barrio Carvajal Bogotá D.C
Tele-Fax: 679 8841 – 311 2516364 Email: gabrielduartediaz@yahoo.com


CONSORCIO INTER 1


Fig. 2 Montaje sobre Obra Construida.

2. De evidenciar la existencia del Filtro Fitopedológico, se propone para este sistema de tratamiento una Limpieza general de lodos y la Construcción del Sistema de tratamiento preferente propuesto ajustando el Vertedero de excesos entre las Reglas de Cribado y la Canaleta Parshall y vertedero después de la Caja de salida a un futuro humedal. Perdiendo el cerramiento del predio y ajustes posteriores a la limpieza.

PTAR SANTO DOMINGO Y BETANIA

Cra 72L No. 35 – 06 Sur Barrio Carvajal Bogotá D.C
Tele-Fax: 679 8841 – 311 2516364 Email: gabrielduartediaz@yahoo.com

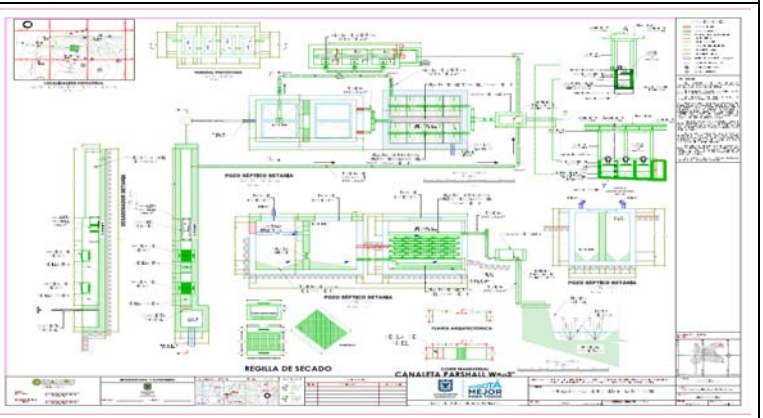

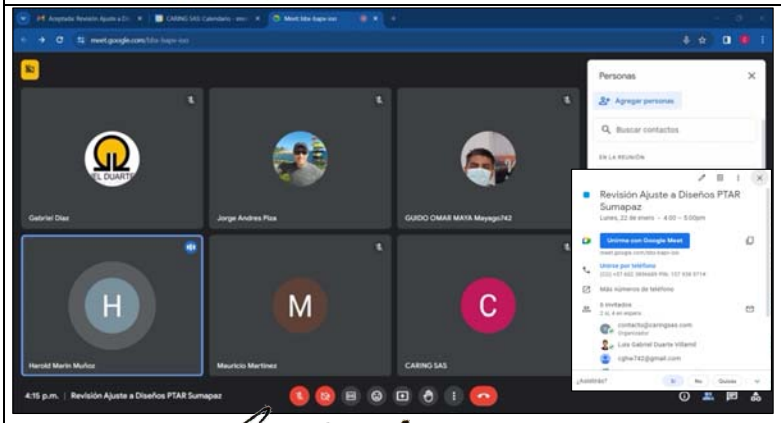


CONSORCIO INTER 1

Bogotá D.C. enero 24 de 2024

INT-SUMA-11-2024

Señores:
CONSORCIO GHW SUMAPAZ
Atn: R.L. GUIDO OMAR MAYA DURANGO

REF: CONTRATO No. CIN-466-2023 - "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".

ASUNTO: Revisión y aprobación de *«PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PIPMA»*

Cordial saludo:

En el ejercicio de seguimiento y control realizado por esta Interventoría y considerando las disposiciones establecidas en el contrato *«CO1- 455/2023» «REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: «CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C»».*

Y en atención a lo remitido por el Consorcio GHW Sumapaz, en los correos eléctricos con fecha de 15 de enero, 19 de enero y 23 de 2024, asociados al documento *«PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PIPMA»* y sus anexos.

«1. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
2. PLAN DE ACCION
3. CRONOGRAMA AMBIENTAL
4. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL
5. FICHAS DE MANEJO DE FLORA FAUNA Y PAISAJE»

Esta Interventoría le informa que, desde el marco de sus competencias, realizó la revisión del PIPMA junto con los anexos correspondientes, generando las observaciones a que deran a lugar y que fueron atendidas por el CONSORCIO GHW SUMAPAZ, por lo que esta Interventoría da visto bueno y aprobación a los

Cra 72L No. 35 – 06 Sur Barrio Carvajal Bogotá D.C
Tele-Fax: 679 8841 – 311 2516364 Email: gabrielduartediaz@yahoo.com

CONSORCIO INTER 1

documentos asociados al *«CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C»*

Finalmente, esta Interventoría quedará atenta a suministrar o solucionar cualquier inquietud desde el ámbito de nuestras competencias.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO INTER 1
Ing. GABRIEL DUARTE DÍAZ
Director de Interventoría
Revisó: Oliver Pérez Maheca
Elaboró: Oliver Pérez Maheca

Copia:
Atn: Luisa Lozano
Supervisor Contrato
Secretaría de Hacienda

Cra 72L No. 35 – 06 Sur Barrio Carvajal Bogotá D.C
Tele-Fax: 679 8841 – 311 2516364 Email: gabrielduartediaz@yahoo.com

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	31/01/2024	**PERIODO No.**	7	DEL	**29/01/2024**	AL	**31/01/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CIN-456-2023		CONTRATO No.:	COP-452-2023	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	89		PLAZO ACTUALIZADO:	89	
PLAZO TRANSCURRIDO:	43 EQUIVALE AL	48.31%	PLAZO TRANSCURRIDO:	43 EQUIVALE AL	48.31%
VALOR INICIAL :	$	136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$	509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$	-	VALOR ADICION(ES):	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$	509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$	-	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$	509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024	16/01/2024	-8
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024	16/01/2024	-8
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024	24/01/2024	-8
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024	24/01/2024	-8
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024	16/01/2024	0
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024		no iniciado
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024		no iniciado
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024		no iniciado
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39		#¡VALOR!

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la segunda semana de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

Dentro de la programación se tenia previsto para esta semana la realización de un informe Preliminar de la revisión y análisis de los Estudios y Diseños Existente, sin embargo en comité de seguimiento del dia 10 de enero 2024 se llego al acuerdo de la entrega del mismo para el proximo 16 de enero de 2024.

El contratista el dia 16 de enero de 2024 mediante oficio CGHW_005_23 realizo entrega del informe hidraulico,por ende a la fecha no se registra alguna problemática identificada en la ejecución del contrato.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	31/01/2024	**PERIODO No.**	7	DEL	**29/01/2024**	AL	**31/01/2024**


6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.


El 29 de enero de 2024 mediante comunicado INT-SUMA-14-2024 se le realizo sugerencia al contratista de obra acerca del aprovechamiento “insitu” de los lodos generados en las PTARs y pozos sépticos en la localidad de Sumapaz.


Mediante oficio INT-SUMA-015-2024 se realizó la aprobación del Plan de gestión social de obra por parte de la interventoría de fecha 30 de enero de 2024, previo requisito al inicio de obras.


7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>

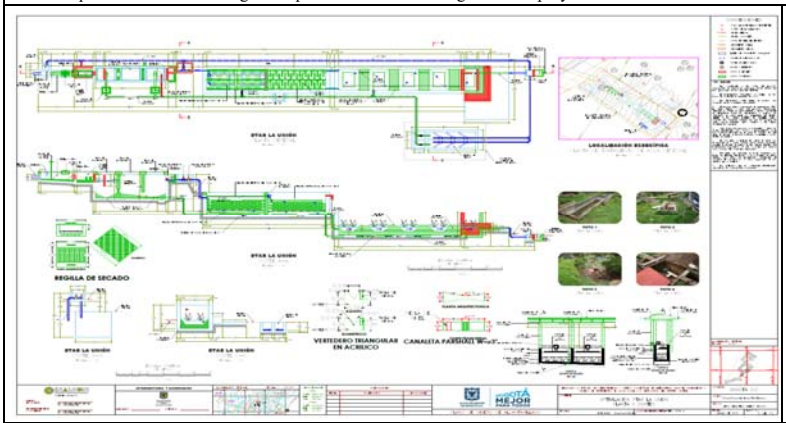

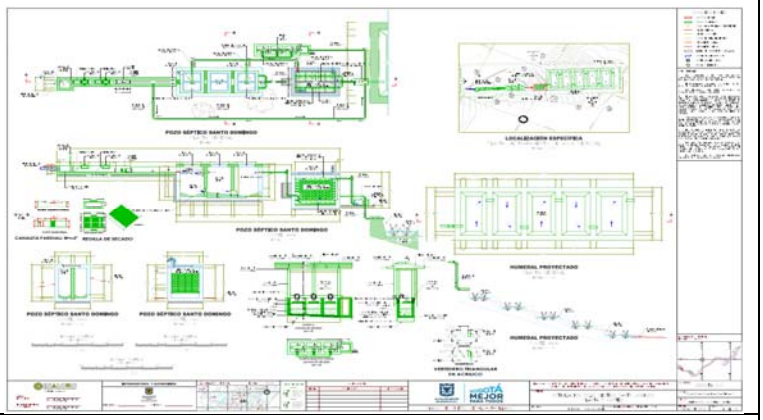

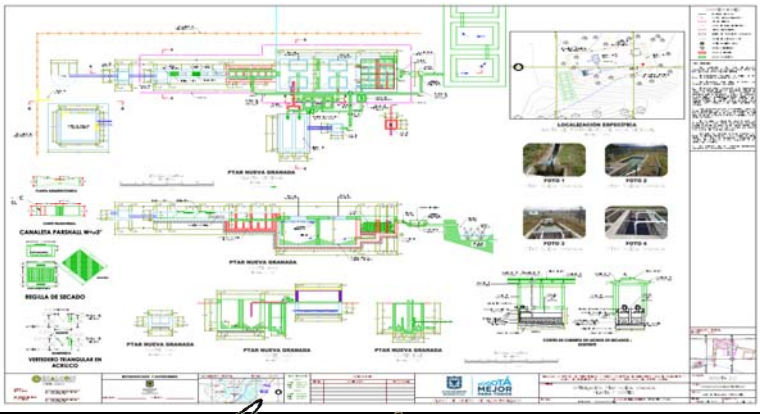

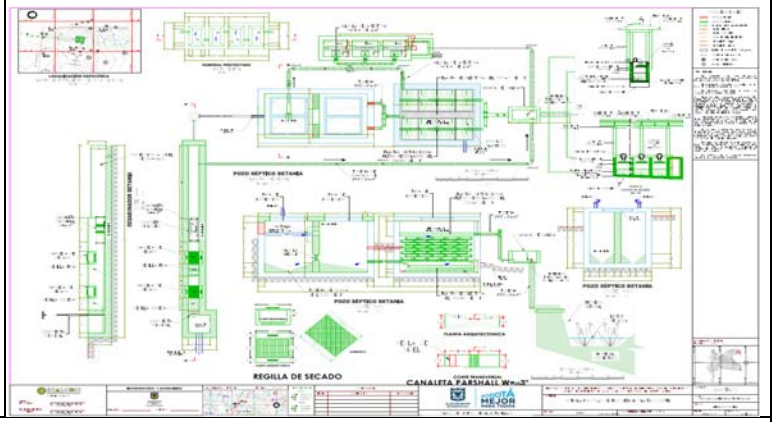

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**
