ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN -REINICIO	Código: F - 262
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de

PROYECTO:	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio (Descripcion detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)		SI
INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		SI
REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (V°B° interventoria aplica para prorroga y reinicio)		SI
FLUJO DE CAJA EN PROJECT (V°B° interventoria) Porcentajes y costos planeados.		SI
INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		SI
ACTA COMITÉ (Particip. RL.Contratista, RL. Interventoria, Director Operativo de Ejecucion y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)		SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.		N/A
MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando		
UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente tramite:		
ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)		
Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoria deberá asegurarse que la ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la interventoria debera comunicar		
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		
ACTUALIZACION Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantia Unica de cumplimiento y		

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: NELSY MILENA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
M.P.

Firma
Nombre: IVANA DURLEY BRICEÑO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P.

Firma
Nombre:N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN
M.P.

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA
SUPERVISOR
M.P.

Firma
Nombre: N/A
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

V°B°
Nombre:N/A
APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

Puerto López, 13 de febrero de 2024 SI.50.35.095.02.2024

Doctor
HEBERT LEONARDO CAMARGO MORENO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-0004-2023 CUYO OBJETO ES **ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACÚSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META.**

Asunto: Entrega de documentación correspondiente a la PRORROGA Número Dos (02), para su respectivo archivo en el expediente contractual.

Cordial saludo,

Me permito la presente para informarle que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-0004-2023, cuyo objeto es la "**ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACÚSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META**", se ha viabilizado por parte de la supervisión, la PRORROGA Número Dos (02) correspondiente al mencionado contrato.

Con el propósito de mantener la transparencia y organización de la gestión contractual, adjunto a la presente comunicación encontrará la documentación completa relativa a la mencionada prórroga. Dichos documentos incluyen, entre otros, el acta de la reunión donde se acordó la prórroga, el acta de prórroga, así como cualquier otro documento relevante.

La entrega de esta documentación tiene como finalidad su respectivo archivo en el expediente contractual de la obra en cuestión. Asimismo, dicha información servirá como referencia para cualquier consulta o auditoría futura.

Agradecemos de antemano su colaboración y diligencia en este proceso. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional o aclaración que pueda requerir.

Sin otro particular,

MARYLIN PAOLA FONSECA
Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Diego Andres Garay	Nombre: Marylin Paola Fonseca	Nombre: Marylin Paola Fonseca
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
Fecha: 13/02/2024	Fecha: 13/02/2024	Fecha: 13/02/2024

Código Postal 501...
Teléfono 2453...
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Puerto López (Meta), 09 de febrero de 2024

Señora
MARYLIN FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura.
Puerto López.

REF: CONTRATO No 100-103-13-09-0004 "ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"

ASUNTO: Informes mensuales - Contrato No 100-103-13-09-0004-2023

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio realizamos la solicitud de aprobación de prorroga para la obra "ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META" según lo estipulado en el comité de obra realizado el día 09 de febrero del 2024.

En consideración a las circunstancias expuestas tales: realización de modificatoria que contempla cantidades mayores y menores e ítems no previstos, el registro de lluvias presentado durante el periodo que representa el 24% del tiempo restante del contrato, con el objetivo de garantizar la ejecución satisfactoria de las actividades programadas, nos dirigimos formalmente con la solicitud de una prorroga de 60 días calendario. Esto nos permitirá disponer de un plazo razonable para la ejecución del proyecto de manera óptima y satisfactoria.

De antemano agradezco su atención

Atentamente,

IVANA BRICEÑO R
Representante legal
Consorcio Espacios Puerto
espaciospuerto@gmail.com

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	**Código: F-098**
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO N°:	100-103-13-09-0004-2023
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	15/12/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	29/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 314.786.287,82
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO Nit. 901.781.193
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28/12/2024	N/A	30
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	28/01/2024

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	12/01/2024		20
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
1	1/02/2024		17
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	17/02/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACIÓN (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 314.786.287,82			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	45	DIAS		MESES

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN	☐	**PRORROGA**	☑

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	17 DE FEBRERO DE 2024

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN	☐	al contrato anteriormente citado por valor de		N/A
			TIEMPO	
			MES	**DIAS**
PRORROGA	☑	al contrato anteriormente citado de		60

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia veintiseis (09) del mes de febrero de 2024 . El Contrato referenciado. presenta un avance fisico ejecutado del 2,67% contra un avance programado del 85%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 314.786.287,82
Valor facturado ($)	$ 0,00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

Que de conformidad a lo informado por el contratista de obra esta solicitud de prorroga se origina a raiz de las siguientes necesidades: La realización de una modificatoria de cantidades mayores y menores e ítems no previstos que se da en verificación del contrato para atender las necesidades del proceso constructivo, La ejecución del cronograma de actividades realizado con el cual se evidencia que el tiempo faltante del contrato no permitirá llevar a termino contractual la entrega del proyect al cual se le suma las condiciones climaticas desfavorables presentadas durante el mes de febrero del 2024 que impidieron el desarrollo de las actividades propuestas correspondiendo al 24% del tiempo de ejecucion,En consideración de las circunstancias expuestas y con el objetivo primordial de garantizar la ejecución satisfactoria de las actividades programadas en virtud del contrato de referencia, nos vemos en la necesidad de formalmente justificar la solicitud de una prórroga de sesenta días calendario. Esto nos permitirá disponer de un plazo razonable para asegurar la ejecución del proyecto, lo cual resulta esencial para cumplir con los términos y objetivos establecidos en el mencionado contrato.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

Que una vez revisada las causales , la supervisión viabiliza la solicitud de prorroga por el periodo de 60 dias contados a partir de la fecha actual de terminacion del proyecto, con el fin de que la supervision realice el debido seguimiento y control de calidad a las obras ejecutadas por parte del contratista con el fin que el contratiosta ejecute en su totalidad las actividades establecidas en la minuta contractual.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$			314.786.287,82
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	8	**DIAS**	2	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	17/04/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los nueve (09) días del mes de febrero del año 2024

Nombre del Contratista : CONSORCIO ESPACIOS PUERTO **Representante Legal Contratista: IVANA DURLEY BRICEÑO** **Firma**	**Nombre de la Interventoria : N/A** **Representante Legal Interventoria: N/A** **Firma**
Nombre del Supervisor Asignado: MARYLIN PAOLA FONSECA **Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0004-2023

"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"

INFORME PRORROGA N°2



FEBRERO 2024

Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3
OBJETIVO DEL INFORME 3
1. GENERALIDADES Y CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA 4
2. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 5
3. ADMINISTRATIVO Y LEGALES 6
3.1. ACTAS GENERADAS 6
3.2. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO 6
3.3. CONTROL DE PÓLIZAS 6
4. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS 8
5. JUSTIFICACION PRORROGA 12
6. CONCLUSIONES 13

INTRODUCCION

El municipio de Puerto López, Meta mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, con el fin de satisfacer las necesidades demandadas en el proyecto en concordancia con las metas establecidas dentro del plan de desarrollo y con el fin de ejecutar el componente de obra del proyecto, adjudico al **CONSORCIO ESPACIOS PUERTO** con Representante Legal **IVANA DURLEY BRICEÑO**, identificada con CC 1.122.137.612 de Acacias la **"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META".** En el presente informe se describen todos los aspectos preliminares, administrativos, técnicos y jurídicos que se han presentado hasta la fecha en la ejecución del contrato, y la justificación para presentar la solicitud de prorroga No.2.

OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto describir todos los aspectos del proyecto que describen y muestran el estado real de ejecución del proyecto como todos los procesos logisticos y constructivos que se realizan para ejecutar cada una de las actividades contractuales a los trabajos propios del proyecto.

1. GENERALIDADES Y CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	" ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"
CONTRATO N	100-103-13-09-0004-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO NIT. 901781193-1 IVANA DURLEY BRICEÑO C.C. No. 1.122.137.612
SUPERVISOR:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($314.786.287,82)
FECHA DEL CONTRATO:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ANTICIPO	N/A
PRORROGA No. 1	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGA No. 1	TREINTA (30) DIAS
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	28 DE ENERO DEL 2024
SUSPENSION N.° 1	12 DE ENERO 2024
TIEMPO DE SUSPENSION N°1	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE REINICIO	01 DE FEBRERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	16 DE FEBRERO DE 2024

2. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Puerto López - Meta, se encuentra ubicado a una distancia de 85 Km. de Villavicencio. Los límites geográficos del Municipio de Puerto López están definidos de la siguiente manera:

Por el Norte: con el municipio de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare
Por el Oriente: con el municipio de Puerto Gaitán
Por el Sur: con el municipio de San Martin
Por el Occidente: con el municipio de San Carlos de Guaroa y Villavicencio



Imagen 1. Localización de Puerto López - Meta

Las actividades propias del proyecto se desarrollarán en un punto especifico descrito a continuación:

Las siguientes coordenadas señalan el punto donde se construirá la estructura de la concha acústica 4°05'35.3"N 72°57'18.6"W, ubicado . la dirección Cra. 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta



Imagen 2. Ubicación puerto López

3. ADMINISTRATIVO Y LEGALES

3.1. ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la presente fecha se han generado por parte del contratista y supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
INICIO	15/12/2023
PRORROGA	28/12/2023
SUSPENSION	04/01/2024

3.2. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO

No CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR ANTICIPO	ACTAS PARCIALES
CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-0004-2023	$ 314.786.287,82	N/A	N/A

3.3. CONTROL DE PÓLIZAS

INICIALES			
Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales	CV-100038209		
Fecha de expedición.	14 DE DICIEMBRE DE 2023		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	CV-100010178		
Fecha de expedición.	14 DE DICIEMBRE DE 2023		
Expedidas por:	MUNDIAL DE SEGUROS SA		
Aprobación de pólizas por entidad	15 DE DICIEMBRE DE 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	14/12/2023	29/04/2024	$ 31.478.628,80
Salarios y Prestaciones Sociales	14/12/2023	29/12/2026	$ 15.739.314,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/2023	29/12/2023	$ 232.000.000,00
Estabilidad y calidad de obra	29/12/2023	29/12/2028	$ 62.957.257,60
			$ 342.175.201,80

ACTUALIZACION ACTA DE INICIO			
Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales	CV-100038209		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	CV-100010178		
Expedida por:	MUNDIAL DE SEGUROS SA		
Fecha de expedición.	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
Aprobación de pólizas por entidad	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	14/12/2023	29/04/2024	$ 31.478.628,80
Salarios y Prestaciones Sociales	14/12/2023	29/12/2026	$ 15.739.314,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/2023	29/12/2023	$ 232.000.000,00
Estabilidad y calidad de obra	29/12/2023	29/12/2028	$ 62.957.257,60
			$ 342.175.201,80

ACTA DE REINICIO			
Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales	CV-100038209		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	CV-100010178		
Expedida por:	MUNDIAL DE SEGUROS SA		
Fecha de expedición.	02 FEBRERO DE 2024		
Aprobación de pólizas por entidad	01 DE FEBRERO DE 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	01/02/2024	20/06/2024	$ 31.478.628,80
Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2024	24/02/2027	$ 15.739.314,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	02/02/2024	03/01/2029	$ 232.000.000,00
Estabilidad y calidad de obra	03/01/2024	03/01/2029	$ 62.957.257,60
			$ 342.175.201,80

4. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Las actividades realizadas se indican a continuación:


CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PARQUE LA LAGUNA								
1,1	MÁSTIL CON TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE ARO Y MALLA				-	0,00	$ 0		$ 0
1.1.1	MÁSTIL METÁLICO CON TABLERO DE 1,20 x 1,80MTS INCLUYE ARO Y MALLA PARA BALONCESTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	3.613.026,00	3.613.026,00	0,00	$ 0	1,00	$ 3.613.026
COSTO SUBTOTAL					3.613.026,00		$ 0		$ 3.613.026
1.2	PLACAS EN HEXÁGONOS Y BANCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN								
1.2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	161,29	37.420,00	6.035.471,80	137,57	$ 5.147.869	23,72	$ 887.602
1.2.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	62,28	831.653,00	51.795.348,84	0,00	$ 0	62,28	$ 51.795.349
1.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3902,88	9.156,00	35.734.769,28	0,00	$ 0	3902,88	$ 35.734.769
1.2.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	3,24	133.272,00	431.801,28	0,00	$ 0	3,24	$ 431.801
1.2.5	RELLENO CON GRAVILLA	M3	10,96	97.506,00	1.068.665,76	0,00	$ 0	10,96	$ 1.068.666
1.2.6	BANCOS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN	UND	9,00	1.348.231,00	12.134.079,00	0,00	$ 0	9,00	$ 12.134.079
1.2.7	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO	ML	10,00	282.096,00	2.820.960,00	0,00	$ 0	10,00	$ 2.820.960
1.2.8	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5,60	87.080,00	487.648,00	0,00	$ 0	5,60	$ 487.648
1.2.9	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,04	115.622,00	4.624,88	0,00	$ 0	0,04	$ 4.625
1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25,00	138.493,00	3.462.325,00	0,00	$ 0	25,00	$ 3.462.325
COSTO SUBTOTAL					113.975.693,84		$ 5.147.869		$ 108.827.824,44
2	CONCHA ACUSTICA								
2.1	TARIMA								

2.1.1	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	10,76	13.932,00	149.908,32	10,76	$ 149.908	10,76	$ 149.908
2.1.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,76	34.438,00	370.552,88	0,00	$ 0	10,76	$ 370.553
2.1.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,44	778.836,00	2.679.195,84	0,00	$ 0	3,44	$ 2.679.196
2.1.4	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	137,72	9.156,00	1.260.964,32	0,00	$ 0	137,72	$ 1.260.964
2.1.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	34,43	96.054,00	3.307.139,22	0,00	$ 0	34,43	$ 3.307.139
COSTO SUBTOTAL					**7.767.760,58**		**$ 149.908**		**$ 7.767.760,58**
2.2	**MUROS**								
2.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	51,35	7.023,00	360.631,05	51,35	$ 360.631	51,35	$ 360.631
2.2.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	19,92	34.438,00	686.004,96	0,00	$ 0	19,92	$ 686.005
2.2.3	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,95	19.893,00	78.577,35	0,00	$ 0	3,95	$ 78.577
2.2.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	51,20	13.931,00	713.267,20	0,00	$ 0	51,20	$ 713.267
2.2.5	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	13,15	1.709,00	22.473,35	0,00	$ 0	13,15	$ 22.473
COSTO SUBTOTAL					**1.860.953,91**		**$ 360.631**		**$ 1.860.953,91**
2,3	**ESCALERAS**								
2.3.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,97	87.080,00	171.547,60	1,97	$ 171.548	1,97	$ 171.548
2.3.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,51	359.979,00	183.589,29	0,51	$ 183.589	0,51	$ 183.589
2.3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	34,67	8.508,00	294.972,36	0,00	$ 0	34,67	$ 294.972
2.3.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,67	555.667,00	927.963,89	0,00	$ 0	1,67	$ 927.964
2.3.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	5,00	96.054,00	480.270,00	0,00	$ 0	5,00	$ 480.270
2.3.6	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1,40	195.971,00	274.359,40	0,00	$ 0	1,40	$ 274.359
COSTO SUBTOTAL					**2.332.702,54**		**$ 355.137**		**$ 2.332.702,54**
2.4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
2.4.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	112.745,00	450.980,00	0,00	$ 0	4,00	$ 450.980
2.4.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	104.281,00	625.686,00	0,00	$ 0	6,00	$ 625.686

2.4.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2,00	253.004,00	506.008,00	0,00	$ 0	2,00	$ 506.008
2.4.4	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	431.504,00	431.504,00	0,00	$ 0	1,00	$ 431.504
2.4.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	35,00	48.450,00	1.695.750,00	0,00	$ 0	35,00	$ 1.695.750
2.4.6	ACOMETIDA PARCIAL AL 2No2+1 No10 DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	38.630,00	1.545.200,00	0,00	$ 0	40,00	$ 1.545.200
2.4.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	3,00	373.832,00	1.121.496,00	0,00	$ 0	3,00	$ 1.121.496
2.4.8	POSTE METALICO 4MTS 180X180MM	UND	3,00	2.595.356,00	7.786.068,00	0,00	$ 0	3,00	$ 7.786.068
2.4.9	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	3,00	1.543.134,00	4.629.402,00	0,00	$ 0	3,00	$ 4.629.402
2.4.10	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	3,00	67.698,00	203.094,00	0,00	$ 0	3,00	$ 203.094
2.4.11	AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO DE 1½"	UND	3,00	164.546,00	493.638,00	0,00	$ 0	3,00	$ 493.638
2.4.12	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 # 14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	13,50	41.192,00	556.092,00	0,00	$ 0	13,50	$ 556.092
COSTO SUBTOTAL					**20.044.918,00**		**$ 0**		**$ 20.044.918**
2.5	**CUBIERTA METALICA**								
2.5.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	9,04	5.065,00	45.787,60	9,04	$ 45.788	9,04	$ 45.788
2.5.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	4,07	87.080,00	354.415,60	4,07	$ 354.416	4,07	$ 354.416
2.5.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	440,08	8.508,00	3.744.200,64	0,00	$ 0	440,08	$ 3.744.201
2.5.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	5,40	555.667,00	3.000.601,80	0,00	$ 0	5,40	$ 3.000.602
2.5.5	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,38	889.938,00	3.007.990,44	0,00	$ 0	3,38	$ 3.007.990
2.5.6	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,69	955.493,00	659.290,17	0,00	$ 0	0,69	$ 659.290
2.5.7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3127,07	23.012,00	71.960.134,84	0,00	$ 0	3127,07	$ 71.960.135

2.5.8	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	159,58	21.035,00	3.356.765,30	0,00	$ 0	159,58	$ 3.356.765
2.5.9	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	UND	24,00	8.839,00	212.136,00	0,00	$ 0	24,00	$ 212.136
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	71,59	42.494,00	3.042.145,46	0,00	$ 0	71,59	$ 3.042.145
2.5.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	9,78	106.066,00	1.037.325,48	0,00	$ 0	9,78	$ 1.037.325
2.5.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	24.458,00	146.748,00	0,00	$ 0	6,00	$ 146.748
2.5.13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	33.070,00	132.280,00	0,00	$ 0	4,00	$ 132.280
COSTO SUBTOTAL					90.699.821,33		$ 400.203		$ 90.699.821
				COSTO DIRECTO TOTAL	$ 240.294.876		$ 6.413.748,86		$ 235.147.006,80
				COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)	$ 240.294.876		$ 6.413.748,86		$ 235.147.006,80
				ADMINISTRACION 26%	$ 62.476.668		$ 1.667.574,70		$ 61.138.221,77
				IMPREVISTOS 1%	$ 2.402.949		$ 64.137,49		$ 2.351.470,07
				UTILIDAD 4%	$ 9.611.795		$ 256.549,95		$ 9.405.880,27
				AIU 31%	$ 74.491.412		$ 1.988.262,14		$ 72.895.572,11
				TOTAL, COSTO PRESUPUESTO DE OBRA	$ 314.786.288		$ 8.402.011,00		$ 308.042.578,91
				TOTAL, COSTO PRESUPUESTODEL PROYECTO	$ 314.786.287,82		$ 8.402.011,00		$ 308.042.578,91

GRAFICA AVANCE FÍSICO

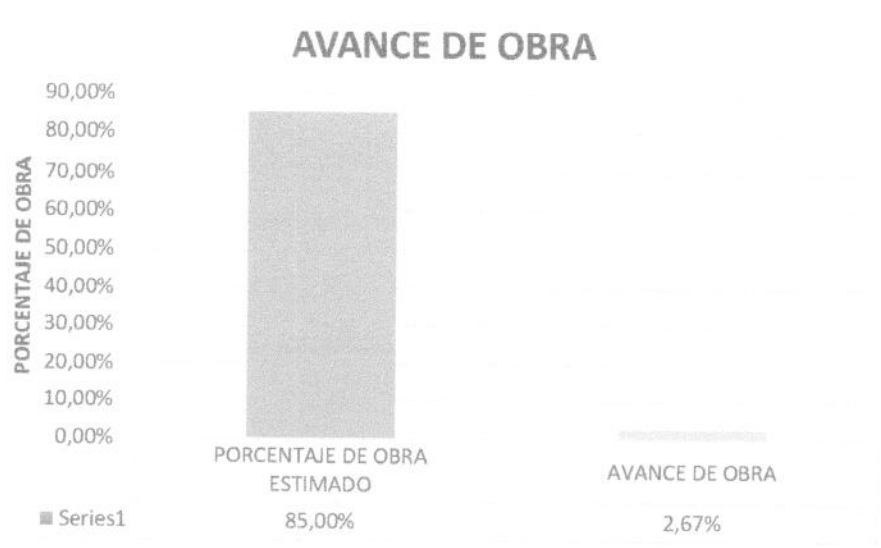

El avance que se evidencia de obra que se evidencia respecto a las actividades ejecutadas son de un 2,67% en comparación al 85,00% de la programación de obra

5. JUSTIFICACION PRORROGA

Mediante el presente documento, nos permitimos presentar formalmente la justificación de prórroga adicional para el contrato N.º 100-103-13-09-0004-2023 del proyecto **"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"**, de sesenta (60) días en relación al contrato.

Esta solicitud de prorroga se origina a raiz de las siguientes necesidades:

- La realización de una modificatoria de cantidades mayores y menores e ítems no previstos que se da en verificación del contrato para atender las necesidades del proceso constructivo.
- La ejecución del cronograma de actividades realizado con el cual se evidencia que el tiempo faltante del contrato no permitirá llevar a término contractual la entrega del proyecto.

Adjuntamos el cronograma de actividades aterrizado al tiempo real de terminación de obra, junto al flujo de caja el cual detalla los recursos que se implementaran en la ejecución.

En consideración de las circunstancias expuestas y con el objetivo primordial de garantizar la ejecución satisfactoria de las actividades programadas en virtud del contrato de referencia, nos vemos en la necesidad de formalmente justificar la solicitud de una prórroga de cuarenta y cinco días. Esto nos permitirá disponer de un plazo razonable para asegurar la ejecución del proyecto, lo cual resulta esencial para cumplir con los términos y objetivos establecidos en el mencionado contrato.

6. CONCLUSIONES

La solicitud de prórroga presentada se basa en circunstancias fuera del control del CONSORCIO ESPACIOS PUERTO, las cuales están relacionadas con el tiempo que se requiere para finalizar el proyecto.

En vista de estas circunstancias, la solicitud de prórroga de sesenta días se justifica plenamente. La extensión del contrato por este período adicional es necesaria para garantizar, cumplir con los términos y objetivos estipulados en el contrato y asegurar la ejecución satisfactoria de las actividades programadas.


En conclusión, la solicitud de prórroga se basa en hechos justificables y tiene como objetivo principal salvaguardar el cumplimiento exitoso de las obligaciones contractuales del consorcio ante las circunstancias.

IVANA DURLEY BRICEÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESPACIOS PUERTO


- ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRESENTE PERIODO


CERRAMIENTO



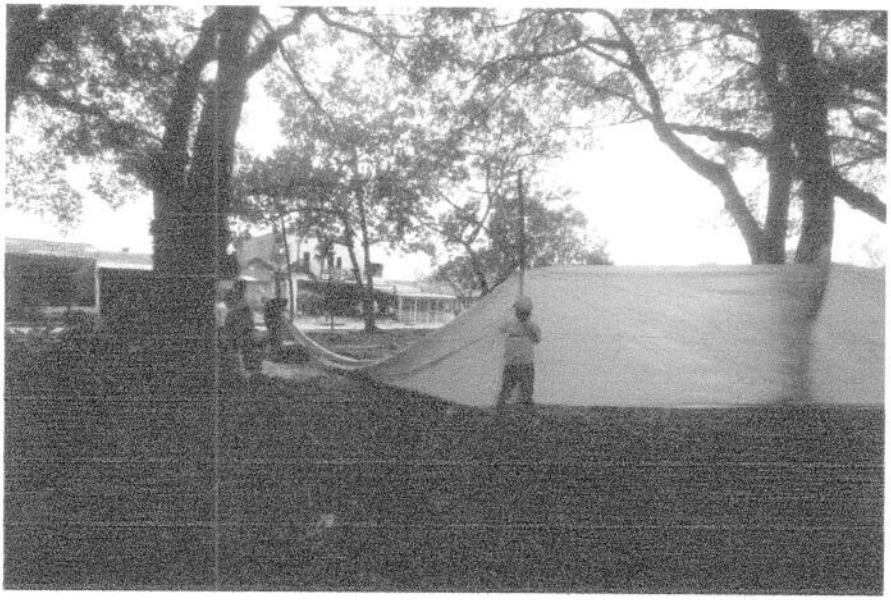


LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.

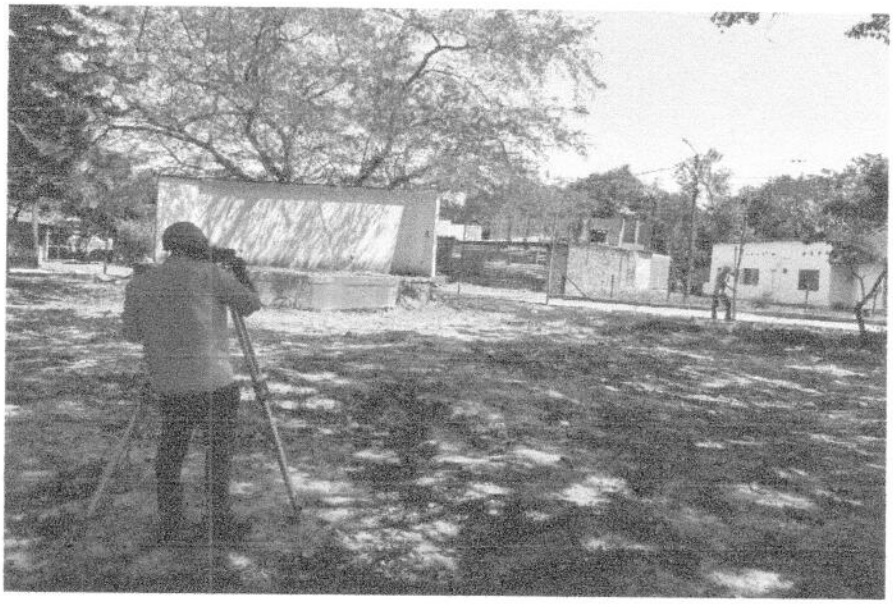

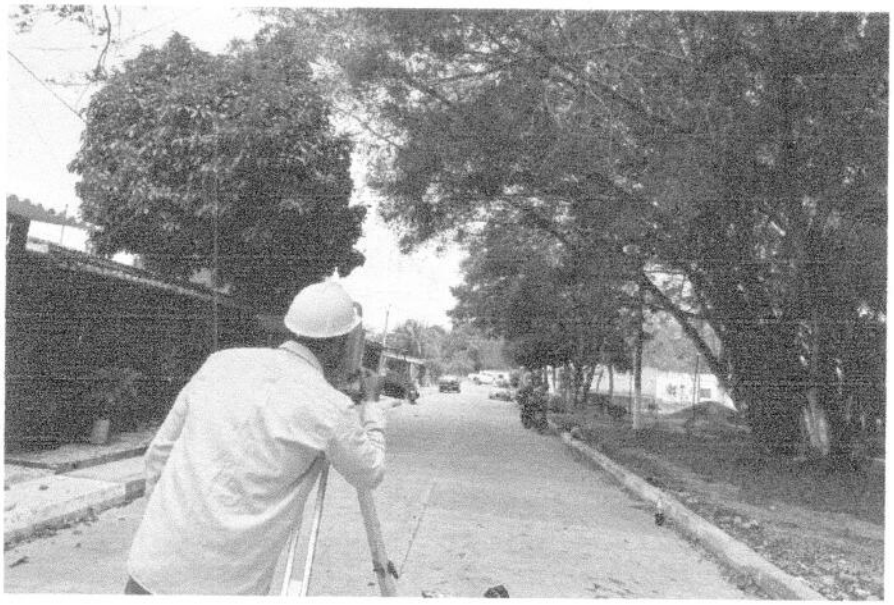


RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR MAX 3", SUMINISTRO EXTENDIDO Y NIVELACIÓN.

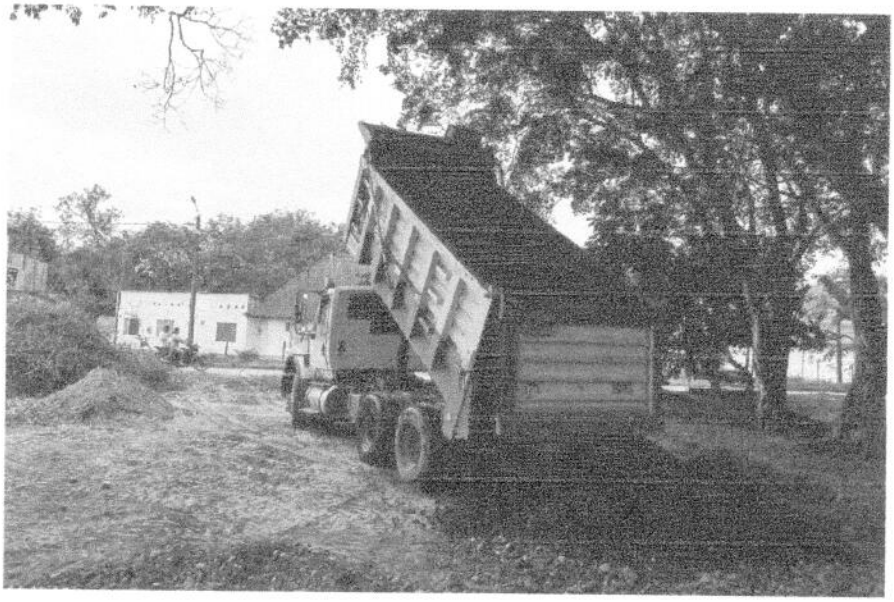



Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta


DEMOLICION DE PAÑETES DE MUROS E=0,03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

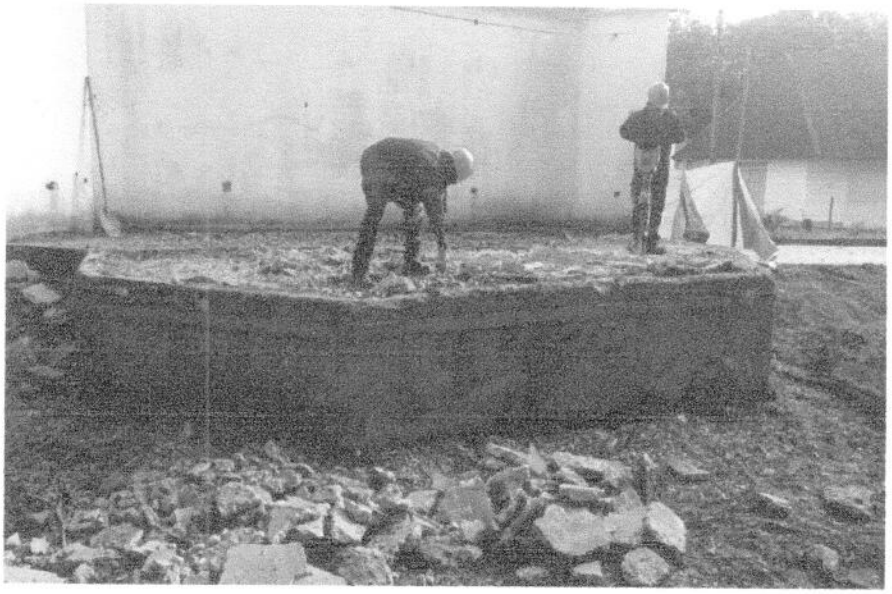



Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta


LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET

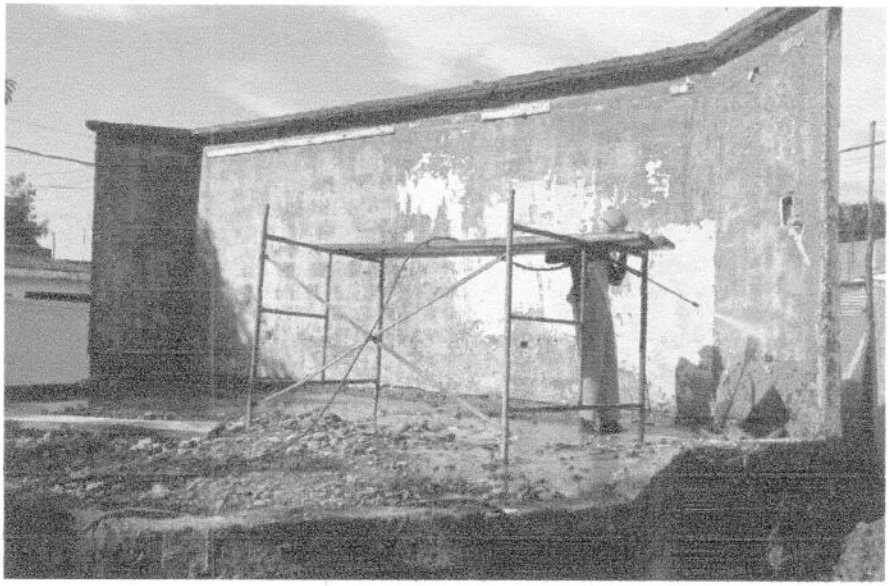





Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta


EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0 2,00 M. INCLUYE CARGUE

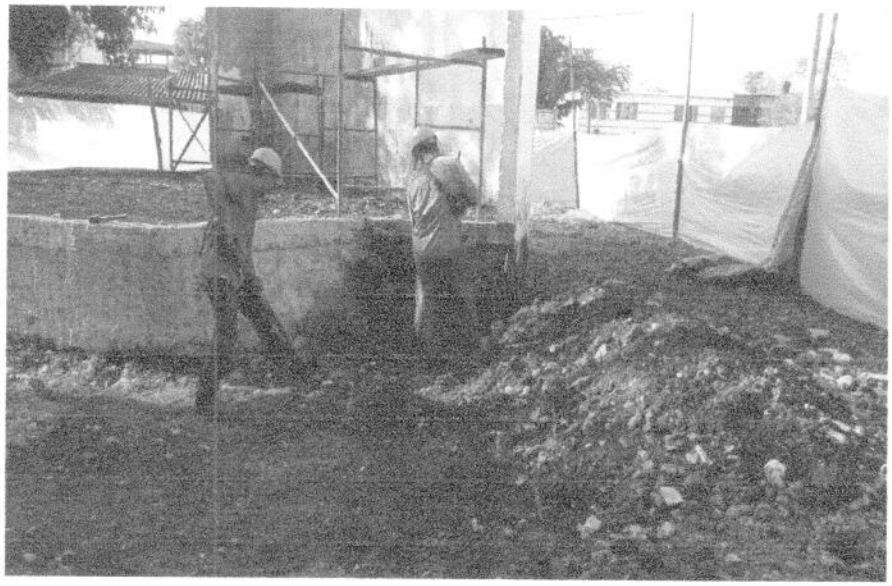

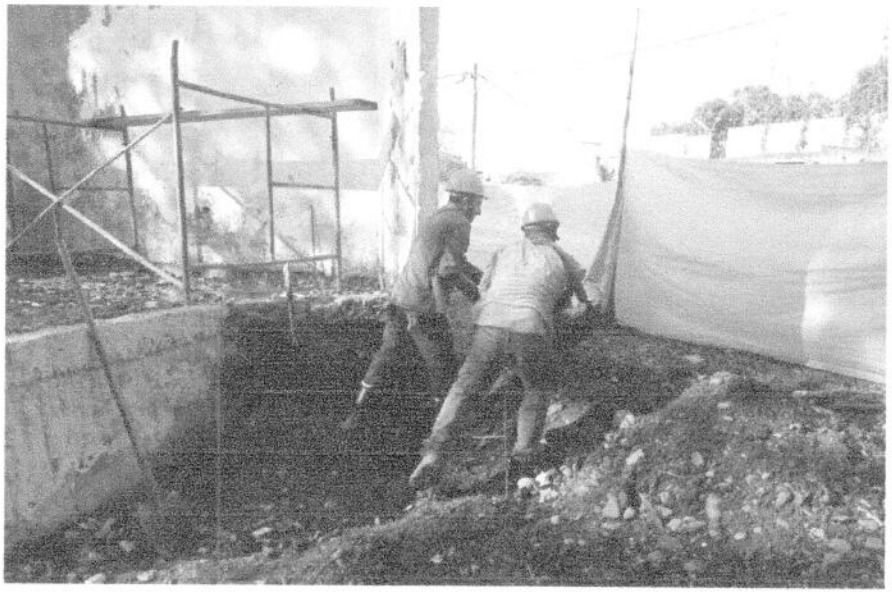

DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

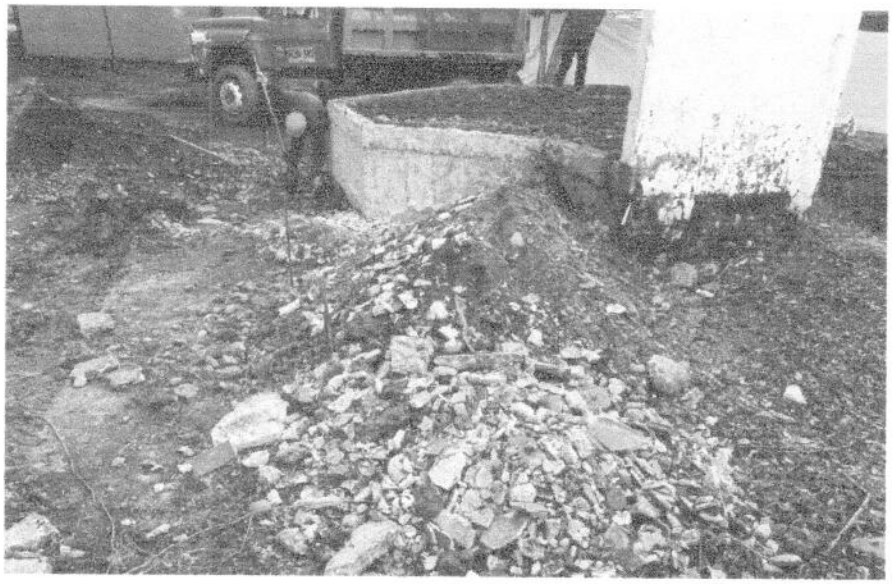

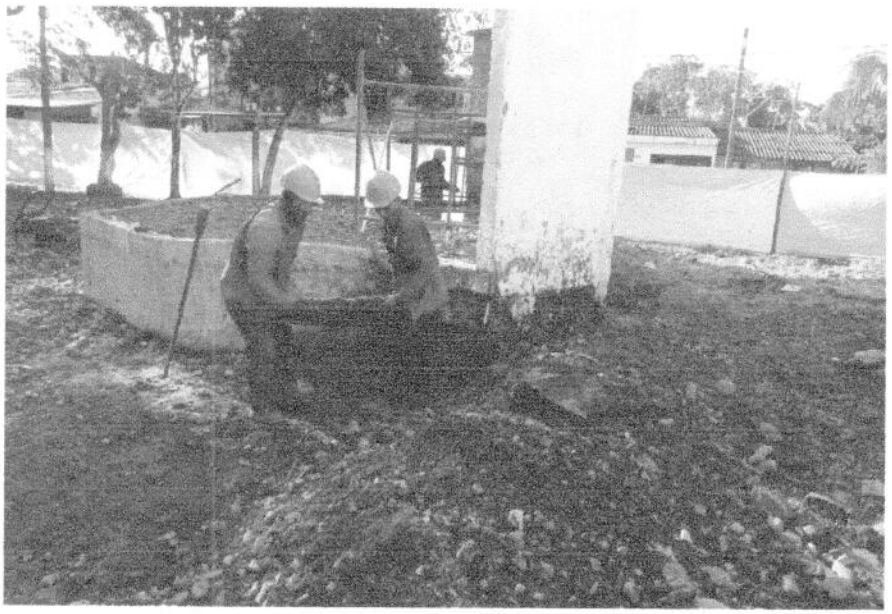

Dirección: Carrera 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta
Tel: 3102623377
consorcioespaciospuerto@gmail.com
Puerto López - Meta

INFORME No 2
PERIODO DEL 28/12/2023 AL 09/02/2024
FECHA DE PRESETANCION: 12/02/2024
PRORROGA

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO:	*OBRA*			
CONTRATO N°:	*100-103-13-09-0004-2023*			
OBJETO CONTRATO:	*ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACÚSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META.*			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*Trecientos catorce millones setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y siete pesos con ochenta y dos centavos. M/cte. ($ 314.786.287,82)*			
CONTRATISTA:	*CONSORCIO ESPACIOS PUERTO*			
CORREO ELECTRONICO:	*Licitaciones.proyectos17@gmail.com*			
FECHA DE INICIACIÓN:	*15/12/2023.*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		***Meses***	*15*	***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*29/12/2023*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*N/A.*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*N/A.*			
CORREO ELECTRONICO:	*N/A.*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ.*			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° 1:				*28/12/2023.*
TIEMPO:		***Meses***	***30***	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*28/01/2024*
SUSPENSIÓN N°1:				*12/01/2024*
TIEMPO:		***Meses***	*20*	***Días***

AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N°XX:		***Meses***		***Días***
TIEMPO:				
REINICIO N°1:	*01/02/2024*			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	*16/02/2024*			
MODIFICACIÓN N°XX:	*N/A*			
VALOR MODIFICADO:	*N/A*			
FECHA ADICIONAL N° XX:	*N/A*			
VALOR ADICIONAL:	*N/A*			
VALOR ACTUALIZADO:	*N/A*			
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	*16/02/2024*			
Relacionar todas las actas suscritas y aprobadas por las partes a la fecha de presentación del informe				

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	*PUERTO LÓPEZ – META.*	***VEREDA:***	
CORREGIMIENTO:		***BARRIO:***	*LA LAGUNA.*
COORDENADAS:	*4°05'35.3"N - 72°57'18.6"W*		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Las siguientes coordenadas señalan el punto donde se construirá la estructura de la concha acústica 4°05'35.3"N 72°57'18.6"W, ubicado . la dirección Cra. 4 #14b-67 a 14b-1, Puerto López, Meta



Imagen 1. Ubicación del predio en el municipio de Puerto López

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE.

Avance físico

	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
1	PARQUE LA LAGUNA								
1,1	MÁSTIL CON TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE ARO Y MALLA								
1.1.1	MÁSTIL METÁLICO CON TABLERO DE 1,20 x 1,80MTS INCLUYE ARO Y MALLA PARA BALONCESTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 3.613.026,00	100%	$ 3.613.026,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1,2	PLACAS EN HEXÁGONOS Y BANCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN								
1.2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	100%	$ 6.035.471,80	100%	$ 6.035.471,80	85%	$ 5.147.869	85%	$ 5.147.869
1.2.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$51.795.348,84	100%	$51.795.348,84	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$35.734.769,28	100%	$35.734.769,28	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	100%	$ 431.801,28	100%	$ 431.801,28	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.5	RELLENO CON GRAVILLA	100%	$ 1.068.665,76	100%	$ 1.068.665,76	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.6	BANCOS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN	100%	$ 2.134.079,00	100%	$ 2.134.079,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.7	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO	100%	$ 2.820.960,00	100%	$ 2.820.960,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.8	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	100%	$ 487.648,00	100%	$ 487.648,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.9	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	100%	$ 4.624,88	100%	$ 4.624,88	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	100%	$ 3.462.325,00	100%	$ 3.462.325,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00

2	CONCHA ACÚSTICA								
2,1	TARIMA								
2.1.1	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	100%	$ 149.908,32	100%	$ 149.908,32	100%	$ 149.908,32	100%	$ 149.908,32
2.1.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	100%	$ 370.552,88	100%	$ 370.552,88	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.1.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 2.679.195,84	100%	$ 2.679.195,84	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.1.4	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 1.260.964,32	100%	$ 1.260.964,32	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.1.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	100%	$ 3.307.139,22	100%	$ 3.307.139,22	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2,2	MUROS								
2.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	100%	$ 360.631,05	100%	$ 360.631,05	100%	$ 360.631,05	100%	$ 360.631,05
2.2.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	100%	$ 686.004,96	100%	$ 686.004,96	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.2.3	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	100%	$ 78.577,35	100%	$ 78.577,35	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.2.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	100%	$ 713.267,20	100%	$ 713.267,20	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.2.5	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	100%	$ 22.473,35	100%	$ 22.473,35	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2,3	ESCALERAS								
2.3.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	100%	$ 171.547,60	100%	$ 171.547,60	100%	$ 171.547,60	100%	$ 171.547,60
2.3.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	100%	$ 183.589,29	100%	$ 183.589,29	100%	$ 183.589,29	100%	$ 183.589,29
2.3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	100%	$ 294.972,36	100%	$ 294.972,36	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.3.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	100%	$ 927.963,89	100%	$ 927.963,89	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.3.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	100%	$ 480.270,00	100%	$ 480.270,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.3.6	PISO EN GRANITO PULIDO	100%	$ 274.359,40	100%	$ 274.359,40	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2,4	INSTALACIONES ELECTRICAS								
2.4.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 450.980,00	100%	$ 450.980,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2.4.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 625.686,00	100%	$ 625.686,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 506.008,00	100%	$ 506.008,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.4	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 431.504,00	100%	$ 431.504,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 1.695.750,00	100%	$ 1.695.750,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.6	ACOMETIDA PARCIAL AL 2No2+1 No10 DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 1.545.200,00	100%	$ 1.545.200,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	100%	$ 1.121.496,00	100%	$ 1.121.496,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.8	POSTE METALICO 4MTS 180X180MM	100%	$ 7.786.068,00	100%	$ 7.786.068,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.9	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 4.629.402,00	100%	$ 4.629.402,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.10	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	100%	$ 203.094,00	100%	$ 203.094,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.11	AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO DE 1½"	100%	$ 493.638,00	100%	$ 493.638,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2.4.12	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 # 14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 556.092,00	100%	$ 556.092,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2,5	CUBIERTA METALICA								
2.5.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	100%	$ 45.787,60	100%	$ 45.787,60	100%	$ 45.787,60	100%	$ 45.787,60
2.5.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	100%	$ 354.415,60	100%	$ 354.415,60	$ 00	$ 354.415,60	100%	$ 354.415,60
2.5.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)	100%	$ 3.744.200,64	100%	$ 3.744.200,64	$ 0,00	0,00%	0,00%	$ 0,00

	INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE								
2.5.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	100%	$ 3.000.601,80	100%	$ 3.000.601,80	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.5	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 3.007.990,44	100%	$ 3.007.990,44	$ 0,00	$0,00%	0,00%	$ 0,00
2.5.6	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 659.290,17	100%	$ 659.290,17	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$71.960.134,84	100%	$71.960.134,84	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.8	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	100%	$ 3.356.765,30	100%	$ 3.356.765,30	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.9	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	100%	$ 212.136,00	100%	$ 212.136,00	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	100%	$ 3.042.145,46	100%	$ 3.042.145,46	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	100%	$ 1.037.325,48	100%	$ 1.037.325,48	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 146.748,00	100%	$ 146.748,00	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00
2.5.13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	100%	$ 132.280,00	100%	$ 132.280,00	$ 0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2.1. COMITÉS, REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	FECHA	ASPECTOS TRATADOS
N.°1	15/12/2023	Inicio de obra
N. °2	12/12/2023	Prórroga de obra N°1
N.° 3	04/01/2024	Suspensión
N.°4	09/02/2024	Prorroga y proyección de modificatoria de contrato

Nota:

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

Se realizaron actividades de relleno en material mixto de rio máximo 3", demoliciones de pañetes, limpiezas de paredes excavaciones conforme a las especificaciones técnicas suministradas al contratista de obra.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad en terreno *Ensayo a compresión en cilindros de concreto* *C.B.R Muestra inalterada* *Flexión de Vigas de Concreto* *Rodadura Asfáltica* *Límite de Consistencia* *Desgaste* *Proctor* *Gradación* *Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles* *Granulometría* *Equivalente de Arena* *otros (Especificar)*	*N/A*	*N/A*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

vxNota: *Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
NELSY MILENA ROJAS	RESIDENTE DE OBRA	100%

Nota: *En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		1060983874				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
FABIAN CASTAÑEDA	OFICIAL	1121890293	9	SALUD TOTAL		SURA

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
001	30 DIAS	El contratista manifiesta problemáticas relacionadas al suministro de los materiales, a causa del cierre de operaciones de sus proveedores en el marco de las festividades decembrinas.
002	20 DIAS	El contratista comunica los inconvenientes que se siguen

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

		presentando en la entrega de materiales por cierres en la vía.
003	*16 DIAS*	*El contratista solicita reinicio de obra, tras la suspensión de 19 días por inconvenientes presentados con los proveedores.*

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	***VALOR ($)***	***JUSTIFICACIÓN***
N/A	*N/A*	*N/A*

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	***VALOR ACTUALIZADO ($)***	***JUSTIFICACIÓN***
N/A	*N/A*	*N/A*

2. GARANTIAS:

ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*CV-100038209*
ANEXO N°	*N/A*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*CV-100010178*
ANEXO N°	*N/A*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.*

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO	*14/12/2023*	*29/04/2024*	*$ 31.478.628,80*
PRESTACIONES SOCIALES	*14/12/2023*	*29/12/2026*	*$ 15.739.314,40*
ESTABILIDAD DE LA OBRA	*29/12/2023*	*29/12/2028*	*$ 62.957.257,60*
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*14/12/2023*	*29/12/2023*	*$ 232.000.000,00*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

PRORROGA NUMERO 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*CV-100038209*
ANEXO N°	*N/A*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*CV-100010178*
ANEXO N°	*N/A*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.*

GARANTIAS	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
	DESDE	*HASTA*	
CUMPLIMIENTO	*28/12/2023*	*04/06/2024*	*$ 31.478.628,80*
PRESTACIONES SOCIALES	*28/12/2023*	*03/02/2027*	*$ 15.739.314,40*
ESTABILIDAD DE LA OBRA	*03/01/2024*	*03/01/2029*	*$ 62.957.257,60*
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*19/12/2023*	*03/02/2024*	*$ 232.000.000,00*

REINICIO DE OBRA NUMERO 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*CV-100038209*
ANEXO N°	*N/A*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*CV-100010178*
ANEXO N°	*N/A*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.*

GARANTIAS	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
	DESDE	*HASTA*	
CUMPLIMIENTO	*01/02/2024*	*20/06/2024*	*$ 31.478.628,80*
PRESTACIONES SOCIALES	*01/02/2023*	*24/02/2027*	*$ 15.739.314,40*
ESTABILIDAD DE LA OBRA	*03/01/2024*	*03/01/2029*	*$ 62.957.257,60*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*02/02/2024*	*03/01/2029*	*$ 232.000.000,00*

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
01897	*08/11/2023*	2.3.33.3302.1604.15 BPIN 2020505730032 Construcción, mejoramiento, mantenimiento y dotación de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Puerto López	*$ 57.715.733,00*
		2.3.33.3302.1603.02 BPIN 2020505730048 Construcción adecuar, mantener, salvaguardar y conservar los escenarios culturales y artísticos del municipio de Puerto López.	*$ 12.200.000,00*
		2.3.33.3302.1603.03 BPIN 2020505730048 Construcción adecuar, mantener, salvaguardar y conservar los escenarios culturales y artísticos del municipio de Puerto López.	*$ 250.000.000,00*

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
02052	*14/12/2023*	2.3.33.3302.1604.15 BPIN 2020505730032 Construcción, mejoramiento, mantenimiento y dotación de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Puerto López	*$ 56.787.446,32*
		2.3.33.3302.1603.02 BPIN 2020505730048 Construcción adecuar, mantener, salvaguardar y conservar los escenarios culturales y artísticos del municipio de Puerto López.	*$ 11.993.357,57*
		2.3.33.3302.1603.03 BPIN 2020505730048 Construcción adecuar, mantener, salvaguardar y conservar los escenarios culturales y artísticos del municipio de Puerto López.	*$ 246.005.483,93*


PAGOS REALIZADOS

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *15/12/2023*

Avance físico ejecutado 2,67% y avance financiero ejecutado 0,00%

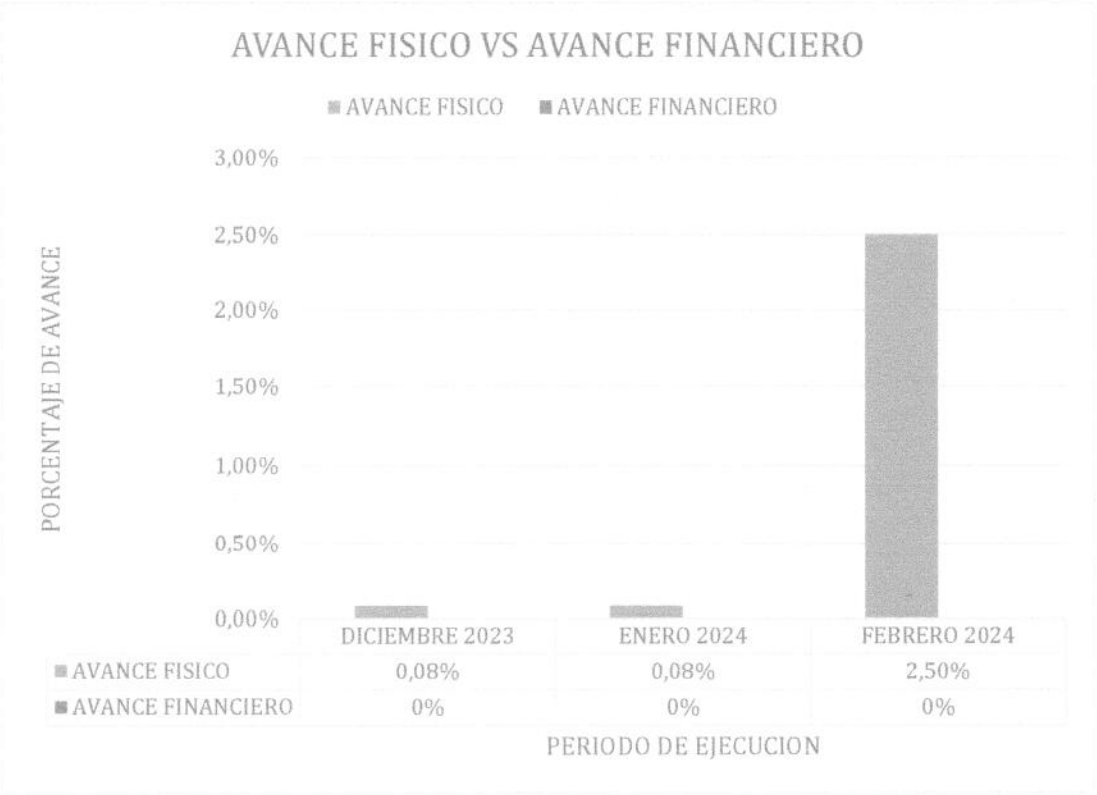

INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra, remitir como anexo al presente informe cuando aplique*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

La realización de la obra cuyo objeto es **ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACÚSTICA EN EL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META**, Presenta retrasos en la ejecución del proyecto dado que no ha sido posible alcanzar los rendimientos propuestos, esto se dio debido a una revisión del contrato y actividades específicas del mismo y se encontró un considerable aumento en las dimensiones de algunas actividades, por lo cual se le solicita al contratista realizar un cronograma de actividades aterrizado que contemple la fecha final de terminación del proyecto de manera idónea y con esto sustentar una prórroga final.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTIVIDADES EJECUTADAS		
	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	PARQUE LA LAGUNA							
1,1	MÁSTIL CON TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE ARO Y MALLA							
1.1.1	MÁSTIL METÁLICO CON TABLERO DE 1,20 x 1,80MTS INCLUYE ARO Y MALLA PARA BALONCESTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 3.613.026,00	$ 3.613.026,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
	COSTO SUBTOTAL				$ 3.613.026,00			
1,2	PLACAS EN HEXÁGONOS Y BANCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN							
1.2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	161,29	$ 37.420,00	$ 6.035.471,80	137,57	$ 5.147.869	85 %
1.2.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	62,28	$ 831.653,00	$ 51.795.348,84	0.00	$ 0.00	0.00 %
1.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3902,88	$ 9.156,00	$ 35.734.769,28	0.00	$ 0.00	0.00 %
1.2.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	3,24	$ 133.272,00	$ 431.801,28	0.00	$ 0.00	0.00 %
1.2.5	RELLENO CON GRAVILLA	M3	10,96	$ 97.506,00	$ 1.068.665,76	0.00	$ 0.00	0.00 %
1.2.6	BANCOS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN	UND	9,00	$ 1.348.231,00	$ 12.134.079,00	0.00	$ 0.00	0.00 %

1.2.7	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO	ML	10,00	$ 282.096,00	$ 2.820.960,00	0,00	$ 0,00	0,00 %
1.2.8	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5,60	$ 87.080,00	$ 487.648,00	0,00	$ 0,00	0,00 %
1.2.9	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,04	$ 115.622,00	$ 4.624,88	0,00	$ 0,00	0,00 %
1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25,00	$ 138.493,00	$ 3.462.325,00	0,00	$ 0,00	0,00 %
			COSTO SUBTOTAL		$113.975.693,84		$ 3.035.471,90	
2	CONCHA ACÚSTICA							
2,1	TARIMA							
2.1.1	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	10,76	$ 13.932,00	$ 149.908,32	10,76	$149.906,32	100%
2.1.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,76	$ 34.438,00	$ 370.552,88	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.1.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,44	$ 778.836,00	$ 2.679.195,84	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.1.4	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	137,72	$ 9.156,00	$ 1.260.964,32	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.1.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	34,43	$ 96.054,00	$ 3.307.139,22	0,00	$ 0,00	0,00 %
			COSTO SUBTOTAL		$ 7.767.760,58			
2,2	MUROS							
2.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	51,35	$ 7.023,00	$ 360.631,05	51,35	$360.631	100 %
2.2.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	19,92	$ 34.438,00	$ 686.004,96	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.2.3	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,95	$ 19.893,00	$ 78.577,35	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.2.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	51,20	$ 13.931,00	$ 713.267,20	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.2.5	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	13,15	$ 1.709,00	$ 22.473,35	0,00	$ 0,00	0,00 %
			COSTO SUBTOTAL		$ 1.860.953,91		$ 0,00	
2,3	ESCALERAS							
2.3.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,97	$ 87.080,00	$ 171.547,60	1,97	$ 171.547,60	100 %

2.3.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,51	$ 359.979,00	$ 183.589,29	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	34,67	$ 8.508,00	$ 294.972,36	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.3.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,67	$ 555.667,00	$ 927.963,89	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.3.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	5,00	$ 96.054,00	$ 480.270,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.3.6	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1,40	$ 195.971,00	$ 274.359,40	0.00	$ 0.00	0.00 %
			COSTO SUBTOTAL		$ 2.332.702,54		$ 0.00	
2,4	INSTALACIONES ELECTRICAS							
2.4.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 112.745,00	$ 450.980,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$ 104.281,00	$ 625.686,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2,00	$ 253.004,00	$ 506.008,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.4	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 431.504,00	$ 431.504,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	35,00	$ 48.450,00	$ 1.695.750,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.6	ACOMETIDA PARCIAL AL 2No2+1 No10 DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 38.630,00	$ 1.545.200,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	3,00	$ 373.832,00	$ 1.121.496,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.8	POSTE METALICO 4MTS 180X180MM	UND	3,00	$ 2.595.356,00	$ 7.786.068,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.9	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	3,00	$ 1.543.134,00	$ 4.629.402,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.10	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	3,00	$ 67.698,00	$ 203.094,00	0.00	$ 0.00	0.00 %
2.4.11	AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO DE 1½"	UND	3,00	$ 164.546,00	$ 493.638,00	0.00	$ 0.00	0.00 %

2.4.12	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 # 14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	13,50	$ 41.192,00	$ 556.092,00	0,00	$ 0,00	0,00 %
			COSTO SUBTOTAL		$ 20.044.918,00		$0,00	
2,5	CUBIERTA METALICA							
2.5.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	9,04	$ 5.065,00	$ 45.787,60	9,04	$ 45.787,60	100%
2.5.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	4,07	$ 87.080,00	$ 354.415,60	4,07	$ 354.415,60	100 %
2.5.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	440,08	$ 8.508,00	$ 3.744.200,64	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	5,40	$ 555.667,00	$ 3.000.601,80	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.5	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,38	$ 889.938,00	$ 3.007.990,44	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.6	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,69	$ 955.493,00	$ 659.290,17	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3127,07	$ 23.012,00	$ 71.960.134,84	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.8	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	159,58	$ 21.035,00	$ 3.356.765,30	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.9	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	UND	24,00	$ 8.839,00	$ 212.136,00	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	71,59	$ 42.494,00	$ 3.042.145,46	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	9,78	$ 106.066,00	$ 1.037.325,48	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	$ 24.458,00	$ 146.748,00	0,00	$ 0,00	0,00 %
2.5.13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	$ 33.070,00	$ 132.280,00	0,00	$ 0,00	0,00 %
			COSTO SUBTOTAL		$ 90.699.821,33		$ 400.203	
	COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)				$240.294.876,20		$ 6.413.748,86	
				ADMINISTRACIÓN 26%	$ 62.476.667,81		$ 1.667.574,70	
				IMPREVISTOS 1%	$ 2.402.948,76		$ 64.137,49	
				UTILIDAD 4%	$ 9.611.795,05		$ 256.549,95	
				AIU 31%	$ 74.491.411,62		$ 1.988.262,14	
				TOTAL, COSTO PRESUPUESTO	$314.786.287,82	TOTAL, EJECUTADO	$ 8.402.011,00	2,67 %

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA .

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PARQUE LA LAGUNA	EJECUTADO	%
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	$5.147.869	85%



OBSERVACIONES

Se evidencia el suministro del relleno con material mixto de río sin procesar tamaño Max. 3", así como el extendido, nivelación, humedecimiento y compactación del mismo en el sitio de ejecución de las obras.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONCHA ACUSTICA	EJECUTADO	%
	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 INCLUYE TRASIEGO Y CARGIUE MANUAL	$ 149.908	100%



OBSERVACIONES
Se evidencia demolición de muros de la tarima de la concha acústica

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONCHA ACUSTICA	EJECUTADO	%
	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	$ 360.631	100%



OBSERVACIONES
Se evidenciaron actividades de limpieza en toda el área de muros y senderos de la concha

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONCHA ACUSTICA	**EJECUTADO**	%
	EXCAVACION MANUAL EN CONCLOMERADO H=0 – 2.00 M INCLUYE CARGUE	$ 171.548	100%



OBSERVACIONES

Se evidenciaron actividades de excavación manual en área de las escaleras y se realiza el retiro del material de excavación.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONCHA ACUSTICA	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	$ 183.589	100%



OBSERVACIONES
Se evidenciaron actividades de demolición de escalera existente y cargue manual de escombros.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONCHA ACUSTICA	**EJECUTADO**	%
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	$ 45.787,60	100%



OBSERVACIONES
Se evidenciaron actividades de localización y replanteo requerido en las actividades relacionadas a la cubierta de la concha acústica.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA – SUSPENSIÓN - REINICIO

La prórroga del contrato de la obra cuyo objeto es **ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACÚSTICA EN EL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META** se justifica dado que los rendimientos propuestos para la ejecución del contrato inicialmente no se relacionan con los rendimientos que se han podido alcanzar por parte del contratista de obra, teniendo en cuenta las condiciones y características de las actividades en desarrollo. Por esta razón se recalcularon los tiempos de ejecución basados en dichos rendimientos, en los cuales se ve la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución del contrato a 60 días adicionales al tiempo de ejecución aprobado en la prórroga N.º 1 del 28 de diciembre de 2023, con el fin de dar cumplimiento con el alcance y objeto del contrato.

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conforme a la justificación presentada, la supervisión viabiliza el trámite de prorroga en el periodo 60 días contados a partir de la fecha presente, teniendo presente la relación del cronograma de actividades que contempla el desarrollo de ejecución de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban.

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social

NELSY MILENA
RESIDENTE DE OBRA
Nº MATRICULA PROFESIONAL: 25202-146782

MARYLIN PAOLA FONSECA
SUPERVISOR ASIGNADO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-13, 09:32:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1060983874

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 13/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO		
Documento	NI901781193	**Dirección**	CL 23 #9 - 50
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	66189000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	BRICEÑO RAMIREZ IVANA DURLEY	**Identificación**	CC 1122137612
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 1121660953	HECTOR FABIAN CAETANEDA SIERRA	01	00	X															0	0	0	0	0		(230201) PROTECCION	$ 390,000	$ 62,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 390,000	$ 15,600	6.960	$ 390,000	$ 27,200	(CCF04) COFREM	$ 390,000	$ 15,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,800
CC 1121660183	YADY JOHANNA HERRERA DIAZ	01	00	X															0	16	16	16	16		(230201) PROTECCION	$ 693,334	$ 111,000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 693,334	$ 27,800	6.960	$ 693,334	$ 48,500	(CCF04) COFREM	$ 693,334	$ 27,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214,900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,083,334	$ 1,083,334	$ 1,083,334	$ 1,083,334	$ 173,400	$ 43,400	$ 75,500	$ 43,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335,700	$ 0	$ 335,700

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618950 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE COMITE**	**Código: F – 166** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

Acta No:	04	**Fecha (dd/mm/aa):**	09 febrero 2024
Ubicación:	BARRIO LA ALGUNA PUERTO LOPEZ	**Hora Inicio:**	08:00 AM
		Hora Final:	10:00 AM
Responsable:	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO	**Contrato:**	100-103-13-09-0004-2023
Objetivo de la reunión:	SOLICITUD PRORROGA Nº2 POR PARTE DEL CONTRATISTA		
Dirige la Reunión:		**Diligencia la presenta acta:**	

1. Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Ivana Briceño	**Representante legal**	**Consorcio espacios puerto**	
Nelsy rojas	**Residente de obra**	**Consorcio espacios puerto**	
Marylin Fonseca	**Supervisora**	**Alcaldía municipal de puerto lopez**	

2. Agenda de la reunión (Temas)

1.	Socialización de modificatoria para cantidades mayores y menores e ítems no previstos.
2.	Revisión porcentaje de lluvias registrado durante el periodo de ejecución
3.	Solicitud de prórroga por parte del contrato

3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

1	Se inicia comité, presentándose cada uno de los participantes al comité: contratista y supervisión por parte de la alcaldía, donde se exponen los temas a tratar que involucran la ejecución de las actividades correspondientes al contrato N.° 100-103-13-09-0004-2023, dicho comité se reúne en el barrio la laguna donde se encuentra ubicada la obra en ejecución.
2	La Ingeniera Nelsy Rojas en función de residente de obra inicia presentando los hallazgos descubiertos durante la revisión del contrato de obra. Dichos hallazgos evidencian la necesidad de una solicitud de modificación debido a la revisión de actividades y la toma de medidas en obra, ítems que no fueron previstos en las actividades eléctricas originales, pero que son fundamentales para garantizar una instalación correcta. Además, se expone el registro de lluvias durante el período comprendido entre el 01 de febrero de 2024 y el 09 de febrero de 2024, fecha en la que se llevó a cabo el comité de obra correspondiente. Asimismo, se exponen las dudas concernientes al tiempo de terminación del proyecto, lo que lleva a un acuerdo mutuo de llevar a cabo la prórroga N°2. Esta decisión se sustenta en el cronograma de actividades elaborado en el proyecto y en el flujo de caja, teniendo en cuenta cada una de las actividades incluidas en el contrato.
3	Se da por culminado el comité, concluyendo los compromisos que se deberán cumplir según los establecido con supervisión de la alcaldía y contratistas.

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Entrega de documentación para prorroga N°2	CONTRATISTA DE OBRA	09 DE FEBRERO DE 2024	
Entrega de solicitud de modificatoria según formatos suminstrados por supervisión	CONTRATISTA DE OBRA	15 DE FEBRERO 2024	

6. Información de la próxima Reunión

Fecha: 16 de febrero 2024
Hora: 08:00 am
Lugar: Alcaldía municipal de puerto Lopez

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	Seguimiento a solicitud de modificatoria y revisión de documentación a entregar
2	Revisión de avance de obra a la fecha
3	
4	
