E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO _____ 2. AREA _____

3. CONTRATISTA LEVELS

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA LUZ MARY CASTAÑO

COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES
COPIA ACTA DE INICIO		104
INFORME DE ACTIVIDADES		098 H1
PAGO S.G.S.S.S		079 R2
CERT. BANCARIA		068 R3
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

Alcaldía Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 14/02/24
HORA: _____
FOLIOS: _____
No.Radicación: _____
Firma: Sonia Pedraza

SUPERVISOR: WILLIAN CORTES

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 161

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
C.P. 9093		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD: _____

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	14-2-24	

TESORERIA: _____

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

LEVELS SAS
NIT 901.380.377-9
MZ 2 CS 24 MADEIRA
Tel: (031) 3004937014
Girardot - Colombia
edwardmurcas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. LEVE 110

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
NIT	832.001.794-2	**Teléfono**	(031) 7293922
Dirección	CARRERA 2 No 12-38	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2024, 15:24
Expedición	13/02/2024, 15:24
Vencimiento	13/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 601-2023 - PAGO ACTA PARCIAL 002 FASE 2, CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.	1.00	39,226,957.29
2	ADMINISTRACIÓN (23,0%)	1.00	9,022,200.18
3	IMPREVISTOS (2,0%)	1.00	784,539.15
4	UTILIDAD (5,0%)	1.00	1,961,347.86

Fase 2
Carla 2

Total items: 4

Total Bruto	50,995,044.48
Total a Pagar	50,995,044.48

Valor en Letras:
Cincuenta millones novecientos noventa y cinco mil cuarenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 50,995,044.48

Observaciones:
IVA DEL 19,0% SOBRE UTILIDAD DEL 5,0% EQUIVALENTE A $372.656,09

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 14/02/24
HORA: 11.09
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma: Monica Martinez

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061202760 aprobado en 20231204 prefijo LEVE desde el número 101 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 658a77e4bb6a4a95c509bdf4f7ca1612495403a7d210e6200ddef32fb4429d4f5cbaba2d91cb3022115880e32ec8f001

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

Soacha, 14 de febrero de 2024

Doctor
WILLIAM CORTES ESPITIA
Tesorero / Supervisor de Contrato
ESE MUNICIPAL DE SOACHA
Ciudad

Asunto: **Aprobación del cumplimiento técnico de la CUENTA DE COBRO No. 002 - Fase 2 del Contrato de Obra No. 601-2023**

Cordial saludo.

El suscrito **ARQ. JUAN FELIPE GARZON CASTAÑO**, en calidad de apoyo técnico a la supervisión del contrato de obra 601-2023, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASE 1 Y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION EXIGIDOS POR LAS NORMATIVAS VIGENTES**, certifico que la documentación presentada correspondiente a la **CUENTA DE COBRO No 002** con factura No **leve 110** del periodo comprendido entre el 1 al 29 de Diciembre de 2023 por un valor de **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 50.995.044,48 M/CTE)**, radicado con C.C 002 del 14 de febrero de 2024, cumpliendo a cabalidad con la ejecución contractual.

Atentamente,

JUAN FELIPE GARZON CASTAÑO
Arquitecto referente de Infraestructura

ARQUITECTO. LILIANA PARRA CASTELLANOS
INTERVENTORIA

Bogotá D.C, 13 Febrero del 2024.

OFICIO-INTERV-018-13-02-2024

SEÑORES.
E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
Atte. WILLIAM CORTES
Supervisor de contrato
Ciudad

Referencia. Contrato de Consultoría **No. 618-2023**, celebrado entre la empresa social del estado E.S.E municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza y Liliana Parra Castellanos.

Asunto. CUMPLIDO TECNICO, ADMNISTRATIVO, JURIDICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL

La suscrita **ARQ. LILIANA PARRA CASTELLANOS**, en calidad de directora de interventoría con cedula No. 52.226.390, en desarrollo del contrato vigente, cuyo objeto consiste en "**INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 601 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y LEVELS S.A.S.**", me permito certificar que:

El contratista **LEVELS S.A.S** con NIT 832.001.794-2, quien ejecuta el contrato de obra N° 601-2023, cuyo objeto consiste en "**CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 Y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTODE LOS ESTANDARES DE HABILITACION EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDADES VIGENTES**" ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo que se **AUTORIZA** el valor a pagar y las cantidades y valores ejecutados consignados en el **Corte de obra No.2 de la Fase 2** del periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre de 2023 resultando un valor de **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS Y CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 50.995.044, 48).**

Así mismo, certifico que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el corte No. 2 fueron medidos y verificados en su totalidad y se encuentran conforme con lo contratado. El valor de la presente acta corresponde a la Factura Electrónica de Venta N° 110 del 13/02/2024.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 13 de Febrero de 2024

Sin otro particular,



LILIANA PARRA CASTELLANOS
ARQUITECTO
DIRECTOR INTERVENTORIA

Levels Sas

Soacha, Cundinamarca; martes 13 de febrero del 2024,

Arquitecta:
LILIANA PARRA CASTELLANOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Atte.: Directora Interventoría
Copia Supervisión delegada
arqlilianaparracastellanos@gmail.com
subgerenciaad.esesoacha@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública No 601 de 2023, Celebrado entre la Empresa de Salud Empresa Social del Estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza y Levels S.A.S
Asunto: Entrega Documentos Acta Parcial de Obra 002 Fase 2

Respetados señores,

Dando cumplimiento a las actividades contratadas y demás requisitos, respetuosamente hacemos entrega de la documentación requerida para el trámite de pago Acta Parcial de Obra 002 Fase 2; a continuación, entregamos:

A. Cumplido No 2 – Fase 2 INTERVENTORIA
B. Cumplido No 2 – Fase 2 SUPERVISION CONTRATO

DOCUMENTOS ANEXOS:

1. Factura Electrónica
2. Certificación Bancaria
3. Informe de Obra Parcial 002 Fase 2
4. Acta Mayores y Menores Cantidades de Obra 002 Fase 2
5. Acta de Aprobación de Pactacion de Precios No 2
6. Acta Parcial de Obra 002 Fase 2
7. Memoria Cantidades de Obra Fase 2
8. Garantías del Proceso
9. Pago Seguridad Social
10. Certificación Pago Seguridad Social
11. Registro Fotográfico

Agradeciendo su gestión y valiosa colaboración para la cancelación de las actividades ejecutadas,

respetuosamente,

LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.
DIRECTOR DE PROYECTO

Levels Sas

INFORME PARCIAL DE OBRA No 002
FASE 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No 601-2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTRATANTE:
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
NIT No. 832.002.794-2

CONTRATISTA DE OBRA:
LEVELS S.A.S
NIT. 901.380.377-9

SUPERVISION DELEGADO:
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
NIT No. 832.002.794-2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOACHA
DICIEMBRE 2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. DESCRIPCION – LOCALIZACION
3. EQUIPO – HERRAMIENTA
4. MAQUINARIA
5. ACTIVIDADES CONTRATADAS FASE 2
6. RELACION DE PAGOS
7. AVANCES ACTIVIDADES
8. MANO DE OBRA
9. COMPONENTE AMBIENTAL
10. COMPONENTE SISOMA
11. RECOMENDACIONES – CONCLUSIONES

1. INTRODUCCION

La E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA, en cabeza de su directora MARIA VICTORIA HERRERA ROA, buscando mejorar el inventario físico de la entidad, a su vez; comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del municipio y el desarrollo territorial, utilizando los mecanismos de contratación pública y demás instrumentos, consolido el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 601 DE 2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE; dándose inicio el día cinco (05) de octubre del 2023.

En el presente informe, se consignan las actividades de obra civil y control del proceso constructivo durante el periodo Parcial 002 de la Fase 2.

2. DESCRIPCION – LOCALIZACION

Contrato de Obra Pública No 601-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE, dando inicio al mismo, el día cinco (05) de octubre del 2023.

CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA No 601 - 2023			
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE			
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CVS. $472.318.372,94			
CONTRATANTE	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2 R.L. MARIA VICTORIA HERRERA ROA			
CONTRATISTA	LEVELS S.A.S R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON			
INTERVENTORIA	LILIANA PARRA CASTELLANOS			
FECHA DE INICIO	05 DE OCTUBRE DEL 2023			
OTRO SI MODIFICATORIO No 1	N.A.			
OTRO SI No	N.A.			
PLAZO:	TRES (03), HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
FECHA TERMINACION PROYECTADA	31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
SUPERVISOR	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2			
RP	03-OCTUBRE DEL 2023			
POLIZAS	APROBACION: 04-OCTUBRE DEL 2023			
	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	**No POLIZA**	560-47-994000169322
	AMPARO	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS		
	ANEXO No		N.A.	
	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	**No POLIZA**	560-74-994000031104
	AMPARO	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	ANEXO No		N.A.	

Nota: Información tomada del contrato de obra, acta de inicio y carpeta del proceso

LOCALIZACION



MUNICIPIO SOACHA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Georreferenciación: 4°33'59.92"N, 74°11'13.05"O
Centro de Salud Ciudadela Sucre
Departamento Cundinamarca

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

3. EQUIPO – HERRAMIENTA

- MEZCLADORA DIÉSEL DE 1 BULTO
- BOGUE
- FORMALETA TIPO CAMILLA
- PULIDORA
- CIERRA ELÉCTRICA PORTÁTIL
- TALADRO DEMOLEDOR
- TALADRO ELECTRICO
- NIVEL LASER
- DECAMETRO
- HERRAMIENTA MENOR

4. MAQUINARIA

- VOLQUETA DIÉSEL DE 6 M3
- COMPACTADOR DIÉSEL TIPO RANA
- PLANTA ELECTRICA PORTATIL

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS

FASE 1

No	No ICCU / CODIGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT
1		PRELIMINARES		
1.1	1.8 ICCU	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	20,00
2		DEMOLICIONES		
2.1	1.12 ICCU	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO (AREAS COMUNES)	M2	250,00
2.2	1,26 ICCU	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	9,00
2.3	1.11 ICCU	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	250,00
2.4	1.16 ICCU	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	12,00
3		MAMPOSTERÍA		
3.1	5.15 ICCU	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (BAÑOS)	M2	10,00
4		ESTRUCTURA - CUBIERTA		
4.1	1.34 ICCU	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	250,00
4.2	7.28 ICCU	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	250,00
4.3	7.34 ICU	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	12,00
4.4	1.14 ICCU	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO (DESMONTE Y RETIRO INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	250,00
4.5	15.3 ICCU	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	250,00
5		PISOS		
5.1	14. 6 ICCU	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	250,00
5.2	14.42 ICCU	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	300,00
6		PAÑETES		
6.1	6.15 ICCU	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	280,00
7		PINTURAS		
7.1	18.26 ICCU	PINTURA EPÓXICA PARA (ODONTOLÓGICO, VACUNACION, ENFERMERIA, ESTERILIZACION, TOMA DE MUESTRAS)	M2	100,00
7.2	18.16 ICCU	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	600,00
8		APARATOS SANITARIOS		
8.1	1.32 ICCU	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS EXISTENTE)	UN	6,00

8.2	1.32 ICCU	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00
8.3	17.6 ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00
8.4	17.1 ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4,00
9		CARPINTERIA DE ALUMINIO - ACERO Y METALICA (FE)		
9.1	10.16 ICCU	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	20,00
9.2	1.38 ICCU	DESMONTE MARCOS - PUERTAS	UN	20,00
9.3	17.13 ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00
9.4	APU 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 .50CM DE ANCHO	ML	12,00
9.5	APU 3	SUMINISTRO INSTALACIÓN DIVISIÓN MODULAR EN VIDRIO CALIBRE 10 MM CON HERRAJES Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. H: 1.90 M	M2	58,43
10		EQUIPOS		
10.1	21.1 ICCU	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO (SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO Direccionable D-7050)	UN	6,00
11		ESPEJOS, VIDRIOS Y CERRADURAS		
11.1	9.24 ICCU	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM (1.0 *.60M)	M2	10,00
11.2	9.31 ICCU	VIDRIO INCOLORO DE 5 MM	M2	20,00

FASE 2

No	No ICCU / CODIGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT
1		PRELIMINARES		
1.1	1.8 ICCU	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	20,00
2		DEMOLICIONES		
2.1	1.12 ICCU	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO (AREAS COMUNES)	M2	250,00
2.2	1,26 ICCU	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	9,00
2.3	1.11 ICCU	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	250,00
2.4	1.16 ICCU	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	12,00
3		MAMPOSTERÍA		
3.1	5.15 ICCU	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (BAÑOS)	M2	10,00
4		ESTRUCTURA - CUBIERTA		
4.1	1.34 ICCU	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	250,00
4.2	7.28 ICCU	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	250,00
4.3	7.34 ICU	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	12,00
4.4	1.14 ICCU	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO (DESMONTE Y RETIRO INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	250,00
4.5	15.3 ICCU	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	250,00
5		PISOS		
5.1	14. 6 ICCU	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	250,00
5.2	14.42 ICCU	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	300,00
6		PAÑETES		
6.1	6.15 ICCU	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	280,00
7		PINTURAS		
7.1	18.26 ICCU	PINTURA EPÓXICA PARA (ODONTOLÓGICO, VACUNACION, ENFERMERIA, ESTERILIZACION, TOMA DE MUESTRAS)	M2	100,00
7.2	18.16 ICCU	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	600,00
8		APARATOS SANITARIOS		
8.1	1.32 ICCU	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS EXISTENTE)	UN	6,00
8.2	1.32 ICCU	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00
8.3	17.6 ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00
8.4	17.1 ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4,00
9		CARPINTERIA DE ALUMINIO - ACERO Y METALICA (FE)		
9.1	10.16 ICCU	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	20,00
9.2	1.38 ICCU	DESMONTE MARCOS - PUERTAS	UN	20,00
9.3	17.13 ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00
9.4	APU 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 .50CM DE ANCHO	ML	12,00
9.5	APU 3	SUMINISTRO INSTALACIÓN DIVISIÓN MODULAR EN VIDRIO CALIBRE 10 MM CON HERRAJES Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. H: 1.90 M	M2	58,43
10		EQUIPOS		
10.1	21.1 ICCU	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO (SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO Direccionable D-7050)	UN	6,00
11		ESPEJOS, VIDRIOS Y CERRADURAS		
11.1	9.24 ICCU	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM (1.0 *.60M)	M2	10,00
11.2	9.31 ICCU	VIDRIO INCOLORO DE 5 MM	M2	20,00

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

6. RELACION DE PAGOS

Dadas las características y exigencias del contrato, no se contempló pago de anticipo o pago similar.

RELACION DE VALORES:

RELACION PAGOS			
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$**	**472.318.372,94**	**100%**
VALOR ANTICIPO	$	-	0,00%
VALOR ACTA PARCIAL 001 FASE 1	$	90.787.095,54	19,22%
VALOR ACTA PARCIAL 001 FASE 2	$	37.269.525,90	7,89%
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 001 (FASE 1 + FASE 2)	**$**	**128.056.621,44**	**27,11%**

VALOR CONTRATADO	**$ 472.318.372,94**	**EQUIVALENTE CONTRATADO**	**39,73%**	**VALOR EJECUTADO PARCIAL 001 – FASE 2**	**$ 37.269.525,90**	**EQUIVALENTE EJECUTADO FASE 2**	**7,89%**

7. AVANCES ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 601-2023

DETALLADO PAGOS			
VALOR TOTAL CONTRATADO INICIALMENTE	**$**	**472.318.372,94**	**100%**
FASE 1			
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA FASE 1	**$**	**284.671.532,85**	**60,27%**
VALOR ACTA PARCIAL 001 FASE 1	$	90.787.095,54	19,22%
VALOR ACTA PARCIAL 002 FASE 1 (A)	$	74.728.489,17	15,82%
VALOR ACUMULADA SIN EJECUTAR FASE1	$	119.155.948,14	25,23%
FASE 2			
NUEVO VALOR PRESUPUESTO FASE 2	**$**	**187.646.840,09**	**39,73%**
VALOR ACTA PARCIAL 001 FASE 2	$	37.269.525,90	7,89%
VALOR ACTA PARCIAL 002 FASE 2 (B)	$	50.995.044,48	10,80%
VALOR ACUMULADA SIN EJECUTAR FASE 2	$	99.382.269,71	21,04%
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 002 (A)+(B)	**$**	**125.723.533,65**	**27,11%**
VALOR TOTAL EJECUTADO (FASE 1: PARCIAL 001,002 + FASE 2: PARCIAL 001,002)	$	253.780.155,10	53,73%
VALOR ACUMULADO SIN EJECUTAR	$	218.538.217,84	46,27%

EQUIVALENTE CONTRATADO	**39,73%**	**EQUIVALENTE EJECUTADO**	**18,69%**

Nota: la anterior relación se proyecta en virtud para tramite del cobro Acta Parcial 002 de la Fase 2, los valores relacionados son el resultado de las actividades de obra ejecutadas durante el periodo parcial 002 de la fase 2 y establecen de manera informativa las cifras y rendimientos ejecutados.

8. MANO DE OBRA

Dando cumplimiento a las exigencias presentadas por la parte contratante y buscando la armonía en todas las partes, el contratista de obra utilizo el siguiente personal:

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FRENTE DE TRABAJO
1	GONZALEZ ERIKA VALENTINA	1010236968	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA
1	FAJARDO SUAREZ JHON FREDY	83226345	OFICIAL DE OBRA	MAMPOSTERIA
2	OLMOS HERRERA DAVID ANDRES	1073688065	AYUDANTE DE OBRA	ESTUCO Y PINTURA
3	OVALLE SALAZAR WILSON	79823635	MAESTRO DE OBRA	REPELLOS Y MAMPOSTERÍA
4	ROJAS GARAY EDWIN ARMANDO	79220973	OFICIAL DE OBRA	REPELLOS Y MAMPOSTERÍA
5	TIRIA BARBOSA CARLOS ANDRES	1073695023	AYUDANTE DE OBRA	ESTUCO Y PINTURA
6	RAMOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	11389444	OBRA BLANCA	ACABADOS – INSTALADORES CIELORASO
7	ROMERO FORERO WILIAM ANTONIO	11220311	OBRA BLANCA	ACABADOS – INSTALADORES CIELORASO
8	MOLINA DEVIA DAGOBERTO	11306986	OBRA BLANCA	ACABADOS – INSTALADORES CIELORASO
9	LUIS JOSE SEPULVEDA	4237752	OBRA BLANCA	ACABADOS – INSTALADORES CIELORASO
10	MORA OSPINA JEFERSON STIVEN	1000781738	OBRA BLANCA	ACABADOS – INSTALADORES CIELORASO
11	MORA ALEJO SAMUEL	79767875	OBRA BLANCA	ACABADOS – INSTALADORES CIELORASO
12	MOSQUERA DEOGRACIAS	91130653	OBRA BLANCA	ACABADOS – INSTALADORES CIELORASO


9. COMPONENTE AMBIENTAL

Acatando las directrices de la entidad contratante y las políticas ambientales se realizaron las siguientes en direccionamiento del buen desarrollo del contrato:

1. Recolección residuos de obra.
2. Aislamiento de las ares de trabajo.
3. Clasificación del material resultante de demoliciones obra.
4. Puntos de recepción del material resultante de demoliciones de obra

Nota: Estas actividades fueron ejecutadas bajo el monitoreo de la interventoría de obra.

A continuación, se adjunta evidencia de los procesos en sitio:

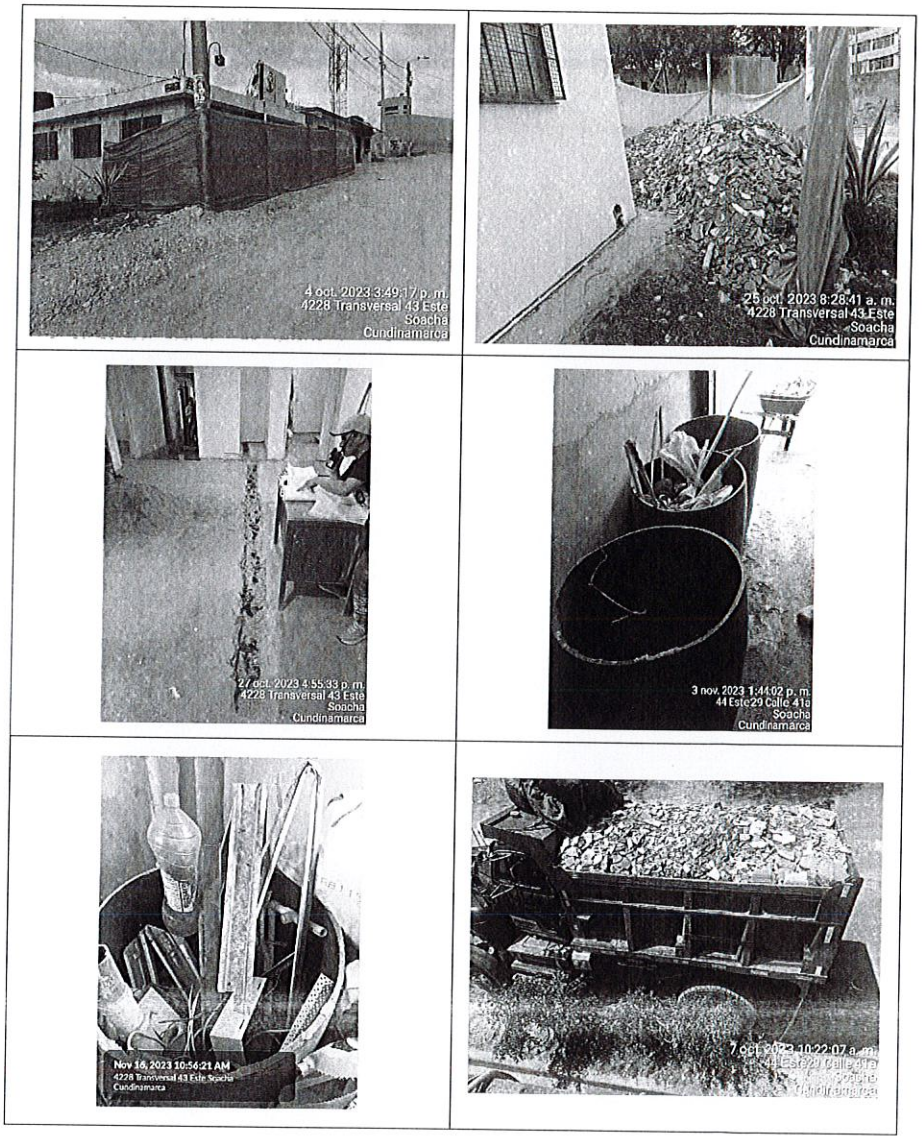

Todos los procesos fueron direccionados evitando daños ambientales, daños a terceros y cumpliendo con las exigencias del proceso.

10. COMPONENTE SISOMA


Acatando las exigencias del contrato y demás componentes, se analizaron y realizaron los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo:

- Reposición de EPP: Se realiza una jornada de entrega y reposición de elementos de protección personal, tales como:

✓ Gafas de seguridad con protección lateral para el personal en general, oscuras para los días de sol.


✓ Guantes de carnaza o tipo ingeniero para el personal en general, para la protección de manos en la manipulación y figurado de hierro y labores en general de la obra

Evidencia de entrega

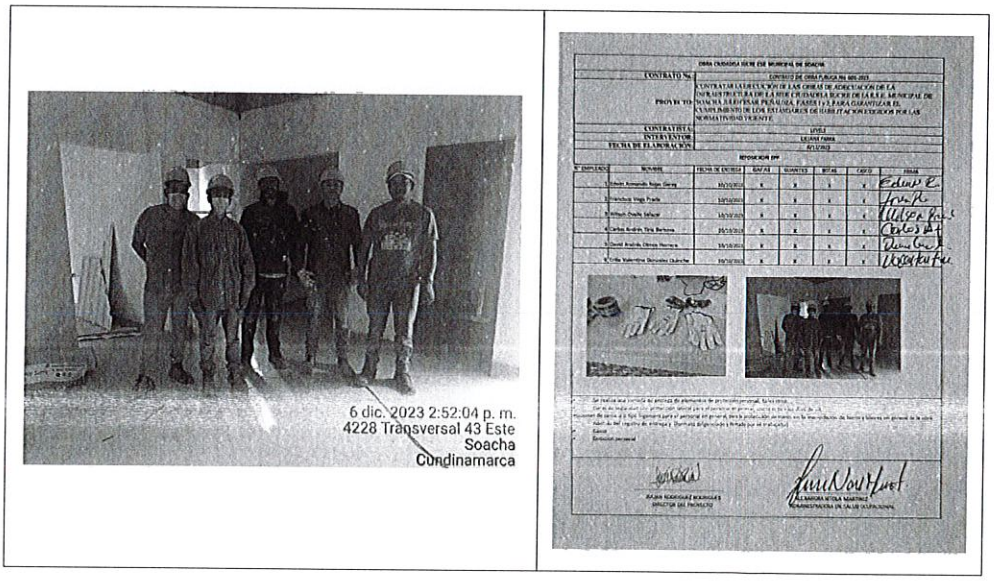

- Jornada de orden y aseo en obra, aplicando la técnica de las 5s.

Evidencia de entrega:

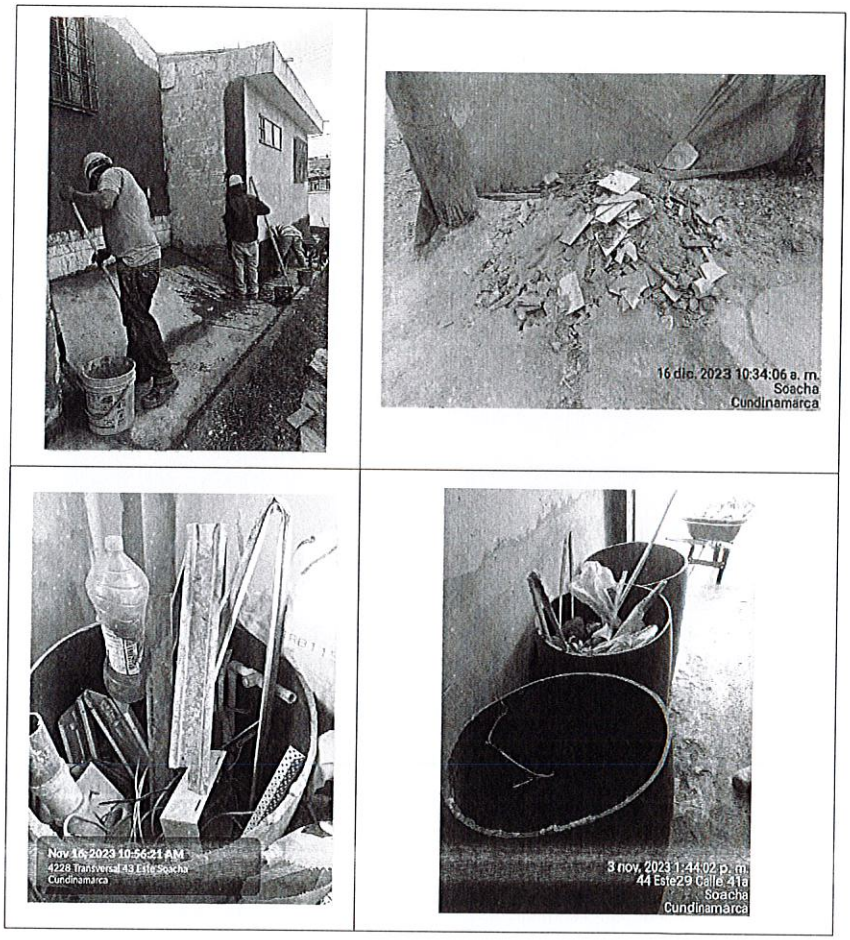

- Se evalúan actividades de riesgo y se diligencian permisos de trabajo incluyendo personal que va a hacer trabajo en alturas.

Nota: Se evalúa los permisos de trabajo y para los trabajos como instalación de cielo raso no se requiere permiso ya que es un trabajo a una altura de 80 a 90cm.

Se adjunta evidencia permisos de trabajo:

Levels Sas

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Resolución 1409 de 2012, Artículo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todas las especies relacionadas en la presente resolución tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajo en altura.
Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales, definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado por el ejecutor o por el autorizado y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.
Cuando se vaya a desarrollar rutinariamente, el formato del permiso de trabajo en alturas debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo con el coordinador de trabajo en alturas.

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Empresa: LEVELS	Ciudad: SOACHA	Lugar de Trabajo: CLACELA SUCRE ESE MUNICIPAL
Area/Proceso: CASCO DE CUIDAD	Descripción detallada del trabajo: Calle 17 # 14-24 Este Barrio: Chalacota	Vigencia del Permiso: 1 mes
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 05 - 12 - 2024	Hora de inicio: a.m./p.m. 7 am	Hora de Finalización: a.m./p.m. 05 - 01 - 2025 7 am

Cédula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
79535673	Edwin Armando Rojas Sierra	Si	OFICIAL DE OBRA	Si	
1014425178	Yeraldin Vega Pulido	Si	OFICIAL DE OBRA	Si	
79833635	Jaime Duque Salazar	Si	OFICIAL DE OBRA	Si	

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tipos de trabajos en alturas a realizar:

Se realizara el cambio de cubierta con area de 225 mts. Los trabajadores contaran con su linea de vida y los implementos adecuados para la realizacion del trabajo. Se verifica que cada uno de ellos cuenta con su linea de alturas y la capacidad de ejecutar el trabajo

Herramientas a utilizar:

Linea de vida, arnes, guantes, gafas y arnes en la

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar el trabajo: 8 1 mts

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamios	X	Escalera	Elevación de Personal o Grúa con canastilla		Se realizan en áreas Tali	S. No	Espacio Confinado	—	Trabajo en caliente	—	Energías Peligrosas	—
Otros (Cuales?):						Otros (Cuales?):							

Procedimiento para desarrollar el trabajo:

El personal de altura desconocen las tareas que van a ser asignadas con sogas con el fin de prevenirlas al personal que esta en tierra. Cada uno forma las tareas que se realizaran se pasaran por parte del personal en tierra y se acomodaran por el personal en alturas. Posteriores se ejecutan con tornillos y amarres

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas

Línea de vida vertical	S. X No	Bolsas de posicionamiento	S. X No	Sistemas de anclaje	S. X No	Arnés de cuerpo entero	S. X No	Cuerdas	S. X No
Línea de vida horizontal	S. X No	Eslinga	S. X No	Casco con barbuquejo	S. X No	Señalización temporal	S. X No	Cinta	S. X No

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (Cuales?):

ITEM	SI	No	N/A	ITEM	SI	No	N/A
El trabajo en alturas se va a realizar en ESCALA (AST)	X			Se han consultado los permisos y se cuenta con los requerimientos de ley	X		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea	X			Se realizaron inspecciones, cuenta con los permisos para su manipulación			X
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	X			Se minimizan los riesgos presentes en el sitio de trabajo	X		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	X			Esta cerrado el área con cinta para que active el cono de seguridad en caso de un descuido	X		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	X			Se hubo dentro realizado la todos tiene instalada la línea de vida o una estructura fija de anclaje donde se va a trabajar puede asegurarse	X		
Se verifica que la formación en alturas del personal este acorde al trabajo a realizar	X			El personal que va a ingresar cuenta la base consulte el procedimiento de entrega previa y rescate	X		
El sitio donde se realizara el trabajo está aislado y señalizado temporalmente	X			Los trabajos se encuentran con puntos en sus barras o anclajes	X		
Se han establecido mecanismos de comunicación efectivos con el personal, el grupo de vigilancia y operativos		X		Esta capacitado el personal de atención de los accidentes	X		
Cuentan con equipo de rescate en caso de una emergencia	X			Los conos o cintas tienen las precauciones y cubren un mínimo 50 cm. del andamio			X
Cuentan con línea de seguridad certificado y acondicionado para el uso de línea de vida	X			Se ha divulgado con todos los empleados relacionados para dar a divulgación de herramienta	X		
Se cuenta con rescate de vida para cada uno de los colaborados	X			Los andamios se encuentran en excelentes condiciones de uso			X
Los movimientos serán acompañados con dos (dos) vigías			X	Los guantes de acuerdo con el nivel definido para el tipo de actividad a realizar, se encuentran en buen estado y cumplen con la norma correcta			X
Las Cuerdas se encuentran en buen estado	X			Los operarios del andamio cumplen con las especificaciones técnicas			X
Todos los trabajadores están todos cumplen las medidas de protección establecidas en la evaluación de riesgos	X			Los residuos cumplen las especificaciones técnicas			X

Nombre y Cédula de la persona que autoriza (Emisor)	Firma
ALEXANDRA NATALIA MARTINEZ ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL LICENCIA RESOLUCION No 1917 DE 28-04-2018	Alexandra Natalia

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para prevenir que se interrumpa una distancia segura entre el cuerpo y otros elementos externos para prevenir que el cuerpo con los elementos de la estación retenedora, absorbe con el nivel de varias vacunas. Elementos que las EPP preventivo, antiderrapante, otros).

Se anexa Idoneidad del personal en alturas:



PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S.
NIT. 901.309.746-2
LICENCIA SSTN° 8655
DEL 10 OCTUBRE DE 2019
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
005E2020226000000023620
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014 20.380.1
CELAC 18-CPR-002
www.pretalsas.com.co
Av. Calle 57 R sur 76 A 95
3B 463 48 H
CELAC

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

OTORGADO A

WILSON OVALLE SALAZAR
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79823635
AFILIADO A LA ARL COLPATRIA
RAZON SOCIAL: LEVELS SAS
NIT. 901380377-9
REPRESENTANTE LEGAL:SANDRA MARTINEZ CC: 1070594428
QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACION PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

REALIZADO DESDE EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 32 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (30) DE (11) DEL (2023)
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

ELIZABETH TARAZONA
ENTRENADORA
Licencia S.O Resolucion 9891 de 7 de Julio de 2021



PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S.
NIT. 901.309.746-2
LICENCIA SSTN° 8655
DEL 10 OCTUBRE DE 2019
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
005E2020226000000023620
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014 20.380.1
CELAC 18-CPR-002
www.pretalsas.com.co
Av. Calle 57 R sur 76 A 95
3B 463 48 H
CELAC

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

OTORGADO A

FRANCISCO VEGA PRADA
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1024460939
AFILIADO A LA ARL COLPATRIA
RAZON SOCIAL: LEVELS SAS
NIT. 901380377-9
REPRESENTANTE LEGAL:SANDRA MARTINEZ CC: 1070594428
QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

REALIZADO DESDE EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 32 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (30) DE (11) DEL (2023)
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

ELIZABETH TARAZONA
ENTRENADORA
Licencia S.O Resolucion 9891 de 7 de Julio de 2021



PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S.
NIT. 901.309.746-2
LICENCIA SSTN° 8655
DEL 10 OCTUBRE DE 2019
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
005E2020226000000023620
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014 20.380.1
CELAC 18-CPR-002
www.pretalsas.com.co
Av. Calle 57 R sur 76 A 95
3B 463 48 H
CELAC

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

OTORGADO A

EDWIN ARMANDO ROJAS GARAY
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79220973
AFILIADO A LA ARL COLPATRIA
RAZON SOCIAL: LEVELS SAS
NIT. 901380377-9
REPRESENTANTE LEGAL:SANDRA MARTINEZ CC: 1070594428
QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

REALIZADO DESDE EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 32 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (30) DE (11) DEL (2023)
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

ELIZABETH TARAZONA
ENTRENADORA
Licencia S.O Resolucion 9891 de 7 de Julio de 2021

Por lo anterior, las acciones de mejora realizadas para los procesos fueron:

- Reposición de elementos de protección personal, Implementando formato de entrega y reposición de dotación y EPP.

- Realización jornadas de orden y aseo diarios: media hora antes de la salida, se suspenden las labores habituales para la limpieza de las áreas, almacenamientos de materiales, equipos y herramientas de trabajo, además para la delimitación con cintas que pudieran resultar afectadas durante el desarrollo de la jornada laboral.

- Cronograma de capacitación al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de intervención en promoción y prevención de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los temas que se propuestos son:

  - Manipulación manual de cargas. 9- dic. 2023
  - Uso y mantenimiento de elementos de protección personal. 16-dic-2023
  - Identificación de Riesgos en obra 18-dic-2023
  - Buenas prácticas de manufactura y trabajos limpios. 23-dic-2023

Se deja claridad en hasta la presentación de este documento en el lugar de las actividades no se han presentado accidentes, alteraciones o situaciones adversas que vinculen al personal que labora en el proyecto.

11. RECOMENDACIONES – CONCLUSIONES

- ✓ Las actividades parciales, fueron ejecutadas normalmente, dando cumplimiento a las características de los ítems contratados.
- ✓ Las situaciones o inquietudes parciales generadas durante la ejecución del proceso constructivo fueron solucionadas a satisfacción en coordinación de las partes vinculadas.
- ✓ Las modificaciones realizadas durante el proceso constructivo fueron analizadas y aprobadas en coordinación de las partes interesadas.
- ✓ Los procesos técnicos utilizados para la ejecución de las actividades aquí consignadas fueron aprobadas y coordinados con la normatividad vigente.
- ✓ Se procede a la entrega del informe parcial y se deja como evidencia en cumplimiento a las exigencias establecidas
- ✓ No se presentaron situaciones adversas o anómalas al proceso.

Por lo anterior se hace entrega del Informe Parcial 002 Fase 2, soporte para trámite en cumplimiento de las exigencias establecidas, a su vez; se presentan las actividades parciales ejecutadas en este periodo, debidamente desarrolladas, terminadas y revisadas por las partes interesadas, dando cumplimiento parcial al objeto del contrato.

Atentamente,

LEVELS S.A.S
R.L SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOACHA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CONTRATO DE OBRA No 601-2023 - ACTA MAYORES Y MENORES 002 - FASE 2

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE

CONTRATANTE: E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	**VALOR CONTRATO:**	$ 472.318.372,94	**FECHA SUSPENSION 001:**
CONTRATISTA: LEVELS S.A.S - NIT 901.380.377-9 R.L SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA REINICIO 001:**
	PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**
SUPERVISOR: E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	**FECHA ACTA DE INICIO:**	5-oct-23	**ACTA MAYORES Y MENORES 002 - FASE 2**
CONTRATO DE OBRA No.: 601-2023	**FECHA TERMINACION PROYECTADA:**	31-dic-23	

ACTA MAYORES Y MENORES 002 - FASE 2

ACTIVIDADES									CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		
No	No ICCU / CODIGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID.	CANT CONTRATADA	V. UNITARIO CONTRATADO	V. TOTAL CONTRATADO	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1				**PRELIMINARES**				**$ 28.799.470,35**			**$ -**	**$ 1.058.804,03**			**$ 27.740.666,33**
1,1	ICCU 1,12	ICCU		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	211,75	$ 9.943,00	$ 2.105.430,25	0,00	0,00	$ -	$ -	211,75	$ 9.943,00	$ 2.105.430,25
1,2	ICCU 6,15	ICCU		PAÑETE IMPERMEABILIZADO FACHADA 1:3, E=1,5 CM	M2	255,30	$ 24.558,00	$ 6.269.657,40	0,00	0,00	$ -	$ -	255,30	$ 24.558,00	$ 6.269.657,40
1,3	ICCU 18,23	ICCU		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS FACHADA	M2	226,00	$ 9.622,00	$ 2.174.572,00	0,00	0,00	$ -	$ -	226,00	$ 9.622,00	$ 2.174.572,00
1,4	APU	APU		MEDIA CAÑA EN CIELORASO EN POLIMERO SELLADO EXTRASOLIDO COLOR BLANCO	ML	235,00	$ 74.700,00	$ 17.554.500,00	0,00	14,17	$ -	$ 1.058.804,03	220,83	$ 74.700,00	$ 16.495.695,98
1,5	ICCU 1,39	ICCU		DESMONTE VENTANAS	M2	43,70	$ 15.911,00	$ 695.310,70	0,00	0,00	$ -	$ -	43,70	$ 15.911,00	$ 695.310,70
1,6	APU	ICCU		PERFIL METALICO ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA, INCLUYE PINTURA	ML	0,00	$ 93.750,00	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 93.750,00	$ -
2				**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.786.918,45**			**$ -**	**$ -**			**$ 49.786.918,45**
2,1	ICCU 12,15	ICCU		TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UNID	2,00	$ 667.479,00	$ 1.334.958,00	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 667.479,00	$ 1.334.958,00
2,2	ICCU 12,9	ICCU		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNID	60,00	$ 67.460,00	$ 4.047.600,00	0,00	0,00	$ -	$ -	60,00	$ 67.460,00	$ 4.047.600,00
2,3	ICCU 12,17	ICCU		TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	500,00	$ 5.748,00	$ 2.874.000,00	0,00	0,00	$ -	$ -	500,00	$ 5.748,00	$ 2.874.000,00
2,4	APU	ICCU		CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO #12	ML	1450,00	$ 8.250,00	$ 11.962.500,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1450,00	$ 8.250,00	$ 11.962.500,00
2,5	ICCU 12,4	ICCU		SALIDA LÁMPARA, CONMUTABLE PVC COMPLETA	UNID	25,00	$ 91.675,00	$ 2.291.875,00	0,00	0,00	$ -	$ -	25,00	$ 91.675,00	$ 2.291.875,00
2,6	APU	APU		PANEL LED SOBRE PONER CIRCULAR 1800 LUMENES LUZ FRIA, INCLUYE CORTE CIELORASO	UNID	75,00	$ 187.260,00	$ 14.044.500,00	0,00	0,00	$ -	$ -	75,00	$ 187.260,00	$ 14.044.500,00
2,7	APU	APU		SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UNID	17,00	$ 188.705,00	$ 3.207.985,00	0,00	0,00	$ -	$ -	17,00	$ 188.705,00	$ 3.207.985,00
2,8	APU	APU		CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	543,28	$ 18.450,00	$ 10.023.500,45	0,00	0,00	$ -	$ -	543,28	$ 18.450,00	$ 10.023.500,45
3				**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 14.533.842,90**			**$ -**	**$ -**			**$ 14.533.842,90**
3,1	ICCU 11,1	ICCU		ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UNID	0,00	$ 291.384,00	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 291.384,00	$ -
3,2	ICCU 11,4	ICCU		BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	50,00	$ 43.790,00	$ 2.189.500,00	0,00	0,00	$ -	$ -	50,00	$ 43.790,00	$ 2.189.500,00
3,3	ICUU 11,20	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,00	$ 109.545,00	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 109.545,00	$ -
3,4	ICCU 11,32	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	72,95	$ 43.902,00	$ 3.202.650,90	0,00	0,00	$ -	$ -	72,95	$ 43.902,00	$ 3.202.650,90
3,5	ICCU 11,35	ICCU		REGISTRO 1"	UND	0,00	$ 130.678,00	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -
3,6	APU	APU		ADECUACIÓN TRAMPA DE GRASA	UND	1,00	$ 8.520.000,00	$ 8.520.000,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 8.520.000,00	$ 8.520.000,00
3,7	ICCU 3,5	ICCU		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	2,00	$ 310.846,00	$ 621.692,00	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 310.846,00	$ 621.692,00
3,8	ICCU 13,4	ICCU		ALISTADO PISOS 1:3, E=0,04	M2	0,00	$ 31.625,00	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 31.625,00	$ -
4				**CARPINTERIA METALICA**				**$ 6.968.548,80**			**$ -**	**$ -**			**$ 6.968.548,80**
4,1	ICCU 10,4	ICCU		MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0,8 (VENTANERIA)	UND	0,00	$ 191.165,00	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 191.165,00	$ -
4,2	ICCU 10,20	ICCU		VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	43,20	$ 161.309,00	$ 6.968.548,80	0,00	0,00	$ -	$ -	43,20	$ 161.309,00	$ 6.968.548,80
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 100.088.780,50**							**$ 99.029.976,47**

ITEM NO PRVISTOS

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		ACTIVIDADES DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		
		GENERAL	PARTICULAR						MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
NP				DEMOLICIONES				$ 44.254.942,65			$ 1.058.804,03	$ -			$ 45.313.746,68
NP 1	APU	APU		PUERTA EN ALUMINIO TIPO INCLUYE VIDRIO 5 MM TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 0,60 HASTA 1.10 MTS, ALTURA PROMEDIO 2.00 MTS	UNID	19,00	$ 1.139.800,00	$ 21.656.200,00	0,00	0,00	$ -	$ -	19,00	$ 1.139.800,00	$ 21.656.200,00
NP 2	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AQUAJET PRO MARCA CORONA PARA PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE GRIFERIA	UNID.	1,00	$ 690.480,80	$ 690.480,80	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 690.480,80	$ 690.480,80
NP 3	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS INSTITUCIONAL REF 003891001 CORONA PARA PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA	UNID.	1,00	$ 701.524,80	$ 701.524,80	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 701.524,80	$ 701.524,80
NP 4	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 40 CM D:1 1/4 PULG PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA (BAÑO)	UNID.	1,00	$ 211.966,60	$ 211.966,60	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 211.966,60	$ 211.966,60
NP 5	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION KIT DESAGUE LAVAPLATOS Y LAVAMANOS (CANASTILLA, SIFON)	UNID.	16,00	$ 81.700,85	$ 1.307.213,60	0,00	0,00	$ -	$ -	16,00	$ 81.700,85	$ 1.307.213,60
NP 6	APU	APU		REGATA EN MURO DE MAPOSTERIA DIVISORIA	ML	55,90	$ 6.895,50	$ 385.458,45	153,55	0,00	$ 1.058.804,03	$ -	209,45	$ 6.895,50	$ 1.444.262,48
NP 7	APU	APU		RETIRO DE SOBRANTES Y DESCARGUE EN ESCOMBRERA A UNA DISTANCIA DE 9 KM (INCLUYE CARGUE, SELECCIÓN SOLIDOS Y CERTIFICADO DISPOSICION DE RESIDUOS)	M3	65,99	$ 102.200,00	$ 6.744.178,00	0,00	0,00	$ -	$ -	65,99	$ 102.200,00	$ 6.744.178,00
NP 8	ICCU 11,27	ICCU		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	85,40	$ 11.028,00	$ 941.791,20	0,00	0,00	$ -	$ -	85,40	$ 11.028,00	$ 941.791,20
NP 9	ICCU 11,16	ICCU		PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UNID.	34,00	$ 85.887,00	$ 2.920.158,00	0,00	0,00	$ -	$ -	34,00	$ 85.887,00	$ 2.920.158,00
NP 10	ICCU 11,35	ICCU		REGISTRO 1"	UNID.	1,00	$ 130.678,00	$ 130.678,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 130.678,00	$ 130.678,00
NP 11	ICCU 11,36	ICCU		REGISTRO 1/2"	UNID.	20,00	$ 73.377,00	$ 1.467.540,00	0,00	0,00	$ -	$ -	20,00	$ 73.377,00	$ 1.467.540,00
NP 12	ICCU 11,37	ICCU		REGISTRO 3/4"	UNID.	1,00	$ 92.103,00	$ 92.103,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 92.103,00	$ 92.103,00
NP 13	ICCU 14,37	ICCU		TAPA REGISTRO 20X20	UNID.	20,00	$ 24.351,00	$ 487.020,00	0,00	0,00	$ -	$ -	20,00	$ 24.351,00	$ 487.020,00
NP 14	ICCU 11,12	ICCU		LLAVE MANGUERA	UNID.	1,00	$ 46.376,00	$ 46.376,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 46.376,00	$ 46.376,00
NP 15	ICCU 11,31	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	55,30	$ 32.066,00	$ 1.773.249,80	0,00	0,00	$ -	$ -	55,30	$ 32.066,00	$ 1.773.249,80
NP 16	ICCU 11,33	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	33,50	$ 59.370,00	$ 1.988.895,00	0,00	0,00	$ -	$ -	33,50	$ 59.370,00	$ 1.988.895,00
NP 17	ICCU 11,19	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UNID.	19,00	$ 90.377,00	$ 1.717.163,00	0,00	0,00	$ -	$ -	19,00	$ 90.377,00	$ 1.717.163,00
NP 18	ICCU 11,21	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UNID.	4,00	$ 116.304,00	$ 465.216,00	0,00	0,00	$ -	$ -	4,00	$ 116.304,00	$ 465.216,00
NP 19	ICCU 11,41	ICCU		REVENTILACIÓN 2"	ML	23,20	$ 22.747,00	$ 527.730,40	0,00	0,00	$ -	$ -	23,20	$ 22.747,00	$ 527.730,40
							SUBTOTAL OBRAS ITEM NO PREVISTOS	$ 44.254.942,65							$ 45.313.746,68
							SUBTOTAL OBRAS	$ 144.343.723,15							$ 144.343.723,15
							ADMINISTRACION	23% $ 33.199.056,32							$ 33.199.056,32
							IMPREVISTOS	2% $ 2.886.874,46							$ 2.886.874,46
							UTILIDAD	5% $ 7.217.186,16							$ 7.217.186,16
				VALOR TOTAL				$ 187.646.840,09							$ 187.646.840,09

Elaboro:

LEVELS S.A.S
R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo:

LILIANA PARRA CASTELLANOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 601-2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y LEVELS S.A.S**

ACTA No. 01 DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS FASE 2

CONTRATO:	DE OBRA PÚBLICA No 601 - 2023
OBJETO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE
VALOR CONTRATADO:	$ 187.646.840,09
CONTRATANTE:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2 R.L. MARIA VICTORIA HERRERA ROA
CONTRATISTA:	LEVELS S.A.S NIT No 901.380.377-9 R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON
INTERVENTORIA:	ARQ. LILIANA PARRA CASTELLANOS
FECHA DE INICIO:	05 DE OCTUBRE DEL 2023
PLAZO:	TRES (03), HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA TERMINACION PROYECTADA:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
SUPERVISOR:	WILLIAM CORTES

En Soacha, a los 27 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron las siguientes personas: **SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON** como Representante Legal de **LEVELS S.A.S** actuando como CONTRATISTA y la **ARQ LILIANA PARRA CASTELLANOS** actuando como director del contrato de interventoría, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato de la referencia.

A continuación, se relacionan dichos precios unitarios, indicando los ítems correspondientes:

NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	TIPO	DESCRIPCION			
1	APU	PUERTA EN ALUMINIO TIPO INCLUYE VIDRIO 5 MM TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 0,60 HASTA 1.10 MTS, ALTURA PROMEDIO 2.00 MTS	UND	19,00	$ 1.139.800,00
2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AQUAJET PRO MARCA CORONA PARA PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA- INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	$ 690.480,80
3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL REF 003891001 CORONA PARA PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND	1,00	$ 701.524,80

4	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 40 CM D:1 1/4 PULG PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA (BAÑO)	UND	1,00	$ 211.966,60
5	APU	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DESAGUE LAVAPLATOS Y LAVAMANOS (CANASTILLA, SIFON)	UND	16,00	$ 81.700,85
6	APU	REGATA EN MURO DE MAPOSTERIA DIVISORIA	ML	55,90	$ 6.895,50
7	APU	RETIRO DE SOBRANTES Y DESCARGUE EN ESCOMBRERA A UNA DISTANCIA DE 9 KM (INCLUYE CARGUE, SELECCIÓN SOLIDOS Y CERTIFICADO DISPOSICION DE RESIDUOS)	M3	65,99	$ 102.200,00
8	ICCU 11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	85,40	$ 11.028,00
9	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	34,00	$ 85.887,00
10	ICCU 11,35	REGISTRO 1"	UND	1,00	$ 130.678,00
11	ICCU 11,36	REGISTRO 1/2"	UND	20,00	$ 73.377,00
12	ICCU 11,37	REGISTRO 3/4"	UND	1,00	$ 92.103,00
13	ICCU 14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	20,00	$ 24.351,00
14	ICCU 11,12	LLAVE MANGUERA	UND	1,00	$ 46.376,00
15	ICCU 11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	55,30	$ 32.066,00
16	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	33,50	$ 59.370,00
17	ICCU 11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	19,00	$ 90.377,00
18	ICCU 11,29	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	4,00	$ 116.304,00
19	ICCU 11,41	REVENTILACIÓN 2"	ML	23,20	$ 22.747,00

De la presente acta hacen parte los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems no previstos debidamente aprobados por la interventoría, en 59 folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON
Representante Legal
Contratista de obra

LILIANA PARRA CASTELLANOS
Director de Interventoría

V° B°

WILLIAM CORTES
E.S.E Municipal Julio Cesar Peñaloza de Soacha

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:00:53 AM horas del 29/12/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1010061680**
Apellidos y Nombres: **RESTREPO LOPEZ CATALINA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

CONTRATO DE OBRA No 601-2023 - ACTA PARCIAL 002 - FASE 2

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE

CONTRATANTE: E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
CONTRATISTA: LEVELS S.A.S - NIT 901.380.377-9

VALOR CONTRATO:	$ 472.318.372,94	**FECHA SUSPENSION 001:**	
VALOR ANTICIPO:	$ -	**FECHA REINICIO 001:**	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOACHA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

R.I SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON
SUPERVISOR: E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
CONTRATO DE OBRA No.: 601-2023

PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	
FECHA ACTA DE INICIO:	5-oct-23		
FECHA TERMINACION PROYECTADA:	31-dic-23	**CONTIENE:** ACTA PARCIAL 02 - FASE 2	

ACTA PARCIAL 002 - FASE 2

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES / MENORES UNID	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL 001 CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL 002 CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	ACUMULADOS / SALDOS CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1				**PRELIMINARES**				$ 27.740.666,33			$ 10.157.684,35			$ 1.087.286,00			$ 16.495.695,98
1,1	ICCU 1,12	ICCU		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	211,75	$ 9.943,00	$ 2.105.430,25	211,75	$ 9.943,00	$ 2.105.430,25	0,00	$ 9.943,00	$ -	0,00	$ 9.943,00	$ -
1,2	ICCU 6,15	ICCU		PAÑETE IMPERMEABILIZADO FACHADA 1:3, E=1,5 CM	M2	255,30	$ 24.558,00	$ 6.269.657,40	255,30	$ 24.558,00	$ 6.269.657,40	0,00	$ 24.558,00	$ -	0,00	$ 24.558,00	$ -
1,3	ICCU 18,23	ICCU		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS FACHADA	M2	226,00	$ 9.622,00	$ 2.174.572,00	113,00	$ 9.622,00	$ 1.087.286,00	113,00	$ 9.622,00	$ 1.087.286,00	0,00	$ 9.622,00	$ -
1,4	APU	ICCU		MEDIA CAÑA EN CIELORASO EN POLIMERO SELLADO EXTRASOLIDO COLOR BLANCO	ML	220,83	$ 74.700,00	$ 16.495.695,98	0,00	$ 74.700,00	$ -	0,00	$ 74.700,00	$ -	220,83	$ 74.700,00	$ 16.495.695,98
1,5	ICCU 1,39	ICCU		DESMONTE VENTANAS	M2	43,70	$ 15.911,00	$ 695.310,70	43,70	$ 15.911,00	$ 695.310,70	0,00	$ 15.911,00	$ -	0,00	$ 15.911,00	-$ 0,00
1,6	APU	ICCU		PERFIL METALICO ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA, INCLUYE PINTURA	ML	0,00	$ 93.750,00	$ -	0,00	$ 93.750,00	$ -	0,00	$ 93.750,00	$ -	0,00	$ 93.750,00	$ -
2				**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 49.786.918,45			$ -			$ 10.023.500,45			$ 39.763.418,00
2,1	ICCU 12,15	ICCU		TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UNID	2,00	$ 667.479,00	$ 1.334.958,00	0,00	$ 667.479,00	$ -	0,00	$ 667.479,00	$ -	2,00	$ 667.479,00	$ 1.334.958,00
2,2	ICCU 12,5	ICCU		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNID	60,00	$ 67.460,00	$ 4.047.600,00	0,00	$ 67.460,00	$ -	0,00	$ 67.460,00	$ -	60,00	$ 67.460,00	$ 4.047.600,00
2,3	ICCU 12,17	ICCU		TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	500,00	$ 5.748,00	$ 2.874.000,00	0,00	$ 5.748,00	$ -	0,00	$ 5.748,00	$ -	500,00	$ 5.748,00	$ 2.874.000,00
2,4	APU	ICCU		CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO #12	ML	1450,00	$ 8.250,00	$ 11.962.500,00	0,00	$ 8.250,00	$ -	0,00	$ 8.250,00	$ -	1450,00	$ 8.250,00	$ 11.962.500,00
2,5	ICCU 12,4	ICCU		SALIDA LÁMPARA, CONMUTABLE PVC COMPLETA	UNID	25,00	$ 91.675,00	$ 2.291.875,00	0,00	$ 91.675,00	$ -	0,00	$ 91.675,00	$ -	25,00	$ 91.675,00	$ 2.291.875,00
2,6	APU	ICCU		PANEL LED SOBRE PONER CIRCULAR 1800 LUMENES LUZ FRÍA, INCLUYE CORTE CIELORASO	UNID	75,00	$ 187.260,00	$ 14.044.500,00	0,00	$ 187.260,00	$ -	0,00	$ 187.260,00	$ -	75,00	$ 187.260,00	$ 14.044.500,00
2,7	APU	ICCU		SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UNID	17,00	$ 188.705,00	$ 3.207.985,00	0,00	$ 188.705,00	$ -	0,00	$ 188.705,00	$ -	17,00	$ 188.705,00	$ 3.207.985,00
2,8	APU	ICCU		CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	543,28	$ 18.450,00	$ 10.023.500,45	0,00	$ 18.450,00	$ -	543,28	$ 18.450,00	$ 10.023.500,45	0,00	$ 18.450,00	$ -
3				**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 14.533.842,90			$ -			$ 8.084.342,90			$ 6.449.500,00
3,1	ICCU 11,1	ICCU		ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UNID	0,00	$ 291.384,00	$ -	0,00	$ 291.384,00	$ -	0,00	$ 291.384,00	$ -	0,00	$ 291.384,00	$ -
3,2	ICCU 11,4	ICCU		BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	50,00	$ 43.790,00	$ 2.189.500,00	0,00	$ 43.790,00	$ -	0,00	$ 43.790,00	$ -	50,00	$ 43.790,00	$ 2.189.500,00
3,3	ICCU 11,20	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/SIPARAL 3"	UND	0,00	$ 109.545,00	$ -	0,00	$ 109.545,00	$ -	0,00	$ 109.545,00	$ -	0,00	$ 109.545,00	$ -
3,4	ICCU 11,32	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	72,95	$ 43.902,00	$ 3.202.650,90	0,00	$ 43.902,00	$ -	72,95	$ 43.902,00	$ 3.202.650,90	0,00	$ 43.902,00	$ -
3,5	ICCU 11,35	ICCU		REGISTRO 1"	UND	0,00	$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -
3,6	APU	ICCU		ADECUACIÓN TRAMPA DE GRASA	UND	1,00	$ 8.520.000,00	$ 8.520.000,00	0,00	$ 8.520.000,00	$ -	0,50	$ 8.520.000,00	$ 4.260.000,00	0,50	$ 8.520.000,00	$ 4.260.000,00
3,7	ICCU 3,5	ICCU		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	2,00	$ 310.846,00	$ 621.692,00	0,00	$ 310.846,00	$ -	2,00	$ 310.846,00	$ 621.692,00	0,00	$ 310.846,00	$ -
3,8	ICCU 13,4	ICCU		ALISTADO PISOS 1:3, E=0,04	M2	0,00	$ 31.625,00	$ -	0,00	$ 31.625,00	$ -	0,00	$ 31.625,00	$ -	0,00	$ 31.625,00	$ -
4				**CARPINTERIA METALICA**				$ 6.968.548,80			$ -			$ 6.968.548,80			$ -
4,1	ICCU 10,4	APU		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0,8 (VENTANERIA)	UND	0,00	$ 191.165,00	$ -	0,00	$ 191.165,00	$ -	0,00	$ 191.165,00	$ -	0,00	$ 191.165,00	$ -
4,2	ICCU 10,20	APU		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	43,20	$ 161.309,00	$ 6.968.548,80	0,00	$ 161.309,00	$ -	43,20	$ 161.309,00	$ 6.968.548,80	0,00	$ 161.309,00	$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 99.029.976,47			$ 10.157.684,35			$ 26.163.678,15			$ 62.708.613,98

ITEM NO PREVISTOS

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES / MENORES				CANTIDADES ACTA PARCIAL 001			CANTIDADES ACTA PARCIAL 002			ACUMULADOS / SALDOS		
		GENERAL	PARTICULAR		UNID	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
NP				DEMOLICIONES				$ 45.313.746,68			$ 18.511.181,73			$ 13.063.279,15			$ 13.739.285,80
NP 1	APU	APU		PUERTA EN ALUMINIO TIPO INCLUYE VIDRIO 5 MM TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 0,60 HASTA 1,10 MTS, ALTURA PROMEDIO 2,00 MTS	UNID	19,00	$ 1.139.800,00	$ 21.656.200,00	0,00	$ 1.139.800,00	$ -	9,50	$ 1.139.800,00	$ 10.828.100,00	9,50	$ 1.139.800,00	$ 10.828.100,00
NP 2	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AQUAJET PRO MARCA CORONA PARA PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE GRIFERIA	UNID	1,00	$ 690.480,80	$ 690.480,80	0,00	$ 690.480,80	$ -	0,00	$ 690.480,80	$ -	1,00	$ 690.480,80	$ 690.480,80
NP 3	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS INSTITUCIONAL REF 003891001 CORONA PARA PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA	UNID	1,00	$ 701.524,80	$ 701.524,80	0,00	$ 701.524,80	$ -	0,00	$ 701.524,80	$ -	1,00	$ 701.524,80	$ 701.524,80
NP 4	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 40 CM D:1 1/4 PULG PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA (BAÑO)	UNID	1,00	$ 211.966,60	$ 211.966,60	0,00	$ 211.966,60	$ -	0,00	$ 211.966,60	$ -	1,00	$ 211.966,60	$ 211.966,60
NP 5	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION KIT DESAGUE LAVAPLATOS Y LAVAMANOS (CANASTILLA, SIFON)	UNID	16,00	$ 81.700,85	$ 1.307.213,60	0,00	$ 81.700,85	$ -	0,00	$ 81.700,85	$ -	16,00	$ 81.700,85	$ 1.307.213,60
NP 6	APU	APU		REGATA EN MURO DE MAMPOSTERIA DIVISORIA	ML	209,45	$ 6.895,50	$ 1.444.262,48	55,90	$ 6.895,50	$ 385.458,45	153,55	$ 6.895,50	$ 1.058.804,03	0,00	$ 6.895,50	$ -
NP 7	APU	APU		RETIRO DE SOBRANTES Y DESCARGUE EN ESCOMBRERA A UNA DISTANCIA DE 9 KM (INCLUYE CARGUE, SELECCIÓN SOLIDOS Y CERTIFICADO DISPOSICION DE RESIDUOS)	M3	65,99	$ 102.200,00	$ 6.744.178,00	65,99	$ 102.200,00	$ 6.744.178,00	0,00	$ 102.200,00	$ -	0,00	$ 102.200,00	$ -
NP 8	ICCU 11,27	ICCU		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	85,40	$ 11.028,00	$ 941.791,20	85,40	$ 11.028,00	$ 941.791,20	0,00	$ 11.028,00	$ -	0,00	$ 11.028,00	$ -
NP 9	ICCU 11,16	ICCU		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UNID	34,00	$ 85.887,00	$ 2.920.158,00	34,00	$ 85.887,00	$ 2.920.158,00	0,00	$ 85.887,00	$ -	0,00	$ 85.887,00	$ -
NP 10	ICCU 11,35	ICCU		REGISTRO 1"	UNID	1,00	$ 130.678,00	$ 130.678,00	1,00	$ 130.678,00	$ 130.678,00	0,00	$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -
NP 11	ICCU 11,36	ICCU		REGISTRO 1/2"	UNID	20,00	$ 73.377,00	$ 1.467.540,00	20,00	$ 73.377,00	$ 1.467.540,00	0,00	$ 73.377,00	$ -	0,00	$ 73.377,00	$ -
NP 12	ICCU 11,37	ICCU		REGISTRO 3/4"	UNID	1,00	$ 92.103,00	$ 92.103,00	1,00	$ 92.103,00	$ 92.103,00	0,00	$ 92.103,00	$ -	0,00	$ 92.103,00	$ -
NP 13	ICCU 14,37	ICCU		TAPA REGISTRO 20X20	UNID	20,00	$ 24.351,00	$ 487.020,00	20,00	$ 24.351,00	$ 487.020,00	0,00	$ 24.351,00	$ -	0,00	$ 24.351,00	$ -
NP 14	ICCU 11,12	ICCU		LLAVE MANGUERA	UNID	1,00	$ 46.376,00	$ 46.376,00	1,00	$ 46.376,00	$ 46.376,00	0,00	$ 46.376,00	$ -	0,00	$ 46.376,00	$ -
NP 15	ICCU 11,31	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	55,30	$ 32.066,00	$ 1.773.249,80	18,61	$ 32.066,00	$ 596.874,68	36,69	$ 32.066,00	$ 1.176.375,12	0,00	$ 32.066,00	$ -
NP 16	ICCU 11,33	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	33,50	$ 59.370,00	$ 1.988.895,00	33,50	$ 59.370,00	$ 1.988.895,00	0,00	$ 59.370,00	$ -	0,00	$ 59.370,00	$ -
NP 17	ICCU 11,19	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UNID	19,00	$ 90.377,00	$ 1.717.163,00	19,00	$ 90.377,00	$ 1.717.163,00	0,00	$ 90.377,00	$ -	0,00	$ 90.377,00	$ -
NP 18	ICCU 11,21	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UNID	4,00	$ 116.304,00	$ 465.216,00	4,00	$ 116.304,00	$ 465.216,00	0,00	$ 116.304,00	$ -	0,00	$ 116.304,00	$ -
NP 19	ICCU 11,41	ICCU		REVENTILACIÓN 2"	ML	23,20	$ 22.747,00	$ 527.730,40	23,20	$ 22.747,00	$ 527.730,40	0,00	$ 22.747,00	$ -	0,00	$ 22.747,00	$ -
							SUBTOTAL OBRAS ITEM NO PREVISTOS	$ 45.313.746,68			$ 18.511.181,73			$ 13.063.279,15			$ 13.739.285,80
							SUBTOTAL OBRAS	$ 144.343.723,15			$ 28.668.866,08			$ 39.226.957,29			$ 76.447.899,78
							ADMINISTRACION	23,00%	$ 33.199.056,32		$ 6.593.839,20			$ 9.022.200,18			$ 17.583.016,95
							IMPREVISTOS	2,00%	$ 2.886.874,46		$ 573.377,32			$ 784.539,15			$ 1.528.958,00
							UTILIDAD	5,00%	$ 7.217.186,16		$ 1.433.443,30			$ 1.961.347,86			$ 3.822.394,99
							VALOR TOTAL	$ 187.646.840,09			$ 37.269.525,90			$ 50.995.044,48			$ 99.382.269,71

Elaboro;

LEVELS S.A.S
R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo;

LILIANA PARRA CASTELLANOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	1	**PRELIMINARES**
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
1.3	M2	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS FACHADA







OBSERVACIONES

Se hace el cobro del 50% pendiente

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		**DIMENSIONES**				**CANTIDAD OBRA**
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	**M2**
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	VINILO SOBRE PAÑETE 2					
	P1	22,15	2,70	0,00	0,50	29,90
	P2	10,70	2,80	0,00	0,50	14,98
	P3	22,50	2,70	0,00	0,50	30,38
	P4	9,58	2,50	0,00	0,50	11,98
	P5	9,40	2,50	0,00	0,50	11,75
	P6	8,85	2,50	0,00	0,50	11,07
	P7	2,36	2,50	0,00	0,50	2,95
					CANTIDAD EJECUTADA	113,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA M2	**113,00**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: 1.3	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** M2

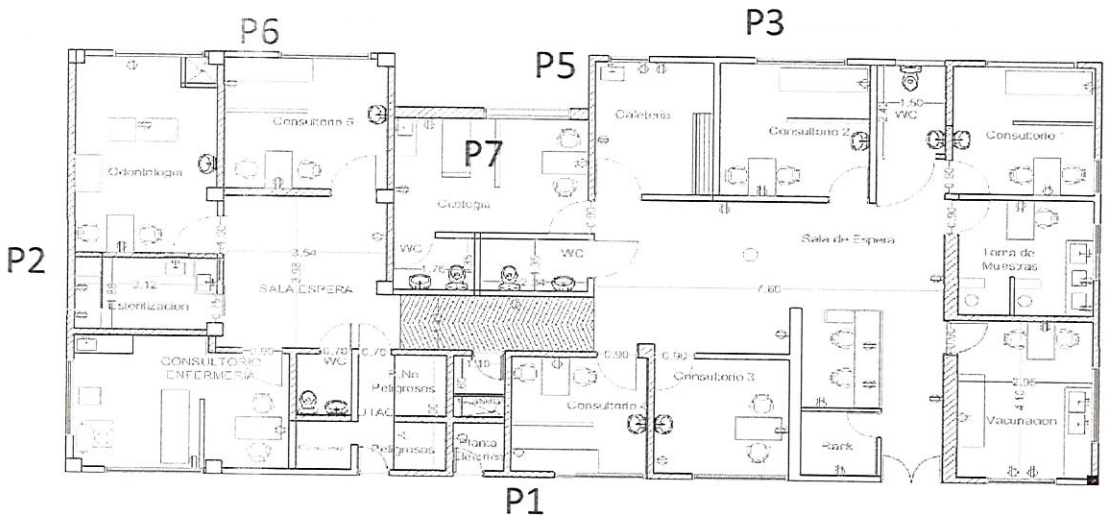

P1 P2 P3 P4 P5 P6

AREA INTERVENIDA

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA


MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTIVIDAD	1	PRELIMINARES
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2,8	ML	Cable UTP Categoria 6A

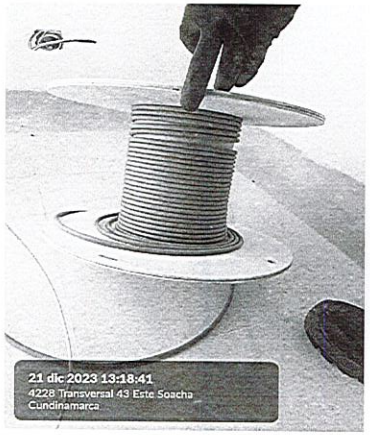



CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA ML
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	CABLE					
	C1	130,00	0,00	0,00	1,00	130,00
	C2	22,30	0,00	0,00	1,00	22,30
	C3	43,05	0,00	0,00	1,00	43,05
	C4	20,00	0,00	0,00	1,00	20,00
	C5	19,00	0,00	0,00	1,00	19,00
	C6	14,60	0,00	0,00	1,00	14,60
	C7	18,00	0,00	0,00	1,00	18,00
	C8	22,50	0,00	0,00	1,00	22,50
	C9	14,60	0,00	0,00	1,00	14,60
	C10	25,30	0,00	0,00	1,00	25,30
	C11	12,20	0,00	0,00	1,00	12,20
	C12	12,65	0,00	0,00	1,00	12,65
	C13	78,96	0,00	0,00	1,00	78,96
	C14	58,45	0,00	0,00	1,00	58,45
	C15	51,67	0,00	0,00	1,00	51,67
					CANTIDAD EJECUTADA	543,28
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ML	**543,28**


ELABORO ;

DI :LS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO SOACHA		
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA		
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.		
ITEM: 2,8	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** ML

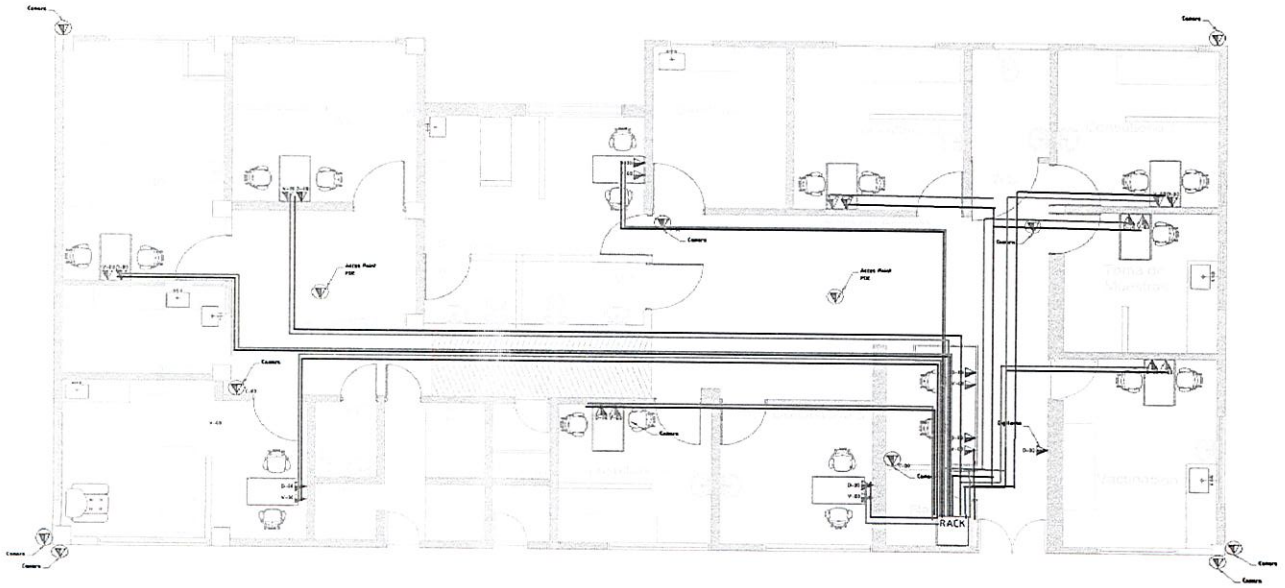

CABLE

ELABORO ;

D 'ELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	3	INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3.4	UNID	RED SANITARIA PVC-S 3"



OBSERVACIONES

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	UNID
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	RED SANITARIA PVC-S 3"					
	R1	12,30	0,00	0,00	1,00	12,30
	R2	4,78	0,00	0,00	1,00	4,78
	R3	2,42	0,00	0,00	1,00	2,42
	R4	6,60	0,00	0,00	1,00	6,60
	R5	2,95	0,00	0,00	1,00	2,95
	R6	3,57	0,00	0,00	1,00	3,57
	R7	4,62	0,00	0,00	1,00	4,62
	R8	3,23	0,00	0,00	1,00	3,23
	R9	3,12	0,00	0,00	1,00	3,12
	R10	4,20	0,00	0,00	1,00	4,20
	R11	2,53	0,00	0,00	1,00	2,53
	R12	3,78	0,00	0,00	1,00	3,78
	R13	5,93	0,00	0,00	1,00	5,93
	R14	3,30	0,00	0,00	1,00	3,30
	R15	3,32	0,00	0,00	1,00	3,32
	R16	2,90	0,00	0,00	1,00	2,90
	R17	3,40	0,00	0,00	1,00	3,40
					CANTIDAD EJECUTADA	72,95
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA UNID	**72,95**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: 3,4	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** UNID

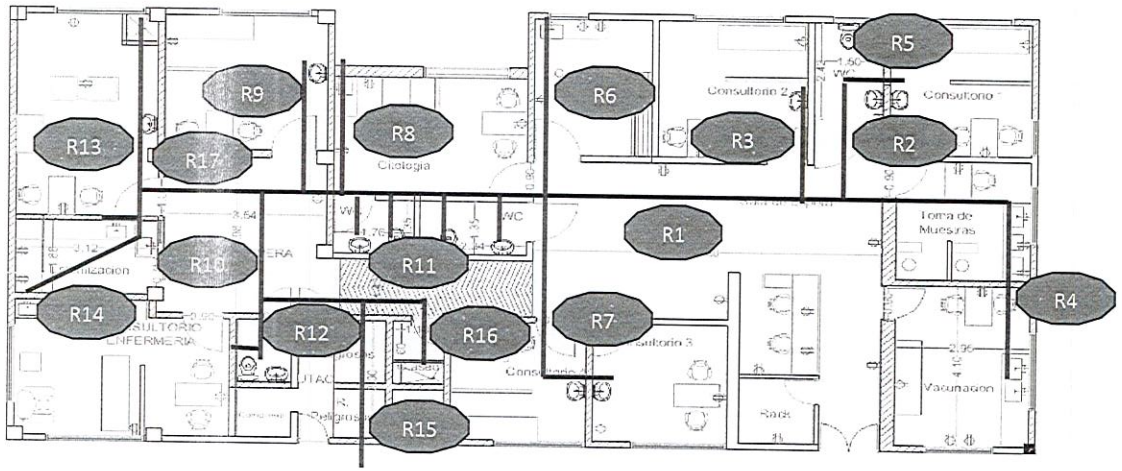

AREA INTERVENIDA

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA


MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	3	**INSTALACIONES SANITARIAS**
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
3,6	UNIDAD	ADECUACION TRAMPA DE GRASA

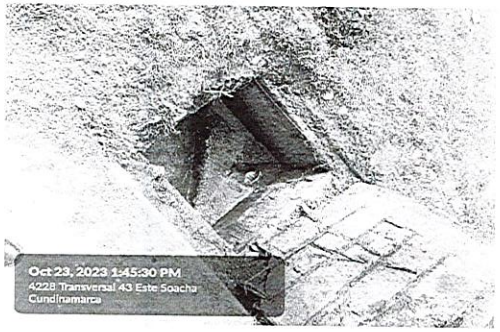

OBSERVACIONES

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		**DIMENSIONES**				**CANTIDAD OBRA UNIDAD**
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	CAJAS DE INSPECCIÓN					
	T1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
					CANTIDAD EJECUTADA	0,50
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA UNIDAD	**0,50**

ELABORO :

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA


MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: 3.6	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDAD

T1

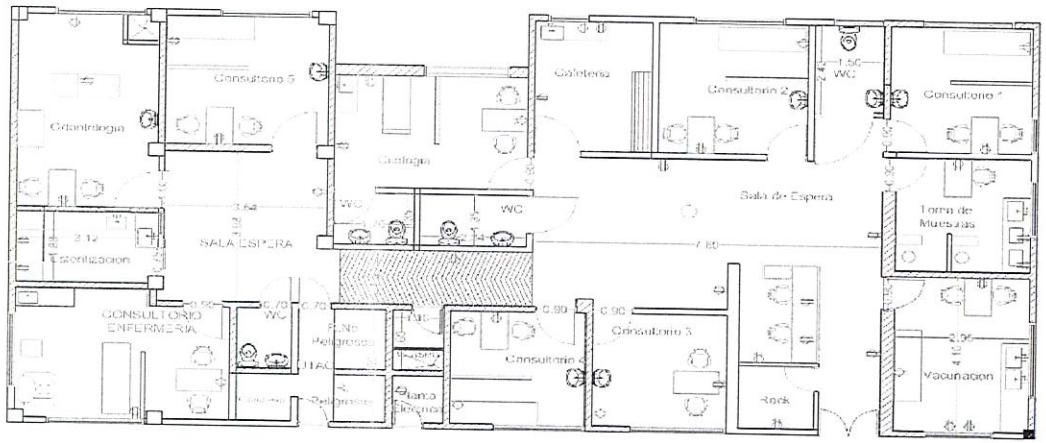

AREA INTERVENIDA

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	3	**INSTALACIONES SANITARIAS**
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
3.7	UNIDAD	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60





OBSERVACIONES

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		**DIMENSIONES**				**CANTIDAD OBRA UNIDAD**
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	CAJAS DE INSPECCIÓN					
	C1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	C2	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
					CANTIDAD EJECUTADA	2,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA UNIDAD	**2,00**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: 3.7	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDAD

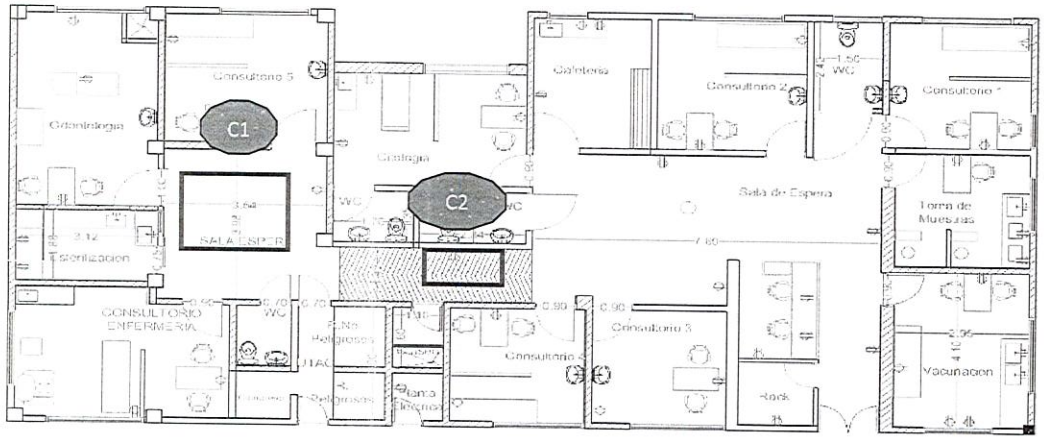

AREA INTERVENIDA

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA


E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	9	DEMOLICIONES
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.2	M2	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO









OBSERVACIONES

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	M2
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	DESMONTE APARATOS					
	V1	2,70	2,00	0,00	1,00	5,40
	V2	2,00	1,11	0,00	1,00	2,22
	V3	2,30	1,14	0,00	1,00	2,62
	V4	2,00	1,11	0,00	1,00	2,22
	V5	2,30	2,00	0,00	1,00	4,60
	V6	2,85	1,60	0,00	1,00	4,56
	V7	2,00	1,50	0,00	1,00	3,00
	V8	1,60	2,60	0,00	1,00	4,16
	V9	1,00	1,14	0,00	1,00	1,14
	V10	2,20	1,12	0,00	1,00	2,46
	V11	3,00	1,60	0,00	1,00	4,80
	V12	3,01	2,00	0,00	1,00	6,01
					CANTIDAD EJECUTADA	43,20
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA M2	**43,20**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: 4.2 | **CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA | **UNIDAD DE MEDIDA:** M2

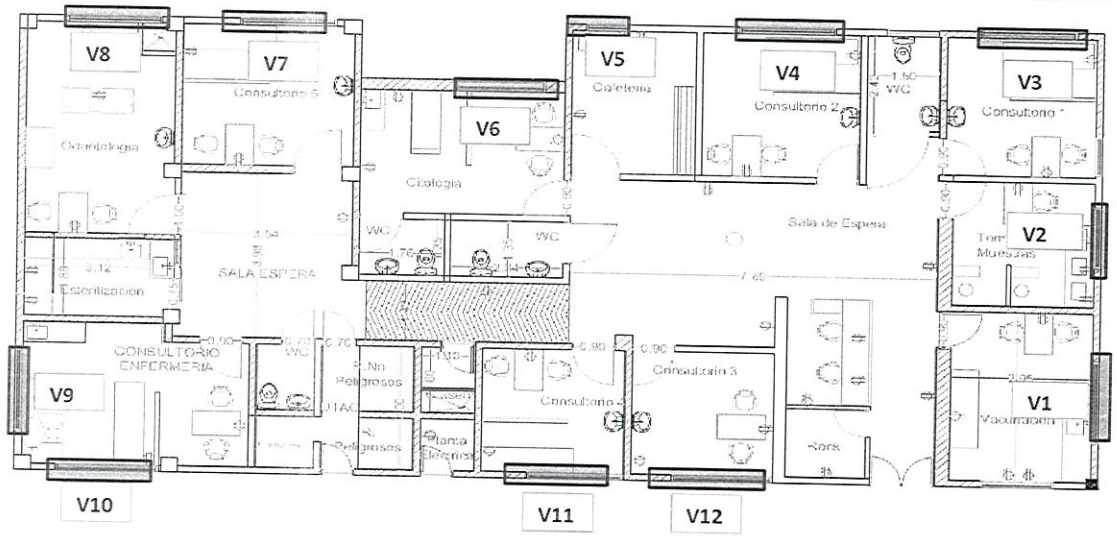

ELEMENTO DESMONTADO

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTIVIDAD	INP	ITEM NO PREVISTOS
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP 1	UNIDAD	PUERTA EN ALUMINIO TIPO INCLUYE VIDRIO 5 MM TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 0,60 HASTA 1.10 MTS, ALTURA PROMEDIO 2.00 MTS





OBSERVACIONES SE AUTORIZA PAGO AL 50% YA QUE APENAS ESTAN EN OBRA LAS

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA UNIDAD
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	PORCENTAJE	
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	REGATEADA EN MURO					
	Puertas	19,00	0,00	0,00	50%	9,50
					CANTIDAD EJECUTADA	9,50
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA UNIDAD	**9,50**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: NP 1	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDAD

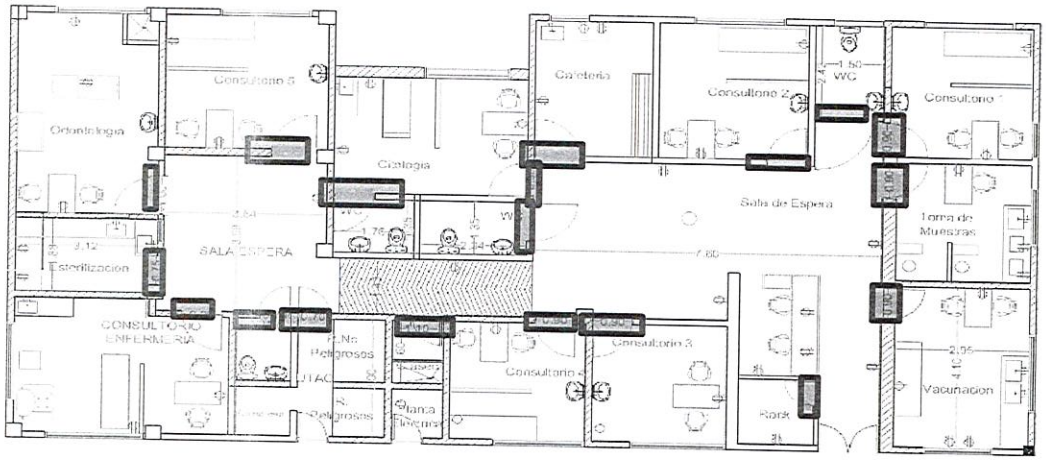

AREA INTERVENIDA

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA


MUNICIPIO SOACHA


E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA


OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	INP	ITEM NO PREVISTOS
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP 6	ML	REGATA EN MURO PARA INTSLACION MEDIACAÑA

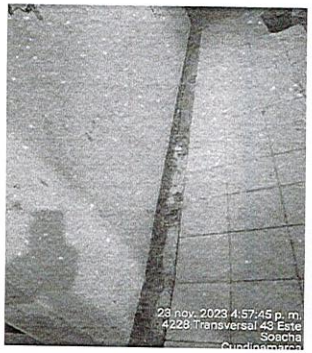





OBSERVACIONES

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	ML
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	REGATEADA EN MURO					
	DEMOLICION MANUAL 1	52,90	0,00	0,00	1,00	52,90
	DEMOLICION MANUAL 2	70,30	0,00	0,00	1,00	70,30
	DEMOLICION MANUAL 3	30,35	0,00	0,00	1,00	30,35
					CANTIDAD EJECUTADA	153,55
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ML	**153,55**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: NP 6	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** ML

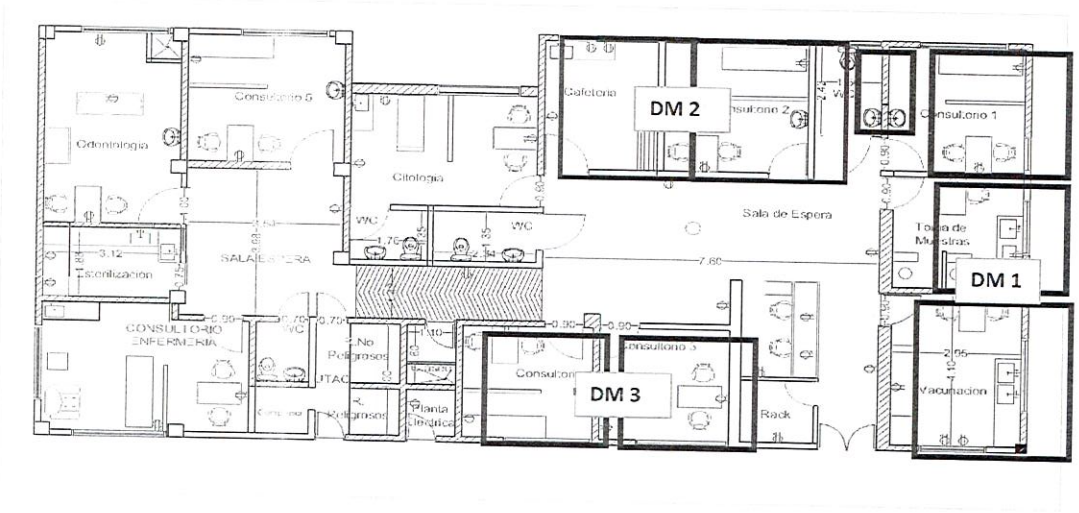

AREA INTERVENIDA

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA


MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	INP	ITEM NO PREVISTOS
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP 15	ML	RED SANITARIA PVC-S 2"

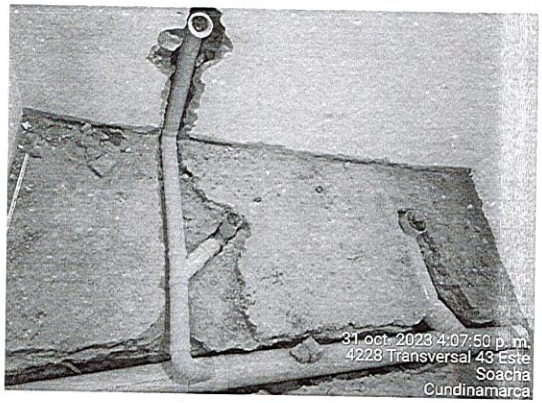

OBSERVACIONES : Se cobro solo una parte en la Primera Parcial

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	ML
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	RED SANITARIA PVC-S 2"					
	R1	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
	R2	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
					CANTIDAD EJECUTADA	36,69
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ML	**36,69**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: NP 15	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** ML

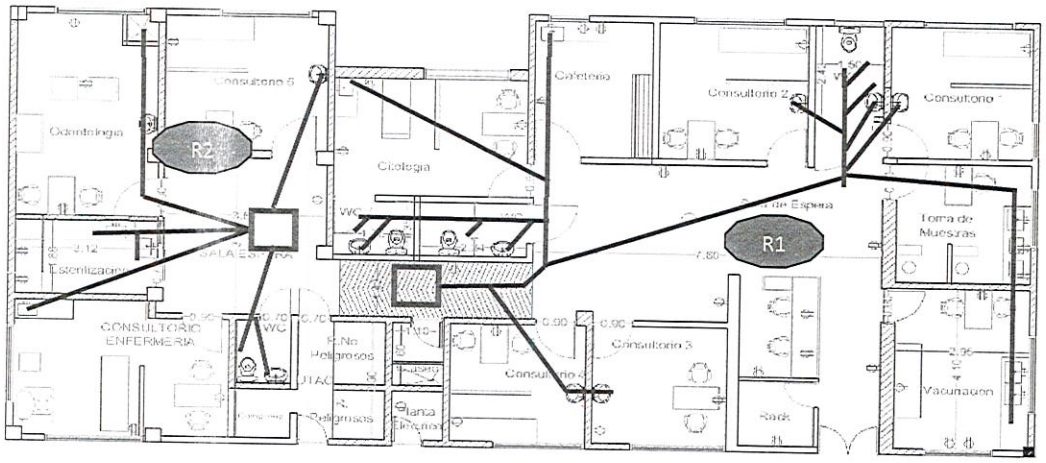

AREA INTERVENIDA

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de diciembre de 2023, a las 11:12:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1010061680
Código de Verificación	101006168023122911208

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN - PATRICLSUSP02V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607516035

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000169322 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	10	2023	03	10	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **LEVELS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.380.377-9**

DIRECCIÓN: CARRERA 85 23 B 88 TO 4 AP 402 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3045232362

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** IDENTIFICACIÓN: NIT **832.001.794-2**

BENEFICIARIO: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** IDENTIFICACIÓN: NIT **832.001.794-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/10/2023	07/07/2024	47,231,837.29
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/10/2023	07/01/2027	47,231,837.29
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	141,695,511.88
CALIDAD DEL BIEN	02/10/2023	07/07/2024	94,463,674.59

BENEFICIARIOS
NIT 832001794 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA No. 601-2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***330,622,861.05	$ ********1,703,180	$****11,000.00	$ ******325,694	$ ********2,039,874

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560751603

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F0A0EFA7E5C CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2022

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607514931

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000031104 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO
02	10	2023

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS
02	10	2023	23:59

VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
03	01	2024	23:59	93

FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
02	10	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS
02	10	2023	23:59

VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
03	01	2024	23:59	93

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **LEVELS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.380.377-9**

DIRECCIÓN: CARRERA 85 23 B 88 TO 4 AP 402 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3045232362

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LEVELS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.380.377-9**

DIRECCIÓN: CARRERA 85 23 B 88 TO 4 AP 402 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 3045232362

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: LEVELS SAS NIT : 901380377

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CIUDAD: SOACHA

DIRECCION: LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		
	RCE PATRONAL	232,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	23,200,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 601-2023 REFERENTE A CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ASEGURADO: LEVELS S.A.S. NIT: 901.380.377-9 Y/O E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT: 832.001.794-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT: 832.001.794-2

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ **********118,225	$*********0.00	$ *******22,463	$ **********140,687

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560751493

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F0AOEF8775C CLIENTE YEIBUSTOS 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000031104** ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION PAGINA: 2

TOMADOR: **LEVELS SAS** IDENTIFICACION: **901.380.377-9**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	LEVELS SAS	901380377-9	LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO	SOACHA	232,000,000.00	118,225	140,687

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
118,225	140,687

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:17:25 horas del 29/12/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1010061680,** Apellidos y Nombres **RESTREPO LOPEZ CATALINA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza**, con NIT **832001794-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901380377	9	LEVELS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	Cra 85 23b 88 Tor4 Ap 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6921965	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	275252786	9458891617	E	2023/11/21	2023/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$569,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (2 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: SAS LEVELS (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1070594428	MARTINEZ SANDRA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	53905329	PESCADITE ANGELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0

2023/11/14 11:28 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901380377	9	LEVELS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	Cra 85 23b 88 Tor 4 Ap 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6921965	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	2751866494	94538991768	E	2023/12/20	2023/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$569,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa: COLSUBSIDIO (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SAS LEVELS (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1070594428	MARTINEZ SANDRA	232201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-21	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	52905329	RICAURTE ANGELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-21	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0

2023/11/14 11:08 AM
