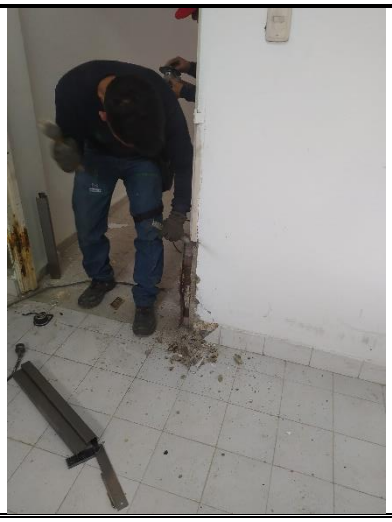
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.5 Mantenimiento puerta camerino costado derecho. Incluye cambio de bisagras, reemplazo de un (1) m de marco, anticorrosivo y pintura final
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 105	Se realiza el desmote de la puerta, el reemplazo del material deteriorado en el marco lamina calibre 14, así como el cambio de bisagras, corrección de bandos y filos y la reinstalación de la puerta
MARCO DETERIORADO POR OXIDO	
MARCO DETERIORADO POR OXIDO	
RETIRO MARCO	 

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.5 Mantenimiento puerta camerino costado derecho. Incluye cambio de bisagras, reemplazo de un (1) m de marco, anticorrosivo y pintura final
REMPLAZO SECCION DE MARCO EN MAL ESTADO Y CAMBIO DE BISAGRAS	
MARCO Y PUERTA RESTAURADOS	 
CANTIDAD	CANTIDAD: 1 UNIDAD
