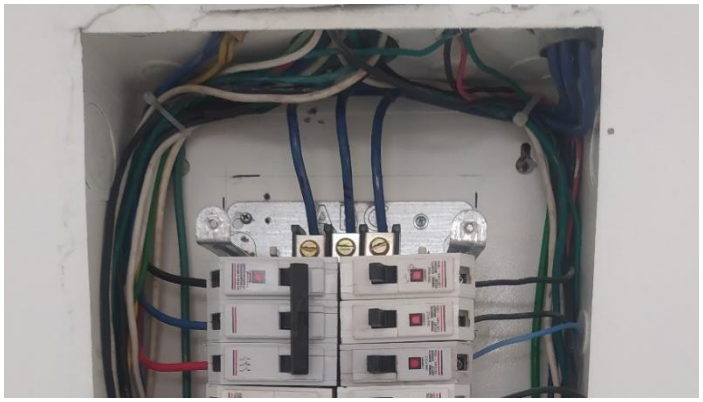
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.2.1 Suministro e instalación Acometida incluye en Cable #6 x 4 + # 8 x 1 y mano de obra.
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 301	Una vez colocados los ductos y cajas, se realiza la instalación de cuatro líneas de cable #6 y una #8 desde el tablero principal hasta el tablero de 18 circuitos, para lo cual se empleó la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación.
INICIO ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL	 
INGRESO ACOMETIDA A TABLERO AUDITORIO	
ENTRADA ACOMETIDA TABLERO AUDITORIO	
CANTIDAD	LONGITUD: 3+2+8+15+2+3 LONGITUD : 33.00 m
