

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
0		**CRONOGRAMA RAPS VENECIA línea base 5**	**3%**	**2.6%**	**3%**	**777 días**	**lun 31/01/22**	**vie 22/08/25**	**$ 62,056,249,725.02**	**$ 62,056,249,725.02**	**$ 1,624,132,270.46**	**$ 1,618,158,807.04**		
1		**COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA**	**3%**	**2.6%**	**3%**	**777 días**	**lun 31/01/22**	**vie 22/08/25**	**$ 62,056,249,725.02**	**$ 62,056,249,725.02**	**$ 1,624,132,270.46**	**$ 1,618,158,807.04**		
2		**ACTA DE INICIO AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**0 días**	**lun 31/01/22**	**lun 31/01/22**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**19FC+10 días;46;51;81;16**
3		**ACTIVIDADES DESPUES DE INICIO DE CONTRATO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**155 días**	**lun 31/01/22**	**jue 15/09/22**	**$ 23,338,085.00**	**$ 23,338,085.00**	**$ 23,338,085.00**	**$ 23,338,085.00**		
4		Plan de calidad	100%	100.0%	100%	13 días	lun 31/01/22	mié 16/02/22	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	2	
5		Instalacion Punto IDU	100%	100.0%	100%	22 días	lun 31/01/22	mar 1/03/22	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	2	
6		Plan detallado de inversion de anticipo	100%	100.0%	100%	155 días	lun 31/01/22	jue 15/09/22	$ 3,622,917.00	$ 3,622,917.00	$ 3,622,917.00	$ 3,622,917.00	2	
7		PAC	100%	100.0%	100%	30 días	mar 1/02/22	lun 14/03/22	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	2FC+1 día	
8		PDT	100%	100.0%	100%	5 días	mar 1/02/22	lun 7/02/22	$ 4,715,168.00	$ 4,715,168.00	$ 4,715,168.00	$ 4,715,168.00	2FC+1 día	9
9		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	2 días	mar 8/02/22	mié 9/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	8	10
10		Aprobacion PDT	100%	100.0%	100%	0 días	mié 9/02/22	mié 9/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	9	
11		Comité de inicio de contrato	100%	100.0%	100%	0 días	lun 31/01/22	lun 31/01/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2	
12		Vista al lugar de obra con presencia del IDU	100%	100.0%	100%	5 días	mié 23/02/22	mar 1/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2FC+17 días	
13		**AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**96%**	**96.9%**	**96%**	**462 días**	**lun 31/01/22**	**vie 24/05/24**	**$ 1,638,339,320.02**	**$ 1,638,339,320.02**	**$ 1,587,873,780.73**	**$ 1,580,209,770.94**		
14		**RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**43 días**	**lun 31/01/22**	**jue 31/03/22**	**$ 463,389,020.00**	**$ 463,389,020.00**	**$ 463,389,020.00**	**$ 463,389,020.00**		
15		**TOPOGRAFIA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 18,616,774.00**	**$ 18,616,774.00**	**$ 18,616,774.00**	**$ 18,616,774.00**		
16		Informe de revisión, verificación y análisis de información topográfica	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 18,616,774.00	$ 18,616,774.00	$ 18,616,774.00	$ 18,616,774.00	2	17
17		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	16	114
18		**ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 56,497,031.00**	**$ 56,497,031.00**	**$ 56,497,031.00**	**$ 56,497,031.00**		
19		Metodología para el estudio de transito	100%	100.0%	100%	10 días	lun 14/02/22	vie 25/02/22	$ 33,880,257.00	$ 33,880,257.00	$ 33,880,257.00	$ 33,880,257.00	2FC+10 días	20
20		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 25/02/22	vie 25/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	19	21
21		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 28/02/22	vie 4/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	20	22
22		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	lun 7/03/22	jue 10/03/22	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	21	23
23		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	4 días	vie 11/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	22	24
24		Aprobación interventoría y radicacion a SDM	100%	100.0%	100%	0 días	mié 16/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	23	208;120;124;25
25		Revision y aprobacion SDM	100%	100.0%	100%	9 días	jue 17/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	24	
26		Informe de recopilación y análisis de información de transito	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	27
27		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	26	114
28		**GEOTECNIA Y PAVIMENTOS**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 26,586,838.00**	**$ 26,586,838.00**	**$ 26,586,838.00**	**$ 26,586,838.00**		
29		Informe de investigación y recopilación de información pavimentos	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 26,586,838.00	$ 26,586,838.00	$ 26,586,838.00	$ 26,586,838.00	2	30
30		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	29	114
31		**DISEÑO GEOMETRICO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 26,616,774.00**	**$ 26,616,774.00**	**$ 26,616,774.00**	**$ 26,616,774.00**		
32		Informe de recopilación y análisis de información	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 26,616,774.00	$ 26,616,774.00	$ 26,616,774.00	$ 26,616,774.00	2	33
33		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	32	114
34		**ESTUDIOS SOCIALES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 56,586,837.00**	**$ 56,586,837.00**	**$ 56,586,837.00**	**$ 56,586,837.00**		
35		Plan de dialogo ciudadano, comunicación estrategica con la propuesta metodologica y cronograma	100%	100.0%	100%	28 días	lun 31/01/22	mié 9/03/22	$ 26,646,709.00	$ 26,646,709.00	$ 26,646,709.00	$ 26,646,709.00	2	36
36		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 9/03/22	mié 9/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	35	37
37		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 10/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	36	38
38		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	jue 17/03/22	mié 23/03/22	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	37	39
39		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 23/03/22	mié 23/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	38	40
40		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 24/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	39	41
41		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 30/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	40	118
42		Informe de recopilación y análisis de información	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 26,616,774.00	$ 26,616,774.00	$ 26,616,774.00	$ 26,616,774.00	2	43
43		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	42	114
44		**ESTUDIOS AMBIENTALES Y SST**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 68,173,672.00**	**$ 68,173,672.00**	**$ 68,173,672.00**	**$ 68,173,672.00**		
45		**ENTREGA DE INFORMACION SST**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**36 días**	**lun 31/01/22**	**mar 22/03/22**	**$ 31,616,770.00**	**$ 31,616,770.00**	**$ 31,616,770.00**	**$ 31,616,770.00**		
46		Hojas de vida	100%	100.0%	100%	10 días	lun 31/01/22	vie 11/02/22	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	2	47
47		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 11/02/22	vie 11/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	46	48
48		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 11/02/22	vie 11/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	47	49
49		Documentos de ingreso (contrato laboral, con sus respecti	100%	100.0%	100%	5 días	lun 14/02/22	vie 18/02/22	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	48	50
50		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 18/02/22	vie 18/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	49	120
51		Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y c	100%	100.0%	100%	21 días	lun 31/01/22	lun 28/02/22	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	2	53
52		Protocolo de bioseguridad	100%	100.0%	100%	21 días	lun 31/01/22	lun 28/02/22	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	2	117
53		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 28/02/22	lun 28/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	51	120;54
54		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mar 1/03/22	lun 7/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	53	117;55
55		Ajstes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	mar 8/03/22	lun 14/03/22	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	$ 8,323,354.00	54	56
56		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 14/03/22	lun 14/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	55	120;57
57		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mar 15/03/22	mar 22/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	56	58
58		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 22/03/22	mar 22/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	57	118
59		**ESTUDIOS AMBIENTALES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 36,556,902.00**	**$ 36,556,902.00**	**$ 36,556,902.00**	**$ 36,556,902.00**		
60		Elaboracion de metodologia	100%	100.0%	100%	28 días	lun 31/01/22	mié 9/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	61
61		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 9/03/22	mié 9/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	60	62
62		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 10/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	61	63
63		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	jue 17/03/22	mié 23/03/22	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	$ 3,323,354.00	62	64
64		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 23/03/22	mié 23/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	63	65
65		revison de internvetoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 24/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	64	66
66		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 30/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	65	118
67		Informe de recopilación, análisis y revisión de información	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	68
68		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	67	114
69		**DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 36,616,774.00**	**$ 36,616,774.00**	**$ 36,616,774.00**	**$ 36,616,774.00**		
70		**REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 36,616,774.00**	**$ 36,616,774.00**	**$ 36,616,774.00**	**$ 36,616,774.00**		
71		Elaboracion de metodologia	100%	100.0%	100%	28 días	lun 31/01/22	mié 9/03/22	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	2	72
72		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 9/03/22	mié 9/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	71	73
73		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 10/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	72	74
74		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	jue 17/03/22	mié 23/03/22	$ 16,100,000.00	$ 16,100,000.00	$ 16,100,000.00	$ 16,100,000.00	73	75

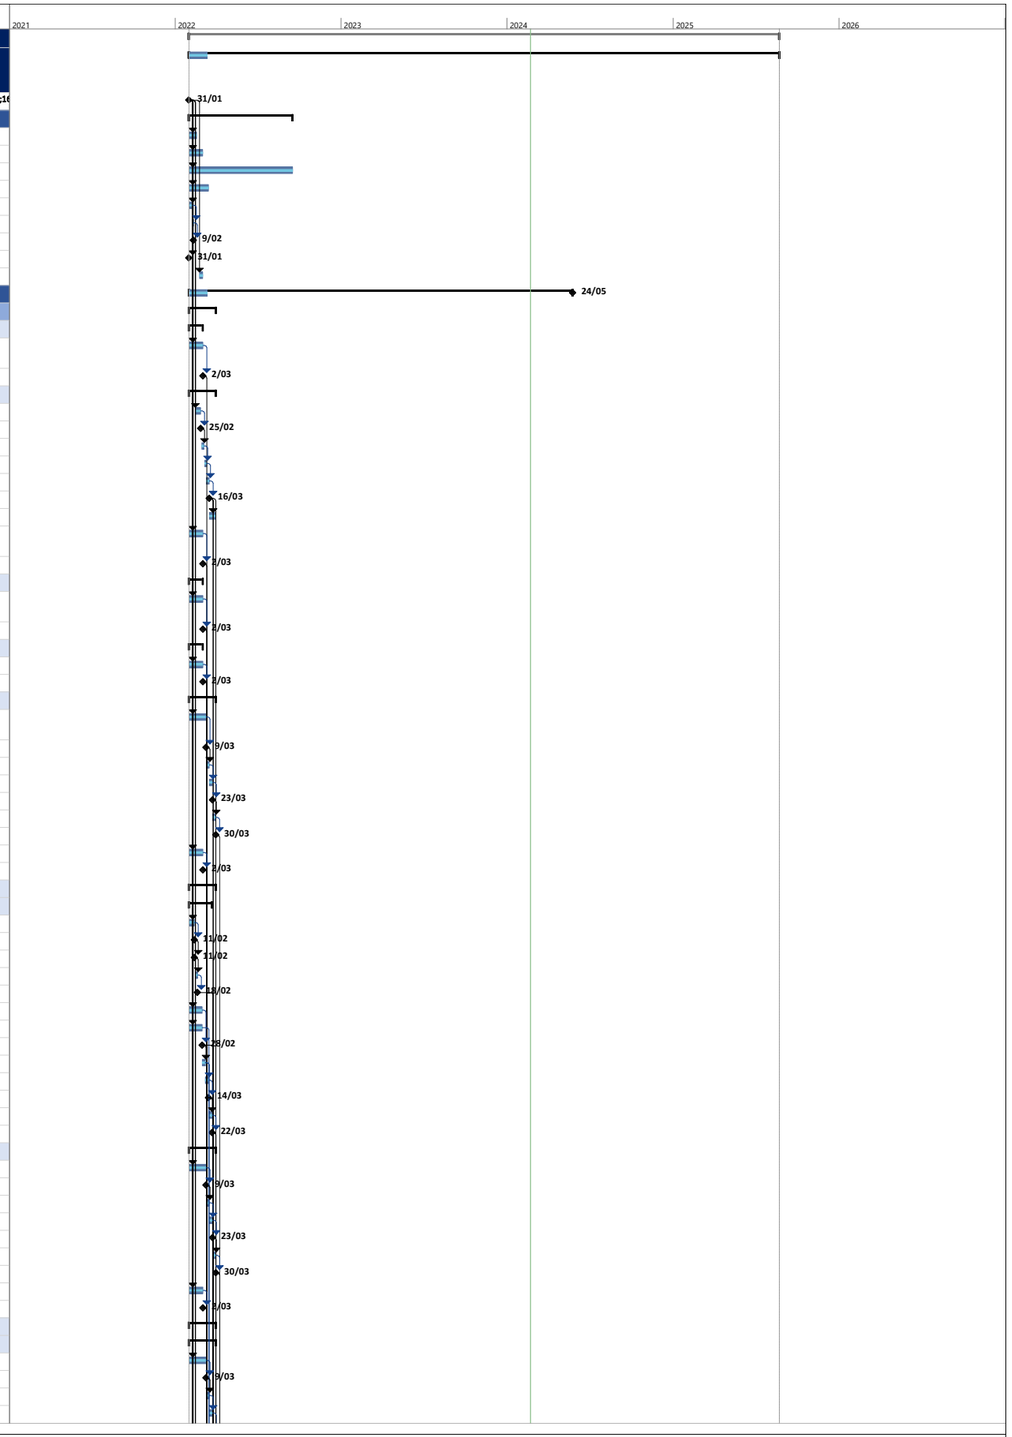

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
75		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 23/03/22	mié 23/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	74	76
76		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 24/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75	77
77		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 30/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	76	118
78		Recopilación de información secundaria	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,316,774.00	$ 16,316,774.00	$ 16,316,774.00	$ 16,316,774.00	2	79
79		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	78	114
80		**DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, Y OTROS OPERADORES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 92,283,870.00**	**$ 92,283,870.00**	**$ 92,283,870.00**	**$ 92,283,870.00**		
81		Metodología de redes electricas	100%	100.0%	100%	28 días	lun 31/01/22	mié 9/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	82
82		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 9/03/22	mié 9/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	81	83
83		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 10/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	82	84
84		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	jue 17/03/22	mié 23/03/22	$ 9,200,000.00	$ 9,200,000.00	$ 9,200,000.00	$ 9,200,000.00	83	85
85		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 23/03/22	mié 23/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	84	86
86		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 24/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	85	87
87		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 30/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	86	118
88		**CODENSA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
89		Recopilación y análisis de informacion existente	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	90
90		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	89	114
91		**ETB**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
92		Recopilación y análisis de informacion existente	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	93
93		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	92	114
94		**OTROS A OPERADORES TELEFONIA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
95		Recopilación y análisis de informacion existente	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	96
96		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	95	114
97		**GAS NATURAL**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
98		Recopilación y análisis de informacion existente	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	99
99		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	98	114
100		**URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
101		Recopilación y análisis de informacion existente	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	102
102		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	101	114FC-1 día
103		**ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**23 días**	**lun 31/01/22**	**mié 2/03/22**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
104		Recopilación y análisis de informacion existente	100%	100.0%	100%	23 días	lun 31/01/22	mié 2/03/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	2	105
105		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/03/22	mié 2/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	104	114
106		**CRONOGRAMA, PRESUPUESTO, DOCUM. CONTRATACION**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**42 días**	**lun 31/01/22**	**mié 30/03/22**	**$ 21,590,064.00**	**$ 21,590,064.00**	**$ 21,590,064.00**	**$ 21,590,064.00**		
107		Metodología de costos y presupuesto	100%	100.0%	100%	28 días	lun 31/01/22	mié 9/03/22	$ 19,970,064.00	$ 19,970,064.00	$ 19,970,064.00	$ 19,970,064.00	2	108
108		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 9/03/22	mié 9/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	107	109
109		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 10/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	108	110
110		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	jue 17/03/22	mié 23/03/22	$ 1,620,000.00	$ 1,620,000.00	$ 1,620,000.00	$ 1,620,000.00	109	111
111		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 24/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	110	112
112		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 30/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	111	118
113		**ENTREGA FINAL INFORMES DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**20 días**	**jue 3/03/22**	**jue 31/03/22**	**$ 26,586,838.00**	**$ 26,586,838.00**	**$ 26,586,838.00**	**$ 26,586,838.00**		
114		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 3/03/22	mié 9/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	17;27;30;33;68;79;90;93;96;9	115;405FC-15 días;409FC-
115		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	$ 26,586,838.00	$ 26,586,838.00	$ 26,586,838.00	$ 26,586,838.00	114	116;243;141FC-19 días;25
116		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mar 15/03/22	mar 22/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	115	117;444FC+3 días;456;457
117		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 22/03/22	mar 22/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	116;54;52	120;118FC+7 días
118		APROBACION IDU	100%	100.0%	100%	0 días	jue 31/03/22	jue 31/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	117FC+7 días;66;41;77;87;112	120
119		**AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**100%**	**99.9%**	**100%**	**455 días**	**mié 9/02/22**	**vie 24/05/24**	**$ 1,002,000,271.50**	**$ 1,002,000,271.50**	**$ 1,000,778,068.01**	**$ 1,000,778,068.01**		
120		Inicio Etapa Estudios y Diseños	100%	100.0%	100%	0 días	jue 31/03/22	jue 31/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	117;24;50;53;130;118;56	327FC+5 días;522FC-31 dí
121		***Inicio de Recomposición***	100%	***100.0%***	100%	0 días	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	120CC+210 días	122FC+149 días;1660
122		***Inicio de prórroga***	0%	***100.0%***	0%	0 días	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121FC+149 días	188FC+3 días;278CC-
123		**TRABAJO DE CAMPO DE TRANSITO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**32 días**	**lun 14/02/22**	**mié 30/03/22**	**$ 81,105,668.00**	**$ 81,105,668.00**	**$ 81,105,668.00**	**$ 81,105,668.00**		
124		Toma de información en campo (aforos de volúmenes vehiculares o peatonales, o bici-usuarios, ejercicios de origen destino, toma de velocidades, de ocupación visual de pasajeros, accidentalidad y rutas de transporte público, entre otros).	100%	100.0%	100%	9 días	jue 17/03/22	mié 30/03/22	$ 63,658,057.00	$ 63,658,057.00	$ 63,658,057.00	$ 63,658,057.00	24	208
125		Elaboracion de PMTs para trabajos de campo	100%	100.0%	100%	9 días	lun 14/02/22	jue 24/02/22	$ 11,631,741.00	$ 11,631,741.00	$ 11,631,741.00	$ 11,631,741.00	2FC+10 días	126
126		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 24/02/22	jue 24/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	125	127
127		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	126	128
128		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	vie 4/03/22	mar 8/03/22	$ 5,815,870.00	$ 5,815,870.00	$ 5,815,870.00	$ 5,815,870.00	127	129
129		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 9/03/22	mar 15/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	128	130
130		Aprobación interventoría y SDM	100%	100.0%	100%	10 días	mié 16/03/22	mié 30/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	129	120;139;149FC+1 día
131		**TRABAJO DE CAMPO DE PAVIMENTOS Y GEOTECNIA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**80 días**	**lun 14/02/22**	**jue 9/06/22**	**$ 116,629,377.00**	**$ 116,629,377.00**	**$ 116,629,377.00**	**$ 116,629,377.00**		
132		Elaboracion de plan de exploracion para pavimentos	100%	100.0%	100%	9 días	lun 14/02/22	jue 24/02/22	$ 39,631,741.00	$ 39,631,741.00	$ 39,631,741.00	$ 39,631,741.00	2FC+10 días	133
133		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 24/02/22	jue 24/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	132	134
134		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	133	135
135		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 4/03/22	jue 10/03/22	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	134	136
136		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 10/03/22	jue 10/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	135	137
137		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	136	138
138		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	137	139
139		Ejecucion de la exploracion geotecniaca	100%	100.0%	100%	15 días	jue 31/03/22	vie 22/04/22	$ 56,690,765.00	$ 56,690,765.00	$ 56,690,765.00	$ 56,690,765.00	130;138	140
140		Ensayos de laboratorio	100%	100.0%	100%	15 días	lun 25/04/22	vie 13/05/22	$ 13,185,833.00	$ 13,185,833.00	$ 13,185,833.00	$ 13,185,833.00	139	141CC;142
141		Análisis de los resultados de las investigaciones y ensayos de l	100%	100.0%	100%	15 días	lun 25/04/22	vie 13/05/22	$ 4,697,864.00	$ 4,697,864.00	$ 4,697,864.00	$ 4,697,864.00	140CC;115FC-19 días	259;473FC+5 días;485FC-5
142		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 13/05/22	vie 13/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	140;141	143
143		Revision de intervnetoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 16/05/22	vie 20/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	142	144
144		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	8 días	lun 23/05/22	jue 2/06/22	$ 1,260,000.00	$ 1,260,000.00	$ 1,260,000.00	$ 1,260,000.00	143	145
145		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 2/06/22	jue 2/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	144	146
146		Revision de intervnetoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	145	147
147		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 9/06/22	jue 9/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	146	419
148		**TRABAJO DE INSPECCION DE REDES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**24 días**	**vie 1/04/22**	**vie 6/05/22**	**$ 21,910,000.00**	**$ 21,910,000.00**	**$ 21,910,000.00**	**$ 21,910,000.00**		

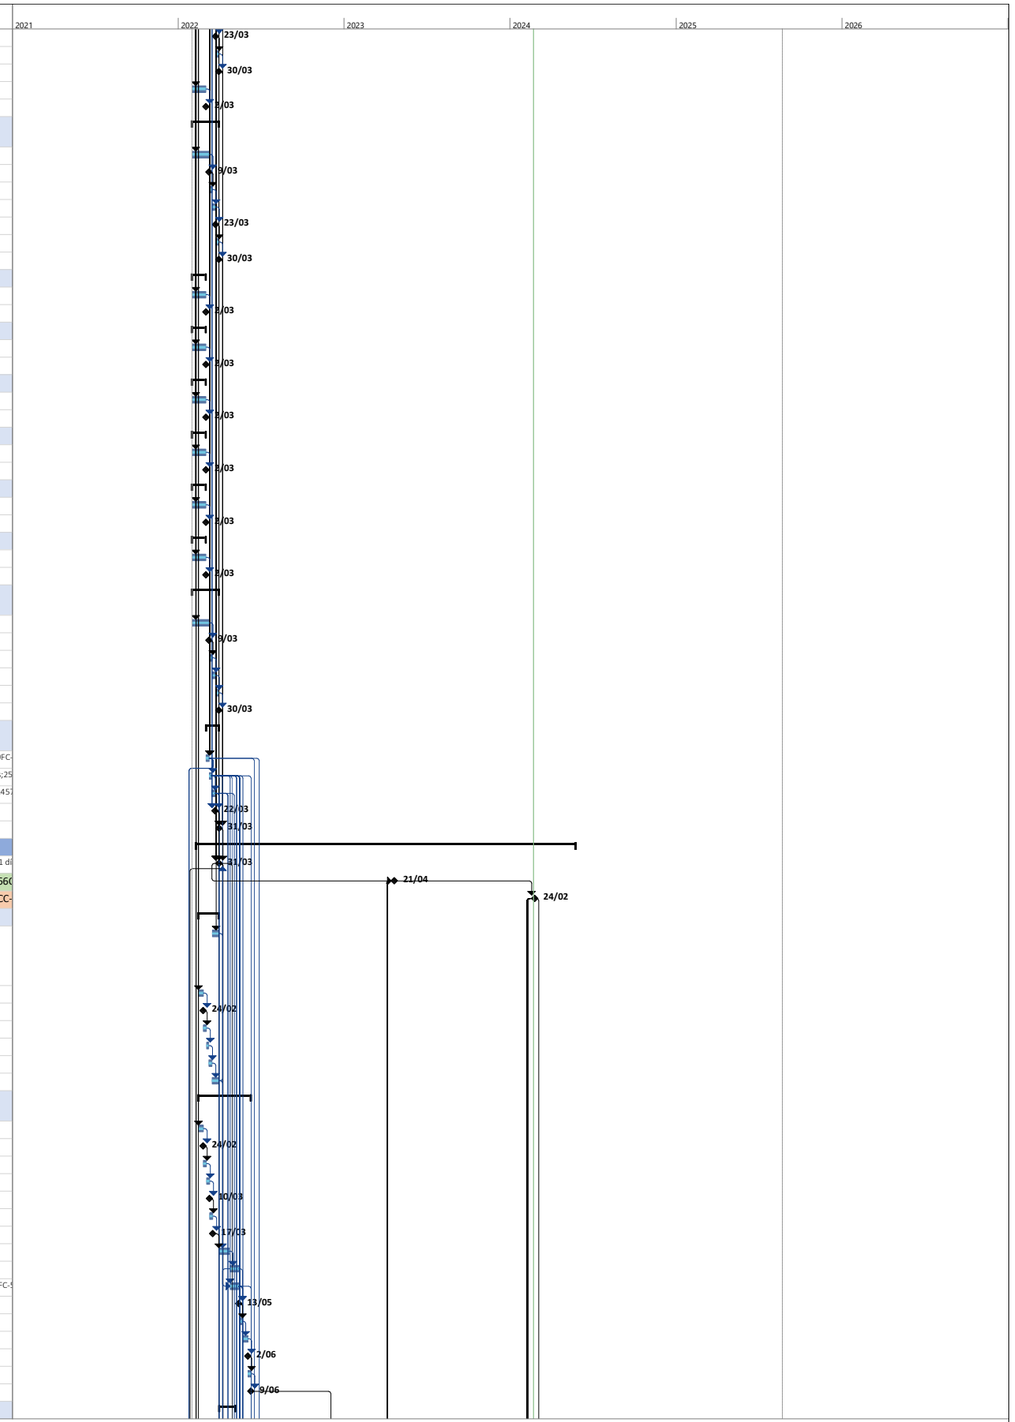

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea — Resumen — Hito inactivo — solo duración — solo el comienzo — Hito externo — División crítica
División — Resumen del proyecto — Resumen inactivo — Informe de resumen manual — solo fin — Fecha límite — Progreso
Hito — Tarea inactiva — Tarea manual — Resumen manual — Tareas externas — Tareas críticas — Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
149		Verificacion y compementacion de redes	100%	100.0%	100%	14 días	vie 1/04/22	vie 22/04/22	$ 16,280,000.00	$ 16,280,000.00	$ 16,280,000.00	$ 16,280,000.00	130FC+1 día;115	150FC-10 días
150		Procesamento	100%	100.0%	100%	15 días	jue 7/04/22	vie 29/04/22	$ 5,630,000.00	$ 5,630,000.00	$ 5,630,000.00	$ 5,630,000.00	149FC-10 días	151
151		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 29/04/22	vie 29/04/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	150	152;409FC-17 días;431FC-
152		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 2/05/22	vie 6/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	151	153
153		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 6/05/22	vie 6/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	152	419
154		**COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**100%**	**99.8%**	**100%**	**455 días**	**mié 9/02/22**	**vie 24/05/24**	**$ 782,355,226.50**	**$ 782,355,226.50**	**$ 781,133,023.01**	**$ 781,133,023.01**		
155		**TOPOGRAFIA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**426 días**	**mié 9/02/22**	**jue 11/04/24**	**$ 22,130,875.00**	**$ 22,130,875.00**	**$ 22,130,875.00**	**$ 22,130,875.00**		
156		Verificacion de Poligonales y nivelacion; detalles	100%	100.0%	100%	9 días	mié 9/02/22	lun 21/02/22	$ 7,106,992.00	$ 7,106,992.00	$ 7,106,992.00	$ 7,106,992.00	2FC+7 días	158FC-5 días
157		Localizacion de ejes	100%	100.0%	100%	9 días	mié 9/02/22	lun 21/02/22	$ 10,371,187.00	$ 10,371,187.00	$ 10,371,187.00	$ 10,371,187.00	2FC+7 días	158FC-15 días
158		Cálculos(Carteras topográficas)	100%	100.0%	100%	11 días	mar 15/02/22	mar 1/03/22	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	156FC-5 días;157FC-15 días	159FC+3 días;160
159		Complementacion y apropiacion de planos	100%	100.0%	100%	8 días	lun 7/03/22	mié 16/03/22	$ 2,326,348.00	$ 2,326,348.00	$ 2,326,348.00	$ 2,326,348.00	158FC+3 días	243FC-8 días;160
160		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 16/03/22	mié 16/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	158;159	161;195FC+8 días
161		Revisión por la Interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 17/03/22	jue 24/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	160	162
162		Ajustes a observaciones de Interventoria	100%	100.0%	100%	3 días	vie 25/03/22	mar 29/03/22	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	$ 1,163,174.00	161	163FC+125 días
163		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	162FC+125 días	164
164		Revisión por la Interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 3/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	163	1039
165		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**149 días**	**vie 21/04/23**	**vie 23/02/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
166		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	7 días	vie 21/04/23	mar 2/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC-1 día	167
167		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	166	168
168		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	8 días	jue 4/05/23	lun 15/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	167	169
169		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	17 días	mar 16/05/23	jue 8/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	168	170
170		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	169	171
171		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	8 días	mar 13/06/23	vie 23/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	170	172
172		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	4 días	lun 26/06/23	jue 29/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	171	173
173		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	2 días	vie 30/06/23	mar 4/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	172	174
174		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	7 días	mié 5/07/23	jue 13/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	173	175
175		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	2 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	174	176
176		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	175	177
177		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 19/07/23	mié 26/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	176	178
178		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	16 días	jue 27/07/23	vie 18/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	177	179
179		Entrega a Interventoría	100%	100.0%	100%	1 día	mar 22/08/23	mar 22/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	178	180
180		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	6 días	mié 23/08/23	mié 30/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	179	181
181		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	2 días	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	180	182
182		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	lun 4/09/23	lun 4/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	181	183
183		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	6 días	mar 5/09/23	mar 12/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	182	184
184		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	7 días	mié 13/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	183	185
185		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 22/09/23	vie 22/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	184	186
186		Revisión Interventoría	100%	100.0%	100%	46 días	mar 19/12/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	185	1039
187		**Prórroga topografia**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**28 días**	**jue 29/02/24**	**jue 11/04/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
188		Mesa de trabajo IDU	0%	0.0%	0%	1 día	jue 29/02/24	jue 29/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122FC+3 días	189
189		Atención observaciones	0%	0.0%	0%	10 días	vie 1/03/24	jue 14/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	188	190
190		Entrega a Interventoría	0%	0.0%	0%	1 día	vie 15/03/24	vie 15/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	189	191
191		Revisión y aprobación Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	lun 18/03/24	vie 22/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	190	192
192		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 26/03/24	mar 26/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	191	193
193		Revision y aprobación IDU	0%	0.0%	0%	10 días	mié 27/03/24	jue 11/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	192	1041;1040
194		**DISEÑO GEOMETRICO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**63 días**	**mié 30/03/22**	**vie 1/07/22**	**$ 21,033,225.00**	**$ 21,033,225.00**	**$ 21,033,225.00**	**$ 21,033,225.00**		
195		Validacion de plantas y perfiles de acuerdo a topografia nu	100%	100.0%	100%	15 días	mié 30/03/22	jue 21/04/22	$ 1,593,023.00	$ 1,593,023.00	$ 1,593,023.00	$ 1,593,023.00	160FC+8 días	222FC-11 días;196;198;22
196		Actualización y complementación a las planta- perfil	100%	100.0%	100%	15 días	vie 22/04/22	jue 12/05/22	$ 5,593,026.00	$ 5,593,026.00	$ 5,593,026.00	$ 5,593,026.00	195	198;197
197		Actualización y complementación a las secciones transvers	100%	100.0%	100%	10 días	vie 13/05/22	jue 26/05/22	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	196	198
198		Actualización y complementación al informe de diseño ge	100%	100.0%	100%	3 días	vie 27/05/22	mié 1/06/22	$ 3,593,024.00	$ 3,593,024.00	$ 3,593,024.00	$ 3,593,024.00	195;196;213;197	199;243FC-7 días
199		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 1/06/22	mié 1/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	198	200;203FC-15 días
200		Revisión de diseños por Interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	199	201
201		Ajustes a observaciones de Interventoría	100%	100.0%	100%	10 días	jue 9/06/22	jue 23/06/22	$ 4,169,435.00	$ 4,169,435.00	$ 4,169,435.00	$ 4,169,435.00	200;214	202
202		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 23/06/22	jue 23/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	201	204
203		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	10 días	mié 11/05/22	mar 24/05/22	$ 2,084,717.00	$ 2,084,717.00	$ 2,084,717.00	$ 2,084,717.00	199FC-15 días	204
204		Revisión de diseños por Interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 24/06/22	vie 1/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	202;203	205
205		Entrega de diseño geométrico al IDU	100%	100.0%	100%	0 días	vie 1/07/22	vie 1/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	204	
206		**ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**123 días**	**jue 31/03/22**	**jue 29/09/22**	**$ 162,940,547.00**	**$ 162,940,547.00**	**$ 162,940,547.00**	**$ 162,940,547.00**		
207		**Transito**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**123 días**	**jue 31/03/22**	**jue 29/09/22**	**$ 63,518,616.00**	**$ 63,518,616.00**	**$ 63,518,616.00**	**$ 63,518,616.00**		
208		Procesamiento de información	100%	100.0%	100%	10 días	jue 31/03/22	mié 13/04/22	$ 1,109,183.00	$ 1,109,183.00	$ 1,109,183.00	$ 1,109,183.00	24;124	213CC-12 días;209FC-10 d
209		Analisis de informacion secundria y primaria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 31/03/22	mié 6/04/22	$ 6,054,591.00	$ 6,054,591.00	$ 6,054,591.00	$ 6,054,591.00	208FC-10 días	213CC-12 días;210
210		Cálculo del tránsito promedio diario (TPD)	100%	100.0%	100%	5 días	jue 7/04/22	mié 13/04/22	$ 8,054,591.00	$ 8,054,591.00	$ 8,054,591.00	$ 8,054,591.00	209	212;211
211		Cargue de informacion para modulacion	100%	100.0%	100%	10 días	lun 18/04/22	vie 29/04/22	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	210	212
212		Modelacion de transito	100%	100.0%	100%	16 días	lun 2/05/22	lun 23/05/22	$ 11,191,069.00	$ 11,191,069.00	$ 11,191,069.00	$ 11,191,069.00	210;211	213FC-15 días;222FC-6 día
213		Informe estudio transito	100%	100.0%	100%	15 días	mar 3/05/22	lun 23/05/22	$ 16,054,591.00	$ 16,054,591.00	$ 16,054,591.00	$ 16,054,591.00	208CC-12 días;209CC-12 días;	214;232FC-20 días;198
214		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 23/05/22	lun 23/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	213	215;201
215		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 24/05/22	mar 31/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	214	216
216		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 1/06/22	mar 7/06/22	$ 11,054,591.00	$ 11,054,591.00	$ 11,054,591.00	$ 11,054,591.00	215	217
217		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 7/06/22	mar 7/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	216	218
218		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 8/06/22	mar 14/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	217	219
219		Aprobación interventoría	100%	100.0%	100%	0 días	mar 14/06/22	mar 14/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	218	220FC+72 días
220		Entrega de informe de tránsito a SDM	100%	100.0%	100%	0 días	jue 29/09/22	jue 29/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	219FC+72 días	620FC+1 día
221		**Señalización**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**50 días**	**lun 16/05/22**	**vie 29/07/22**	**$ 42,581,701.00**	**$ 42,581,701.00**	**$ 42,581,701.00**	**$ 42,581,701.00**		
222		verificacion del Inventario señalización	100%	100.0%	100%	10 días	lun 16/05/22	vie 27/05/22	$ 7,193,900.00	$ 7,193,900.00	$ 7,193,900.00	$ 7,193,900.00	212FC-6 días;195FC-11 días	224;223
223		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	11 días	mar 31/05/22	mar 14/06/22	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	222	224
224		Ajuste al diseño de Señalización	100%	100.0%	100%	15 días	mié 15/06/22	vie 8/07/22	$ 13,258,534.00	$ 13,258,534.00	$ 13,258,534.00	$ 13,258,534.00	212;222;195;223	233FC-35 días;225
225		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 8/07/22	vie 8/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224	226;228FC-15 días
226		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	225	227

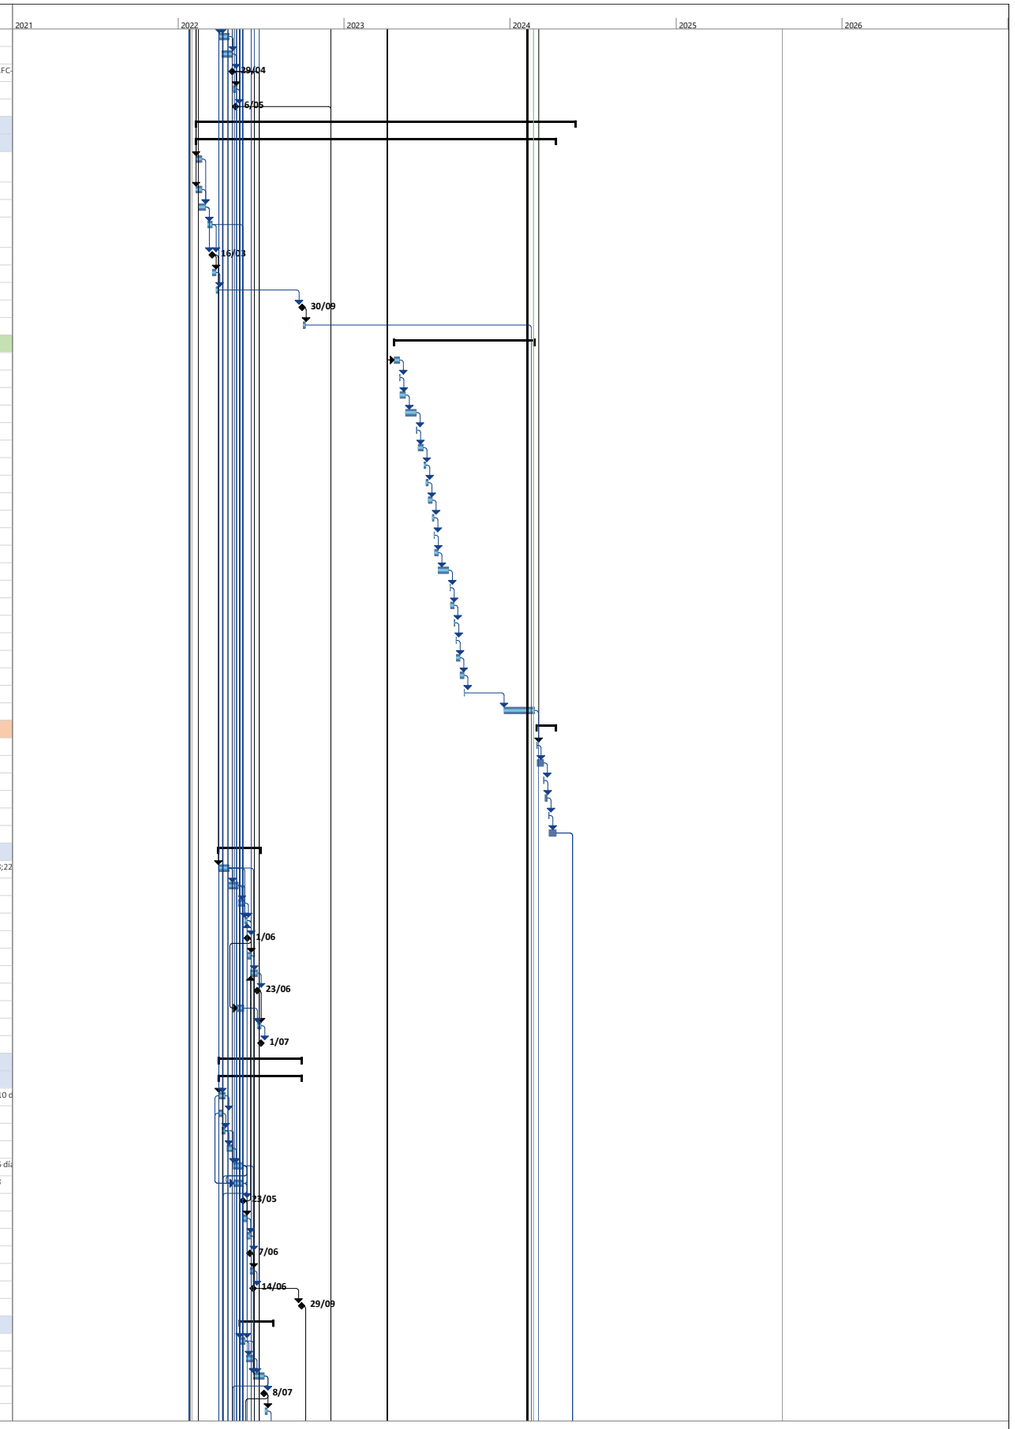

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea — Resumen — Hito inactivo — solo duración — solo el comienzo — Hito externo — División crítica
División — Resumen del proyecto — Resumen inactivo — Informe de resumen manual — solo fin — Fecha límite — Progreso
Hito — Tarea inactiva — Tarea manual — Resumen manual — Tareas externas — Tareas críticas — Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
227		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	lun 18/07/22	vie 22/07/22	$ 6,064,633.00	$ 6,064,633.00	$ 6,064,633.00	$ 6,064,633.00	226	229;620
228		Calculo de cantidades	100%	100.0%	100%	5 días	mié 15/06/22	mié 22/06/22	$ 6,064,634.00	$ 6,064,634.00	$ 6,064,634.00	$ 6,064,634.00	225FC-15 días	229
229		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 25/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	227;228	230
230		Entrega de informe de señalización a SDM	100%	100.0%	100%	0 días	vie 29/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	229	620
231		**Semaforización**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**64 días**	**mar 26/04/22**	**vie 29/07/22**	**$ 56,840,230.00**	**$ 56,840,230.00**	**$ 56,840,230.00**	**$ 56,840,230.00**		
232		Análisis de fases semafóricas	100%	100.0%	100%	10 días	mar 26/04/22	lun 9/05/22	$ 3,064,633.00	$ 3,064,633.00	$ 3,064,633.00	$ 3,064,633.00	213FC-20 días;212FC-46 días	233FC-10 días;236
233		Diseño Semaforización	100%	100.0%	100%	9 días	mar 17/05/22	vie 27/05/22	$ 11,678,043.00	$ 11,678,043.00	$ 11,678,043.00	$ 11,678,043.00	232FC-10 días;224FC-35 días	236;234
234		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	15 días	mar 31/05/22	mar 21/06/22	$ 17,419,511.00	$ 17,419,511.00	$ 17,419,511.00	$ 17,419,511.00	233	235
235		Elaboracion de informe	100%	100.0%	100%	15 días	mié 22/06/22	jue 14/07/22	$ 10,419,511.00	$ 10,419,511.00	$ 10,419,511.00	$ 10,419,511.00	234	236
236		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 14/07/22	jue 14/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	233;232;235	237;240FC-7 días
237		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	236	238
238		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 25/07/22	vie 29/07/22	$ 12,129,266.00	$ 12,129,266.00	$ 12,129,266.00	$ 12,129,266.00	237	239
239		Aprobación interventoría	100%	100.0%	100%	0 días	vie 29/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	238	241
240		Calculo de cantidades	100%	100.0%	100%	7 días	mié 6/07/22	jue 14/07/22	$ 2,129,266.00	$ 2,129,266.00	$ 2,129,266.00	$ 2,129,266.00	236FC-7 días	241
241		Entrega de informe de semaforización o a SDM	100%	100.0%	100%	0 días	vie 29/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	239;240	620
242		**DISEÑO URBANISMO y/o ESPACIO PUBLICO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**213 días**	**lun 23/05/22**	**vie 16/06/23**	**$ 31,270,762.00**	**$ 31,270,762.00**	**$ 31,270,762.00**	**$ 31,270,762.00**		
243		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	10 días	lun 23/05/22	lun 6/06/22	$ 3,054,589.00	$ 3,054,589.00	$ 3,054,589.00	$ 3,054,589.00	159FC-8 días;115;212FC-8 días	247;244
244		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	11 días	mar 7/06/22	mié 22/06/22	$ 4,949,789.00	$ 4,949,789.00	$ 4,949,789.00	$ 4,949,789.00	243	245
245		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	7 días	jue 23/06/22	mar 5/07/22	$ 7,633,192.00	$ 7,633,192.00	$ 7,633,192.00	$ 7,633,192.00	244	246
246		Elaboracion de informe	100%	100.0%	100%	3 días	mié 6/07/22	vie 8/07/22	$ 4,262,006.00	$ 4,262,006.00	$ 4,262,006.00	$ 4,262,006.00	245	247
247		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 8/07/22	vie 8/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	243;246	248
248		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	247	249FC+52 días
249		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 30/09/22	jue 6/10/22	$ 8,528,390.00	$ 8,528,390.00	$ 8,528,390.00	$ 8,528,390.00	248FC+52 días	251FC-10 días;250
250		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 7/10/22	jue 13/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	249	252
251		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	8 días	vie 23/09/22	mar 4/10/22	$ 2,842,796.00	$ 2,842,796.00	$ 2,842,796.00	$ 2,842,796.00	249FC-10 días	252
252		Entrega de diseño urbanismo al IDU	100%	100.0%	100%	0 días	jue 13/10/22	jue 13/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	251;250	419;1039
253		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**20 días**	**jue 18/05/23**	**vie 16/06/23**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
254		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+17 días	255
255		Revision Interventoria	100%	100.0%	100%	3 días	vie 19/05/23	mié 24/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	254	256
256		Entrega a IDU	100%	100.0%	100%	1 día	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	255	257
257		Revision y aprobación IDU	100%	100.0%	100%	15 días	vie 26/05/23	vie 16/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	256	1039
258		**PAVIMENTOS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**379 días**	**lun 16/05/22**	**mié 8/05/24**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**		
259		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	10 días	lun 16/05/22	vie 27/05/22	$ 633,193.00	$ 633,193.00	$ 633,193.00	$ 633,193.00	141;115	263;266FC-6 días;546FC-4
260		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	7 días	mar 31/05/22	mié 8/06/22	$ 2,842,797.00	$ 2,842,797.00	$ 2,842,797.00	$ 2,842,797.00	259	261
261		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	7 días	jue 9/06/22	vie 17/06/22	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	260	262
262		Elaboracion de informe	100%	100.0%	100%	7 días	mar 21/06/22	jue 30/06/22	$ 2,209,604.00	$ 2,209,604.00	$ 2,209,604.00	$ 2,209,604.00	261	263
263		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 30/06/22	jue 30/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	259;262	264
264		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 1/07/22	vie 8/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	263	265
265		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	9 días	lun 11/07/22	vie 22/07/22	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	264	267
266		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	5 días	vie 20/05/22	jue 26/05/22	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	259FC-6 días	546FC-40 días;267
267		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 25/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	265;266	268
268		Entrega de diseño pavimentos al IDU	100%	100.0%	100%	0 días	vie 29/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	267	799;1039
269		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**149 días**	**vie 21/04/23**	**vie 23/02/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
270		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	19 días	vie 21/04/23	jue 18/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC-1 día	271
271		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 19/05/23	vie 19/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	270	272
272		Revision y aprobación interventoria	100%	100.0%	100%	2 días	mar 23/05/23	mié 24/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	271	273
273		Entrega IDU	100%	100.0%	100%	1 día	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	272	274
274		Revisión IDU	100%	100.0%	100%	11 días	vie 26/05/23	vie 9/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	273	275
275		Revisión Interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 13/06/23	mar 20/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	274	276
276		Atencion observaciones	100%	100.0%	100%	110 días	mié 21/06/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	275	1039
277		**Prórroga pavimentos**	**0%**	**4.0%**	**0%**	**50 días**	**sáb 24/02/24**	**mié 8/05/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
278		Entrega a Interventoría	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	279
279		Mesa de trabajo	0%	88.0%	0%	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	278	280
280		Revisión Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	mar 27/02/24	lun 4/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	279	281FC+1 día
281		Átención de observaciones	0%	0.0%	0%	10 días	mié 6/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	280FC+1 día	282
282		Entrega a Interventoría	0%	0.0%	0%	1 día	mié 20/03/24	mié 20/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	281	283
283		Revisión Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	jue 21/03/24	lun 1/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	282	284
284		Átención de observaciones	0%	0.0%	0%	10 días	mar 2/04/24	lun 15/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	283	285
285		Revisión y aprobación de Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	mar 16/04/24	lun 22/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	284	286
286		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 23/04/24	mar 23/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	285	287
287		Revisión y aprobacion IDU	0%	0.0%	0%	10 días	mié 24/04/24	mié 8/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	286	1041;1040
288		**GEOTECNIA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**370 días**	**lun 16/05/22**	**mié 24/04/24**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**		
289		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	10 días	lun 16/05/22	vie 27/05/22	$ 633,193.00	$ 633,193.00	$ 633,193.00	$ 633,193.00	141;115	293;296FC-6 días;546FC-4
290		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	7 días	mar 31/05/22	mié 8/06/22	$ 2,842,797.00	$ 2,842,797.00	$ 2,842,797.00	$ 2,842,797.00	289	291
291		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	7 días	jue 9/06/22	vie 17/06/22	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	290	292
292		Elaboracion de informe	100%	100.0%	100%	7 días	mar 21/06/22	jue 30/06/22	$ 2,209,604.00	$ 2,209,604.00	$ 2,209,604.00	$ 2,209,604.00	291	293
293		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 30/06/22	jue 30/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	289;292	294
294		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 1/07/22	vie 8/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	293	295
295		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	9 días	lun 11/07/22	vie 22/07/22	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	294	297
296		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	5 días	vie 20/05/22	jue 26/05/22	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	289FC-6 días	546FC-40 días;297
297		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 25/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	295;296	298
298		Entrega de diseño pavimentos al IDU	100%	100.0%	100%	0 días	vie 29/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	297	799;1039
299		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**149 días**	**vie 21/04/23**	**vie 23/02/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
300		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC-1 día	301CC
301		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	300CC	302
302		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	7 días	lun 24/04/23	mié 3/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	301	303
303		Atención de osbervaciones	100%	100.0%	100%	4 días	jue 4/05/23	mar 9/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	302	304
304		Entrega a Interventoría	100%	100.0%	100%	1 día	mié 10/05/23	mié 10/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	303	305

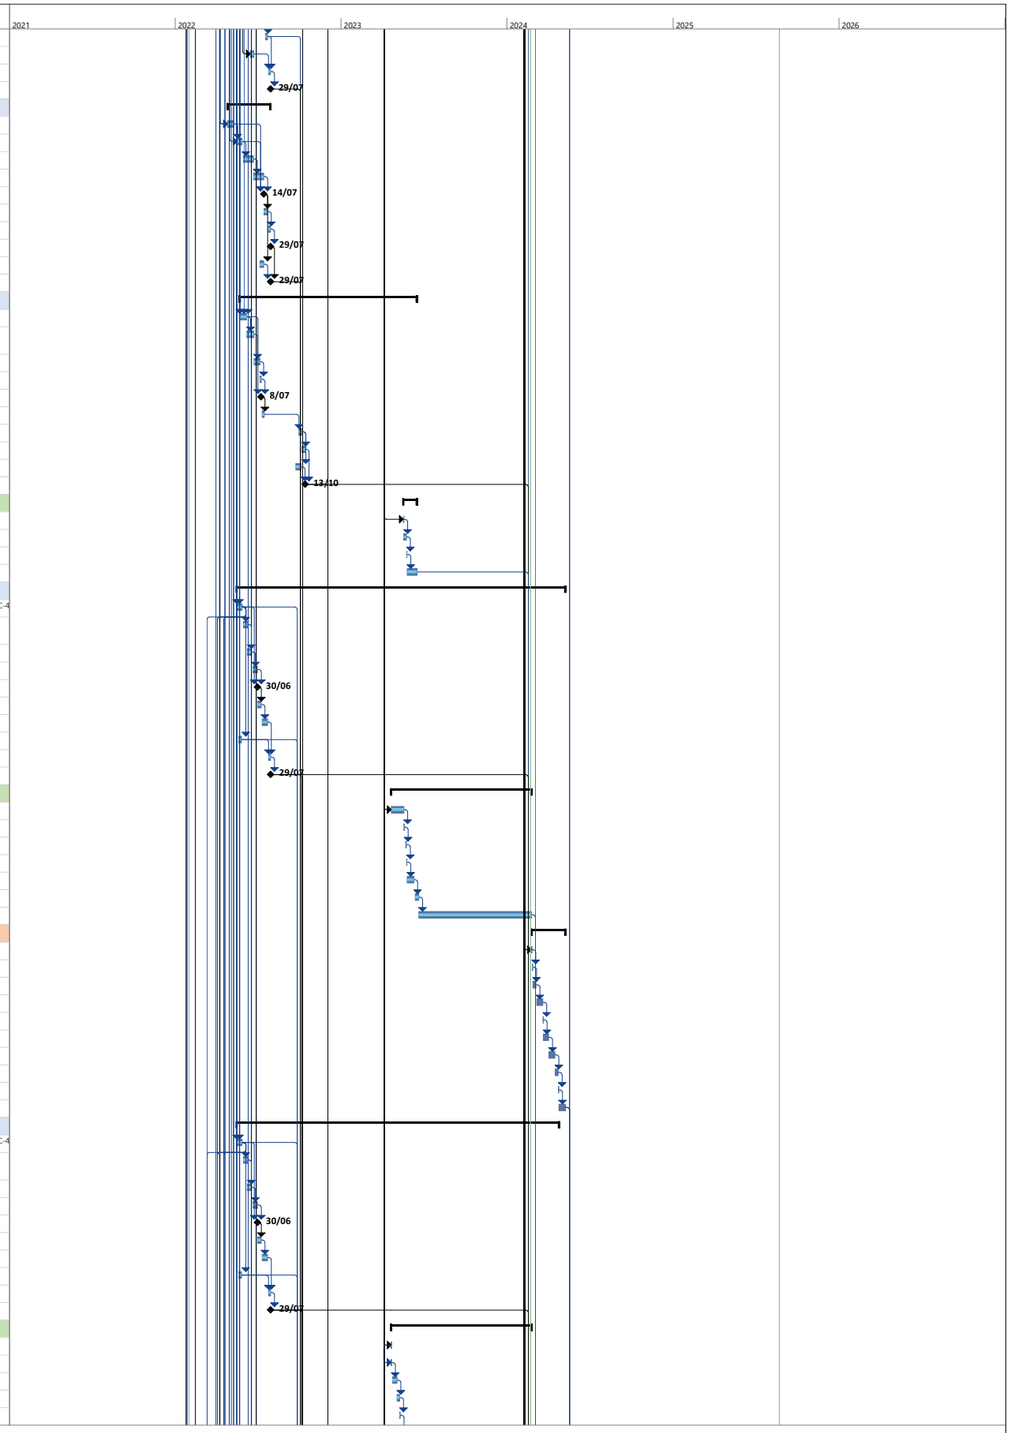

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
305		Revisión Interventoría	100%	100.0%	100%	6 días	jue 11/05/23	jue 18/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	304	306
306		Atención Observaciones	100%	100.0%	100%	6 días	vie 19/05/23	lun 29/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	305	307
307		Entrega a Interventoría	100%	100.0%	100%	1 día	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	306	308
308		Revisión y aprobación Interventoría	100%	100.0%	100%	14 días	mié 31/05/23	mié 21/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	307	309
309		Entrega a IDU	100%	100.0%	100%	1 día	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	308	310
310		Revision IDU	100%	100.0%	100%	40 días	vie 23/06/23	mié 23/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	309	311
311		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	16 días	jue 24/08/23	jue 14/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	310	312
312		Entrega de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 15/09/23	vie 15/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	311	313
313		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	312	314
314		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	47 días	vie 22/09/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	313	1039
315		**Prórroga geotecnia**	**0%**	**5.0%**	**0%**	**41 días**	**sáb 24/02/24**	**mié 24/04/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
316		Entrega a Interventoría	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	317
317		Revisión y aprobación de Interventoría	0%	18.0%	0%	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	316	318
318		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	lun 4/03/24	lun 4/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	317	319
319		Revisión IDU	0%	0.0%	0%	10 días	mar 5/03/24	lun 18/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	318	320
320		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	7 días	mar 19/03/24	lun 1/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	319	321
321		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mar 2/04/24	mar 2/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	320	322
322		Revion y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mié 3/04/24	mar 9/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	321	323
323		entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	322	324
324		Revision y aprobacion IDU	0%	0.0%	0%	10 días	jue 11/04/24	mié 24/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	323	1041;1040
325		**ESTUDIOS AMBIENTALES. FORESTAL Y SST**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**123 días**	**vie 8/04/22**	**vie 7/10/22**	**$ 50,019,484.00**	**$ 50,019,484.00**	**$ 50,019,484.00**	**$ 50,019,484.00**		
326		**Estudio ambiental**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**123 días**	**vie 8/04/22**	**vie 7/10/22**	**$ 18,234,273.00**	**$ 18,234,273.00**	**$ 18,234,273.00**	**$ 18,234,273.00**		
327		Area de influencia directa e indirecta	100%	100.0%	100%	12 días	vie 8/04/22	mié 27/04/22	$ 1,264,610.00	$ 1,264,610.00	$ 1,264,610.00	$ 1,264,610.00	120FC+5 días;115FC+5 días	328;331
328		Caracterizacion ambiental	100%	100.0%	100%	12 días	jue 28/04/22	vie 13/05/22	$ 2,589,888.00	$ 2,589,888.00	$ 2,589,888.00	$ 2,589,888.00	327	333;329
329		Evaluacion ambiental	100%	100.0%	100%	15 días	lun 16/05/22	lun 6/06/22	$ 3,589,888.00	$ 3,589,888.00	$ 3,589,888.00	$ 3,589,888.00	328	330
330		Elaboracion de informe y digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	15 días	mar 7/06/22	mié 29/06/22	$ 2,020,222.00	$ 2,020,222.00	$ 2,020,222.00	$ 2,020,222.00	329	333
331		Inventario forestal	100%	100.0%	100%	15 días	jue 28/04/22	mié 18/05/22	$ 1,264,610.00	$ 1,264,610.00	$ 1,264,610.00	$ 1,264,610.00	327	332
332		Elaboracion de informe y digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	14 días	jue 19/05/22	mié 8/06/22	$ 1,020,222.00	$ 1,020,222.00	$ 1,020,222.00	$ 1,020,222.00	331	334
333		Presupuesto	100%	100.0%	100%	6 días	jue 30/06/22	vie 8/07/22	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	328;330	334
334		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 8/07/22	vie 8/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	333;332	335;351FC+42 días
335		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	334	336
336		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	53 días	lun 18/07/22	vie 30/09/22	$ 5,484,833.00	$ 5,484,833.00	$ 5,484,833.00	$ 5,484,833.00	335	337
337		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	336	338
338		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 3/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	337	339
339		Entrega de estudio ambiental	100%	100.0%	100%	0 días	vie 7/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	338	
340		**Seguridad y salud en el trabajo para el contratista de obra**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**110 días**	**vie 29/04/22**	**vie 7/10/22**	**$ 22,929,220.00**	**$ 22,929,220.00**	**$ 22,929,220.00**	**$ 22,929,220.00**		
341		Elaboracion Seguridad y salud en el trabajo para el cont	100%	100.0%	100%	15 días	vie 29/04/22	jue 19/05/22	$ 1,464,610.00	$ 1,464,610.00	$ 1,464,610.00	$ 1,464,610.00	120FC+18 días;115FC+18 días	344;342
342		Programas de SST	100%	100.0%	100%	15 días	vie 20/05/22	vie 10/06/22	$ 4,585,844.00	$ 4,585,844.00	$ 4,585,844.00	$ 4,585,844.00	341	343
343		Elaboracion de informe	100%	100.0%	100%	15 días	lun 13/06/22	mié 6/07/22	$ 9,414,156.00	$ 9,414,156.00	$ 9,414,156.00	$ 9,414,156.00	342	344
344		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	341;343	345
345		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 13/07/22	mié 13/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	344	346
346		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	55 días	jue 14/07/22	vie 30/09/22	$ 7,464,610.00	$ 7,464,610.00	$ 7,464,610.00	$ 7,464,610.00	345	347
347		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	346	348
348		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 3/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	347	349
349		Aprobación interventoría	100%	100.0%	100%	0 días	vie 7/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	348	
350		**Documennto tecnico, listas de chequeo**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**19 días**	**vie 9/09/22**	**mié 5/10/22**	**$ 8,855,991.00**	**$ 8,855,991.00**	**$ 8,855,991.00**	**$ 8,855,991.00**		
351		Documento tecnico, listas de chequeo	100%	100.0%	100%	14 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22	$ 6,812,301.00	$ 6,812,301.00	$ 6,812,301.00	$ 6,812,301.00	334FC+42 días	352;355
352		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 28/09/22	mié 28/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	351	353
353		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	3 días	jue 29/09/22	lun 3/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	352	354
354		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	2 días	mar 4/10/22	mié 5/10/22	$ 2,043,690.00	$ 2,043,690.00	$ 2,043,690.00	$ 2,043,690.00	353	
355		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 28/09/22	mié 28/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	351	419;356
356		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 29/09/22	mié 5/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	355	357
357		Aprobación interventoría	100%	100.0%	100%	0 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	356	358
358		Documentos tramites y licenicas ante la Secretaria Dist	100%	100.0%	100%	0 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	357	799
359		**ESTUDIO GESTION SOCIAL**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**136 días**	**lun 16/05/22**	**vie 9/12/22**	**$ 122,231,669.00**	**$ 122,231,669.00**	**$ 122,231,669.00**	**$ 122,231,669.00**		
360		**Producto1**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**6 días**	**lun 16/05/22**	**lun 23/05/22**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**141;115FC-20 días**	**367;361**
361		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 23/05/22	lun 23/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	360	362
362		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 24/05/22	mar 31/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	361	363
363		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	mié 1/06/22	vie 3/06/22	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	362	364
364		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 3/06/22	vie 3/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	363	401;365
365		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 6/06/22	vie 10/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	364	366
366		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 10/06/22	vie 10/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	365	401
367		**Producto 2**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**7 días**	**mar 24/05/22**	**jue 2/06/22**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**360**	**374;368**
368		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 2/06/22	jue 2/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	367	369
369		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	368	370
370		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	369	371
371		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 14/06/22	mar 14/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	370	401;372
372		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 15/06/22	mié 22/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	371	373FC+104 días
373		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 21/11/22	lun 21/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	372FC+104 días	401
374		**Producto 3**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**7 días**	**vie 3/06/22**	**lun 13/06/22**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**367**	**381;388;375**
375		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 13/06/22	lun 13/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	374	376
376		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 14/06/22	mar 21/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	375	377
377		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	mié 22/06/22	vie 24/06/22	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	376	378
378		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 24/06/22	vie 24/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	377	401;379
379		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 28/06/22	mar 5/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	378	380FC+95 días
380		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 17/11/22	jue 17/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	379FC+95 días	401
381		**Producto 4**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**10 días**	**mar 14/06/22**	**mié 29/06/22**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**374**	**401;382**
382		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 29/06/22	mié 29/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	381	383
383		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 30/06/22	jue 7/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	382	384

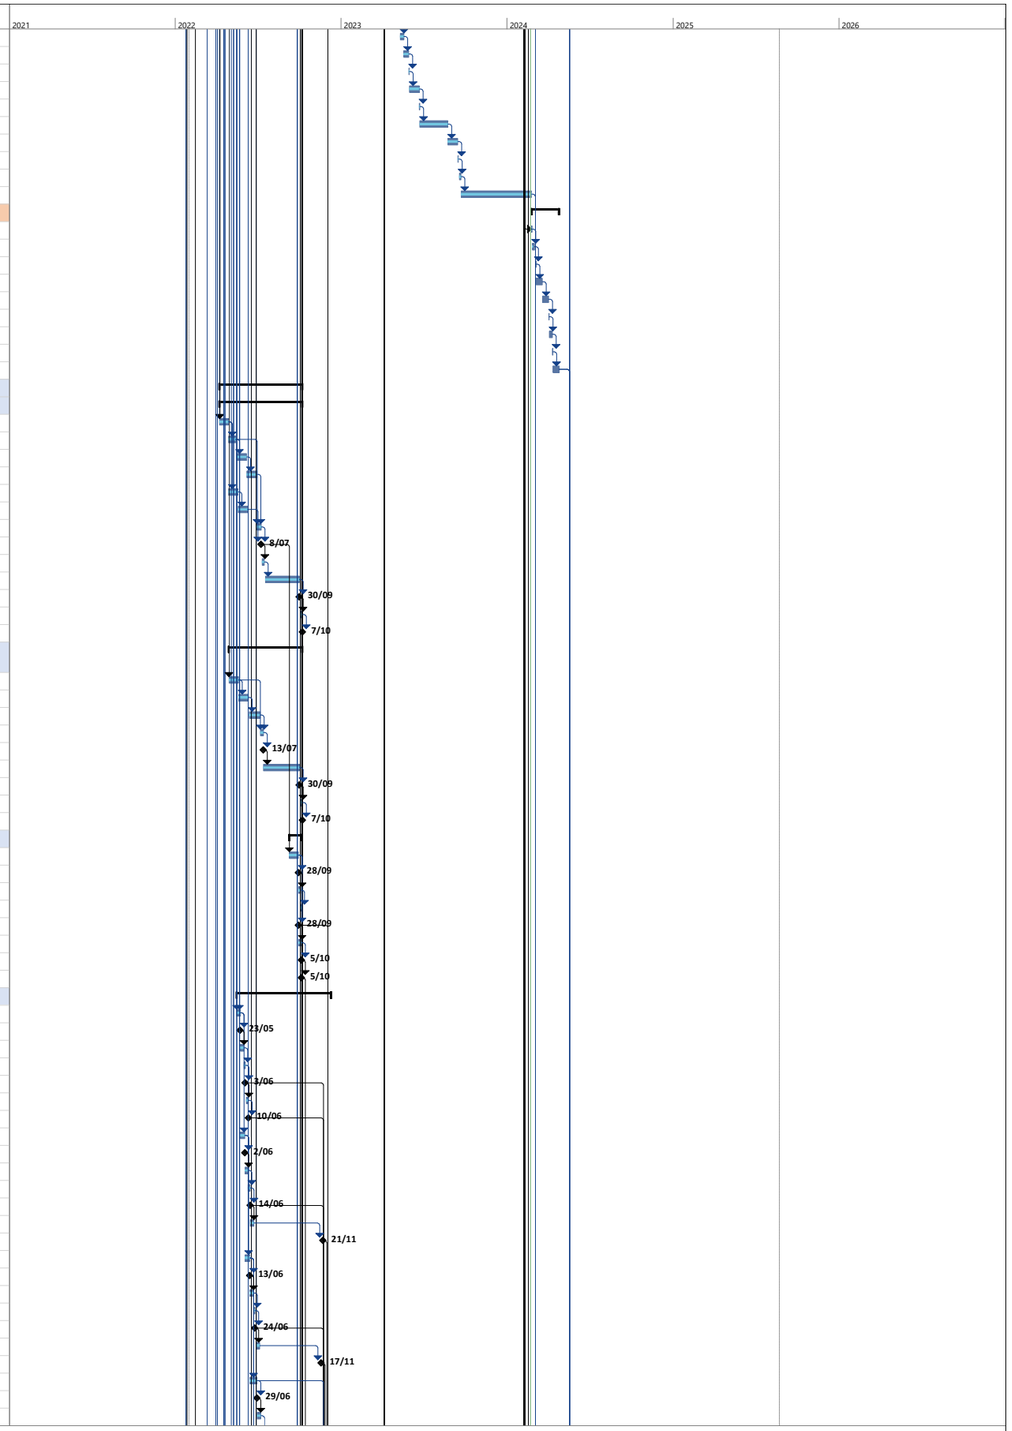

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
384		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	58 días	vie 8/07/22	jue 29/09/22	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	383	385
385		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 29/09/22	jue 29/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	384	401;386
386		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 30/09/22	jue 6/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	385	387
387		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 6/10/22	jue 6/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	386	401;755FC+1 día;684FC+1
388		**Producto 5**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**66 días**	**mar 14/06/22**	**mar 20/09/22**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**374**	**395;389**
389		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 20/09/22	mar 20/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	388	390
390		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 21/09/22	mar 27/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	389	391
391		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 28/09/22	mar 4/10/22	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	390	392
392		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	391	401;393
393		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	392	394
394		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 11/10/22	mar 11/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	393	401
395		**Producto 6**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**35 días**	**mié 21/09/22**	**mar 8/11/22**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**$ 17,688,514.00**	**388**	**396;546FC-45 días**
396		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	395	397
397		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 9/11/22	mar 15/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	396	398
398		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 16/11/22	mar 22/11/22	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	$ 1,323,167.00	397	399;400FC-7 días
399		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 22/11/22	mar 22/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	398	401
400		Prtesupuesto de obra	100%	100.0%	100%	5 días	lun 14/11/22	vie 18/11/22	$ 8,161,583.00	$ 8,161,583.00	$ 8,161,583.00	$ 8,161,583.00	398FC-7 días	546FC-40 días;401
401		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 23/11/22	vie 9/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	400;399;381;364;366;371;373	402
402		Entrega del estudio al IDU	100%	100.0%	100%	0 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	401	419
403		**DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**195 días**	**jue 17/02/22**	**vie 9/12/22**	**$ 145,930,246.00**	**$ 145,930,246.00**	**$ 145,930,246.00**	**$ 145,930,246.00**		
404		**Diseño Redes de Alcantarillado**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**195 días**	**jue 17/02/22**	**vie 9/12/22**	**$ 72,965,128.00**	**$ 72,965,128.00**	**$ 72,965,128.00**	**$ 72,965,128.00**		
405		Empalme diseños consultor JPS con EAAB	100%	100.0%	100%	0 días	jue 17/02/22	jue 17/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114FC-15 días	409;431;406FC+25 días
406		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	vie 25/03/22	lun 18/04/22	$ 2,188,953.00	$ 2,188,953.00	$ 2,188,953.00	$ 2,188,953.00	405FC+25 días	407FC+5 días
407		Ajuste/complementación estudios y diseños	100%	100.0%	100%	15 días	mar 26/04/22	lun 16/05/22	$ 8,377,907.00	$ 8,377,907.00	$ 8,377,907.00	$ 8,377,907.00	406FC+5 días	408FC+7 días;428FC-20 d
408		Digitalizacion planos	100%	100.0%	100%	15 días	jue 26/05/22	jue 16/06/22	$ 13,333,721.00	$ 13,333,721.00	$ 13,333,721.00	$ 13,333,721.00	407FC+7 días	409
409		Elaboracion de informe	100%	100.0%	100%	15 días	vie 17/06/22	mar 12/07/22	$ 19,726,745.00	$ 19,726,745.00	$ 19,726,745.00	$ 19,726,745.00	405;151FC-17 días;114FC-3 d	410;417FC-40 días;418FC-
410		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	409	411;415FC-15 días
411		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 13/07/22	mar 19/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	410	412
412		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	jue 21/07/22	lun 25/07/22	$ 7,296,515.00	$ 7,296,515.00	$ 7,296,515.00	$ 7,296,515.00	411	413
413		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 26/07/22	lun 1/08/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	412	414
414		Aprobación interventoría	100%	100.0%	100%	0 días	lun 1/08/22	lun 1/08/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	413	416
415		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	6 días	vie 17/06/22	mar 28/06/22	$ 7,296,513.00	$ 7,296,513.00	$ 7,296,513.00	$ 7,296,513.00	410FC-15 días	546FC-40 días;416FC+80 d
416		Entrega de diseños de redes de alcantarillado a la EAB	100%	100.0%	100%	0 días	vie 21/10/22	vie 21/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	414;415FC+80 días	419
417		Mesa de trabajo 1	100%	100.0%	100%	0 días	jue 12/05/22	jue 12/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	409FC-40 días	420
418		Mesa de trabajo 2	100%	100.0%	100%	0 días	vie 10/06/22	vie 10/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	409FC-20 días	420
419		Mesa de trabajo 3	100%	100.0%	100%	0 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	416;147;153;252;355;402	
420		Validacion de Diseños de SUDs	100%	100.0%	100%	15 días	mar 28/06/22	mar 19/07/22	$ 3,649,206.00	$ 3,649,206.00	$ 3,649,206.00	$ 3,649,206.00	409FC-10 días;417;418	422;421
421		Actualizacion de Diseños de SUDs	100%	100.0%	100%	8 días	jue 21/07/22	lun 1/08/22	$ 3,699,056.00	$ 3,699,056.00	$ 3,699,056.00	$ 3,699,056.00	420	
422		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 19/07/22	mar 19/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	420	423
423		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	422	424
424		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22	$ 7,396,512.00	$ 7,396,512.00	$ 7,396,512.00	$ 7,396,512.00	423	425FC+43 días
425		Aprobación interventoría	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	424FC+43 días	828
426		**Diseño Redes de Acueducto**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**153 días**	**jue 17/02/22**	**vie 30/09/22**	**$ 72,965,118.00**	**$ 72,965,118.00**	**$ 72,965,118.00**	**$ 72,965,118.00**		
427		Empalme diseños consultor JPS con EAAB	100%	100.0%	100%	0 días	jue 17/02/22	jue 17/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114FC-15 días	409;431;428
428		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	mar 19/04/22	lun 9/05/22	$ 5,107,558.00	$ 5,107,558.00	$ 5,107,558.00	$ 5,107,558.00	427;407FC-20 días	429
429		Ajuste/complementación estudios y diseños	100%	100.0%	100%	15 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	$ 10,107,558.00	$ 10,107,558.00	$ 10,107,558.00	$ 10,107,558.00	428	430
430		Digitalizacion planos	100%	100.0%	100%	15 días	mié 1/06/22	mié 22/06/22	$ 10,215,116.00	$ 10,215,116.00	$ 10,215,116.00	$ 10,215,116.00	429	431FC+2 días
431		Diseños de acueducto	100%	100.0%	100%	15 días	mar 28/06/22	mar 19/07/22	$ 25,645,350.00	$ 25,645,350.00	$ 25,645,350.00	$ 25,645,350.00	114FC-3 días;405;151FC-17 d	432;438FC-40 días;439FC-
432		Entrega diseños redes de alcantarillado	100%	100.0%	100%	0 días	mar 19/07/22	mar 19/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431	433;436FC-15 días
433		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	432	434
434		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22	$ 14,593,024.00	$ 14,593,024.00	$ 14,593,024.00	$ 14,593,024.00	433	435
435		Aprobación interventoría	100%	100.0%	100%	0 días	lun 1/08/22	lun 1/08/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	434	437FC+43 días
436		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	6 días	mar 28/06/22	mié 6/07/22	$ 7,296,512.00	$ 7,296,512.00	$ 7,296,512.00	$ 7,296,512.00	432FC-15 días	546FC-40 días
437		Entrega de diseños de redes de alcantarillado a la EAB	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	435FC+43 días	440;497;511
438		Mesa de trabajo 1	100%	100.0%	100%	0 días	jue 19/05/22	jue 19/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-40 días	828
439		Mesa de trabajo 2	100%	100.0%	100%	0 días	vie 17/06/22	vie 17/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-20 días	828
440		Mesa de trabajo 3	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	437	
441		**DISEÑO DE REDES ETB, CODENSA, GAS NATURAL Y OTROS OPERADORES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**185 días**	**vie 4/03/22**	**lun 12/12/22**	**$ 128,474,263.00**	**$ 128,474,263.00**	**$ 128,474,263.00**	**$ 128,474,263.00**		
442		**CODENSA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**142 días**	**vie 4/03/22**	**vie 30/09/22**	**$ 58,262,840.00**	**$ 58,262,840.00**	**$ 58,262,840.00**	**$ 58,262,840.00**		
443		**Diseños fotometricos UAESP APROBADO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**142 días**	**vie 4/03/22**	**vie 30/09/22**	**$ 10,181,668.00**	**$ 10,181,668.00**	**$ 10,181,668.00**	**$ 10,181,668.00**		
444		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	lun 28/03/22	mar 19/04/22	$ 1,386,251.00	$ 1,386,251.00	$ 1,386,251.00	$ 1,386,251.00	116FC+3 días;259FC-61 días;2	452FC-30 días;453FC-20 d
445		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existe	100%	100.0%	100%	15 días	mié 20/04/22	mar 10/05/22	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	444	446
446		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 10/05/22	mar 10/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	445	447
447		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 11/05/22	mar 17/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	446	448
448		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 18/05/22	mar 24/05/22	$ 2,795,417.00	$ 2,795,417.00	$ 2,795,417.00	$ 2,795,417.00	447	449
449		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 24/05/22	mar 24/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	448	450
450		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	449	451FC+82 días
451		Aprobacion de interventoria y radicacion UAESP	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	450FC+82 días	454
452		Mesa de trabajo 1	100%	100.0%	100%	0 días	vie 4/03/22	vie 4/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	444FC-30 días	
453		Mesa de trabajo 2	100%	100.0%	100%	0 días	vie 18/03/22	vie 18/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	444FC-20 días	
454		Mesa de trabajo 3	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	451	
455		**Diseños de redes CODENSA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**110 días**	**mié 20/04/22**	**mié 28/09/22**	**$ 48,081,172.00**	**$ 48,081,172.00**	**$ 48,081,172.00**	**$ 48,081,172.00**		
456		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	10 días	mié 20/04/22	mar 3/05/22	$ 3,354,500.00	$ 3,354,500.00	$ 3,354,500.00	$ 3,354,500.00	116;259FC-60 días;444;289FC	
457		Diseño redes eléctricas de alumbrado publico, baja t	100%	100.0%	100%	10 días	mié 20/04/22	mar 3/05/22	$ 13,265,023.00	$ 13,265,023.00	$ 13,265,023.00	$ 13,265,023.00	116;259FC-64 días;444;289FC	458;459FC+44 días
458		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	10 días	mié 4/05/22	mar 17/05/22	$ 6,734,977.00	$ 6,734,977.00	$ 6,734,977.00	$ 6,734,977.00	116;259FC-64 días;444FC-30 d	
459		Elaboracionde informe	100%	100.0%	100%	2 días	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$ 13,545,004.00	$ 13,545,004.00	$ 13,545,004.00	$ 13,545,004.00	457FC+44 días	460;467FC-40 días;468FC-
460		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	459	461;464FC-10 días
461		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mié 13/07/22	mar 19/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	460	462

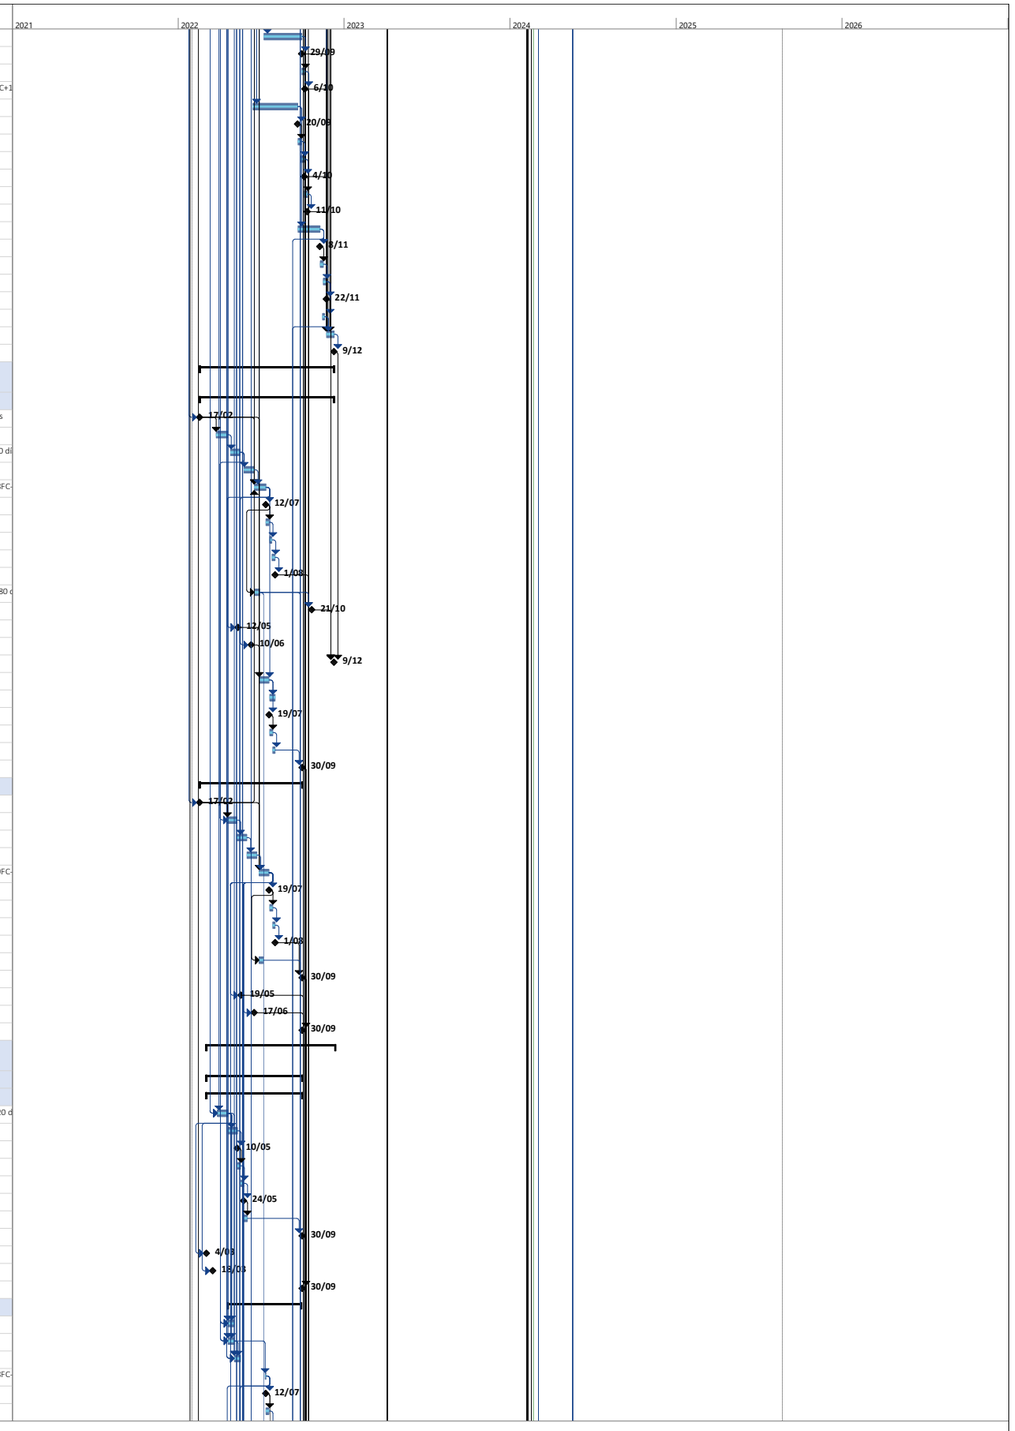

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
462		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	jue 21/07/22	lun 25/07/22	$ 5,590,834.00	$ 5,590,834.00	$ 5,590,834.00	$ 5,590,834.00	461	463
463		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 25/07/22	lun 25/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	462	465
464		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	5 días	mar 28/06/22	mar 5/07/22	$ 5,590,834.00	$ 5,590,834.00	$ 5,590,834.00	$ 5,590,834.00	460FC-10 días	546FC-40 días
465		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 26/07/22	lun 1/08/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	463	466FC+41 días
466		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 28/09/22	mié 28/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	465FC+41 días	469;909
467		Mesa de trabajo 1	100%	100.0%	100%	0 días	jue 12/05/22	jue 12/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	459FC-40 días	
468		Mesa de trabajo 2	100%	100.0%	100%	0 días	vie 10/06/22	vie 10/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	459FC-20 días	
469		Mesa de trabajo 3	100%	100.0%	100%	0 días	mié 28/09/22	mié 28/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	466	
470		**ETB**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**142 días**	**lun 9/05/22**	**lun 12/12/22**	**$ 39,888,255.00**	**$ 39,888,255.00**	**$ 39,888,255.00**	**$ 39,888,255.00**		
471		Validación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	lun 9/05/22	vie 27/05/22	$ 2,822,729.00	$ 2,822,729.00	$ 2,822,729.00	$ 2,822,729.00	141FC-5 días;115	472FC-7 días
472		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existente	100%	100.0%	100%	15 días	jue 19/05/22	jue 9/06/22	$ 15,700,000.00	$ 15,700,000.00	$ 15,700,000.00	$ 15,700,000.00	471FC-7 días	473
473		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	14 días	vie 10/06/22	vie 1/07/22	$ 18,522,729.00	$ 18,522,729.00	$ 18,522,729.00	$ 18,522,729.00	141FC+5 días;115;472	474FC+5 días;477FC-10 d
474		Entrega de diseño de ETB	100%	100.0%	100%	0 días	lun 11/07/22	lun 11/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	473FC+5 días	475
475		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	mar 12/07/22	lun 18/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	474	476;478
476		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	3 días	mar 19/07/22	vie 22/07/22	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	475	478
477		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	5 días	lun 3/10/22	vie 7/10/22	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	473FC-10 días;548	546FC-40 días;478
478		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 7/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	477;476;475	546FC-45 días;479
479		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 10/10/22	vie 14/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	478	480FC+33 días
480		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	lun 12/12/22	lun 12/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	479FC+33 días	979FC-56 días;483
481		Mesa de trabajo 1	100%	100.0%	100%	0 días	jue 19/05/22	jue 19/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-40 días	
482		Mesa de trabajo 2	100%	100.0%	100%	0 días	vie 17/06/22	vie 17/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-20 días	
483		Mesa de trabajo 3	100%	100.0%	100%	0 días	lun 12/12/22	lun 12/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	480	
484		**DISEÑO DE OTROS OPERADOS DE TELEFONIA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**122 días**	**lun 9/05/22**	**mié 2/11/22**	**$ 20,847,178.00**	**$ 20,847,178.00**	**$ 20,847,178.00**	**$ 20,847,178.00**		
485		Validación/ a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	lun 9/05/22	vie 27/05/22	$ 1,266,386.00	$ 1,266,386.00	$ 1,266,386.00	$ 1,266,386.00	141FC-5 días;115	491FC-10 días;546FC-45 d
486		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existente	100%	100.0%	100%	14 días	mar 31/05/22	vie 17/06/22	$ 6,463,800.00	$ 6,463,800.00	$ 6,463,800.00	$ 6,463,800.00	485	487
487		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	11 días	mar 21/06/22	jue 7/07/22	$ 5,536,200.00	$ 5,536,200.00	$ 5,536,200.00	$ 5,536,200.00	486	488
488		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 7/07/22	jue 7/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	487	489
489		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 8/07/22	jue 14/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	488	490
490		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22	$ 3,790,396.00	$ 3,790,396.00	$ 3,790,396.00	$ 3,790,396.00	489	492
491		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	5 días	lun 3/10/22	vie 7/10/22	$ 3,790,396.00	$ 3,790,396.00	$ 3,790,396.00	$ 3,790,396.00	485FC-10 días;548	546FC-40 días;492
492		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 7/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	490;491	546FC-45 días;493
493		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 10/10/22	vie 14/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	492	494FC+13 días
494		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mié 2/11/22	mié 2/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	493FC+13 días	997
495		Mesa de trabajo 1	100%	100.0%	100%	0 días	jue 19/05/22	jue 19/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-40 días	
496		Mesa de trabajo 2	100%	100.0%	100%	0 días	vie 17/06/22	vie 17/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-20 días	
497		Mesa de trabajo 3	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	437	
498		**GAS NATURAL**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**94 días**	**lun 16/05/22**	**vie 30/09/22**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**	**$ 9,475,990.00**		
499		Validación/ a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	lun 16/05/22	lun 6/06/22	$ 633,193.00	$ 633,193.00	$ 633,193.00	$ 633,193.00	141;115	505FC-10 días;546FC-45 d
500		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existente	100%	100.0%	100%	15 días	mar 7/06/22	mié 29/06/22	$ 3,562,930.00	$ 3,562,930.00	$ 3,562,930.00	$ 3,562,930.00	499	501
501		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	6 días	jue 30/06/22	vie 8/07/22	$ 2,437,070.00	$ 2,437,070.00	$ 2,437,070.00	$ 2,437,070.00	500	502
502		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 8/07/22	vie 8/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	501	503
503		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	502	504
504		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	4 días	lun 18/07/22	vie 22/07/22	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	$ 1,895,198.00	503	506
505		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	5 días	lun 23/05/22	vie 27/05/22	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	$ 947,599.00	499FC-10 días	546FC-40 días;506;548;54
506		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 22/07/22	vie 22/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	504;505	546FC-45 días;507
507		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 25/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	506	508FC+43 días
508		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 29/09/22	jue 29/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	507FC+43 días	1011
509		Mesa de trabajo 1	100%	100.0%	100%	0 días	jue 19/05/22	jue 19/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-40 días	
510		Mesa de trabajo 2	100%	100.0%	100%	0 días	vie 17/06/22	vie 17/06/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	431FC-20 días	
511		Mesa de trabajo 3	100%	100.0%	100%	0 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	437	
512		**ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**50 días**	**lun 16/05/22**	**vie 29/07/22**	**$ 15,161,588.00**	**$ 15,161,588.00**	**$ 15,161,588.00**	**$ 15,161,588.00**		
513		Validación/ a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	lun 16/05/22	lun 6/06/22	$ 2,613,108.00	$ 2,613,108.00	$ 2,613,108.00	$ 2,613,108.00	141;115	546FC-45 días;514
514		Ajuste/complementación a Estudios y Diseños Existentes	100%	100.0%	100%	15 días	mar 7/06/22	mié 29/06/22	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	513	515
515		Digitalizacion de planos	100%	100.0%	100%	10 días	jue 30/06/22	jue 14/07/22	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	514	516
516		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 14/07/22	jue 14/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	515	517
517		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	516	518
518		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 25/07/22	vie 29/07/22	$ 3,032,322.00	$ 3,032,322.00	$ 3,032,322.00	$ 3,032,322.00	517	519FC-15 días;520
519		Cantidades de obra	100%	100.0%	100%	6 días	vie 8/07/22	vie 15/07/22	$ 1,516,158.00	$ 1,516,158.00	$ 1,516,158.00	$ 1,516,158.00	518FC-15 días	546FC-40 días;520
520		Entrega de diseños estructurales al IDU	100%	100.0%	100%	0 días	vie 29/07/22	vie 29/07/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	518;519	
521		**ARQUEOLOGIA**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**71 días**	**mié 16/02/22**	**mar 31/05/22**	**$ 14,687,785.00**	**$ 14,687,785.00**	**$ 14,687,785.00**	**$ 14,687,785.00**		
522		**FASE 1.Inscripción y revision del Programa de Arqueología Preventiva ante el ICANH**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**13 días**	**mié 16/02/22**	**vie 4/03/22**	**$ 1,658,299.00**	**$ 1,658,299.00**	**$ 1,658,299.00**	**$ 1,658,299.00**	**120FC-31 días**	
523		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 16/02/22	mar 22/02/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		524
524		Ajustes a observaciones de interventoria	100%	100.0%	100%	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	$ 1,658,299.00	$ 1,658,299.00	$ 1,658,299.00	$ 1,658,299.00	523	525;528
525		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 28/02/22	vie 4/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	524	526
526		Aprobación de la solicitud de inscripción del PAP por pa	100%	100.0%	100%	0 días	vie 4/03/22	vie 4/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	525	527
527		Radicacion del IDU ante el ICANH	100%	100.0%	100%	0 días	vie 4/03/22	vie 4/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	526	544;529
528		**FASE 2. Investigación de archivo, revisión y compilación de antecedentes en arqueología, historia y etnohistoria / Elaboración del documento Diagnóstico Arqueológico**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**25 días**	**lun 28/02/22**	**lun 4/04/22**	**$ 5,660,488.00**	**$ 5,660,488.00**	**$ 5,660,488.00**	**$ 5,660,488.00**	**524**	
529		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 4/03/22	vie 4/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	527	
530		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 28/02/22	vie 4/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		531
531		Ajustes a observaciones de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 7/03/22	vie 11/03/22	$ 5,660,488.00	$ 5,660,488.00	$ 5,660,488.00	$ 5,660,488.00	530	532
532		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 11/03/22	vie 11/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	531	544;533
533		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	lun 14/03/22	vie 18/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	532	534
534		Aprobación del documento Diagnóstico Arqueológico y	100%	100.0%	100%	0 días	vie 18/03/22	vie 18/03/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	533	535FC+10 días
535		Radicacion del IDU ante el ICANH	100%	100.0%	100%	0 días	lun 4/04/22	lun 4/04/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	534FC+10 días	536
536		**FASE 3 Exploración arqueológica,**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**38 días**	**mar 5/04/22**	**mar 31/05/22**	**$ 7,368,998.00**	**$ 7,368,998.00**	**$ 7,368,998.00**	**$ 7,368,998.00**	**535**	

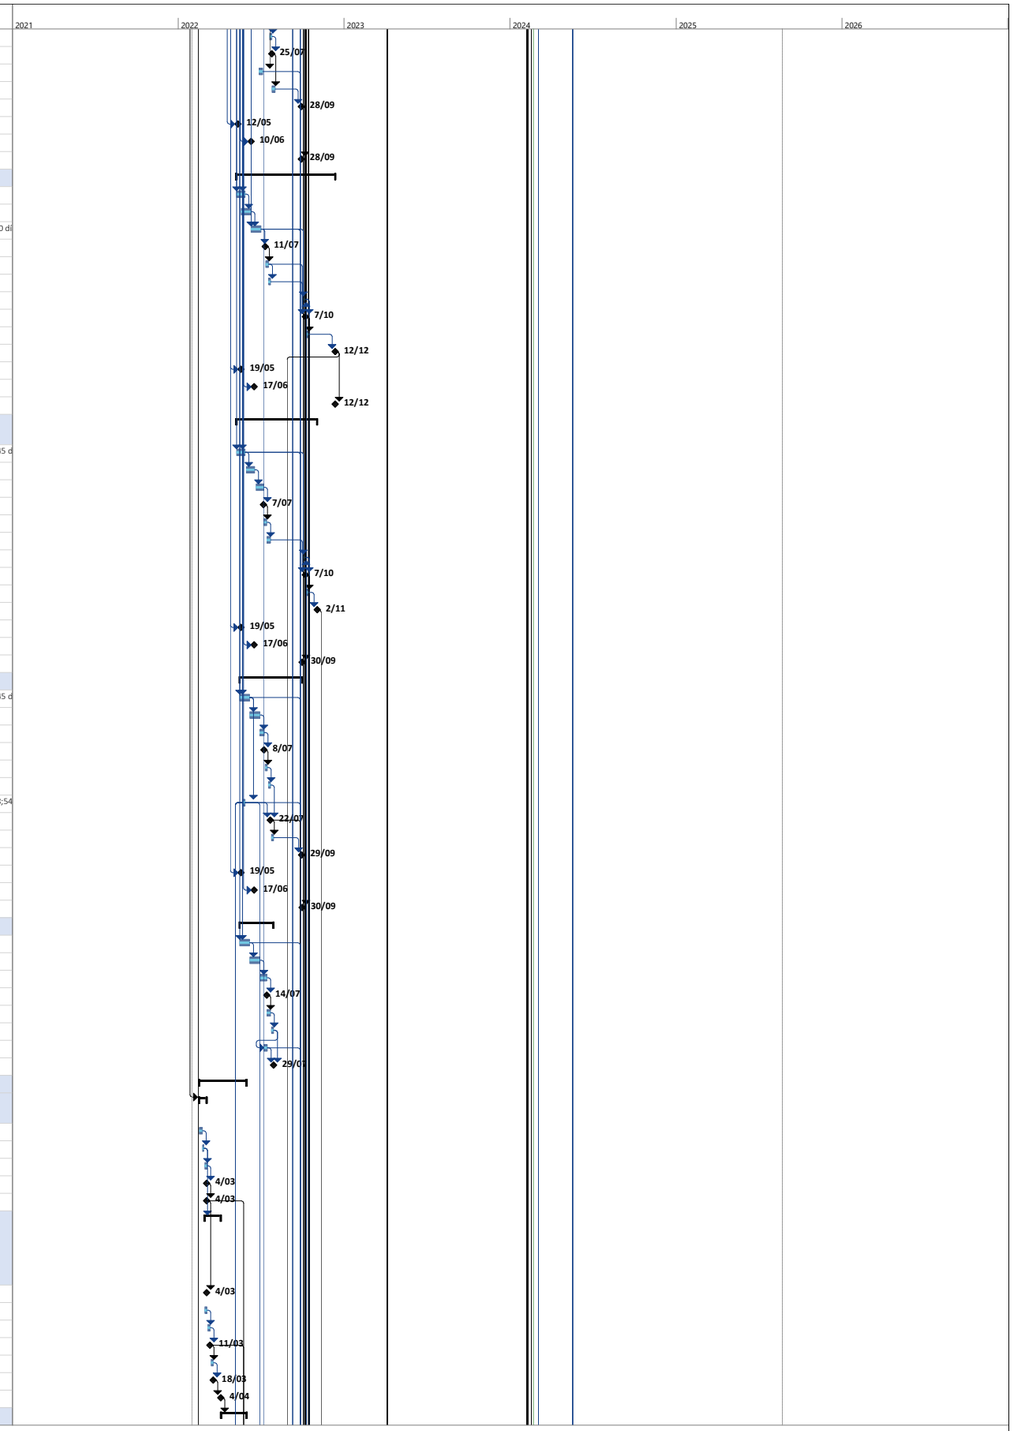

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
537		Elaboracion de Programa de arqueología preventiva	100%	100.0%	100%	9 días	mar 5/04/22	mar 19/04/22	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00		538
538		Elaboración del Informe Final	100%	100.0%	100%	15 días	mié 20/04/22	mar 10/05/22	$ 1,184,499.00	$ 1,184,499.00	$ 1,184,499.00	$ 1,184,499.00	537	539
539		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 10/05/22	mar 10/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	538	540
540		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 11/05/22	mar 17/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	539	541
541		Ajustes a observaciones de interventoria	100%	100.0%	100%	4 días	mié 18/05/22	lun 23/05/22	$ 1,184,499.00	$ 1,184,499.00	$ 1,184,499.00	$ 1,184,499.00	540	542
542		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mar 24/05/22	mar 31/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	541	543
543		Aprobación del de informe final como insumo para la fc	100%	100.0%	100%	0 días	mar 31/05/22	mar 31/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	542	544
544		Radicacion del IDU ante el ICANH	100%	100.0%	100%	0 días	mar 31/05/22	mar 31/05/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	543;527;532	980FC+5 días;998;1012
545		**CRONOGRAMA, PRESUPUESTO, DOCUM. CONTRATACION**	**98%**	**97.5%**	**98%**	**385 días**	**lun 23/05/22**	**vie 24/05/24**	**$ 49,522,802.50**	**$ 49,522,802.50**	**$ 48,300,599.01**	**$ 48,300,599.01**		
546		Elaboracion precios unitarios	100%	100.0%	100%	25 días	lun 26/09/22	vie 28/10/22	$ 1,819,390.00	$ 1,819,390.00	$ 1,819,390.00	$ 1,819,390.00	259FC-45 días;266FC-40 días;	553;547
547		Revision de cantidades de diseños	100%	100.0%	100%	5 días	lun 31/10/22	vie 4/11/22	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	546	
548		Elaboracion de presupuesto cantidades	100%	100.0%	100%	65 días	mié 29/06/22	vie 30/09/22	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	505;415	553;491;477
549		Elaboracion documento de contratación (anexo técnico separable y estudios y documentos previos)	100%	100.0%	100%	88 días	lun 23/05/22	jue 29/09/22	$ 1,819,390.00	$ 1,819,390.00	$ 1,819,390.00	$ 1,819,390.00	505CC	553
550		Elaboracion apéndice A - especificaciones particulares	100%	100.0%	100%	88 días	lun 23/05/22	jue 29/09/22	$ 10,819,390.00	$ 10,819,390.00	$ 10,819,390.00	$ 10,819,390.00	505CC	553
551		Elaboracion apéndice C - especificaciones de redes de servicios públicos	100%	100.0%	100%	88 días	lun 23/05/22	jue 29/09/22	$ 10,819,390.00	$ 10,819,390.00	$ 10,819,390.00	$ 10,819,390.00	505CC	553
552		Desarrollo cronograma	100%	100.0%	100%	88 días	lun 23/05/22	jue 29/09/22	$ 10,606,463.00	$ 10,606,463.00	$ 10,606,463.00	$ 10,606,463.00	505CC	553
553		Entrega cronograma, presupuesto, docum. Contratacion	100%	100.0%	100%	0 días	vie 28/10/22	vie 28/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	550;546;548;549;551;552	554
554		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 28/10/22	vie 28/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	553	555
555		Revisión interventoría	100%	100.0%	100%	5 días	lun 31/10/22	vie 4/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	554	1039
556		**Ajustes de consultoria**	**84%**	**84.0%**	**84%**	**210 días**	**vie 21/04/23**	**vie 24/05/24**	**$ 7,638,779.50**	**$ 7,638,779.50**	**$ 6,416,576.01**	**$ 6,416,576.01**		
557		**PRESUPUESTO**	**96%**	**95.9%**	**96%**	**210 días**	**vie 21/04/23**	**vie 24/05/24**	**$ 6,691,571.59**	**$ 6,691,571.59**	**$ 6,416,576.01**	**$ 6,416,576.01**		
558		**Recomposición**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**149 días**	**vie 21/04/23**	**vie 23/02/24**	**$ 6,416,576.01**	**$ 6,416,576.01**	**$ 6,416,576.01**	**$ 6,416,576.01**		
559		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	2 días	vie 21/04/23	lun 24/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC-1 día	560
560		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	16 días	mar 25/04/23	mié 17/05/23	$ 5,729,085.80	$ 5,729,085.80	$ 5,729,085.80	$ 5,729,085.80	559	561
561		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	560	562
562		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	3 días	vie 19/05/23	mié 24/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	561	563
563		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	7 días	jue 25/05/23	vie 2/06/23	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	562	564
564		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	563	565
565		Revision Interventoria	100%	100.0%	100%	6 días	mar 6/06/23	mié 14/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	564	566
566		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	565	567
567		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 16/06/23	vie 16/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	566	568
568		Revision Interventoria	100%	100.0%	100%	6 días	mar 20/06/23	mar 27/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	567	569
569		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	11 días	mié 28/06/23	jue 13/07/23	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	568	570
570		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	569	571
571		Revision Interventoria	100%	100.0%	100%	3 días	lun 17/07/23	mié 19/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	570	572
572		Ajustes e consultoría	100%	100.0%	100%	8 días	vie 21/07/23	mar 1/08/23	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	$ 137,498.04	571	573
573		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	572	574
574		Revision Interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	jue 3/08/23	jue 10/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	573	575
575		Ajustes e consultoría	100%	100.0%	100%	4 días	vie 11/08/23	mié 16/08/23	$ 137,498.05	$ 137,498.05	$ 137,498.05	$ 137,498.05	574	576
576		Entrega interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	575	577
577		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	6 días	vie 18/08/23	lun 28/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	576	578
578		Ajuste de consultoria	100%	100.0%	100%	65 días	mar 29/08/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	577	1039
579		**Prórroga presupuesto**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 274,995.58**	**$ 274,995.58**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
580		Mesa de trabajo	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	581FC+4 días
581		Avance entrega 1	0%	0.0%	0%	1 día	vie 1/03/24	vie 1/03/24	$ 39,285.00	$ 39,285.00	$ 0.00	$ 0.00	580FC+4 días	582
582		Revisión interventoria	0%	0.0%	0%	3 días	lun 4/03/24	mié 6/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	581	583
583		Avance entrega 2	0%	0.0%	0%	1 día	jue 7/03/24	jue 7/03/24	$ 39,285.00	$ 39,285.00	$ 0.00	$ 0.00	582	584
584		Revisión interventoria	0%	0.0%	0%	3 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	583	585
585		Avance entrega 3	0%	0.0%	0%	1 día	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 39,285.00	$ 39,285.00	$ 0.00	$ 0.00	584	586
586		Revisión interventoria	0%	0.0%	0%	3 días	jue 14/03/24	lun 18/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	585	587
587		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	3 días	mar 23/04/24	jue 25/04/24	$ 39,285.10	$ 39,285.10	$ 0.00	$ 0.00	854;870;886;902;586	588
588		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	vie 26/04/24	vie 26/04/24	$ 39,285.15	$ 39,285.15	$ 0.00	$ 0.00	587	589
589		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	3 días	lun 29/04/24	jue 2/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	588	590
590		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	vie 3/05/24	vie 3/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	589	591
591		Revision IDU	0%	0.0%	0%	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	590	592
592		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	3 días	jue 9/05/24	mar 14/05/24	$ 39,285.15	$ 39,285.15	$ 0.00	$ 0.00	591	593
593		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mié 15/05/24	mié 15/05/24	$ 39,285.18	$ 39,285.18	$ 0.00	$ 0.00	592	594
594		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	593	595
595		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	594	596
596		Revision y aprobación IDU	0%	0.0%	0%	3 días	mié 22/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	595	1041;1040
597		**CRONOGRAMA**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**29 días**	**vie 12/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 809,709.87**	**$ 809,709.87**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
598		**Prórroga cronograma**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**29 días**	**vie 12/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 809,709.87**	**$ 809,709.87**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
599		Entrega Interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	vie 12/04/24	vie 12/04/24	$ 161,941.97	$ 161,941.97	$ 0.00	$ 0.00	122CC+31 días	600
600		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	599	601
601		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	4 días	lun 22/04/24	jue 25/04/24	$ 161,941.97	$ 161,941.97	$ 0.00	$ 0.00	600	602
602		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	vie 26/04/24	vie 26/04/24	$ 161,941.97	$ 161,941.97	$ 0.00	$ 0.00	601	603
603		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	4 días	lun 29/04/24	vie 3/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	602	604
604		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	4 días	lun 6/05/24	jue 9/05/24	$ 161,941.98	$ 161,941.98	$ 0.00	$ 0.00	603	605
605		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	vie 10/05/24	vie 10/05/24	$ 161,941.98	$ 161,941.98	$ 0.00	$ 0.00	604	606
606		Revision y Aprobación de interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 14/05/24	lun 20/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	605	607
607		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	606	608
608		Revision y aprobación IDU	0%	0.0%	0%	3 días	mié 22/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	607	1041;1040
609		**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**31 días**	**vie 5/04/24**	**mar 21/05/24**	**$ 137,498.04**	**$ 137,498.04**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
610		**Prórroga especificaciones tecnicas**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**31 días**	**vie 5/04/24**	**mar 21/05/24**	**$ 137,498.04**	**$ 137,498.04**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
611		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	vie 5/04/24	vie 5/04/24	$ 45,832.68	$ 45,832.68	$ 0.00	$ 0.00	122CC+26 días	612

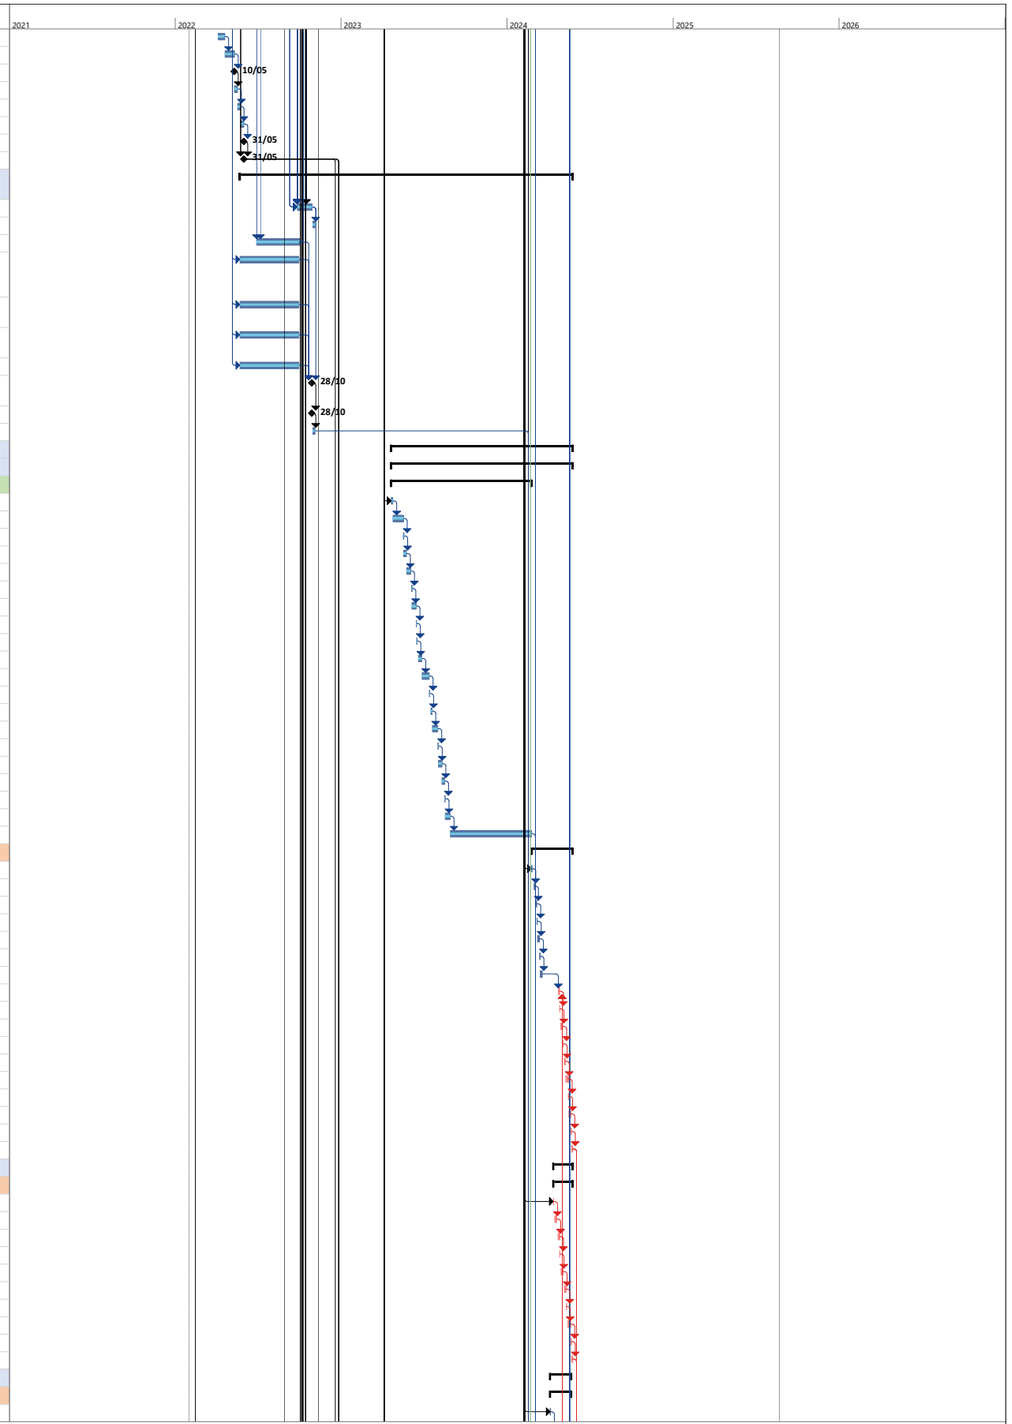

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea baseS	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
612		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	lun 8/04/24	vie 12/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	611	613
613		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	8 días	lun 15/04/24	mié 24/04/24	$ 45,832.68	$ 45,832.68	$ 0.00	$ 0.00	612	614
614		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 25/04/24	jue 25/04/24	$ 45,832.68	$ 45,832.68	$ 0.00	$ 0.00	613	615
615		Revision y aprobación interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	614	616
616		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	lun 6/05/24	lun 6/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	615	617
617		Revision IDU	0%	0.0%	0%	10 días	mar 7/05/24	mar 21/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	616	1040
618		**TRAMITES DE APROBACIONES Y PERMISOS**	**67%**	**71.5%**	**67%**	**462 días**	**lun 31/01/22**	**vie 24/05/24**	**$ 172,950,028.52**	**$ 172,950,028.52**	**$ 123,706,692.73**	$ 116,042,682.93		
619		**ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**296 días**	**lun 3/10/22**	**vie 24/05/24**	**$ 16,616,774.00**	$ 16,616,774.00	**$ 16,616,774.00**	$ 16,616,774.00		
620		Revision SDM	100%	100.0%	100%	10 días	lun 3/10/22	vie 14/10/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	227;241;220FC+1 día;230	621
621		Ajustes a observaciones de SDM	100%	100.0%	100%	25 días	lun 17/10/22	vie 18/11/22	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	620	622
622		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	vie 18/11/22	vie 18/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	621	623
623		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	17 días	lun 21/11/22	vie 23/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	622	624
624		Entrega de interventoria a SDM	100%	100.0%	100%	1 día	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	623	1039
625		**ESTUDIO DE TRANSITO**	**0%**	**68.0%**	**0%**	**186 días**	**lun 29/05/23**	**vie 24/05/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
626		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**125 días**	**lun 29/05/23**	**vie 23/02/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
627		Mesa de trabajo Interventoría	100%	100.0%	100%	1 día	lun 29/05/23	lun 29/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+23 días	628
628		Mesa de trabajo IDU	100%	100.0%	100%	1 día	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	627	629
629		Atención de observaciones	100%	100.0%	100%	51 días	mié 31/05/23	mié 16/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	628	630
630		Entrega de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	629	631
631		Revisión de interventoría	100%	100.0%	100%	6 días	vie 18/08/23	lun 28/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	630	632
632		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	65 días	mar 29/08/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	631	1039
633		**Prórroga estudio transito**	**0%**	**3.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
634		Mesa de trabajo	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	635
635		Atención de observaciones	0%	8.0%	0%	11 días	lun 26/02/24	lun 11/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	634	636
636		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	635	637
637		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	636	638
638		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	637	639
639		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 1/04/24	lun 1/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	638	640
640		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 2/04/24	lun 8/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	639	641
641		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 9/04/24	mar 9/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	640	642
642		Revisión IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 10/04/24	mar 16/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	641	643
643		Entrega SDM	0%	0.0%	0%	1 día	mié 17/04/24	mié 17/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	642	644
644		Revisión y aprobación SDM	0%	0.0%	0%	25 días	jue 18/04/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	643	1041;1040
645		**SEMAFORIZACION**	**0%**	**67.0%**	**0%**	**181 días**	**lun 5/06/23**	**vie 24/05/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
646		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**120 días**	**lun 5/06/23**	**vie 23/02/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
647		Mesa de trabajo SDM	100%	100.0%	100%	1 día	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+28 días	648
648		Atención observaciones	100%	100.0%	100%	47 días	mar 6/06/23	mié 16/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	647	649
649		Entrega de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	648	650
650		Revisión de interventoría	100%	100.0%	100%	6 días	vie 18/08/23	lun 28/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	649	651
651		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	65 días	mar 29/08/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	650	1039
652		**Prórroga semaforizacion**	**0%**	**3.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
653		Mesa de trabajo	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	654
654		Atención de observaciones	0%	8.0%	0%	11 días	lun 26/02/24	lun 11/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	653	655
655		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	654	656
656		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	655	657
657		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	656	658
658		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 1/04/24	lun 1/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	657	659
659		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 2/04/24	lun 8/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	658	660
660		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 9/04/24	mar 9/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	659	661
661		Revisión IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 10/04/24	mar 16/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	660	662
662		Entrega SDM	0%	0.0%	0%	1 día	mié 17/04/24	mié 17/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	661	663
663		Revisión y aprobación SDM	0%	0.0%	0%	25 días	jue 18/04/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	662	1041;1040
664		**SEÑALIZACION**	**0%**	**67.0%**	**0%**	**181 días**	**lun 5/06/23**	**vie 24/05/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
665		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**120 días**	**lun 5/06/23**	**vie 23/02/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
666		Mesa de trabajo SDM	100%	100.0%	100%	1 día	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+28 días	667
667		Atención de observaciones	100%	100.0%	100%	47 días	mar 6/06/23	mié 16/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	666	668
668		Entrega de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	667	669
669		Revisión de interventoría	100%	100.0%	100%	6 días	vie 18/08/23	lun 28/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668	670
670		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	65 días	mar 29/08/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	669	1039
671		**Prórroga señalizacion**	**0%**	**3.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00		
672		Mesa de trabajo	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	673
673		Atencion de observaciones	0%	8.0%	0%	11 días	lun 26/02/24	lun 11/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	672	674
674		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	673	675
675		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	674	676
676		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	675	677
677		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 1/04/24	lun 1/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	676	678
678		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 2/04/24	lun 8/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	677	679
679		Entrega a IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 9/04/24	mar 9/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	678	680
680		Revisión IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 10/04/24	mar 16/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	679	681
681		Entrega SDM	0%	0.0%	0%	1 día	mié 17/04/24	mié 17/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	680	682
682		Revisión y aprobación SDM	0%	0.0%	0%	25 días	jue 18/04/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	681	1041;1040
683		**ESTUDIOS SOCIALES**	**66%**	**67.1%**	**66%**	**291 días**	**lun 10/10/22**	**vie 24/05/24**	**$ 56,632,600.52**	**$ 56,632,600.52**	**$ 38,001,224.20**	$ 37,575,581.92		
684		Elaboracion de actas	100%	100.0%	100%	41 días	lun 10/10/22	jue 15/12/22	$ 2,316,058.12	$ 2,316,058.12	$ 2,316,058.12	$ 2,316,058.12	387FC+1 día	685
685		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	jue 15/12/22	jue 15/12/22	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	684	686
686		Revision de intervnetoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 16/12/22	jue 22/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	685	687
687		Ajustes de consultoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	686	688
688		Entrega de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	687	689
689		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mar 27/12/22	mar 27/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	688	690
690		Aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mié 28/12/22	mié 28/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	689	1039

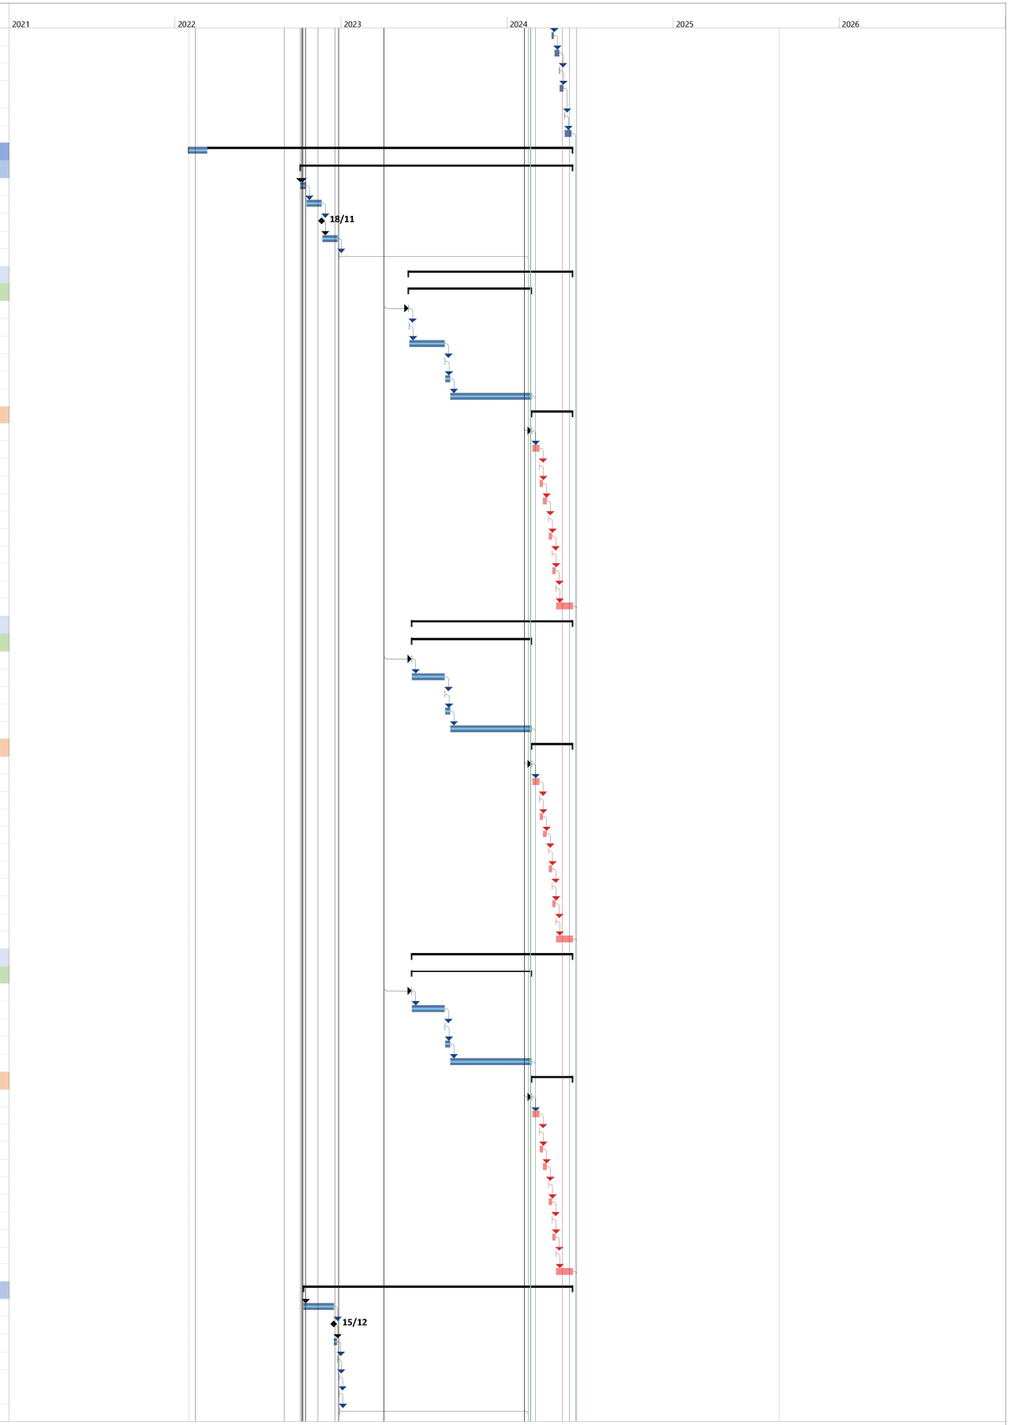

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea — Resumen — Hito inactivo — solo duración — solo el comienzo — Hito externo — División crítica
División — Resumen del proyecto — Resumen inactivo — Informe de resumen manual — solo fin — Fecha límite — Progreso
Hito — Tarea inactiva — Tarea manual — Resumen manual — Tareas externas — Tareas críticas — Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
691		**Recomposición**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**22 días**	**vie 21/04/23**	**mié 24/05/23**	**$ 13,896,349.20**	**$ 13,896,349.20**	**$ 13,896,349.20**	**$ 13,896,349.20**		
692		Atención de observaciones actas ejes 9, 11, 13 y 14	100%	100.0%	100%	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	121CC-1 día	693CC
693		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	692CC	694
694		Revision y aprobación de intervnetoria	100%	100.0%	100%	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	693	695
695		Atención de observaciones actas eje 9	100%	100.0%	100%	3 días	mar 25/04/23	jue 27/04/23	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	694	696
696		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	vie 28/04/23	vie 28/04/23	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	695	697
697		Revision y aprobación de intervnetoria	100%	100.0%	100%	1 día	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	696	698
698		Atención de observaciones actas ejes 9 y 11	100%	100.0%	100%	11 días	mié 3/05/23	mié 17/05/23	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	697	699
699		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	3 días	jue 18/05/23	mar 23/05/23	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	$ 2,316,058.20	698	700
700		Revision y aprobación de intervnetoria	100%	100.0%	100%	1 día	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	699	1039
701		**Prórroga actas de vecindad**	**0%**	**2.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 17,472,018.04**	**$ 17,472,018.04**	**$ 349,440.36**	**$ 0.00**		
702		Entrega hojas de vida	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 349,440.36	$ 349,440.36	$ 349,440.36	$ 0.00	122CC-1 día	703
703		Revision y aprobacion hojas de vida	0%	29.0%	0%	3 días	lun 26/02/24	mié 28/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	702	704
704		Entrega documentos de ingreso interventoria	0%	0.0%	0%	7 días	jue 29/02/24	vie 8/03/24	$ 349,440.36	$ 349,440.36	$ 0.00	$ 0.00	703	705
705		Aprobacion documentos de ingreso	0%	0.0%	0%	3 días	lun 11/03/24	mié 13/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	704	706
706		Levantamiento inventario predial	0%	0.0%	0%	1 día	jue 14/03/24	jue 14/03/24	$ 349,440.36	$ 349,440.36	$ 0.00	$ 0.00	705	707
707		Actualizacion de metodologia	0%	0.0%	0%	2 días	vie 15/03/24	lun 18/03/24	$ 349,440.36	$ 349,440.36	$ 0.00	$ 0.00	706	708
708		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mar 19/03/24	mar 19/03/24	$ 349,440.36	$ 349,440.36	$ 0.00	$ 0.00	707	709
709		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	708	711;733;722;744;1040
710		**EJE 14**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**38 días**	**lun 1/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 2,246,402.32**	**$ 2,246,402.32**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
711		Elaboracion y aprobacion volante 1er - 2da - 3er entrega	0%	0.0%	0%	3 días	lun 1/04/24	mié 3/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	709	712
712		Entrega volante 1era visita	0%	0.0%	0%	3 días	jue 4/04/24	lun 8/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	711	713
713		Levantamiento y sistematizacion de actas de vecindad	0%	0.0%	0%	12 días	mar 9/04/24	mié 24/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	712	714
714		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 25/04/24	jue 25/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	713	715
715		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	714	716
716		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	715	717
717		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 9/05/24	jue 9/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	716	718
718		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 10/05/24	vie 17/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	717	719
719		Entrega copia propietarios	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	718	720CC
720		Cargue actas plataforma bachue	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	719CC	1040
721		**EJE 11**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**38 días**	**lun 1/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 2,246,402.32**	**$ 2,246,402.32**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
722		Elaboracion y aprobacion volante 1er - 2da - 3er entrega	0%	0.0%	0%	3 días	lun 1/04/24	mié 3/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	709	723
723		Entrega volante 1era visita	0%	0.0%	0%	3 días	jue 4/04/24	lun 8/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	722	724
724		Levantamiento y sistematizacion de actas de vecindad	0%	0.0%	0%	12 días	mar 9/04/24	mié 24/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	723	725
725		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 25/04/24	jue 25/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	724	726
726		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	725	727
727		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	726	728
728		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 9/05/24	jue 9/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	727	729
729		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 10/05/24	vie 17/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	728	730
730		Entrega copia propietarios	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	729	731CC
731		Cargue actas plataforma bachue	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	730CC	1040
732		**EJE 10**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**38 días**	**lun 1/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 2,246,402.32**	**$ 2,246,402.32**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
733		Elaboracion y aprobacion volante 1er - 2da - 3er entrega	0%	0.0%	0%	3 días	lun 1/04/24	mié 3/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	709	734
734		Entrega volante 1era visita	0%	0.0%	0%	3 días	jue 4/04/24	lun 8/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	733	735
735		Levantamiento y sistematizacion de actas de vecindad	0%	0.0%	0%	12 días	mar 9/04/24	mié 24/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	734	736
736		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 25/04/24	jue 25/04/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	735	737
737		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	736	738
738		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	737	739
739		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 9/05/24	jue 9/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	738	740
740		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 10/05/24	vie 17/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	739	741
741		Entrega copia propietarios	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	740	742CC
742		Cargue actas plataforma bachue	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 280,800.29	$ 280,800.29	$ 0.00	$ 0.00	741CC	1040
743		**EJE 7-13-12-6**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**38 días**	**lun 1/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 8,985,609.28**	**$ 8,985,609.28**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
744		Elaboracion y aprobacion volante 1er - 2da - 3er entrega	0%	0.0%	0%	3 días	lun 1/04/24	mié 3/04/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	709	745
745		Entrega volante 1era visita	0%	0.0%	0%	3 días	jue 4/04/24	lun 8/04/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	744	746
746		Levantamiento y sistematizacion de actas de vecindad	0%	0.0%	0%	12 días	mar 9/04/24	mié 24/04/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	745	747
747		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 25/04/24	jue 25/04/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	746	748
748		Revision interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	747	749
749		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	748	750
750		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 9/05/24	jue 9/05/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	749	751
751		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	vie 10/05/24	vie 17/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	750	752
752		Entrega copia propietarios	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	751	753CC
753		Cargue actas plataforma bachue	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 1,123,201.16	$ 1,123,201.16	$ 0.00	$ 0.00	752CC	1040
754		**PRODUCTO 1 y 7 PDC Y CONSOLIDADO SOCIAL**	**90%**	**90.6%**	**90%**	**291 días**	**lun 10/10/22**	**vie 24/05/24**	**$ 16,000,000.56**	**$ 16,000,000.56**	**$ 14,491,201.93**	**$ 14,415,000.00**		
755		Consolidado social	100%	100.0%	100%	41 días	lun 10/10/22	jue 15/12/22	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	387FC+1 día	756
756		Entrega de consolidado	100%	100.0%	100%	0 días	jue 15/12/22	jue 15/12/22	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	755	757
757		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 16/12/22	jue 22/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	756	758
758		Atención de observaciones	100%	100.0%	100%	7 días	vie 23/12/22	lun 2/01/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	757	759
759		Entrega de consolidado	100%	100.0%	100%	0 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	758	760
760		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 13/01/23	jue 19/01/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	759	1039
761		**Recomposición**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**68 días**	**jue 27/04/23**	**mié 9/08/23**	**$ 10,571,000.00**	**$ 10,571,000.00**	**$ 10,571,000.00**	**$ 10,571,000.00**		
762		**PRODUCTO 1**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**62 días**	**lun 8/05/23**	**mié 9/08/23**	**$ 6,727,000.00**	**$ 6,727,000.00**	**$ 6,727,000.00**	**$ 6,727,000.00**		
763		Atencion del punto IDU	100%	100.0%	100%	60 días	lun 8/05/23	vie 4/08/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	121CC+9 días	764CC

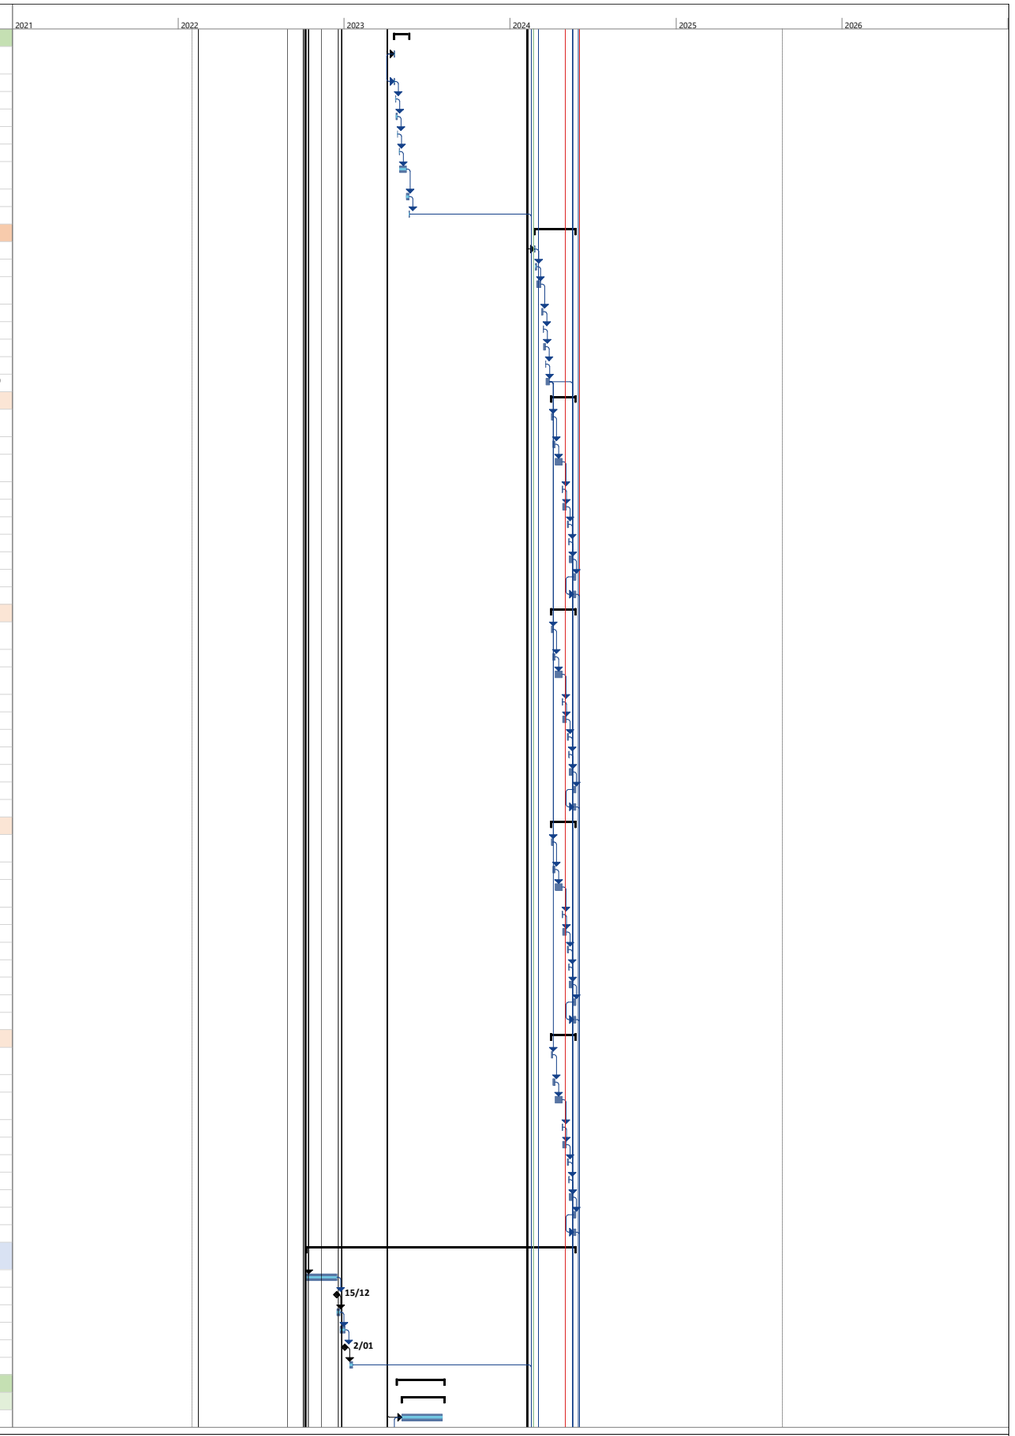

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
764		Atencion de PQRSD	100%	100.0%	100%	60 días	lun 8/05/23	vie 4/08/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	763CC	765;767CC
765		Recoridos Urbanos	100%	100.0%	100%	1 día	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	764	766CC
766		Reuniones extraordinarias	100%	100.0%	100%	1 día	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	765CC	
767		Actualizacion PSI	100%	100.0%	100%	60 días	lun 8/05/23	vie 4/08/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	764CC	768
768		Entrega de informes mensuales	100%	100.0%	100%	1 día	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	767	769
769		Entrega de informes semanales	100%	100.0%	100%	1 día	mié 9/08/23	mié 9/08/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	768	1039
770		**PRODUCTO 7**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**56 días**	**jue 27/04/23**	**vie 21/07/23**	**$ 3,844,000.00**	**$ 3,844,000.00**	**$ 3,844,000.00**	**$ 3,844,000.00**		
771		Actualizacion corte febrero	100%	100.0%	100%	1 día	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	121CC+3 días	772FC+3 días
772		Actualizacion corte abril	100%	100.0%	100%	1 día	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	771FC+3 días	773FC+24 días
773		Actualizacion corte mayo	100%	100.0%	100%	1 día	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	772FC+24 días	774FC+25 días
774		Actualizacion corte junio	100%	100.0%	100%	1 día	vie 21/07/23	vie 21/07/23	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	$ 961,000.00	773FC+25 días	1039
775		**Prórroga producto**	**0%**	**4.8%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 1,585,000.56**	**$ 1,585,000.56**	**$ 76,201.93**	**$ 0.00**		
776		**PRODUCTO 1**	**0%**	**8.9%**	**0%**	**59 días**	**sáb 24/02/24**	**mié 22/05/24**	**$ 853,461.56**	**$ 853,461.56**	**$ 76,201.93**	**$ 0.00**		
777		Actualiza y entregar a interventoria diseños aficheS plegables y volantes inicio de obra actualizado	0%	62.5%	0%	3 días	sáb 24/02/24	mar 27/02/24	$ 121,923.08	$ 121,923.08	$ 76,201.93	$ 0.00	122CC-1 día	778
778		Revisión y aprobación de interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	mié 28/02/24	mar 5/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	777	779FC+33 días;780
779		Entrega plegables actualizados.	0%	0.0%	0%	18 días	jue 25/04/24	mié 22/05/24	$ 121,923.08	$ 121,923.08	$ 0.00	$ 0.00	778FC+33 días	
780		Actualización diseños de valla fija y vallas moviles	0%	0.0%	0%	15 días	mié 6/03/24	mié 27/03/24	$ 121,923.08	$ 121,923.08	$ 0.00	$ 0.00	778	781
781		Revisión y aprobación de interventoría de diseño vallas	0%	0.0%	0%	5 días	lun 1/04/24	vie 5/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	780	782
782		Aprobación IDU diseño vallas	0%	0.0%	0%	10 días	lun 8/04/24	vie 19/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	781	783
783		Elaboración volantes de convocatoría renion de finalización de etapa EYD e inicio de obra.	0%	0.0%	0%	3 días	lun 22/04/24	mié 24/04/24	$ 121,923.08	$ 121,923.08	$ 0.00	$ 0.00	782	784
784		Aprobación diseño por interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	jue 25/04/24	jue 2/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	783	785
785		Entrega de volantes de convocatoria, reuniones y afiches de finalizacion de etapa de estudios y diseño y comienzo de obra y volantes de inicio de obra	0%	0.0%	0%	1 día	vie 3/05/24	vie 3/05/24	$ 121,923.08	$ 121,923.08	$ 0.00	$ 0.00	784	786FC+6 días
786		Reunión de finalización e inicio (2)	0%	0.0%	0%	1 día	mié 15/05/24	mié 15/05/24	$ 121,923.08	$ 121,923.08	$ 0.00	$ 0.00	785FC+6 días	787;795
787		Instalación de valla fija y vallas moviles	0%	0.0%	0%	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$ 121,923.08	$ 121,923.08	$ 0.00	$ 0.00	786	1040
788		**PRODUCTO 7**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**55 días**	**lun 4/03/24**	**vie 24/05/24**	**$ 731,539.00**	**$ 731,539.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
789		Actualizacion corte Julio agosto y septiembre	0%	0.0%	0%	1 día	lun 4/03/24	lun 4/03/24	$ 104,505.00	$ 104,505.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC+5 días	790
790		Actualizacion corte diciembre	0%	0.0%	0%	8 días	mar 5/03/24	jue 14/03/24	$ 104,505.00	$ 104,505.00	$ 0.00	$ 0.00	789	791CC+1 día
791		Actualizacion corte enero 2024	0%	0.0%	0%	5 días	mié 6/03/24	mar 12/03/24	$ 104,505.00	$ 104,505.00	$ 0.00	$ 0.00	790CC+1 día	792CC+2 días
792		Actualizacion corte febrero 2024	0%	0.0%	0%	5 días	vie 8/03/24	jue 14/03/24	$ 104,505.00	$ 104,505.00	$ 0.00	$ 0.00	791CC+2 días	793FC+7 días
793		Actualizacion corte marzo 2024	0%	0.0%	0%	5 días	mié 27/03/24	jue 4/04/24	$ 104,505.00	$ 104,505.00	$ 0.00	$ 0.00	792FC+7 días	794FC+12 días;795
794		Entrega a interventoria corte abril	0%	0.0%	0%	5 días	mar 23/04/24	lun 29/04/24	$ 104,505.00	$ 104,505.00	$ 0.00	$ 0.00	793FC+12 días	796
795		Entrega a interventoria corte mayo	0%	0.0%	0%	5 días	jue 16/05/24	mié 22/05/24	$ 104,509.00	$ 104,509.00	$ 0.00	$ 0.00	793;786	796
796		Revision y aprobación de interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 23/05/24	jue 23/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	794;795	797
797		Entrega y aprobación del IDU	0%	0.0%	0%	1 día	vie 24/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	796	1043;1040
798		**ESTUDIOS AMBIENTALES Y SST**	**72%**	**72.2%**	**72%**	**271 días**	**jue 6/10/22**	**lun 22/04/24**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 12,000,000.00**	**$ 12,000,000.00**		
799		Revision SDA	100%	100.0%	100%	32 días	jue 6/10/22	vie 18/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	268;298;358	800FC+5 días
800		Ajustes a observaciones de SDA	100%	100.0%	100%	32 días	lun 28/11/22	mié 1/02/23	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	799FC+5 días	1039
801		**FAUNA**	**70%**	**69.8%**	**70%**	**169 días**	**vie 19/05/23**	**lun 22/04/24**	**$ 15,283,440.67**	**$ 15,283,440.67**	**$ 10,666,666.67**	**$ 10,666,666.67**		
802		**Recomposición**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**130 días**	**vie 19/05/23**	**vie 23/02/24**	**$ 10,666,666.67**	**$ 10,666,666.67**	**$ 10,666,666.67**	**$ 10,666,666.67**		
803		Atención de observaciones	100%	100.0%	100%	1 día	vie 19/05/23	vie 19/05/23	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	121CC+18 días	804CC
804		Entrega a Interventoría	100%	100.0%	100%	1 día	vie 19/05/23	vie 19/05/23	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	803CC	805
805		Revisión Interventoría	100%	100.0%	100%	4 días	mar 23/05/23	vie 26/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	804	806
806		Atención observaciones	100%	100.0%	100%	1 día	lun 29/05/23	lun 29/05/23	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	$ 1,333,333.34	805	807
807		Entrega a Interventoría	100%	100.0%	100%	1 día	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	806	808
808		Revisión y aprobación Interventoría	100%	100.0%	100%	7 días	mié 31/05/23	jue 8/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	807	809
809		Entrega a IDU	100%	100.0%	100%	1 día	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	808	810
810		Revisión IDU	100%	100.0%	100%	24 días	mar 13/06/23	mar 18/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	809	811
811		Atención observaciones	100%	100.0%	100%	19 días	mié 19/07/23	mié 16/08/23	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	810	812
812		Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	811	813
813		Revision interventoria	100%	100.0%	100%	11 días	vie 18/08/23	lun 4/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	812	814
814		Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	11 días	mar 5/09/23	mar 19/09/23	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	813	815
815		Entrega de interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	814	816
816		Revision de aprobacion de interventoria	100%	100.0%	100%	7 días	jue 21/09/23	mar 26/12/23	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	$ 1,333,333.33	815	817
817		Entrega IDU	100%	100.0%	100%	1 día	mié 27/12/23	mié 27/12/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	816	818
818		Revisión IDU	100%	100.0%	100%	40 días	jue 28/12/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	817	1039
819		**Prórroga fauna**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**39 días**	**sáb 24/02/24**	**lun 22/04/24**	**$ 4,616,774.00**	**$ 4,616,774.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
820		Concepto recibido IDU	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	821
821		Revision SDA	0%	9.0%	0%	10 días	lun 26/02/24	vie 8/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	820	822
822		Ajustes consultoria	0%	0.0%	0%	20 días	lun 11/03/24	mié 10/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	821	823
823		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24	$ 2,308,387.00	$ 2,308,387.00	$ 0.00	$ 0.00	822	824
824		Revision interventoria y aprobacion	0%	0.0%	0%	5 días	vie 12/04/24	jue 18/04/24	$ 2,308,387.00	$ 2,308,387.00	$ 0.00	$ 0.00	823	825
825		Entrega SDA	0%	0.0%	0%	1 día	vie 19/04/24	vie 19/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	824	826
826		Aprobacion SDA	0%	0.0%	0%	1 día	lun 22/04/24	lun 22/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	825	1040
827		**DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO**	**0%**	**33.3%**	**0%**	**296 días**	**lun 3/10/22**	**vie 24/05/24**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 5,538,924.72**	**$ 0.00**		
828		Revision DISEÑOS EAAB	0%	100.0%	0%	37 días	lun 3/10/22	mar 22/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	438;439;425	829FC+5 días
829		Ajustes a observaciones de EAAB	0%	100.0%	0%	69 días	lun 12/12/22	lun 29/05/23	$ 692,365.66	$ 692,365.66	$ 692,365.66	$ 0.00	828FC+5 días	830
830		Entrega a interventoria	0%	100.0%	0%	0 días	lun 29/05/23	lun 29/05/23	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	829	831
831		Revision de interventoria	0%	100.0%	0%	5 días	mar 30/05/23	lun 5/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	830	1039
832		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**136 días**	**jue 11/05/23**	**vie 23/02/24**	**$ 1,384,731.16**	**$ 1,384,731.16**	**$ 1,384,731.16**	**$ 0.00**		
833		Mesas de trabajo ente IDU y EAAB Interferencia de Contratos	0%	100.0%	0%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+12 días	834
834		Mesas de trabajo ente IDU y EAAB Interferencia de Contratos	0%	100.0%	0%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	833	835FC+3 días

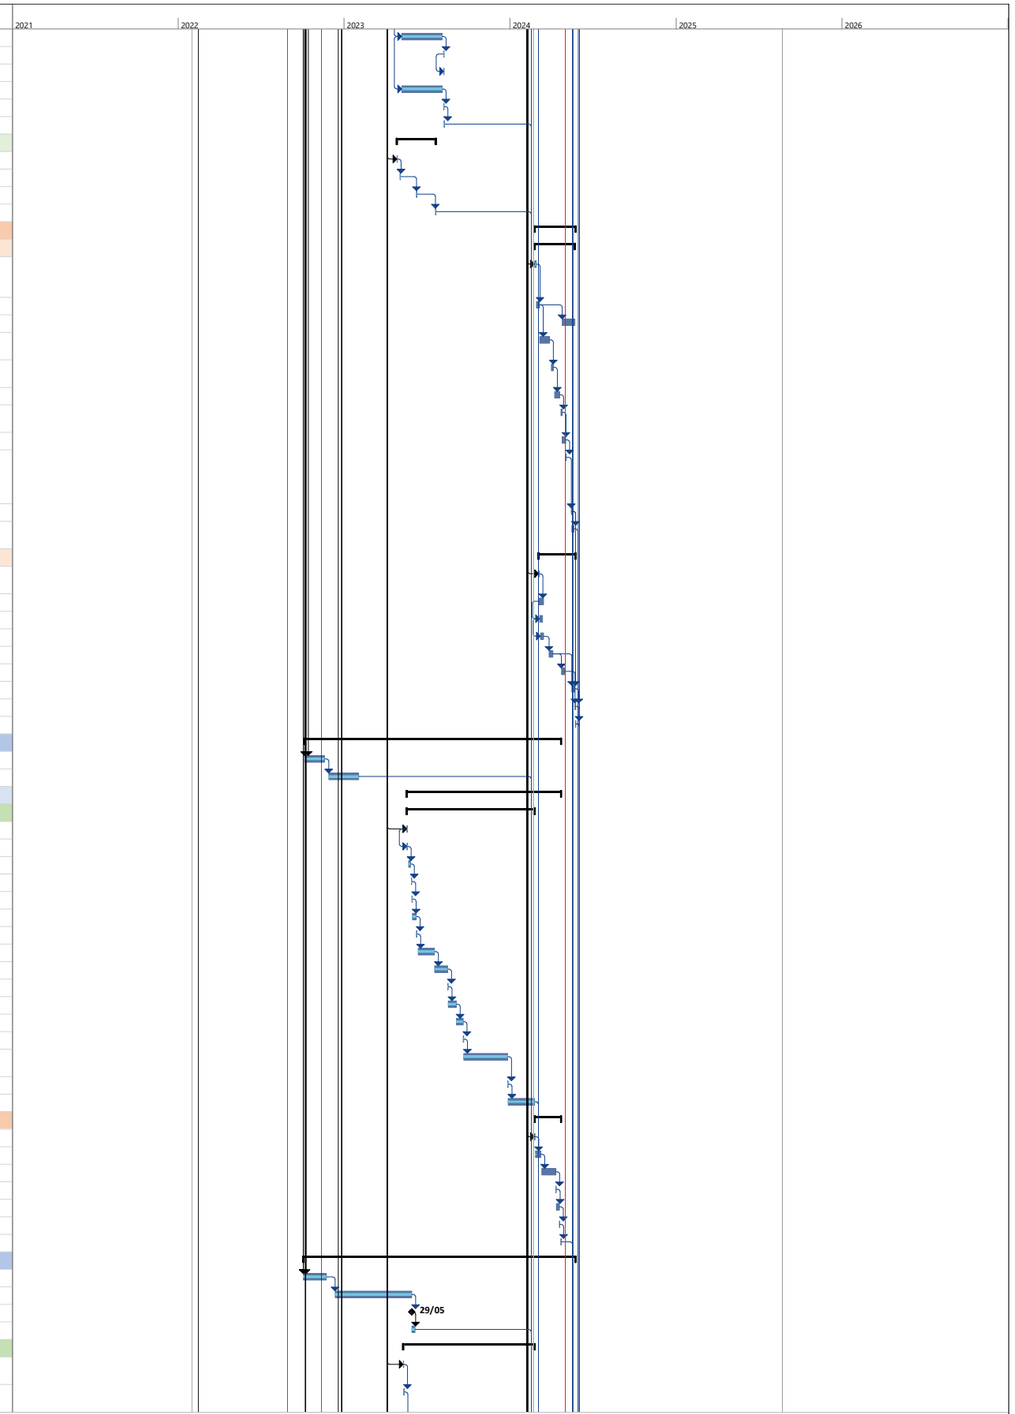

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica			
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso			
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
835		Mesas de trabajo ente IDU y EAAB Interferencia de Contratos	0%	100.0%	0%	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	834FC+3 días	836FC+3 días
836		Mesas de trabajo ente IDU y EAAB Interferencia de Contratos	0%	100.0%	0%	1 día	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	835FC+3 días	837FC+3 días
837		Mesas de trabajo ente IDU y EAAB Interferencia de Contratos	0%	100.0%	0%	1 día	mié 31/05/23	mié 31/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	836FC+3 días	838FC+17 días
838		Mesas de trabajo ente IDU y EAAB Interferencia de Contratos	0%	100.0%	0%	1 día	mié 28/06/23	mié 28/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	837FC+17 días	839
839		Atencion de observaciones	0%	100.0%	0%	54 días	jue 29/06/23	lun 18/09/23	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	838	840
840		Entrega a interventoria	0%	100.0%	0%	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	839	841
841		Revision de interventoria	0%	100.0%	0%	49 días	mié 20/09/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	840	1039
842		**Prórroga redes acueducto**	**0%**	**20.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 13,847,311.60**	**$ 13,847,311.60**	**$ 2,769,462.32**	**$ 0.00**		
843		**Eje 13**	**0%**	**20.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 3,461,827.90**	**$ 3,461,827.90**	**$ 692,365.58**	**$ 0.00**		
844		Entrega a Interventoría Eje 13 acueducto	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	122CC-1 día	845
845		Revisión Interventoría	0%	18.0%	0%	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	844	846
846		Atención observaciones Eje 13	0%	0.0%	0%	5 días	lun 4/03/24	vie 8/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	845	847
847		Entrega a Interventoría Eje 13	0%	0.0%	0%	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	846	848
848		Revisión y aprobación Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	mar 12/03/24	lun 18/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	847	849
849		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 19/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	848	850
850		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	849	851
851		Entrega Apoyo Técnico EAAB	0%	0.0%	0%	5 días	lun 1/04/24	vie 5/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	850	852
852		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	lun 8/04/24	vie 12/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	851	853
853		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	852	854
854		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 16/04/24	lun 22/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	853	855;587
855		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 23/04/24	mar 23/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	854	856
856		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 24/04/24	mar 30/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	855	857
857		Entrega apoyo tecnico EAAB	0%	0.0%	0%	1 día	jue 2/05/24	jue 2/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	856	858
858		Revision y aprobación EAAB	0%	0.0%	0%	15 días	vie 3/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	857	1041;1040
859		**Eje 14**	**0%**	**20.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 3,461,827.90**	**$ 3,461,827.90**	**$ 692,365.58**	**$ 0.00**		
860		Entrega interventoria	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	122CC-1 día	861
861		Revision interventoria	0%	18.0%	0%	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	860	862
862		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	lun 4/03/24	vie 8/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	861	863
863		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	862	864
864		Revisión y aprobación Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	mar 12/03/24	lun 18/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	863	865
865		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 19/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	864	866
866		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	865	867
867		Entrega Zona 4 EAAB	0%	0.0%	0%	5 días	lun 1/04/24	vie 5/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	866	868
868		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	lun 8/04/24	vie 12/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	867	869
869		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	868	870
870		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 16/04/24	lun 22/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	869	871;587
871		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 23/04/24	mar 23/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	870	872
872		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 24/04/24	mar 30/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	871	873
873		Entrega zona 4 EAAB	0%	0.0%	0%	1 día	jue 2/05/24	jue 2/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	872	874
874		Revision y aprobación EAAB	0%	0.0%	0%	15 días	vie 3/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	873	1041;1040
875		**Eje 6**	**0%**	**20.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 3,461,827.90**	**$ 3,461,827.90**	**$ 692,365.58**	**$ 0.00**		
876		Entrega interventoria	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	122CC-1 día	877
877		Revision interventoria	0%	18.0%	0%	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	876	878
878		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	lun 4/03/24	vie 8/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	877	879
879		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	878	880
880		Revisión y aprobación Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	mar 12/03/24	lun 18/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	879	881
881		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 19/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	880	882
882		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	881	883
883		Entrega Zona 4 EAAB	0%	0.0%	0%	5 días	lun 1/04/24	vie 5/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	882	884
884		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	lun 8/04/24	vie 12/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	883	885
885		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	884	886
886		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 16/04/24	lun 22/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	885	887;587
887		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 23/04/24	mar 23/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	886	888
888		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 24/04/24	mar 30/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	887	889
889		Entrega zona 4 EAAB	0%	0.0%	0%	1 día	jue 2/05/24	jue 2/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	888	890
890		Revision y aprobación EAAB	0%	0.0%	0%	15 días	vie 3/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	889	1041;1040
891		**Eje 7**	**0%**	**20.0%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 3,461,827.90**	**$ 3,461,827.90**	**$ 692,365.58**	**$ 0.00**		
892		Entrega interventoria	0%	100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	122CC-1 día	893
893		Revision interventoria	0%	18.0%	0%	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	892	894
894		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	lun 4/03/24	vie 8/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	893	895
895		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	894	896
896		Revisión y aprobación Interventoría	0%	0.0%	0%	5 días	mar 12/03/24	lun 18/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	895	897
897		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 19/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	896	898
898		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	897	899
899		Entrega Zona 4 EAAB	0%	0.0%	0%	5 días	lun 1/04/24	vie 5/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	898	900
900		Atencion observaciones	0%	0.0%	0%	5 días	lun 8/04/24	vie 12/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	899	901
901		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24	$ 692,365.58	$ 692,365.58	$ 0.00	$ 0.00	900	902
902		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mar 16/04/24	lun 22/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	901	903;587
903		Entrega IDU	0%	0.0%	0%	1 día	mar 23/04/24	mar 23/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	902	904
904		Revision IDU	0%	0.0%	0%	5 días	mié 24/04/24	mar 30/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	903	905
905		Entrega zona 4 EAAB	0%	0.0%	0%	1 día	jue 2/05/24	jue 2/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	904	906
906		Revision y aprobación EAAB	0%	0.0%	0%	15 días	vie 3/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	905	1041;1040
907		**DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, Y OTROS OPERADORES**	**75%**	**77.6%**	**75%**	**462 días**	**lun 31/01/22**	**vie 24/05/24**	**$ 66,467,106.00**	**$ 66,467,106.00**	**$ 51,549,769.80**	**$ 49,850,327.01**		
908		**CODENSA**	**50%**	**60.2%**	**50%**	**298 días**	**jue 29/09/22**	**vie 24/05/24**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 10,007,829.80**	**$ 8,308,387.01**		
909		Revision de diseño de redes por ENTIDAD	100%	100.0%	100%	43 días	jue 29/09/22	lun 28/11/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	466	1039
910		**Ajuste de observaciones**	**50%**	**60.2%**	**50%**	**210 días**	**vie 21/04/23**	**vie 24/05/24**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 10,007,829.80**	**$ 8,308,387.01**		
911		**SERIE 6**	**50%**	**60.2%**	**50%**	**210 días**	**vie 21/04/23**	**vie 24/05/24**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 10,007,829.80**	**$ 8,308,387.01**		

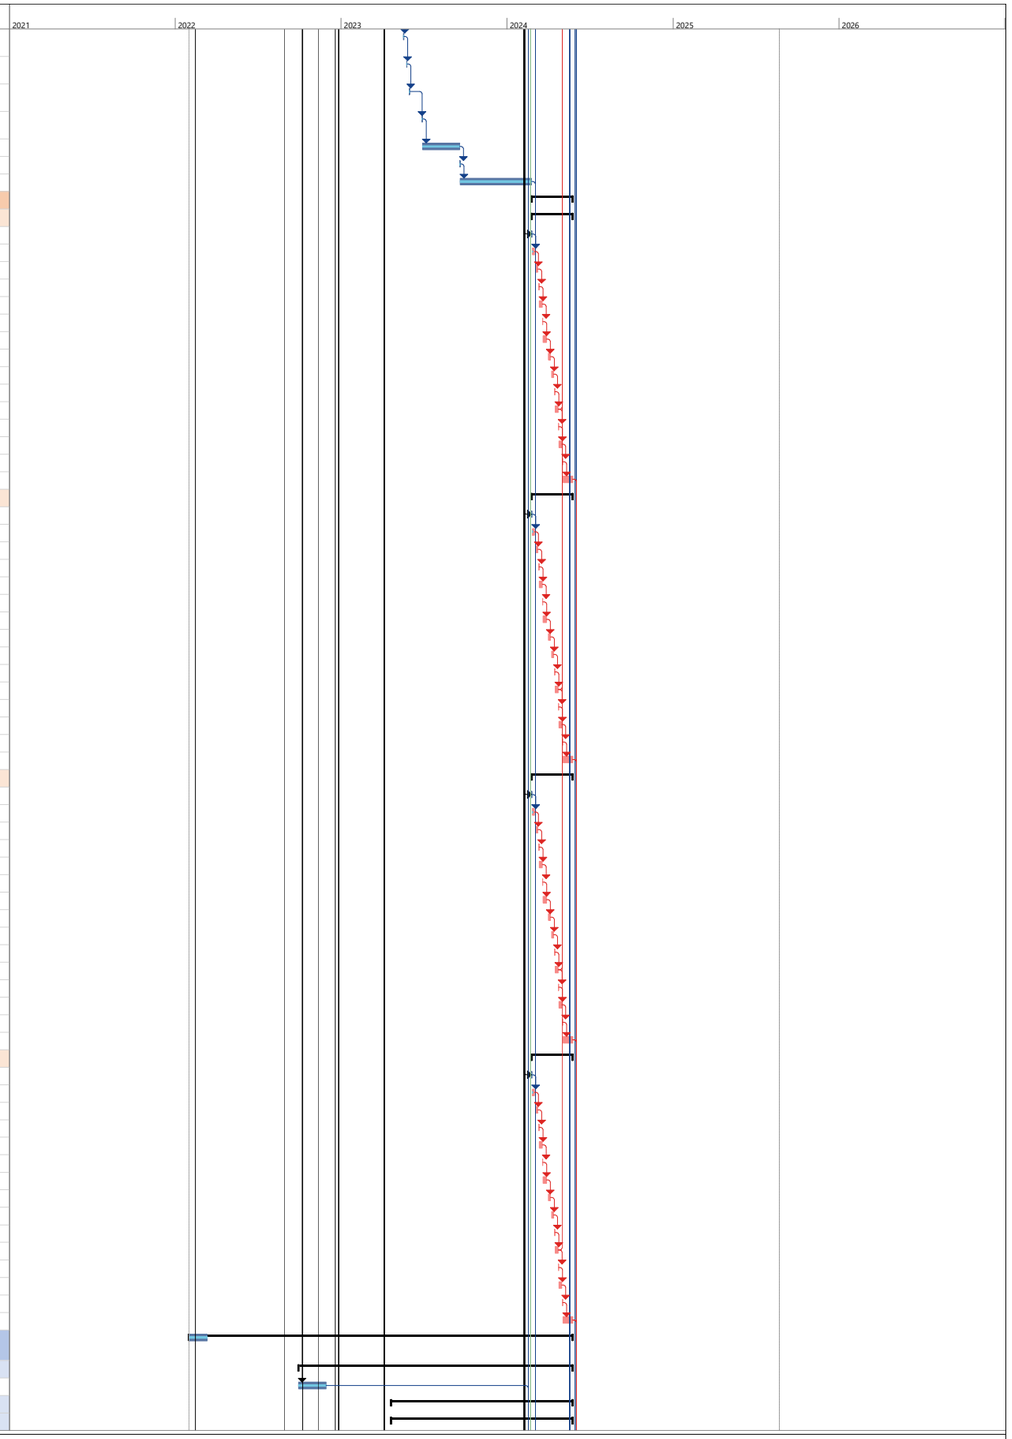

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
912		**Recomposición**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**133 días**	**vie 21/04/23**	**jue 1/02/24**	**$ 8,308,387.01**	**$ 8,308,387.01**	**$ 8,308,387.01**	**$ 8,308,387.01**		
913		**Eje 6**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**53 días**	**vie 21/04/23**	**mar 11/07/23**	**$ 1,986,788.91**	**$ 1,986,788.91**	**$ 1,986,788.91**	**$ 1,986,788.91**		
914		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 397,357.75	$ 397,357.75	$ 397,357.75	$ 397,357.75	121CC-1 día	915
915		Revision interventoria		100.0%	100%	2 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	914	916
916		Ajustes de consultoria		100.0%	100%	2 días	mié 26/04/23	jue 27/04/23	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	915	917CC+1 día
917		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	916CC+1 día	918
918		Revision Interventoria		100.0%	100%	1 día	vie 28/04/23	vie 28/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	917	919
919		Ajustes de Consultoría		100.0%	100%	2 días	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	918	920CC+1 día
920		Entrega a Interventoría		100.0%	100%	1 día	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	$ 397,357.79	919CC+1 día	921
921		Revisión y aprobación Interventoría		100.0%	100%	2 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	920	922FC+14 días
922		Entrega a ENEL		100.0%	100%	1 día	lun 29/05/23	lun 29/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	921FC+14 días	923
923		Revisión y aprobación ENEL		100.0%	100%	28 días	mar 30/05/23	mar 11/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	922	1039
924		**Eje 7**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**77 días**	**lun 17/07/23**	**jue 1/02/24**	**$ 3,612,341.76**	**$ 3,612,341.76**	**$ 3,612,341.76**	**$ 3,612,341.76**		
925		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	lun 17/07/23	lun 17/07/23	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	121CC+55 días	926
926		Revision interventoria		100.0%	100%	4 días	mar 18/07/23	lun 24/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	925	927
927		Ajustes de consultoria		100.0%	100%	18 días	mar 25/07/23	vie 18/08/23	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	926	928
928		Entrega a Interventoría		100.0%	100%	54 días	mar 22/08/23	jue 1/02/24	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	$ 1,204,113.92	927	1039
929		**Eje 10**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**15 días**	**mié 19/07/23**	**jue 10/08/23**	**$ 903,085.44**	**$ 903,085.44**	**$ 903,085.44**	**$ 903,085.44**		
930		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	$ 301,028.48	$ 301,028.48	$ 301,028.48	$ 301,028.48	121CC+57 días	931
931		Revision interventoria		100.0%	100%	2 días	vie 21/07/23	lun 24/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	930	932
932		Ajustes de consultoria		100.0%	100%	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23	$ 301,028.48	$ 301,028.48	$ 301,028.48	$ 301,028.48	931	933
933		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 301,028.48	$ 301,028.48	$ 301,028.48	$ 301,028.48	932	934
934		Revision y aprobación Interventoria		100.0%	100%	1 día	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	933	935
935		Entrega a ENEL		100.0%	100%	1 día	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	934	936
936		Revision y aprobacion ENEL		100.0%	100%	6 días	mié 2/08/23	jue 10/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	935	1039
937		**Eje 13**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**28 días**	**jue 24/08/23**	**mié 27/12/23**	**$ 903,085.45**	**$ 903,085.45**	**$ 903,085.45**	**$ 903,085.45**		
938		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	121CC+80 días	939
939		Revision interventoria		100.0%	100%	3 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	938	940
940		Ajustes de consultoria		100.0%	100%	8 días	mié 30/08/23	vie 8/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	939	941
941		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	940	942
942		Revision de interventoria		100.0%	100%	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	941	943
943		Ajustes de consultoria		100.0%	100%	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	942	944CC
944		Entrega de interventoria		100.0%	100%	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	943CC	945
945		Revision y aprobación Interventoria		100.0%	100%	3 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	944	946FC+2 días
946		Entrega a ENEL		100.0%	100%	1 día	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	945FC+2 días	947
947		Revision y aprobacion ENEL		100.0%	100%	7 días	vie 22/09/23	mié 27/12/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	946	1039
948		**Eje 3**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**28 días**	**jue 24/08/23**	**mié 27/12/23**	**$ 903,085.45**	**$ 903,085.45**	**$ 903,085.45**	**$ 903,085.45**		
949		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	121CC+80 días	950
950		Revision interventoria		100.0%	100%	3 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	949	951
951		Ajustes de consultoria		100.0%	100%	3 días	mié 30/08/23	vie 1/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	950	952
952		Entrega a interventoria		100.0%	100%	1 día	lun 4/09/23	lun 4/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	951	953
953		Revision de interventoria		100.0%	100%	3 días	mar 5/09/23	jue 7/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	952	954
954		Ajustes de consultoria		100.0%	100%	1 día	vie 8/09/23	vie 8/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	953	955CC
955		Entrega interventoria		100.0%	100%	1 día	vie 8/09/23	vie 8/09/23	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	$ 180,617.09	954CC	956
956		Revision y aprobación Interventoria		100.0%	100%	9 días	lun 11/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	955	957
957		Entrega a ENEL		100.0%	100%	1 día	vie 22/09/23	vie 22/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	956	958
958		Revision y aprobación ENEL		100.0%	100%	6 días	mar 19/12/23	mié 27/12/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	957	1039
959		**Prórroga serie 6**	**0%**	**20.5%**	**0%**	**61 días**	**sáb 24/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 8,308,386.99**	**$ 8,308,386.99**	**$ 1,699,442.79**	**$ 0.00**		
960		**Eje 7**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**18 días**	**sáb 24/02/24**	**mar 19/03/24**	**$ 1,699,442.79**	**$ 1,699,442.79**	**$ 1,699,442.79**	**$ 0.00**		
961		Entrega interventoria		100.0%	0%	1 día	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 1,699,442.79	$ 1,699,442.79	$ 1,699,442.79	$ 0.00	122CC-1 día	962
962		Revision y aprobación Interventoria		18.0%	0%	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	961	963
963		Entrega a ENEL		0.0%	0%	1 día	lun 4/03/24	lun 4/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	962	964
964		Revision y aprobación ENEL		0.0%	0%	11 días	mar 5/03/24	mar 19/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	963	1040
965		**Eje 3**	**0%**	**94.0%**	**0%**	**2 días**	**sáb 24/02/24**	**lun 26/02/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
966		Entrega acta de aprobacion ENEL interventori		94.0%	0%	2 días	sáb 24/02/24	lun 26/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	1040
967		**Eje 13**	**0%**	**94.0%**	**0%**	**2 días**	**sáb 24/02/24**	**lun 26/02/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
968		Entrega acta de aprobacion ENEL interventori		94.0%	0%	2 días	sáb 24/02/24	lun 26/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	1040
969		**ACTAS DE COMPETENCIA**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**42 días**	**jue 21/03/24**	**vie 24/05/24**	**$ 6,608,944.20**	**$ 6,608,944.20**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
970		Elaboracion acta de competencia		0.0%	0%	11 días	jue 21/03/24	mar 9/04/24	$ 1,652,236.05	$ 1,652,236.05	$ 0.00	$ 0.00	122CC+18 días	971
971		Entrega a interventoria		0.0%	0%	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24	$ 1,652,236.05	$ 1,652,236.05	$ 0.00	$ 0.00	970	972
972		Revision interventoria		0.0%	0%	5 días	jue 11/04/24	mié 17/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	971	973
973		Atencion observaciones		0.0%	0%	8 días	jue 18/04/24	lun 29/04/24	$ 1,652,236.05	$ 1,652,236.05	$ 0.00	$ 0.00	972	974
974		Entrega interventoria		0.0%	0%	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24	$ 1,652,236.05	$ 1,652,236.05	$ 0.00	$ 0.00	973	975
975		Revision y aprobacion interventoria		0.0%	0%	5 días	jue 2/05/24	mié 8/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	974	976
976		Entrega a ENEL		0.0%	0%	1 día	jue 9/05/24	jue 9/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	975	977
977		Revision y aprobación ENEL		0.0%	0%	10 días	vie 10/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	976	1041;1040
978		**ETB**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**288 días**	**mié 14/09/22**	**mar 23/04/24**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
979		Revision de diseño de redes por ENTIDAD	100%	100.0%	100%	55 días	mié 14/09/22	vie 9/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	480FC-56 días	980FC+5 días
980		Ajustes a observaciones	100%	100.0%	100%	43 días	lun 19/12/22	mié 26/04/23	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	979FC+5 días;544FC+5 días	1039
981		**Recomposición**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**145 días**	**jue 27/04/23**	**vie 23/02/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
982		Entrega a Interventoría	100%	100.0%	100%	1 día	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+3 días	983FC+22 días
983		Entrega a ETB	100%	100.0%	100%	1 día	jue 1/06/23	jue 1/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	982FC+22 días	984
984		Aprobación ETB	100%	100.0%	100%	3 días	vie 2/06/23	mar 6/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	983	985
985		Elaboracion acta de competencia	100%	100.0%	100%	70 días	mié 7/06/23	mié 20/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	984	986
986		Entrega acta de competencia	100%	100.0%	100%	1 día	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	985	987
987		Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	47 días	vie 22/09/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	986	1039
988		**Prórroga ETB**	**0%**	**5.0%**	**0%**	**40 días**	**sáb 24/02/24**	**mar 23/04/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
989		**ACTAS DE COMPETENCIA**	**0%**	**5.0%**	**0%**	**40 días**	**sáb 24/02/24**	**mar 23/04/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
990		Revision interventoria	0%	38.0%	0%	5 días	sáb 24/02/24	jue 29/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC-1 día	991
991		Ajustes de consultoria	0%	0.0%	0%	8 días	vie 1/03/24	mar 12/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	990	992

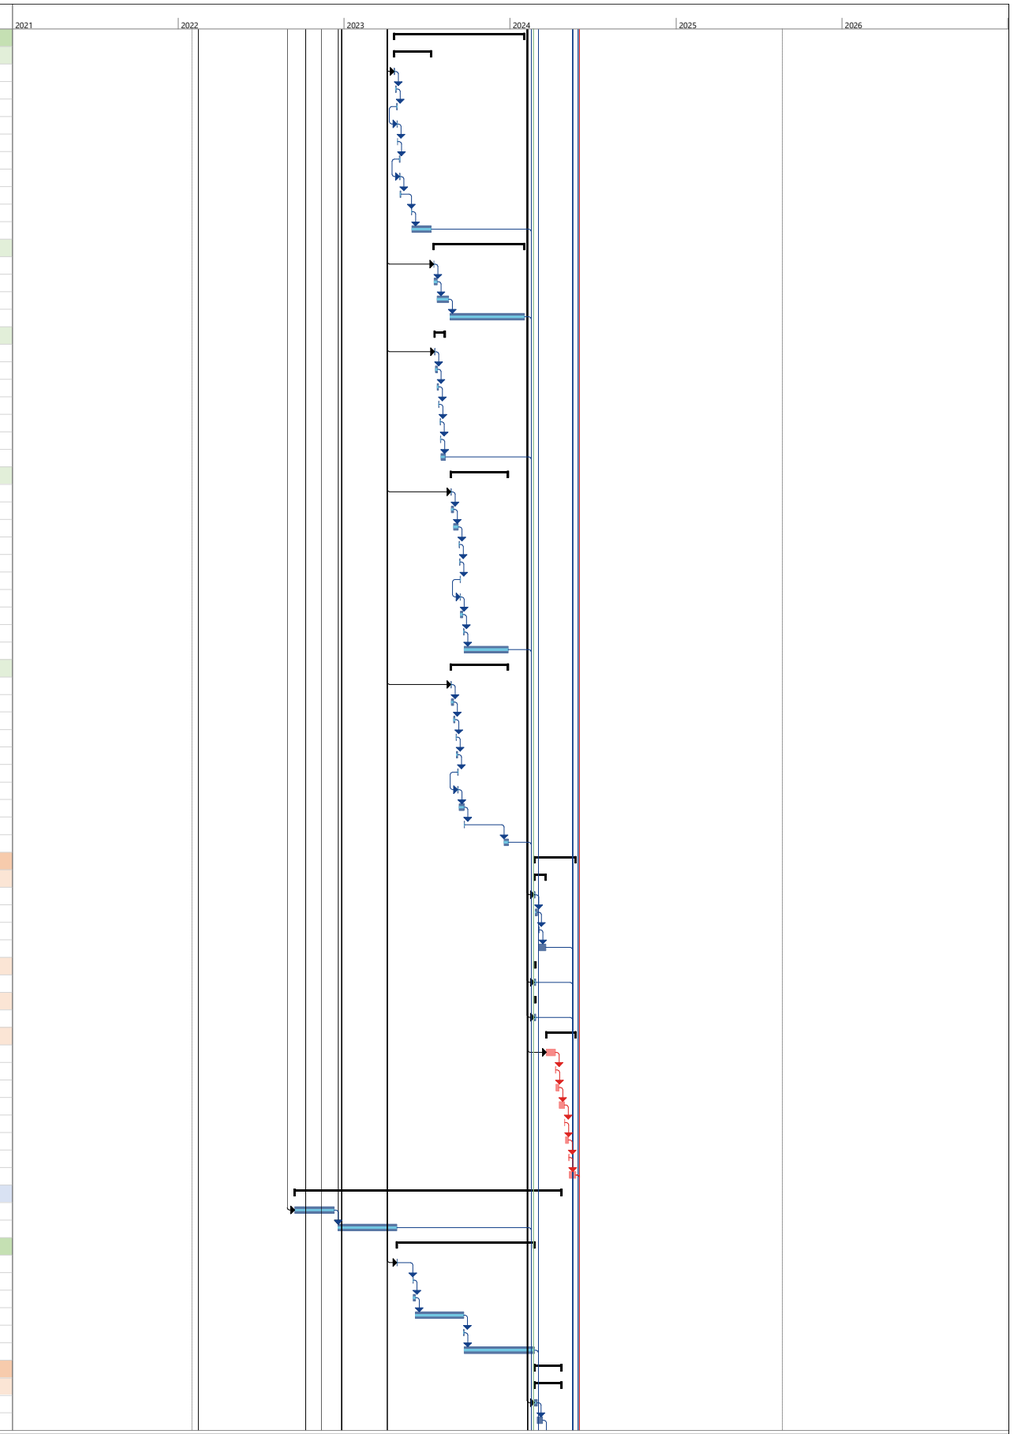

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Ejec. 12/02/2024	% Prog. 19/02/2024	% Ejec. 19/02/2024	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo de línea base5	CPTP	CPTR	Predecesoras	Sucesoras
992		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	991	993
993		Revision y aprobación Interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	jue 14/03/24	mié 20/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	992	994
994		Entrega a ETB	0%	0.0%	0%	1 día	jue 21/03/24	jue 21/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	993	995
995		Revision y aprobación ETB	0%	0.0%	0%	20 días	vie 22/03/24	mar 23/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	994	1041;1040
996		**OTROS OPERADORES**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**444 días**	**lun 31/01/22**	**vie 26/04/24**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**	**$ 16,616,774.00**		
997	✓	Revision de diseño de redes por ENTIDAD	100%	100.0%	100%	25 días	jue 3/11/22	lun 19/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	494	998FC+5 días
998	✓	Ajustes a observaciones	100%	100.0%	100%	32 días	mar 27/12/22	mié 19/04/23	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	$ 16,616,774.00	997FC+5 días;544	999
999		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mié 19/04/23	jue 20/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	998	1000
1000	✓	Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	vie 21/04/23	jue 27/04/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	999	1039
1001		**MOVISTAR**	**0%**	**9.0%**	**0%**	**178 días**	**vie 12/05/23**	**vie 26/04/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
1002	✓	**Recomposicion**	**0%**	**100.0%**	**0%**	**30 días**	**vie 12/05/23**	**mar 27/06/23**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
1003	✓	Mesa de trabajo	100%	100.0%	100%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+13 días	1004FC+15 días
1004	✓	Entrega interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mar 6/06/23	mar 6/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1003FC+15 días	1005FC+12 días
1005	✓	Entrega entidad	100%	100.0%	100%	1 día	mar 27/06/23	mar 27/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1004FC+12 días	1039
1006		**Prórroga MOVISTAR**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**31 días**	**mar 12/03/24**	**vie 26/04/24**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
1007		Revisión de la entidad	0%	0.0%	0%	21 días	mar 12/03/24	vie 12/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122CC+11 días	1008
1008		Aprobación entidad	0%	0.0%	0%	10 días	lun 15/04/24	vie 26/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1007	1040
1009	✓	**TIGO**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**30 días**	**lun 31/01/22**	**vie 11/03/22**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**		
1010		**GAS NATURAL**	**50%**	**50.0%**	**50%**	**297 días**	**vie 30/09/22**	**vie 24/05/24**	**$ 16,616,784.00**	**$ 16,616,784.00**	**$ 8,308,392.00**	**$ 8,308,392.00**		
1011	✓	Revision de diseño de redes por ENTIDAD	100%	100.0%	100%	48 días	vie 30/09/22	vie 16/12/22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	508	1012FC+5 días
1012	✓	Ajustes a observaciones	100%	100.0%	100%	37 días	lun 26/12/22	mar 25/04/23	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	1011FC+5 días;544	1013
1013	✓	Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	0 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	1012	1014
1014	✓	Revision de interventoria	100%	100.0%	100%	5 días	mié 26/04/23	mié 3/05/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1013	1039
1015	✓	**Recomposición**	**100%**	**100.0%**	**100%**	**120 días**	**lun 5/06/23**	**vie 23/02/24**	**$ 4,985,035.20**	**$ 4,985,035.20**	**$ 4,985,035.20**	**$ 4,985,035.20**		
1016	✓	Mesa de trabajo Vanti	100%	100.0%	100%	1 día	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	121CC+28 días	1017
1017	✓	Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	32 días	mar 6/06/23	mar 25/07/23	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	1016	1018
1018	✓	Entrega a interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	mié 26/07/23	mié 26/07/23	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	1017	1019
1019	✓	Revision interventoria	100%	100.0%	100%	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1018	1020
1020	✓	Atencion de observaciones	100%	100.0%	100%	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	1019	1021FC+1 día
1021	✓	Mesa de trabajo Vanti	100%	100.0%	100%	1 día	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1020FC+1 día	1022
1022	✓	Entrega VANTI	100%	100.0%	100%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1021	1023
1023	✓	Revision VANTI	100%	100.0%	100%	81 días	jue 3/08/23	vie 23/02/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1022	1039
1024		**Prórroga GAS NATURAL**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**57 días**	**jue 29/02/24**	**vie 24/05/24**	**$ 8,308,392.00**	**$ 8,308,392.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
1025		**EJES 1-2-3-4-7-9-10-12-13-14**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**39 días**	**jue 29/02/24**	**vie 26/04/24**	**$ 4,985,035.20**	**$ 4,985,035.20**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
1026		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	10 días	jue 29/02/24	mié 13/03/24	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 0.00	$ 0.00	122CC+3 días	1027
1027		Mesa de trabajo	0%	0.0%	0%	1 día	jue 14/03/24	jue 14/03/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1026	1028
1028		Atencion de observaciones	0%	0.0%	0%	6 días	vie 15/03/24	vie 22/03/24	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 0.00	$ 0.00	1027	1029
1029		Entrega interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mar 26/03/24	mar 26/03/24	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 0.00	$ 0.00	1028	1030
1030		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	mié 27/03/24	jue 4/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1029	1031
1031		Entrega VANTI	0%	0.0%	0%	1 día	vie 5/04/24	vie 5/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1030	1032
1032		Revision y aprobación VANTI	0%	0.0%	0%	15 días	lun 8/04/24	vie 26/04/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1031	1040
1033		**Actas de competencia**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**21 días**	**mié 24/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 3,323,356.80**	**$ 3,323,356.80**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		
1034		Elaboracion acta de competencia	0%	0.0%	0%	9 días	mié 24/04/24	mar 7/05/24	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 0.00	$ 0.00	122CC+39 días	1035
1035		Entrega a interventoria	0%	0.0%	0%	1 día	mié 8/05/24	mié 8/05/24	$ 1,661,678.40	$ 1,661,678.40	$ 0.00	$ 0.00	1034	1036
1036		Revision y aprobacion interventoria	0%	0.0%	0%	5 días	jue 9/05/24	jue 16/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1035	1037
1037		Entrega a Vanti	0%	0.0%	0%	1 día	vie 17/05/24	vie 17/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1036	1038
1038		Revisión y aprobación Vanti	0%	0.0%	0%	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1037	1041;1040
1039	✓	***Fin de Reconposición***	***0%***	***100.0%***	***0%***	***0 días***	***vie 23/02/24***	***vie 23/02/24***	***$ 0.00***	***$ 0.00***	$ 0.00	$ 0.00	***186;257;276;314;578;632;65***	
1040		***Fin de prórroga***	***0%***	***0.0%***	***0%***	***0 días***	***vie 24/05/24***	***vie 24/05/24***	***$ 0.00***	***$ 0.00***	$ 0.00	$ 0.00	***193;287;324;596;608;617;64***	
1041		***ACTA DE TERMINACION ESTUDIOS Y DISEÑOS***	0%	0.0%	0%	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	193;287;324;596;608;644;663	1042
1042		***ACTA DE INICIO ETAPA DE OBRA***	0%	0.0%	0%	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1041	1044
1043		**CONSTRUCCION DE OBRA**	**0%**	**0.0%**	**0%**	**314 días**	**mar 28/05/24**	**vie 22/08/25**	**$ 60,369,381,025.00**	**$ 60,369,381,025.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**797**	
1044		EJECUCIÓN DE OBRA	0%	0.0%	0%	291 días	mar 28/05/24	mar 22/07/25	$ 60,369,381,025.00	$ 60,369,381,025.00	$ 0.00	$ 0.00	1042	1045
1045		RECIBO FINAL DE OBRA	0%	0.0%	0%	23 días	mié 23/07/25	vie 22/08/25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1044	1047FC-1 día
1046		ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	58%	51.3%	58%	766 días	lun 14/02/22	jue 21/08/25	$ 25,191,295.00	$ 25,191,295.00	$ 12,920,404.73	$ 14,610,951.10	2FC+10 días	1048
1047		***ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO***	0%	0.0%	0%	1 día	vie 22/08/25	vie 22/08/25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1045FC-1 día	1048
1048		***FIN DE PROYECTO***	0%	0.0%	0%	0 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1046;1047	

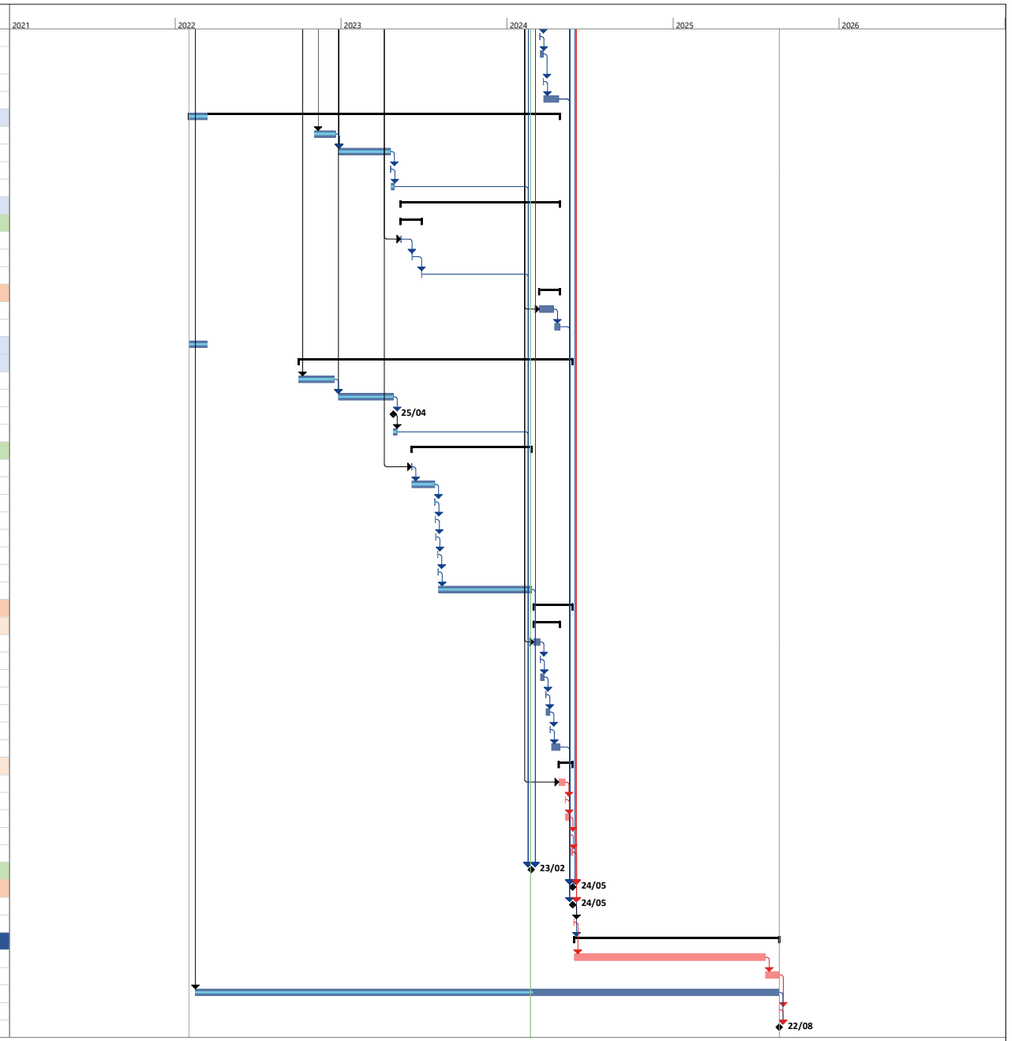

Proyecto: CRONOGRAMA RAPS VE
Fecha: jue 22/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
