Expediente: 485-2023
Radicado: DC-02565-2023
Sede: REGIONAL PARAMO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental: Informe y/o Certificacion Supervisor para pagos
Fecha: 14/12/2023 Hora: 11:08:27 Folios: 24

Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato: 485-2023, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02), y* exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DD
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).						
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.		X	19			
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).						
Informe y/o certificación supervisor para pagos.		X	5			
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

Supervisor Contrato:

NOTAS:

- *El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia.*
- *Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR.*
- *Los anexos se guardan en el servidor de* ***Cornare****, DVTK_Contratos para su consulta.*

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

COPIA CONTROLADA

Convenio Interadministrativo No. 485-2023
Informe de supervisión No. 1

1. **FECHA:** 13 de diciembre de 2023
2. **SUPERVISOR:** Juan Fernando Ospina Berrio
3. **COORD. SUPERVISIÓN:** Liliana Asened Ciro Duque
4. **CONTRATISTA:** Municipio de Nariño
5. **OBJETO:** RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS LA HERMOSA, LA ANGUSTIA Y RIO VENUS PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO
6. **VALOR:** $ 126.900.000

APORTANTES:
APORTE CORNARE: $ 100.320.000
APORTE MUNICIPIO: $ 26.580.000

7. **FECHA DE INICIACIÓN:** 28 de junio de 2023
8. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 20 de diciembre de 2023
9. **LOCALIZACIÓN:** Municipio de Nariño
10. **PLAZO:** Cinco (5) meses y veintidós (22) días

11. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:


CONTRATISTA: MUNICIPIO DE NARIÑO
DIRECCION: CALLE 10 No. 10-15 PARQUE PRINCIPAL
TELEFONO: 8680179
E-MAIL: agricultura@narino-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN FREDY CIFUENTES MARIN

12. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

12.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA

Se realiza visita de inspección ocular en compañía del señor Heber Jesús Morelo Tirado funcionario de la secretaria de Planeación del municipio de Nariño a fin de inspeccionar y verificar la intervención que se viene realizando con maquinaria pesada en los puntos identificados en el convenio del asunto.

Es así como se visita la vereda Quebrada Negra donde se viene trabajando en el cauce del rio venus a fin de mejorar la capacidad hidráulica de dicho afluente y prevenir de esta manera eventos como empalizadas y desbordamientos del rio sobre el centro poblado del Corregimiento de Puerto Venus.

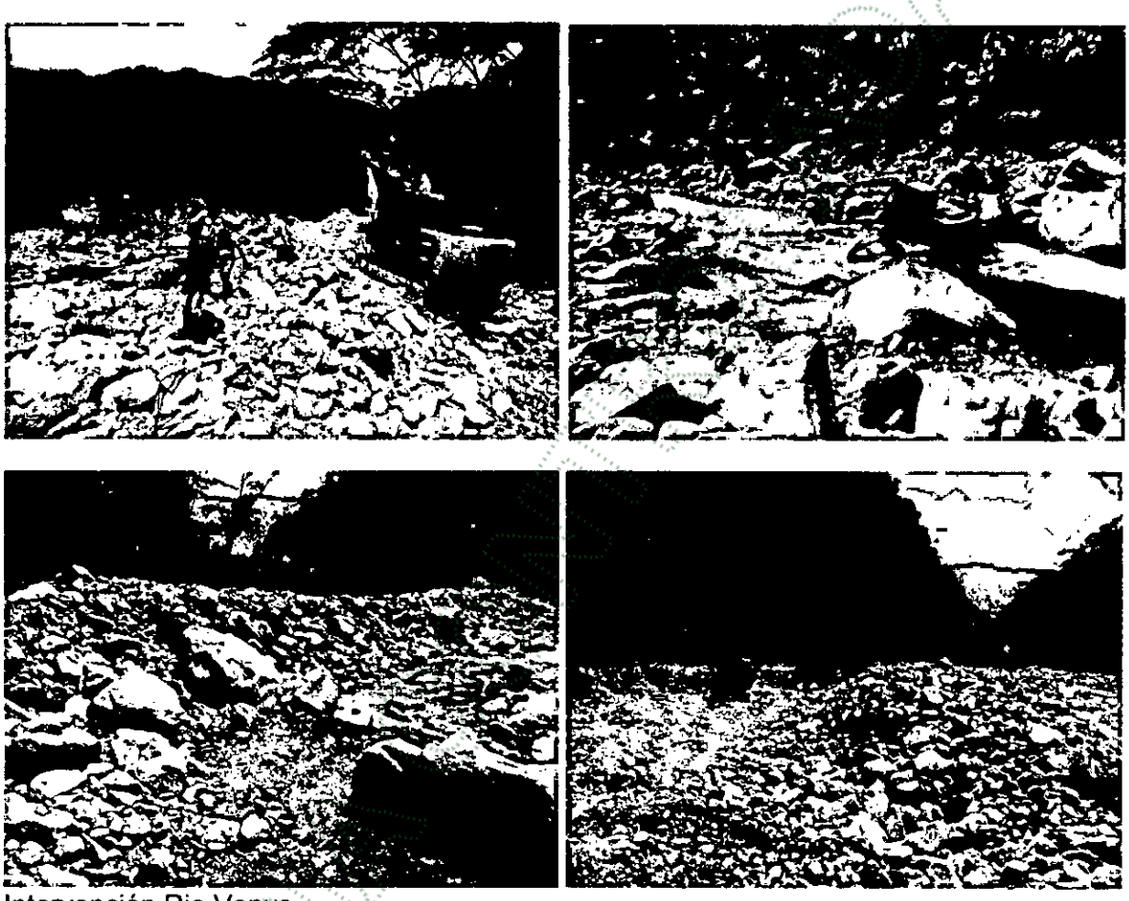

Intervención Rio Venus

Como se evidencia en el registro fotográfico se viene realizando la limpieza y construcción de una barrera de protección sobre la margen izquierda del rio venus a la altura de la vereda Quebrada Negra ubicada a aproximadamente 2 kilómetros aguas arriba del Corregimiento de Puerto Venus.

Otro de los puntos intervenidos es la Quebrada la Angustia a la altura de la vereda El Bosque donde se viene recuperando el cauce de dicho efluente el cual presenta colmatación por sedimentos aportados de la parte alta de la vereda Aguacatal donde en meses pasadas se dio un movimiento en masa de magnitud considerable, se anexa el registro fotográfico de las actividades realizadas a la fecha.



Intervención quebrada la Angustia

En la siguiente tabla se relacionan las actividades ejecutadas con corte a la primera acta de avance

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD CONTRACTUAL	V. UNITARIO.	CANTIDAD EJECUTADA ACTA # 1	VALOR TOTAL
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angustia	m	140	$ 305.000	61	$ 18.544.000
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Hermosa	m	80	$ 305.000	-	$ -
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Venus	m	180	$ 305.000	180	$ 54.900.000
Valla informativa	un	1	$ 500.000	1	$ 500.000
Apoyo técnico y administrativo	Mes	2	$ 1.800.000,00	1	$ 2.160.000
Eventos de capacitación	evento	2	$ 400.000,00	-	$ -
TOTAL EJECUTADO					$ 76.104.000

12. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

El municipio realizo un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja, por un valor de CIENTO VEINTI Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 123.300.000) valor que corresponde a la

cofinanciación en aportes en dinero establecidos en los estudios previos; las cantidades contratadas y las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar guardan conformidad con las exigidas por la Corporación.

El convenio presenta un avance de ejecución de obra del 60.2 % y un porcentaje en tiempo del 95.3 %.

El plazo de ejecución del convenio fue objeto de modificación durante su ejecución prorrogando el plazo en 52 días más.

A la fecha la carpeta se encuentra actualizada con toda la información concerniente al convenio, el municipio cumplió parcialmente con las obligaciones establecidas en la minuta del convenio.

12.2 SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

En la presente tabla se presenta el resumen financiero del proyecto

ACTA	FECHA ACTA	VALOR ACTA	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO
Acta de avance # 1	13-12-2023	$ 76.104.000	$ 60.675.200	$ 15.428.800

12.3 SUPERVISIÓN JURÍDICA

El convenio cuenta con una carpeta con toda la documentación precontractual requerida, con minuta y acta de inicio legalizada.

El convenio fue objeto de dos modificatorios mediante el cual se prorrogo la fecha de terminación en 52 días.

12.4 SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

El contratista viene dando cumplimiento a esta obligación con la vinculación de los obreros al sistema de seguridad social y riesgos profesionales que tienen a cargo la construcción de las obras, igualmente no se evidenciaron impactos ambientales negativos en las áreas adyacentes donde se desarrolla el proyecto; por otro lado, no se tiene registro de incidentes que se hayan presentado con los obreros en la ejecución de la obra.

13. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el pago respectivo del acta de avance No. 1.

Se continuará con las visitas de supervisión del convenio, se recomendó al municipio como ente ejecutor acelerar la ejecución de las actividades para dar cumplimiento con los plazos establecidos en el convenio.

14. ANEXOS

Informe de supervisión 5 folios

Acta de avance 4 folios

Cuenta de cobro 1 folio

Parafiscales 1 folios

Rut 2 folios

Informe Municipio 11 folios

Juan Fernando Ospina Berrio
Supervisor
Regional Paramo

Liliana Asened Ciro Duque
Vo.Bo. Coordinadora Supervisión
Directora Regional

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 1
485-2023

ACTA N°	FECHA	CONTRATO
1	13-12-2023	485-2023

EJECUTOR	MUNICIPIO DE NARIÑO
NIT EJECUTOR	890982566

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	126,900,000
APORTE CORNARE EN DINERO	100,320,000
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
APORTE OTROS EN DINERO	22,980,000
APORTE OTROS EN SERVICIOS	3,600,000

OBJETO	"RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS LA HERMOSA. LA ANGUSTIA Y RIO VENUS PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO"
CONTRATISTA EJECUTOR	MUNICIPIO DE NARIÑO
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN	LILIANA ASENED CIRO DUQUE
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO

LOCALIZACIÓN	INICIA	TERMINA
NARIÑO	2023-06-28	2023-12-20

ADICIONES

Número	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
1	2023-06-28	2023-11-30
2	2023-06-28	2023-12-20

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 1							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angustia	Limpieza de quebradas (hora maquinaria)	140	305,000	42,700,000	60.80000	305,000	18,544,000	14,835,200	0	3,708,800	0	60.80000	18,544,000
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Hermosa	Limpieza de quebradas (hora maquinaria)	80	305,000	24,400,000	0	305,000	0	0	0	0	0	0	0
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Venus	Limpieza de quebradas (hora maquinaria)	180	305,000	54,900,000	180	305,000	54,900,000	45,340,000	0	9,560,000	0	180	54,900,000

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 1
485-2023

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 1							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Valla informativa	Otros Educación ambiental (Plegables, afiches, avisos, cartillas etc.)	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000	500,000	0	0	0	1	500,000
Asistencia Tecnica	Técnico, contratista (Mes)	2	1,800,000	3,600,000	1.20000	1,800,000	2,160,000	0	0	2,160,000	0	1.20000	2,160,000
Eventos de capacitacion	Eventos	2	400,000	800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
VALORES TOTALES				126,900,000			76,104,000	60,675,200	0	15,428,800	0		76,104,000

OBRA ADICIONAL					ACTA No. 1							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
VALORES TOTALES				0			0	0	0	0	0		0

MAYORES CANTIDADES DE OBRA					ACTA No. 1							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
VALORES TOTALES				0			0	0	0	0	0		0

DETALLE OTROS APORTES

Copia Controlada

ACTA DE AVANCE N° 1
485-2023

ACTIVIDAD	APORTANTE	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS
Adecuacion del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angostia	MUNICIPIO DE SARIÑO	3,708,800	3,708,800	0
Adecuacion del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Verde	MUNICIPIO DE SARIÑO	9,560,000	9,560,000	0
Asistencia Tecnica	MUNICIPIO DE SARIÑO	2,160,000	0	2,160,000

APORTANTE	TOTAL APORTE ECONÓMICO	TOTAL APORTE EN SERVICIOS
MUNICIPIO DE SARIÑO	13,268,800	2,160,000

VALOR ACTA	58,104,000
SUBTOTAL APORTE DE CORNARE	60,675,200
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
OTROS DESEMBOLSA CORNARE	0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	0
MENOR VALOR PAGADO	0
MAYOR VALOR PAGADO	0
PAGO CRUCE DE CUENTAS	NO
VALOR TOTAL A PAGAR	**60,675,200**

COORDINADOR DE SUPERVISION

SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 1
485-2023

Autorizo a la tesorería de Cornare, para que efectué el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la entidad que represento a la CUENTA No: _____, BANCO _____, TIPO: AHORROS ___ CORRIENTE ___

Comentarios Se elabora acta de avance # 1 luego de recibir informe por parte del municipio de Nariño

COPIA CONTROLADA

MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA
NIT: 890982566-9
DEPENDENCIA: ALCALDÍA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NRO 20230713-52

Fecha: 13/12/2023

CORPORACION AUTONAMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE
NIT. 8 9 0 9 8 5 1 3 8 -3

DEBE A:

MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
NIT: 890982566-9

LA SUMA DE:

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ML ($60,675,200)

Por concepto de

Avance 01 de la ejecución del convenio **485-2023** cuyo objeto es "**RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS LA HERMOSA, LA ANGUSTIA Y RIO VENUS PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.**

Atentamente,

Favor consignar a la cuenta corriente No 672-212440-43 de Bancolombia, denominada Municipio de Nariño convenios CORNARE.

JOHN FREDY CIFUENTES MARIN
C.C: 98.454.590
Representante Legal

Nariño Antioquia 11 de Diciembre de 2023.

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE NARIÑO ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que, el municipio de Nariño Antioquia, identificado con NIT: 890.982.566-9, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JOHN FREDY CIFUENTES MARIN
Alcalde Municipal

COPIA CONTROLADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14831396327

(415)7707212489984(8020) 000001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 2 5 6 6	9	Impuestos de Medellín	1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MUNICIPIO DE NARIÑO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Nariño 4 8 3

41. Dirección principal
CR 9 5 35

42. Correo electrónico hacienda@narino-antioquia.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 8 4 0	8 6 8 0 0 7 6	3 2 0 6 8 2 5 5 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 1 3 0 4 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 03 / 10 : 02: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CIFUENTES MARIN JOHN FREDY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831396327

(415)7707212489984(8020) 000001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 2 5 6 6	9	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	30
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	07	
72. Número	37	
73. Fecha	19130423	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	04	
76. Fecha de registro	19130423	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	05	
79. Ciudad/Municipio	483	

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	100.0 %
84. Nacional privado	0.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Vigencia

80. Desde	19130423
81. Hasta	30001231

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Contraloría Departamental — 15

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	84	20160601		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831396327

(415)7707212489984(8020) 000001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 2 5 6 6	9	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 4 5 4 5 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CIFUENTES	MARIN	JOHN	FREDY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831396327

(415)7707212489984(8020) 000001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 2 5 6 6		Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 7 0 4 1 7 3 0 8		8 1 6 5 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TABORDA	TABORDA	DIEGO	MARIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE AVANCE NO. 1

CONVENIO 485-2023

OBJETO: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES HÍDRICAS PARA MITIGACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NARIÑO – MUNICIPIO DE NARIÑO N° 485-2023

Fecha de inicio: 28-06-2023

Fecha de finalización inicial: 28-10-2023

Plazo inicial: 4 meses

Prorroga No 1: 1 mes y 2 días

Fecha de finalización según prorroga No 1: 30-11-2023

Plazo según prorroga No 1: 5 meses y 2 días

Prorroga No 2: 20 días

Fecha de finalización según prorroga No 2: 20-12-2023

Plazo Final: 5 meses y 22 días

ADMINISTRACION DELEGADA POR EL MUNICIPIO PARA EJECUTAR LAS OBRAS:

Empresa De Desarrollo Urbano de la Ceja NIT. 901105143-5

CONTRATISTA EJECUTOR ASIGNADO POR LA DELEGADA:

Ingeniería Multimodal Nit: 9013139496

VALOR:

CIENTO VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($126.900.000)

APORTE MUNICIPIO: VENTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($22´980.000)

APORTE MUNICIPIO ESPECIE: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($3´600.000)

CORNARE: CIEN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (100´320.000)

SUPERVICIÓN CORNARE:

JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

TABLA DE CONTENIDO.

Pág.

INTRODUCCIÓN 2
1.1. Descripción general del proyecto. 3
1.2. Localización del proyecto. 3
1.3. Información general contrato 4
2. ASPECTOS TÉCNICOS. 5
3. REGISTRO FOTOGRAFICO 6
4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 20
5. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 20
6. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 21

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene El INFORME DE OBRA No 1, correspondiente a las obras ejecutadas, Elaborado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato interadministrativo CONI-485-2023 suscrito entre el Municipio de Nariño y Cornare, cuyo objeto es: "RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES HÍDRICAS PARA MITIGACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO."

En este informe se incluyen los aspectos más relevantes que le permitan a CORNARE, o a quien lo consulte, tener una visión general de los trabajos que se ejecutaron.

En el presente informe, se relaciona lo ejecutado en el contrato de obra, en el que se incluye principalmente el registro fotográfico que sustenta las actividades realizadas en los puntos de intervención.

COPIA CONTROLADA

1.1. Descripción general del proyecto.


En general las actividades del convenio consisten principalmente en:

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR							
COMPONENTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CORNARE	MUNICIPIO EFECTIVO	MUNICIPIO ESPECIE
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angustia	Hora	140	$ 305.000	$ 42.700.000	$ 34.160.000,00	8.540.000	
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Hermosa	Hora	80	$ 305.000	$ 24.400.000	$ 19.520.000,00	4.880.000	
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Venus	Hora	180	$ 305.000	$ 54.900.000	$ 45.340.000,00	9.560.000	
Valla informativa	Valla	1	$ 500.000	$ 500.000	500.000		
Asistencia Tecnica	Tecnico	2	$ 1.800.000	$ 3.600.000			3.600.000
Eventos de capacitacion	Evento	2	$ 400.000	$ 800.000	800.000		
SUBTOTAL				$ 126.900.000			
TOTAL ACTIVIDADES				$ 126.900.000	100.320.000	22.980.000	3.600.000

Ilustración 1 Condiciones contractuales convenio 485 - 2023

1.2. Localización del proyecto.

Las obras ejecutadas se encuentran en la zona rural del Municipio de Nariño Antioquia, específicamente en el corregimiento Puerto Venus y vereda La hermosa.

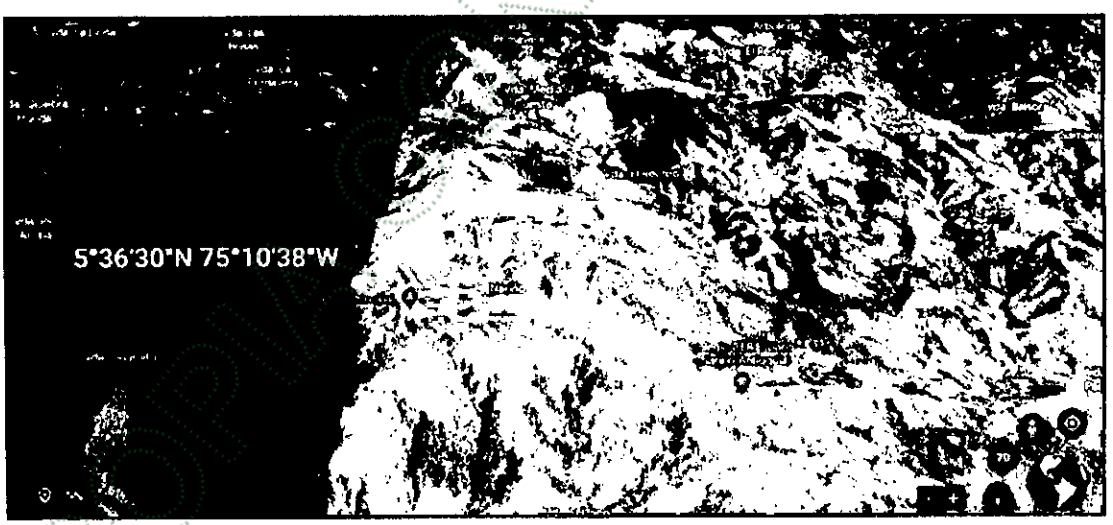

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

1.3. Información general contrato

A continuación, se relacionan los datos del contrato

Tabla 1 FICHA TECNICA CONVENIO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCION	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO CONI-485-2023
OBJETO	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES HÍDRICAS PARA MITIGACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NARIÑO
ADMINISTRACION DELEGADA	EMDUCE NIT. 901105143-5
REPENSENTANTE LEGAL	LILIANA ESCOBAR ORREGO CC. 43.983.022
VALOR CONVENIO	**CIENTO VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($126´900.000)** APORTE MUNICIPIO: VENTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($22´980.000) APORTE MUNICIPIO ESPECIE: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($3´600.000) CORNARE: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CORNARE: CIEN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (100´320.000)
VALOR CONTRATO ADMINISTRACION DELEGADA EMDUCE	**CI-008-2023** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($267.040.999). CONI-485 CIENTO VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($123´300.000) CONI-489 CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($140'600.002) ADMINISTRACION DELEGADA DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOS PESOS ($2'639.582)
PLAZO INICIAL	4 meses
FECHA ACTA DE INICIO	28 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de octubre 2023
PRORROGA No 1	1 mes y 2 días

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

PLAZO SEGÚN PRORROGA NO 1:	5 meses y 2 días
FECHA FINALIZACION PRORROGA No 1	30 de noviembre de 2023
PRORROGA No 2	20 días
PLAZO SEGÚN PRORROGA NO 2:	20 de diciembre de 2023
PLAZO FINAL	5 meses y 22 días

2. ASPECTOS TÉCNICOS.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el presente convenio el cual se especifican unitariamente en el registro fotográfico.

Ítem 1: Para la actividad según convenio de "Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angustia" se llevó a cabo la ejecución de obras mediante uso de maquinaria amarilla tipo oruga, sobre la cual se hicieron trabajos de apertura y construcción de Jarillón aledaño a la zona de afectaciones de avalanchas y demás situaciones que impedían la correcta escorrentía de las aguas de la quebrada la Angustia. Para esta actividad se ejecutaron un total de 60,8 horas que acaparan el presente informe; faltando así un total de 79,2 para cumplir con los requisitos contractuales del convenio.

Ítem 2. Para la actividad según convenio de "Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Venus" se llevó a cabo la completa ejecución de obras mediante uso de maquinaria amarilla tipo oruga, sobre la cual se hicieron trabajos de apertura y construcción de Jarillón aledaño a la zona de afectaciones de avalanchas y demás situaciones que impedían la correcta escorrentía de las aguas en el rio Venus. Para esta actividad se ejecutaron en su totalidad las actividades contractuales correspondientes a 180 horas de trabajo de maquinaria amarilla que acaparan el presente informe. Culminando así las labores en dicho punto y cumpliendo a cabalidad las condiciones técnicas requeridas.

Ítem 4. El contratista cumplió con el diseño y adquisición de valla informativa como lo estipulan las condiciones contractuales del convenio.

Ítem 5. El municipio de Nariño cuenta con apoyo técnico y administrativo el cual brinda al proyecto con profesional idóneo en ingeniería civil el ing. Heber Morelo Tirado.

A continuación, se adjunta registro fotográfico detallado de labores realizadas por contratista encargado de la ejecución fisica de las obras en campo, como evidencia de las cantidades ejecutadas en el presente informe:

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Ítem 1: "Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angustia" Se han ejecutado un total de 60,8 horas maquinas culminando las actividades en el primero de tres puntos críticos que presenta esta quebrada.

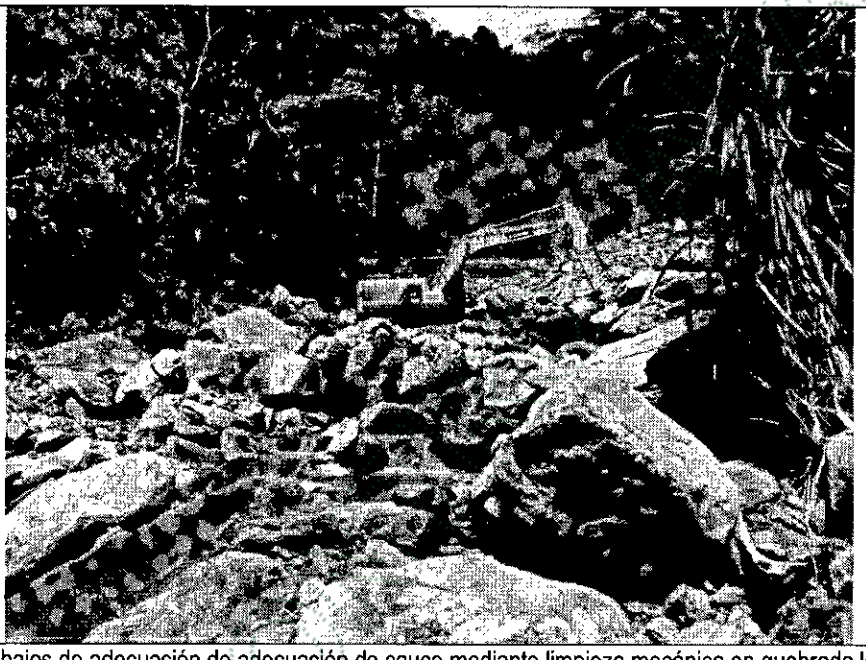


FOTO 1: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia

COPIA CONTROLADA

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 2: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia



FOTO 3: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

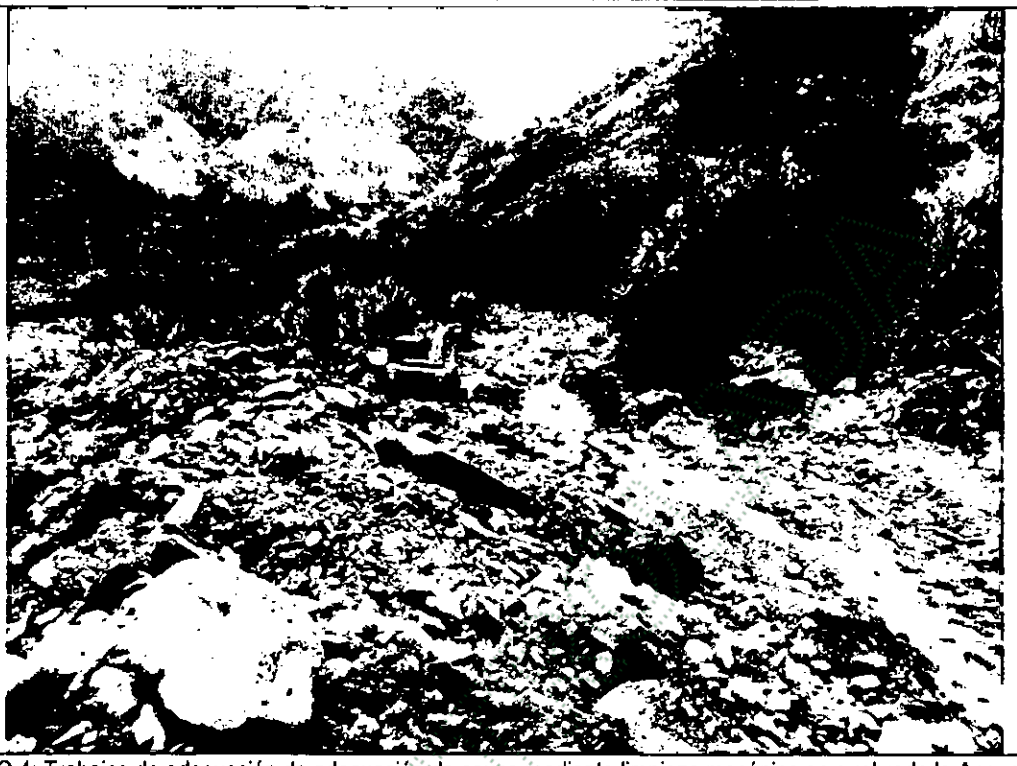


FOTO 4: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia



FOTO 5: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 6: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia



FOTO 7: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 8: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia



FOTO 9: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 10: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica en quebrada la Angustia

Ítem 2: "Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Venus" Se han ejecutado un total de 180 horas maquinas que contemplaban este punto, así, se intervino al 100% la necesidad presentada a satisfacción de la comunidad interesada del proyecto.

COPIA CONTROLADA

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 11: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus

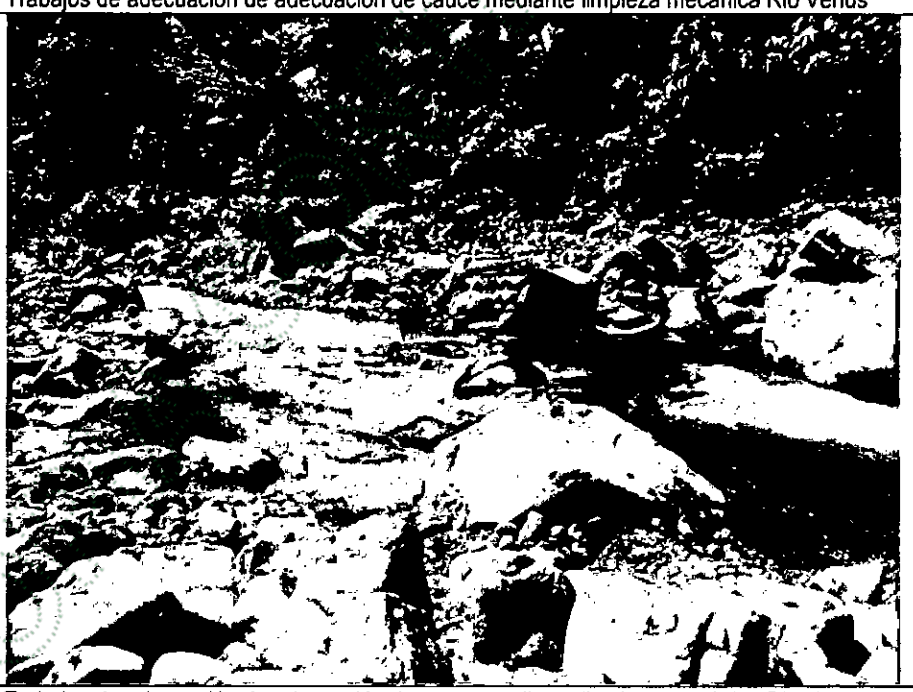


FOTO 12: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 13: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus



FOTO 14: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 15: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus



FOTO 16: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 17: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus



FOTO 18: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

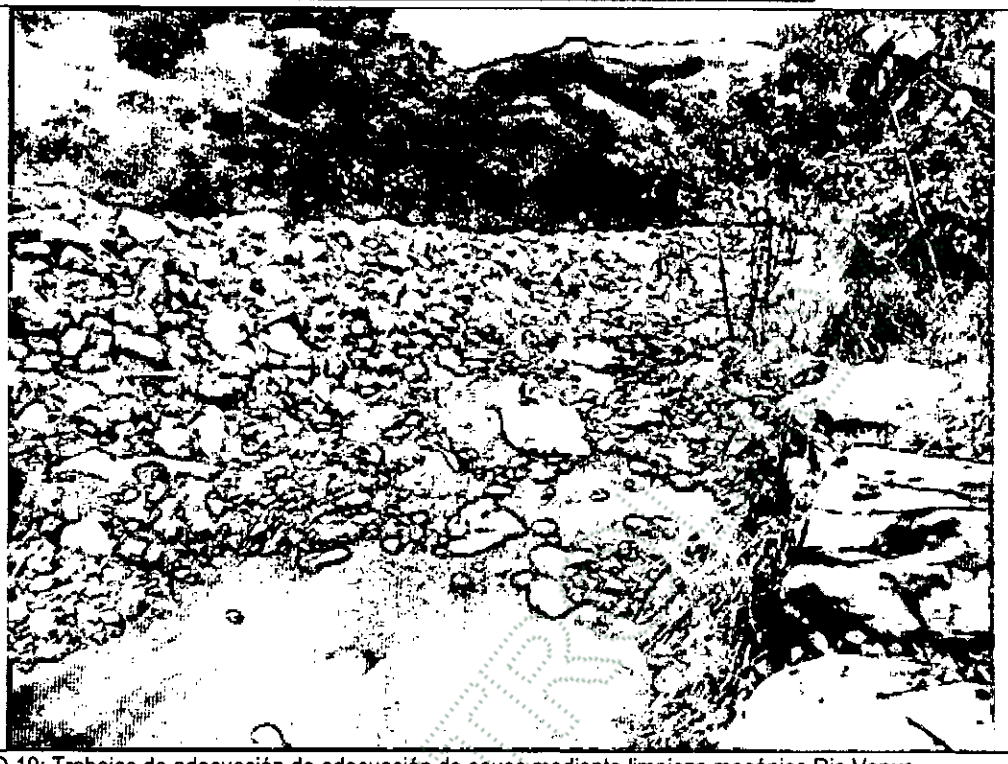


FOTO 19: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus



FOTO 20: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 21: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus



FOTO 22: Trabajos de adecuación de adecuación de cauce mediante limpieza mecánica Rio Venus

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

Ítem 4: "Valla informativa" Se cumplió con el diseño y adquisición de valla publicitaria del convenio según parámetros de la entidad CORNARE.

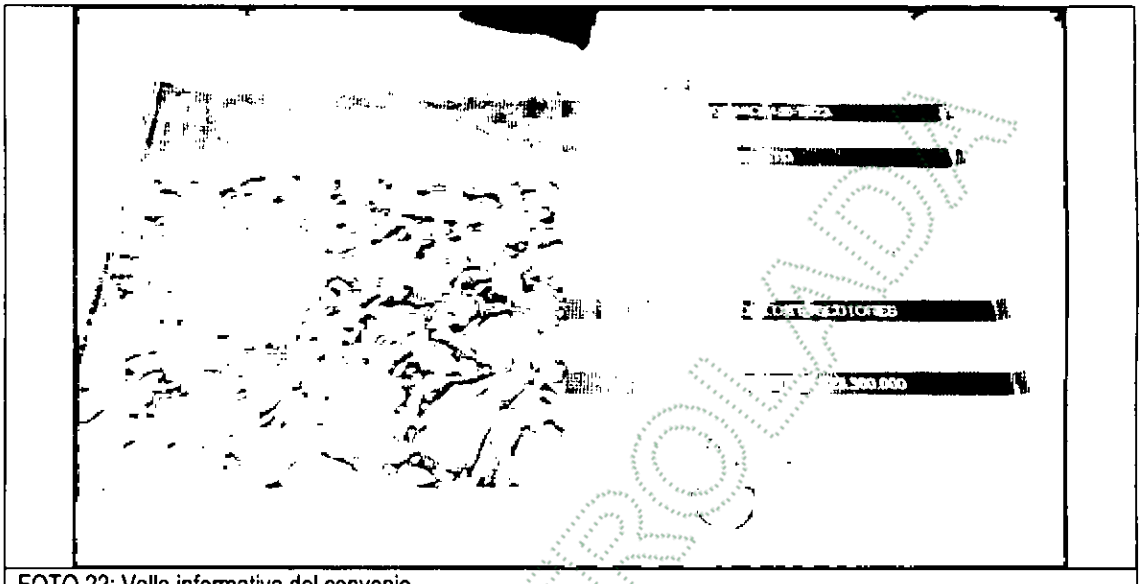


FOTO 22: Valla informativa del convenio

Ítem 5: "Asistencia Técnica" Para el apoyo técnico del convenio, por medio del municipio de contrato al ingeniero civil Heber Morelo, quien realizo constante acompañamiento y seguimiento de actividades ejecutadas y gestión documental del proyecto:

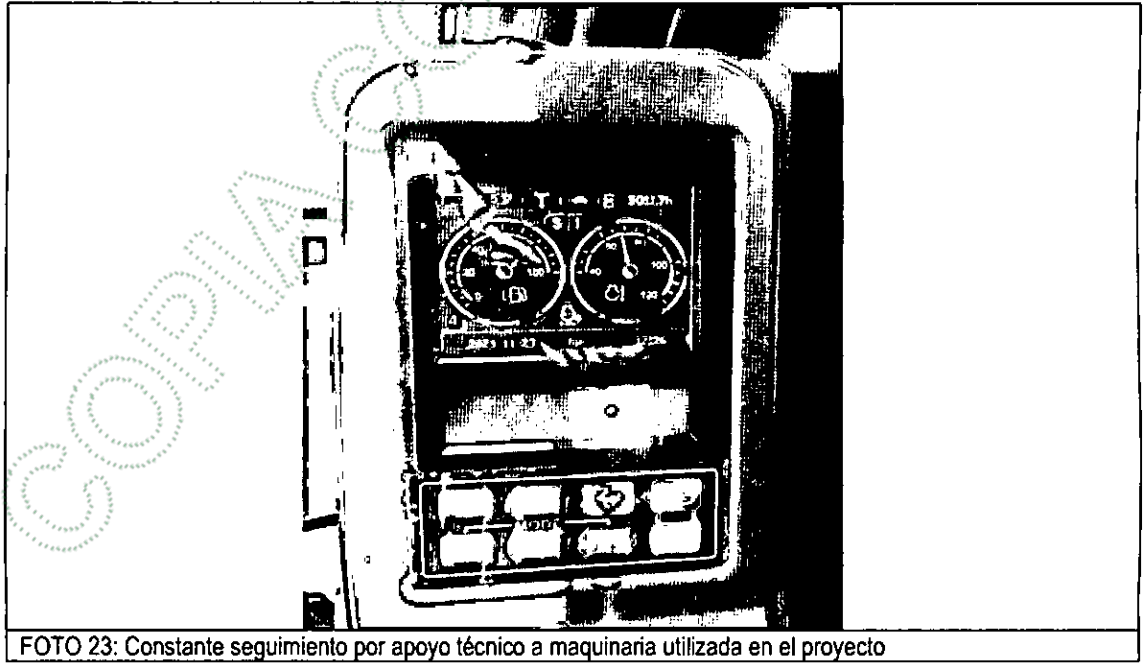


FOTO 23: Constante seguimiento por apoyo técnico a maquinaria utilizada en el proyecto

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t



FOTO 23: Acompañamiento técnico a labores ejecutadas por el contratista de obra en los distintos puntos



FOTO 24: Acompañamiento técnico a labores ejecutadas por el contratista de obra en los distintos puntos

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

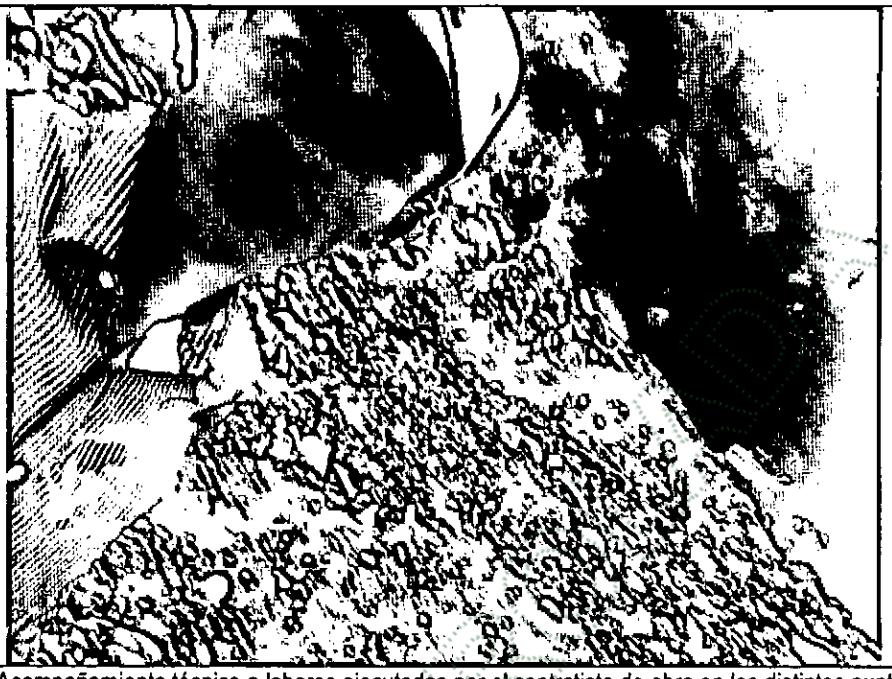


FOTO 24: Acompañamiento técnico a labores ejecutadas por el contratista de obra en los distintos puntos



FOTO 24: Acompañamiento técnico a labores ejecutadas por el contratista de obra en los distintos puntos

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el presente informe se ejecutaron en total el 60% de las actividades contractuales del convenio como se muestra en la siguiente tabla:

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR								ACTA No 1	
COMPONENTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CORNARE	MUNICIPIO EFECTIVO	MUNICIPIO ESPECIE	CANTIDAD	V. PARCIAL
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angustia	Hora	140	$ 305.000	$ 42.700.000	$ 34.160.000,00	8.540.000		60,8	$ 18.544.000
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Hermosa	Hora	80	$ 305.000	$ 24.400.000	$ 19.520.000,00	4.880.000			$ 0
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Venus	Hora	180	$ 305.000	$ 54.900.000	$ 45.340.000,00	9.560.000		180	$ 54.900.000
Valla informativa	Valla	1	$ 500.000	$ 500.000	500.000			1	$ 500.000
Asistencia Tecnica	Tecnico	2	$ 1.800.000	$ 3.600.000			3.600.000	1,2	$ 2.160.000
Eventos de capacitacion	Evento	2	$ 400.000	$ 800.000	800.000				$ 0
SUBTOTAL				$ 126.900.000					$ 76.104.000
TOTAL ACTIVIDADES				$ 126.900.000	100.320.000	22.980.000	3.600.000	TOTAL	$ 76.104.000
								%ejecutado	60%

Ilustración 2 Acta No 1 cantidades ejecutadas informe No 1

5. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

El avance físico del proyecto es del 6% teniendo en cuenta el valor ejecutado al doce (12) de diciembre de 2023.

6. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que a la fecha la presente corresponde a la primera acta de avance parcial, el avance financiero es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL APORTE DEL CONVENIO		$ 126.900.000
Valor Acta Nro. 1		$ 76.104.000
RESTANTE POR EJECUTAR		**$ 50.796.000**

RESÚMEN FINANCIERO CONTRATO CONI-485-2023		
VALOR DEL CONVENIO	$ 126.900.000	100.00%
VALOR ACTA N°1	$ 76.104.000	59,97%
SALDO POR EJECUTAR	$ 50.796.000	41,03%

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t

RESUMEN TÉCNICO

1. Las obras adelantadas se ejecutaron de acuerdo con el presupuesto y de acuerdo con las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión.
2. Las herramientas y equipos utilizados fueron aprobadas por la supervisión.
3. La mano de obra calificada está siendo ejecutada por dos oficiales de obra los cuales cuentan con las respectivas prestaciones sociales.
4. La empresa contratista dispone de un residente de obra con una dedicación del 100 %.
5. El municipio de Nariño cuenta con el apoyo técnico y administrativo.
6. **Imprevistos presentados durante la ejecución de la obra:** Retrasos en las actividades descritos en las prorrogas formalmente solicitadas a las distintas entidades.

Para la cosntancia de lo anterior se firma el día doce (12) de diciembre de 2023.

HÉCFTOR DAVID LÓPEZ QUINTERO
Seretario de planeación y desarrollo territorial.

COPIA CONTROLADA

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	**Revisó:** Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	**CARGO:** secretario de planeación y d.t
