Bogotá D.C. CADV-CIAR-056

Febrero 27 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.**

Reciban de nuestra parte un cordial saludo. Mediante el presente nos permitimos enviar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, aprobado por la Interventoría.


Así mismo adjuntamos soporte del envío del Cronograma al Contratista de Obra y la solicitud de cargue en el Secop II.

Atentamente,

JUAN CARLOS ANTOLÍNEZ FLÓREZ
C.C.: 1.032.457.698 expedida en la ciudad de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
NIT. 901.782.730-1

CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) - BOGOTÁ

Id	MD	EDT	ACTIVIDAD	Notas	DURACIÓN	Predec	Comienzo	Fin
0		**0**	**PROGRAMACIÓN**		**52 días**		**mié 24/01/24**	**sáb 16/03/24**
1		**1**	**CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) - BOGOTÁ**		**0 días**		**mié 24/01/24**	**mié 24/01/24**
2		**2**	**INICIO PROYECTO**		**45 días**		**jue 1/02/24**	**sáb 16/03/24**
3		**2.1**	**PRELIMINARES**		**3 días**		**jue 1/02/24**	**sáb 3/02/24**
4		2.1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE O SIMILAR ALTURA 2M	250ml	1 día		jue 1/02/24	jue 1/02/24
5		2.1.2	CAMPAMENTO CONTENEDOR O SIMILAR	1un	2 días	4	vie 2/02/24	sáb 3/02/24
6		**2.2**	**BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)**		**26 días**		**dom 4/02/24**	**jue 29/02/24**
7		**2.2.1**	**CUBIERTA**		**18 días**		**dom 4/02/24**	**mié 21/02/24**
8		2.2.1.1	DESMONTE DE MANTO	342,25m2	2 días	5	dom 4/02/24	lun 5/02/24
9		2.2.1.2	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	450,25m2	2 días	8	mar 6/02/24	mié 7/02/24
10		2.2.1.3	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3	225,13m2	2 días	9	jue 8/02/24	vie 9/02/24
11		2.2.1.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y MURETES CON RECUBRIMIENTO ACRILICO ELÁSTICO Y TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN	450,25m2	6 días	12	dom 11/02/24	vie 16/02/24
12		2.2.1.5	PENDIENTADO CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3 PARA DESAGUE DE A.LL	68,45m2	1 día	10	sáb 10/02/24	sáb 10/02/24
13		2.2.1.6	DESMONTE DE REJILLAS DE DESAGUE Y REVISIÓN DE DESAGUE(10m)	6un	1 día	10	sáb 10/02/24	sáb 10/02/24
14		2.2.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS TIPO CÚPULA EN ALUMINIO PARA DESAGUE	6un	1 día	11	sáb 17/02/24	sáb 17/02/24
15		2.2.1.8	DESMONTE DE DOMOS	4un	1 día	11	sáb 17/02/24	sáb 17/02/24
16		2.2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS EN LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	4un	1 día	15	dom 18/02/24	dom 18/02/24
17		2.2.1.10	TUBERÍA PARA DESAGUE DE A.LL (INCL. ACCESORIOS)	72ml	3 días	16	lun 19/02/24	mié 21/02/24
18		2.2.1.11	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	40ml	1 día	16	lun 19/02/24	lun 19/02/24
19		2.2.1.12	ACCESORIO (UNION-CODO) BAJANTE CANAL AMAZONAS	20un	1 día	16	lun 19/02/24	lun 19/02/24
20		2.2.1.13	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	48ml	1 día	16	lun 19/02/24	lun 19/02/24
21		2.2.1.14	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	8un	1 día	16	lun 19/02/24	lun 19/02/24
22		**2.2.2**	**PAREDES Y TECHOS**		**10 días**		**mar 20/02/24**	**jue 29/02/24**
23		2.2.2.1	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA	1077,2m2	2 días	21	mar 20/02/24	mié 21/02/24
24		2.2.2.2	ESTUCO Y PINTURA 3 M	1077,2m2	6 días	23FC	sáb 24/02/24	jue 29/02/24
25		**2.3**	**BLOQUE 3**		**32 días**		**lun 12/02/24**	**jue 14/03/24**
26		**2.3.1**	**FACHADAS Y CUBIERTA**		**13 días**		**lun 12/02/24**	**sáb 24/02/24**
27		2.3.1.1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	1un	1 día		lun 12/02/24	lun 12/02/24
28		2.3.1.2	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM	923.22	12 días	27	mar 13/02/24	sáb 24/02/24
29		**2.3.2**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**9 días**		**mar 13/02/24**	**mié 21/02/24**
30		2.3.2.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	134,99m2	5 días	27	mar 13/02/24	sáb 17/02/24
31		2.3.2.2	VENTANA EN ALUMINIO FIJA VIDRIO 4MM	92,84m2	3 días	30CC	vie 16/02/24	dom 18/02/24
32		2.3.2.3	PUERTA EN ALUMINIMO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	42,15m2	3 días	30CC días	vie 16/02/24	dom 18/02/24
33		2.3.2.4	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	4,1m2	1 día	30	dom 18/02/24	dom 18/02/24
34		2.3.2.5	VENTANA ALUM.FIJA C.50-20	1,5m2	1 día	33	lun 19/02/24	lun 19/02/24
35		2.3.2.6	MANTENIMIENTO DE PUERTAS VENTANAS HERMÉTICAS	15,6m2	2 días	34	mar 20/02/24	mié 21/02/24
36		2.3.2.7	VENTANA ALUM, FIJA VIDRIO TEMPLADO 8 MM	2,6m2	1 día	34	mar 20/02/24	mar 20/02/24
37		**2.3.3**	**PAREDES Y TECHOS**		**10 días**		**mié 21/02/24**	**vie 1/03/24**
38		2.3.3.1	LIMPIEZA CIELO RASO CON HIDROLAVADORA	681,8m2	5 días	36	mié 21/02/24	dom 25/02/24
39		2.3.3.2	ESTUCO Y PINTURA 3 M CIELO RASO	681,8m2	5 días	38	lun 26/02/24	vie 1/03/24
40		**2.3.4**	**PISOS**		**2 días**		**sáb 2/03/24**	**dom 3/03/24**
41		2.3.4.1	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	4,7ml	2 días	39	sáb 2/03/24	dom 3/03/24
42		**2.3.5**	**BAÑOS**		**14 días**		**lun 26/02/24**	**dom 10/03/24**
43		2.3.5.1	DESMONTE APARATO SANITARIO	10un	2 días	38	lun 26/02/24	mar 27/02/24
44		2.3.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	4un	1 día	43	mié 28/02/24	mié 28/02/24
45		2.3.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	4un	1 día	44	jue 29/02/24	jue 29/02/24
46		2.3.5.4	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO	4m2	1 día	47	jue 29/02/24	jue 29/02/24
47		2.3.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	3un	1 día	43	mié 28/02/24	mié 28/02/24
48		2.3.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA	2un	1 día	47	jue 29/02/24	jue 29/02/24
49		2.3.5.7	RETIRO DE ENCHAPE	126,2m2	6 días	43	mié 28/02/24	lun 4/03/24
50		2.3.5.8	REPELLO MURO	126,2m2	3 días	49	mar 5/03/24	jue 7/03/24
51		2.3.5.9	ESTUCO Y PINTURA 3 M	126,2m2	3 días	50	vie 8/03/24	dom 10/03/24
52		2.3.5.10	RETIRO CERAMICA	26,5m2	3 días	43	mié 28/02/24	vie 1/03/24
53		2.3.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5	26,5m2	3 días	52	sáb 2/03/24	lun 4/03/24

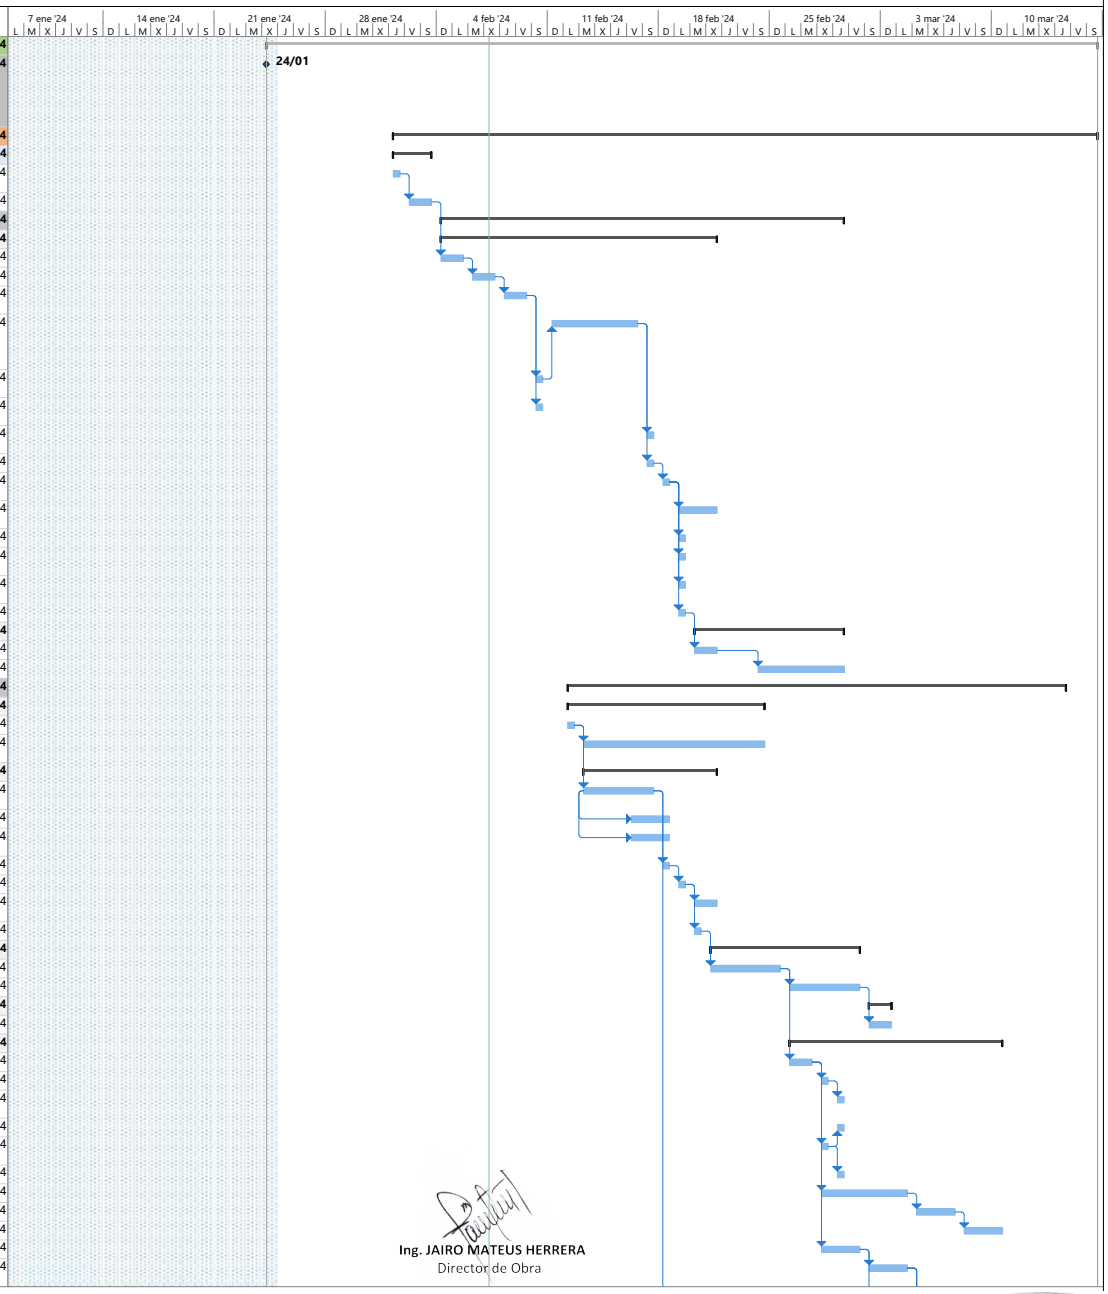


Ing. JAIRO MATEUS HERRERA
Director de Obra

Proyecto: PROGRAMACIÓN
Fecha: mié 7/02/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Ing. Waldo Jesus Ortiz R.
Director de Interventoría

Id	MD	EDT	ACTIVIDAD	Notas	DURACIÓN	Predec	Comienzo	Fin
54		2.3.5.12	DESMONTE DIVISIÓN DE BAÑO	20m2	1 día	52	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24
55		2.3.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO LAMINA CAL. 20	20m2	1 día	53	mar 5/03/24	mar 5/03/24
56		2.3.5.14	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	10un	1 día	54	dom 3/03/24	dom 3/03/24
57		2.3.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	3un	1 día	53	mar 5/03/24	mar 5/03/24
58		2.3.5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 3MM	2m2	1 día	53	mar 5/03/24	mar 5/03/24
59		**2.3.6**	**OTROS**		**9 días**		**mié 6/03/24**	**jue 14/03/24**
60		2.3.6.1	DEMOLICIÓN POCETA DE ASEO (LAVAPIES)	1un	1 día	58	mié 6/03/24	mié 6/03/24
61		2.3.6.2	POCETA DE ASEO EN GRANITO	2un	8 días	60	jue 7/03/24	jue 14/03/24
62		**2.4**	**BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2**		**9 días**		**dom 18/02/24**	**lun 26/02/24**
63		**2.4.1**	**PUERTAS**		**5 días**		**dom 18/02/24**	**jue 22/02/24**
64		2.4.1.1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS BRAZO HIDRÁULICO	2un	1 día	30	dom 18/02/24	dom 18/02/24
65		2.4.1.2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS(CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS)	36un	4 días	64	lun 19/02/24	jue 22/02/24
66		2.4.1.3	MANTENIMIENTO DE PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA	1un	1 día	64	lun 19/02/24	lun 19/02/24
67		**2.4.2**	**VENTANAS**		**2 días**		**mar 20/02/24**	**mié 21/02/24**
68		2.4.2.1	DESMONTE VIDRIO	2,25m2	1 día	66	mar 20/02/24	mar 20/02/24
69		2.4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM	3,45m2	1 día	68	mié 21/02/24	mié 21/02/24
70		**2.4.3**	**PAREDES Y TECHOS**		**4 días**		**jue 22/02/24**	**dom 25/02/24**
71		2.4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE TECHO VENTILACIÓN PVC 30X30	1un	1 día	69	jue 22/02/24	jue 22/02/24
72		2.4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO SUPERBOARD 6MM INCL. PINTURA	25,85m2	4 días	69	jue 22/02/24	dom 25/02/24
73		**2.4.4**	**BAÑOS**		**4 días**		**mié 21/02/24**	**sáb 24/02/24**
74		2.4.4.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	2,4m2	1 día	68	mié 21/02/24	mié 21/02/24
75		2.4.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO INCL. MARCO	2,4m2	1 día	74	jue 22/02/24	jue 22/02/24
76		2.4.4.3	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	15un	1 día	75	vie 23/02/24	vie 23/02/24
77		2.4.4.4	DESCONEXIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA	4un	1 día	75	vie 23/02/24	vie 23/02/24
78		2.4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA PARA DUCHAS DE EMERGENCIA PVC 1/2"	140ml	1 día	75	vie 23/02/24	vie 23/02/24
79		2.4.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA CON FUENTE LAVAOJOS EN ACERO INOXIDABLE	4un	1 día	78	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24
80		**2.4.5**	**LUMINARIAS**		**2 días**		**dom 25/02/24**	**lun 26/02/24**
81		2.4.5.1	RETIRO LAMPARA	151un	1 día	79	dom 25/02/24	dom 25/02/24
82		2.4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	137un	1 día	72	lun 26/02/24	lun 26/02/24
83		2.4.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	14un	1 día	72	lun 26/02/24	lun 26/02/24
84		**2.5**	**BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO**		**17 días**		**vie 16/02/24**	**dom 3/03/24**
85		**2.5.1**	**CUBIERTA**		**7 días**		**vie 16/02/24**	**jue 22/02/24**
86		2.5.1.1	DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	116,6m2	2 días		vie 16/02/24	sáb 17/02/24
87		2.5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	116,6m2	2 días	86	dom 18/02/24	lun 19/02/24
88		2.5.1.3	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM	120m2	4 días	91	lun 19/02/24	jue 22/02/24
89		2.5.1.4	DESMONTE DE DOMOS	4un	1 día	86CC	vie 16/02/24	vie 16/02/24
90		2.5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS EN LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	4un	1 día	89	sáb 17/02/24	sáb 17/02/24
91		2.5.1.6	DESMONTE DE SISTEMA PARA CIRCULACIÓN DE AIRE EN AUDITORIO	1gb	1 día	86	dom 18/02/24	dom 18/02/24
92		**2.5.2**	**VENTANERIA**		**1 día**		**lun 19/02/24**	**lun 19/02/24**
93		2.5.2.1	DESMONTE VIDRIO	1,86m2	1 día	91	lun 19/02/24	lun 19/02/24
94		2.5.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 8MM PARA PUERTA	1,86m2	1 día	91	lun 19/02/24	lun 19/02/24
95		**2.5.3**	**PAREDES Y TECHOS**		**9 días**		**mar 20/02/24**	**mié 28/02/24**
96		2.5.3.1	DESMONTE CIELO RASO	53,2m2	2 días	94	mar 20/02/24	mié 21/02/24
97		2.5.3.2	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD INCL. PINTURA	53,2m2	5 días	96	jue 22/02/24	lun 26/02/24
98		2.5.3.3	PINTURA 3M	240m2	2 días	97	mar 27/02/24	mié 28/02/24
99		**2.5.4**	**MOBILIARIO**		**6 días**		**mar 27/02/24**	**dom 3/03/24**
100		2.5.4.1	DESMONTE DIVISIONES EN VIDRIO	47,91m2	2 días	97	mar 27/02/24	mié 28/02/24
101		2.5.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN VIDRIO TEMPLADO 8 MM ALTURA 2M	47,91m2	2 días	98	jue 29/02/24	vie 1/03/24
102		2.5.4.3	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H	4un	2 días	101	sáb 2/03/24	dom 3/03/24
103		**2.5.5**	**ELÉCTRICO Y LUMINARIAS**		**13 días**		**mar 20/02/24**	**dom 3/03/24**
104		2.5.5.1	RETIRO LAMPARA	63un	2 días	96CC	mar 20/02/24	mié 21/02/24
105		2.5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	39un	2 días	97	mar 27/02/24	mié 28/02/24
106		2.5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	24un	2 días	105	jue 29/02/24	vie 1/03/24
107		2.5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA PARED APLIQUE	10un	1 día	105	jue 29/02/24	jue 29/02/24

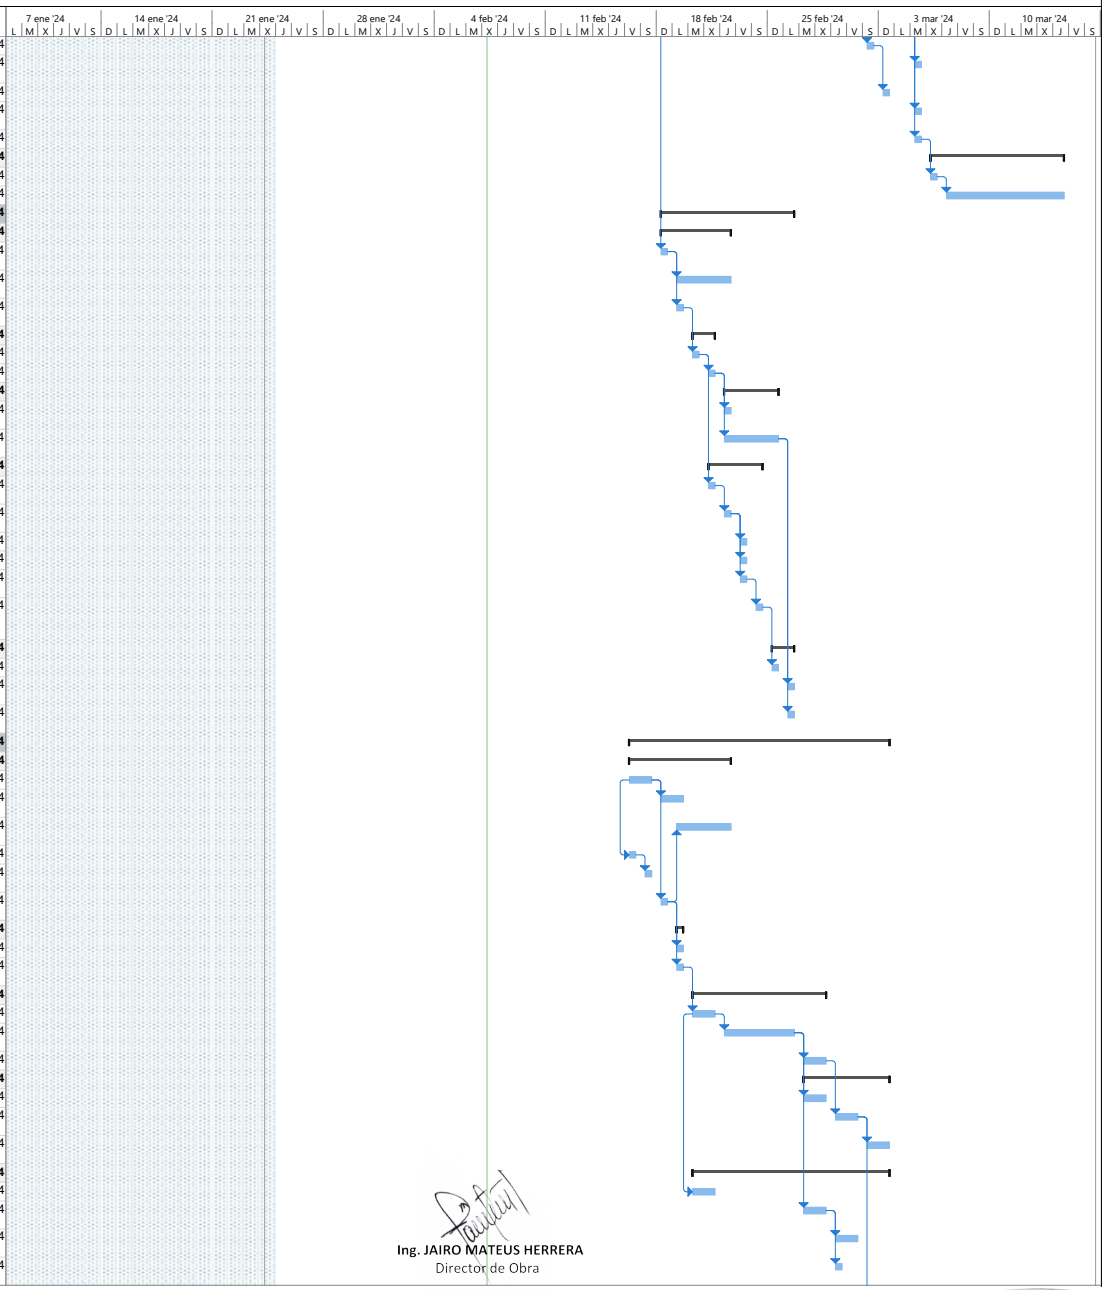


Ing. JAIRO MATEUS HERRERA
Director de Obra

Proyecto: PROGRAMACIÓN
Fecha: mié 7/02/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Ing. Waldo Jesus Ortiz R.
Director de Interventoría

Id	MD	EDT	ACTIVIDAD	Notas	DURACIÓN	Predec	Comienzo	Fin
108		2.5.5.5	SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	4un	2 días	101	sáb 2/03/24	dom 3/03/24
109		**2.6**	**BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)**		**20 días**		**vie 23/02/24**	**mié 13/03/24**
110		**2.6.1**	**FACHADAS**		**3 días**		**vie 23/02/24**	**dom 25/02/24**
111		2.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN PASSTROUGH	1ml	1 día		vie 23/02/24	vie 23/02/24
112		2.6.1.2	REPELLO MURO	3m2	1 día	111	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24
113		2.6.1.3	ESTUCO Y PINTURA 3 M	3m2	1 día	112	dom 25/02/24	dom 25/02/24
114		**2.6.2**	**CUBIERTA**		**12 días**		**lun 26/02/24**	**vie 8/03/24**
115		2.6.2.1	**RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA FIBRO CEMENTO**	255m2	1 día	113	lun 26/02/24	lun 26/02/24
116		2.6.2.2	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	76,5m2	4 días	115	mar 27/02/24	vie 1/03/24
117		2.6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO	76,5m2	5 días	116	sáb 2/03/24	mié 6/03/24
118		2.6.2.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MORTERO IMP. 1:3	18ml	1 día	117	jue 7/03/24	jue 7/03/24
119		2.6.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL 3x1 1/2 x1.1MM	19ml	1 día	118	vie 8/03/24	vie 8/03/24
120		2.6.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	9,7m2	1 día	118	vie 8/03/24	vie 8/03/24
121		**2.6.3**	**PUERTAS**		**3 días**		**sáb 9/03/24**	**lun 11/03/24**
122		2.6.3.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	4,8m2	1 día	120	sáb 9/03/24	sáb 9/03/24
123		2.6.3.2	PUERTA EN ALUMINIMO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	4,8m2	1 día	122	dom 10/03/24	dom 10/03/24
124		2.6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PUERTA	1un	1 día	123	lun 11/03/24	lun 11/03/24
125		**2.6.4**	**VENTANERIA**		**1 día**		**mar 12/03/24**	**mar 12/03/24**
126		2.6.4.1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	2un	1 día	124	mar 12/03/24	mar 12/03/24
127		**2.6.5**	**PAREDES Y TECHOS**		**13 días**		**lun 26/02/24**	**sáb 9/03/24**
128		2.6.5.1	REPELLO MURO	24,9m2	1 día	113	lun 26/02/24	lun 26/02/24
129		2.6.5.2	ESTUCO Y PINTURA 3 M	24,9m2	1 día	128	mar 27/02/24	mar 27/02/24
130		2.6.5.3	DESMONTE CIELO RASO	255m2	4 días	129	mié 28/02/24	sáb 2/03/24
131		2.6.5.4	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD INCL. PINTURA	255m2	7 días	130	dom 3/03/24	sáb 9/03/24
132		**2.6.6**	**OTROS**		**4 días**		**dom 10/03/24**	**mié 13/03/24**
133		2.6.6.1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	1un	1 día	131	dom 10/03/24	dom 10/03/24
134		2.6.6.2	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE)	1gb	1 día	133	lun 11/03/24	lun 11/03/24
135		2.6.6.3	RETIRO DE MOBILIARIO(SILLAS AUDIOTORIO) EN LUGAR QUE SE DISPONGA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ICA	1gb	2 días	134	mar 12/03/24	mié 13/03/24
136		**2.7**	**C. SUMINISTRO DE MOBILIARIO (FUERA DE AIU)- IVA INCLUIDO**		**3 días**		**jue 14/03/24**	**sáb 16/03/24**
137		2.7.1	SUMINISTRO DE SILLAS AUXILIARES PARA AUDITORIO (45X45X72) ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO. ESPALDAR Y ASIENTO INDEPENDIENTES	60un	3 días	135	jue 14/03/24	sáb 16/03/24
138		**3**	**FIN PROYECTO**		**0 días**	**137**	**sáb 16/03/24**	**sáb 16/03/24**
139								
140		4						
141								
142								
143								
144								
145		5						

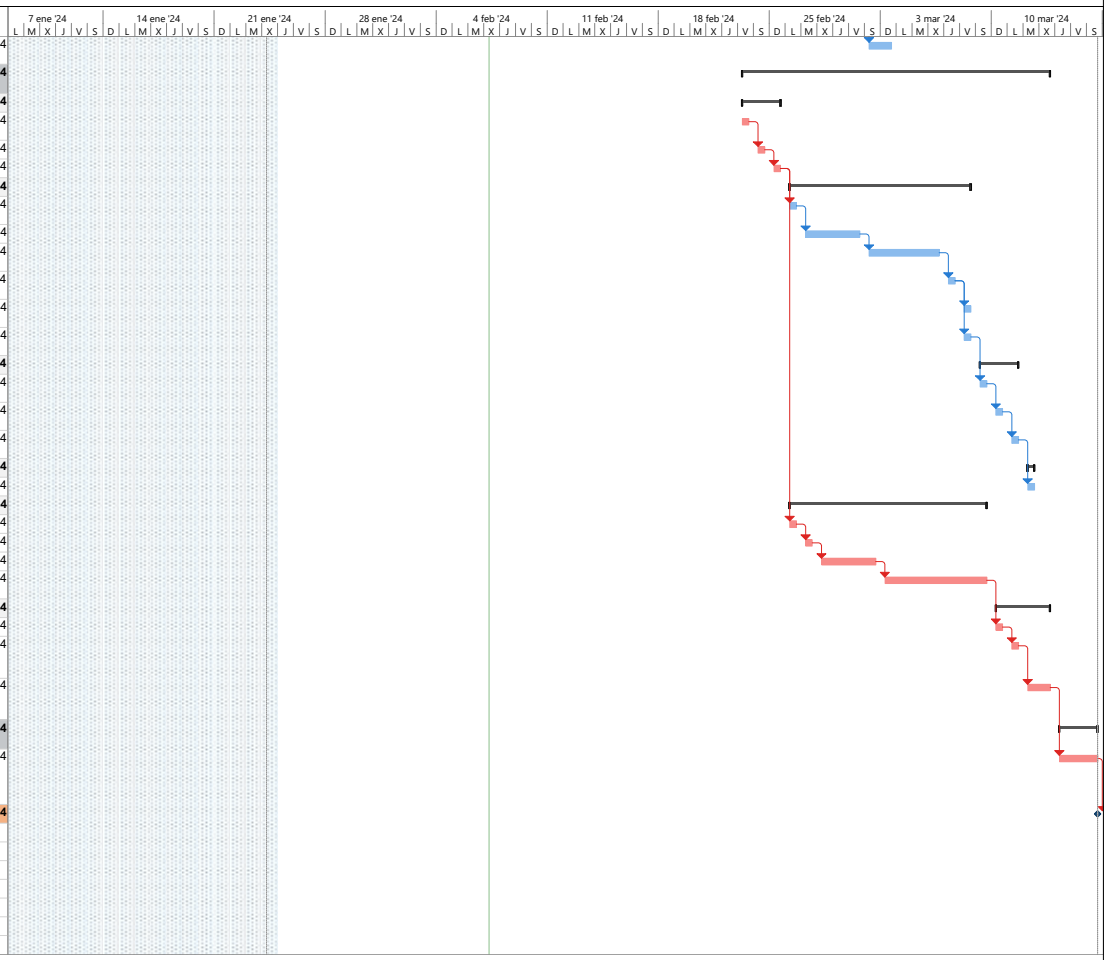

INTERVENTORÍA
CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
R.L. JUAN CARLOS ANTOLÍNEZ FLÓREZ
C.C. No. 1.032.457.698 expedida en la ciudad de Bogotá D.C.

UT LABORATORIO BOGOTA 2023
R.L. CAROLINA REYES PEÑA
Cc. 46376047

Ing. JAIRO MATEUS HERRERA
Director de Obra

Proyecto: PROGRAMACIÓN
Fecha: mié 7/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Ing. Waldo Jesus Ortiz R.
Director de Interventoría

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

Cronograma

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 26 de febrero de 2024, 22:01
Para: CAROLINA REYES PEÑA <lareyes50@hotmail.com>

Bogotá D.C.

Febrero 26 de 2024.

Señora:
CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTA 2023
NIT. 901.779.746 – 8
TELÉFONO: (+57 – 1) - 311 287 34 26.
DIRECCIÓN: CARRERA 30A N. 17-55 - BRR BELLA VISTA EN BOGOTÁ D.C.

Cordial saludo. Mediante el presente de forma anexa enviamos el Cronograma de Actividades aprobado por la Interventoría con las firmas respectivas.

Solicitamos subir dicho Cronograma al Secop II y enviar por este medio el soporte del cargue.

Atentamente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
[El texto citado está oculto]

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.pdf
1354K
