
DIAGRAMA DE GANTT

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL INICIA EN LA MINTERSECCIÓN DE LA RUTA 78 (VÍA CHINÚ-LORICA) Y CONTINÚA HASTA EL COREGIMIENTO DE SAN MATEO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO LOCALIZADO SOBR**	**117 días**	**mar 12/09/23**	**mié 27/03/24**	
2	INICIO	0 días	mar 12/09/23	mar 12/09/23	
3	**PRELIMINARES**	**10 días**	**mar 12/09/23**	**sáb 23/09/23**	
4	Trazado, localizacion y replanteo	10 días	mar 12/09/23	sáb 23/09/23	2
5	**EXPLANACION**	**43 días**	**lun 25/09/23**	**jue 04/01/24**	
6	Excavacion en material comun de la explanacion y canales	25 días	lun 25/09/23	jue 26/10/23	4
7	Conformacion de la calzada existente	25 días	mié 18/10/23	jue 04/01/24	8FC-20 días
8	Transporte de material proveniente de la excavacion de la explanación para distancias	25 días	mar 10/10/23	jue 28/12/23	6FC-12 días
9	**SUB-BASE**	**25 días**	**mar 07/11/23**	**mié 24/01/24**	
10	SubBase granular para pavimento	25 días	mar 07/11/23	mié 24/01/24	7FC-10 días
11	**CONCRETOS**	**44 días**	**mié 24/01/24**	**mar 19/03/24**	
12	Pavimento en concreto hidraulico, MR: 3,8 Mpa	18 días	jue 08/02/24	vie 01/03/24	10FC-15 días,14
13	Bordillos de concreto clase D, 3000 psi	7 días	lun 11/03/24	mar 19/03/24	16
14	Concreto estructural para estructuras de drenaje (Aliviaderos), 21 Mpa	12 días	mié 24/01/24	jue 08/02/24	17,10
15	**ACEROS**	**52 días**	**jue 04/01/24**	**lun 11/03/24**	
16	Acero para bordillos	7 días	vie 01/03/24	lun 11/03/24	12
17	Acero de refuerzo para estructuras de drenaje	7 días	jue 04/01/24	lun 15/01/24	7
18	**SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO**	**5 días**	**mar 19/03/24**	**mié 27/03/24**	
19	Señalizacion de la via. Incluye señales tipo pare y/o la señalizacion necesaria indicada	5 días	mar 19/03/24	mié 27/03/24	13
20	**OTROS**	**117 días**	**mar 12/09/23**	**mié 27/03/24**	
21	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	117 días	mar 12/09/23	mié 27/03/24	2
22	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	117 días	mar 12/09/23	mié 27/03/24	2
23	CARACTERIZACION VIAL	117 días	mar 12/09/23	mié 27/03/24	2
24	FINAL	0 días	mié 27/03/24	mié 27/03/24	19,21,22,23




Proyecto: PROG.CHINÚPAVIMENTO
Fecha: lun 27/02/24

Tareas críticas	Línea de base	Resumen del proyecto
División crítica	División de la línea de base	Tareas externas
Progreso de tarea crítica	Hito de línea de base	Hito externo
Tarea	Hito	Fecha límite
División	Progreso del resumen	
Progreso de tarea	Resumen	

DIAGRAMA DE GANTT

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL INICIA EN LA MINTERSECCIÓN DE LA RUTA 78 (VÍA CHINÚ-LORICA) Y CONTINÚA HASTA EL COREGIMIENTO DE SAN MATEO

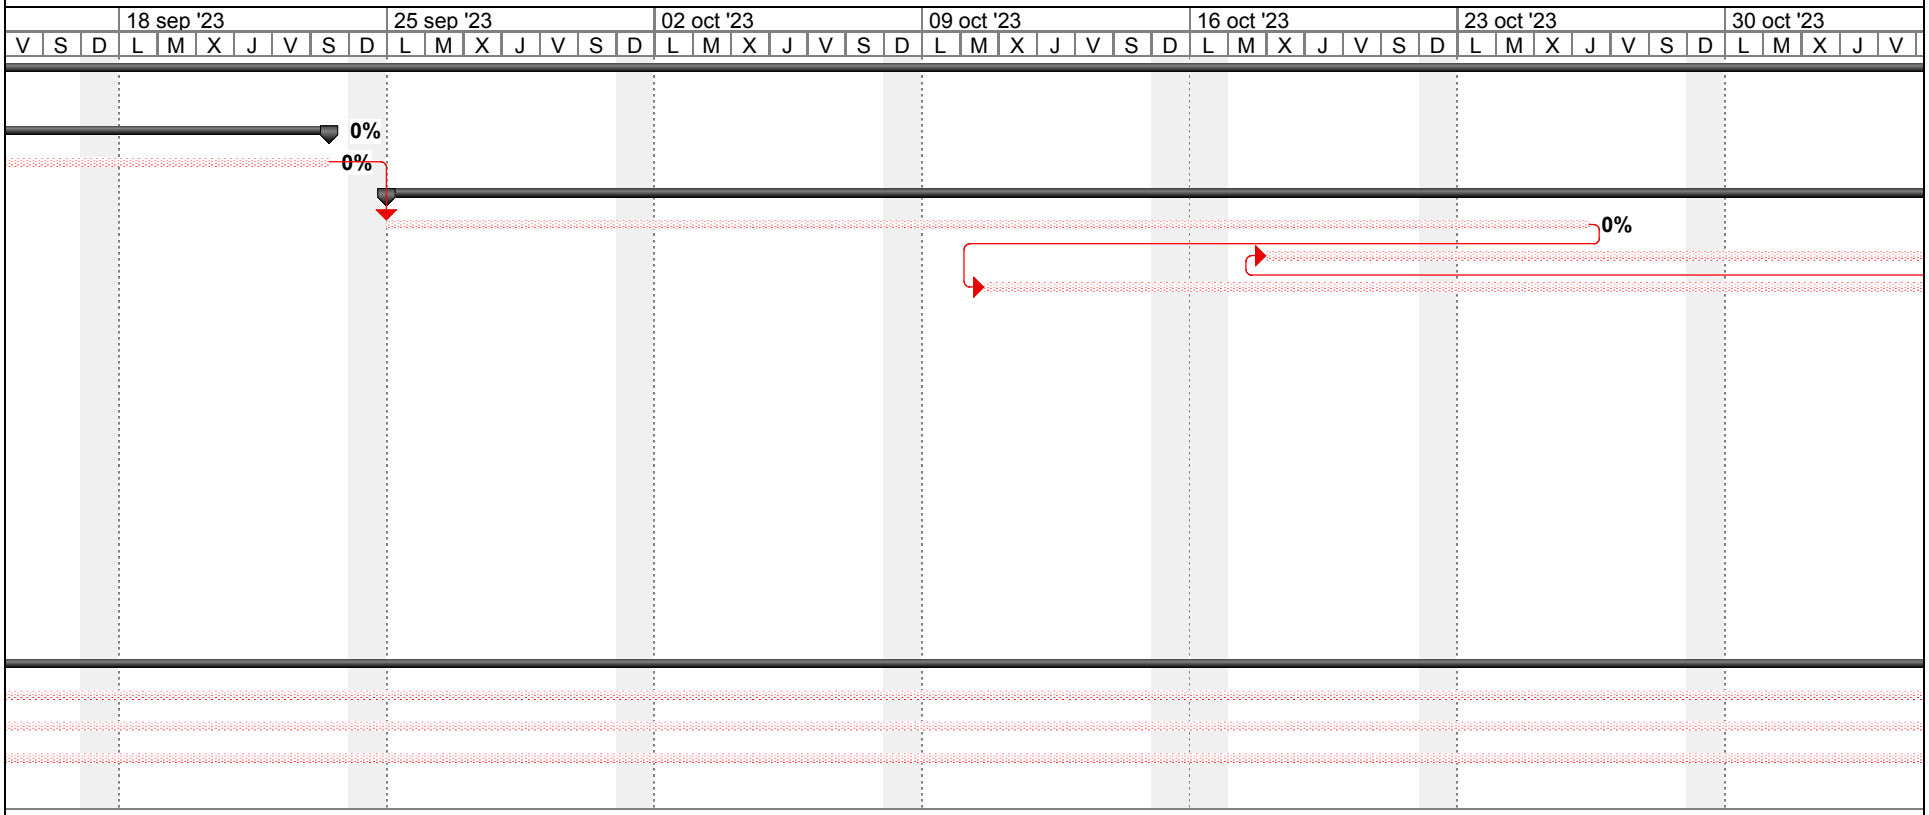


Proyecto: PROG.CHINÚPAVIMENTO
Fecha: lun 27/02/24

Tareas críticas	Línea de base	Resumen del proyecto
División crítica	División de la línea de base	Tareas externas
Progreso de tarea crítica	Hito de línea de base	Hito externo
Tarea	Hito	Fecha límite
División	Progreso del resumen	
Progreso de tarea	Resumen	

DIAGRAMA DE GANTT

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL INICIA EN LA MINTERSECCIÓN DE LA RUTA 78 (VÍA CHINÚ-LORICA) Y CONTINÚA HASTA EL COREGIMIENTO DE SAN MATEO

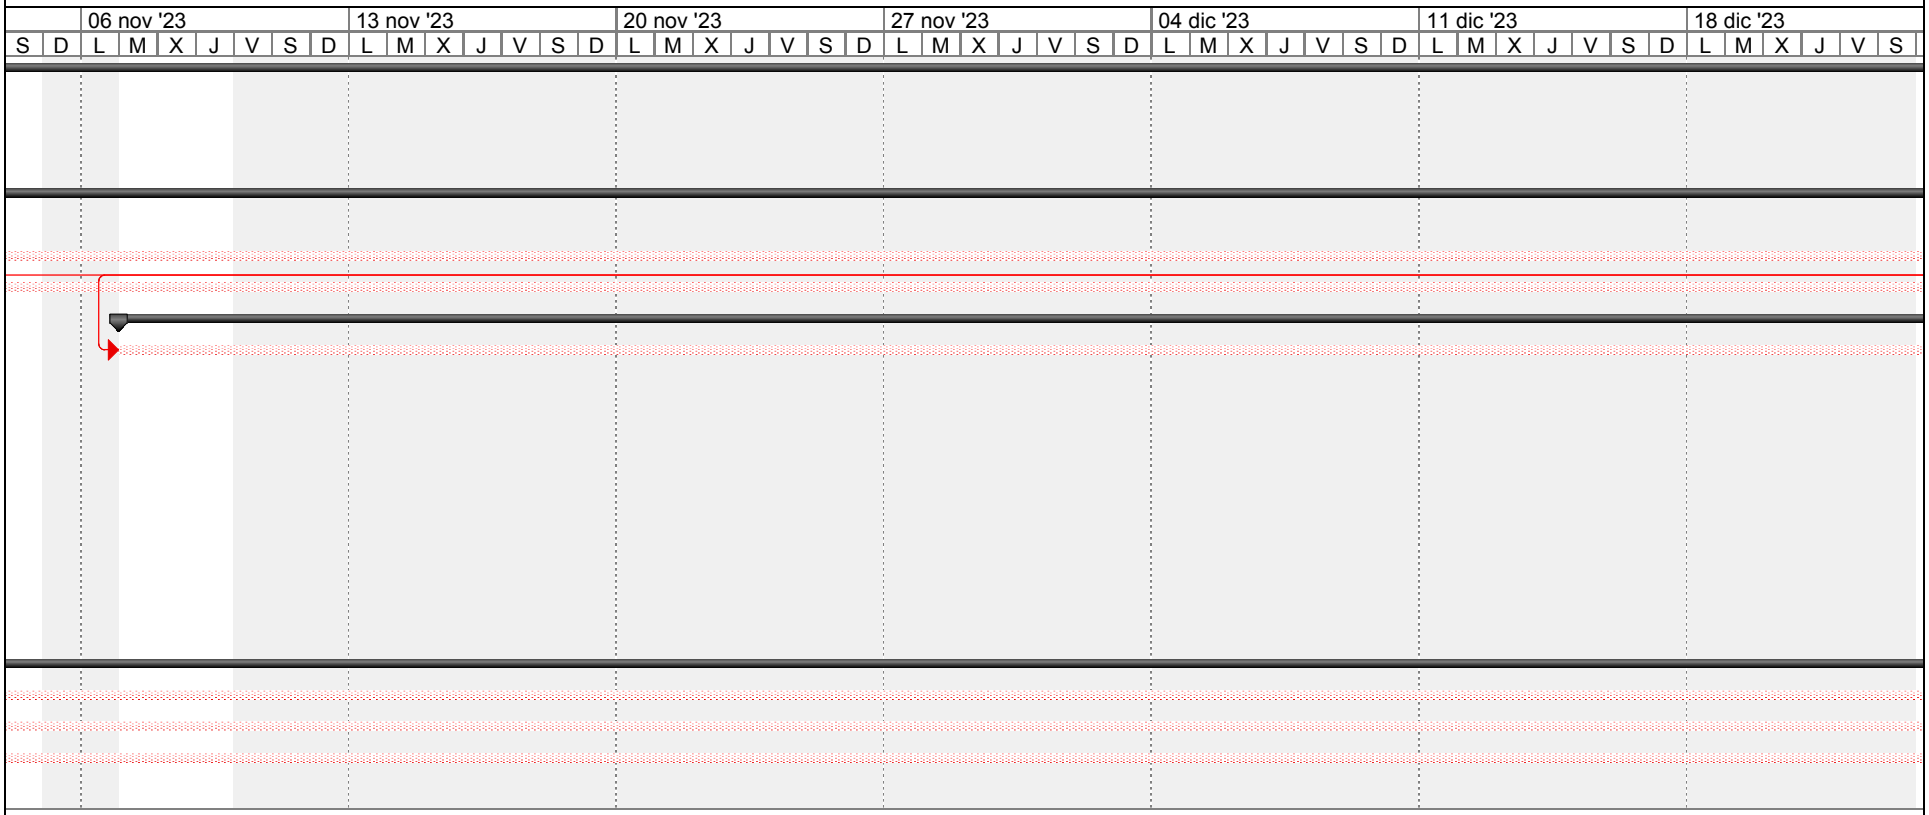


Proyecto: PROG.CHINÚPAVIMENTO
Fecha: lun 27/02/24

Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
Tarea		Hito		Fecha límite	
División		Progreso del resumen			
Progreso de tarea		Resumen			

DIAGRAMA DE GANTT

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL INICIA EN LA MINTERSECCIÓN DE LA RUTA 78 (VÍA CHINÚ-LORICA) Y CONTINÚA HASTA EL COREGIMIENTO DE SAN MATEO

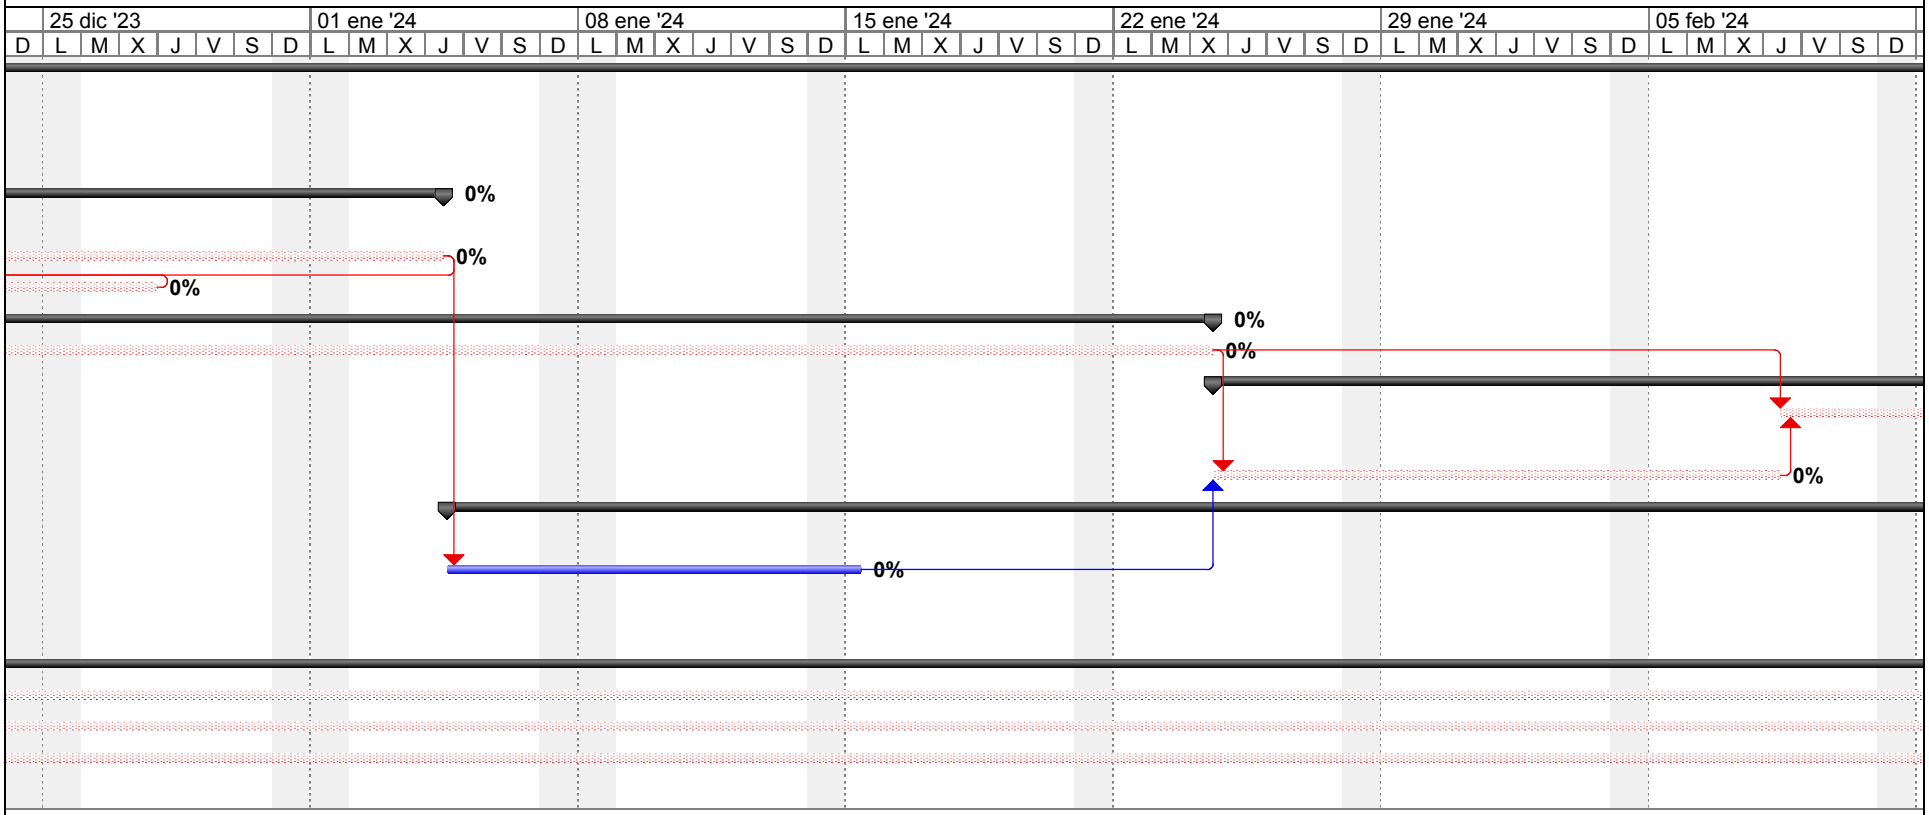


Proyecto: PROG.CHINÚPAVIMENTO
Fecha: lun 27/02/24

Tareas críticas	Línea de base	Resumen del proyecto
División crítica	División de la línea de base	Tareas externas
Progreso de tarea crítica	Hito de línea de base	Hito externo
Tarea	Hito	Fecha límite
División	Progreso del resumen	
Progreso de tarea	Resumen	

DIAGRAMA DE GANTT

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL INICIA EN LA MINTERSECCIÓN DE LA RUTA 78 (VÍA CHINÚ-LORICA) Y CONTINÚA HASTA EL COREGIMIENTO DE SAN MATEO

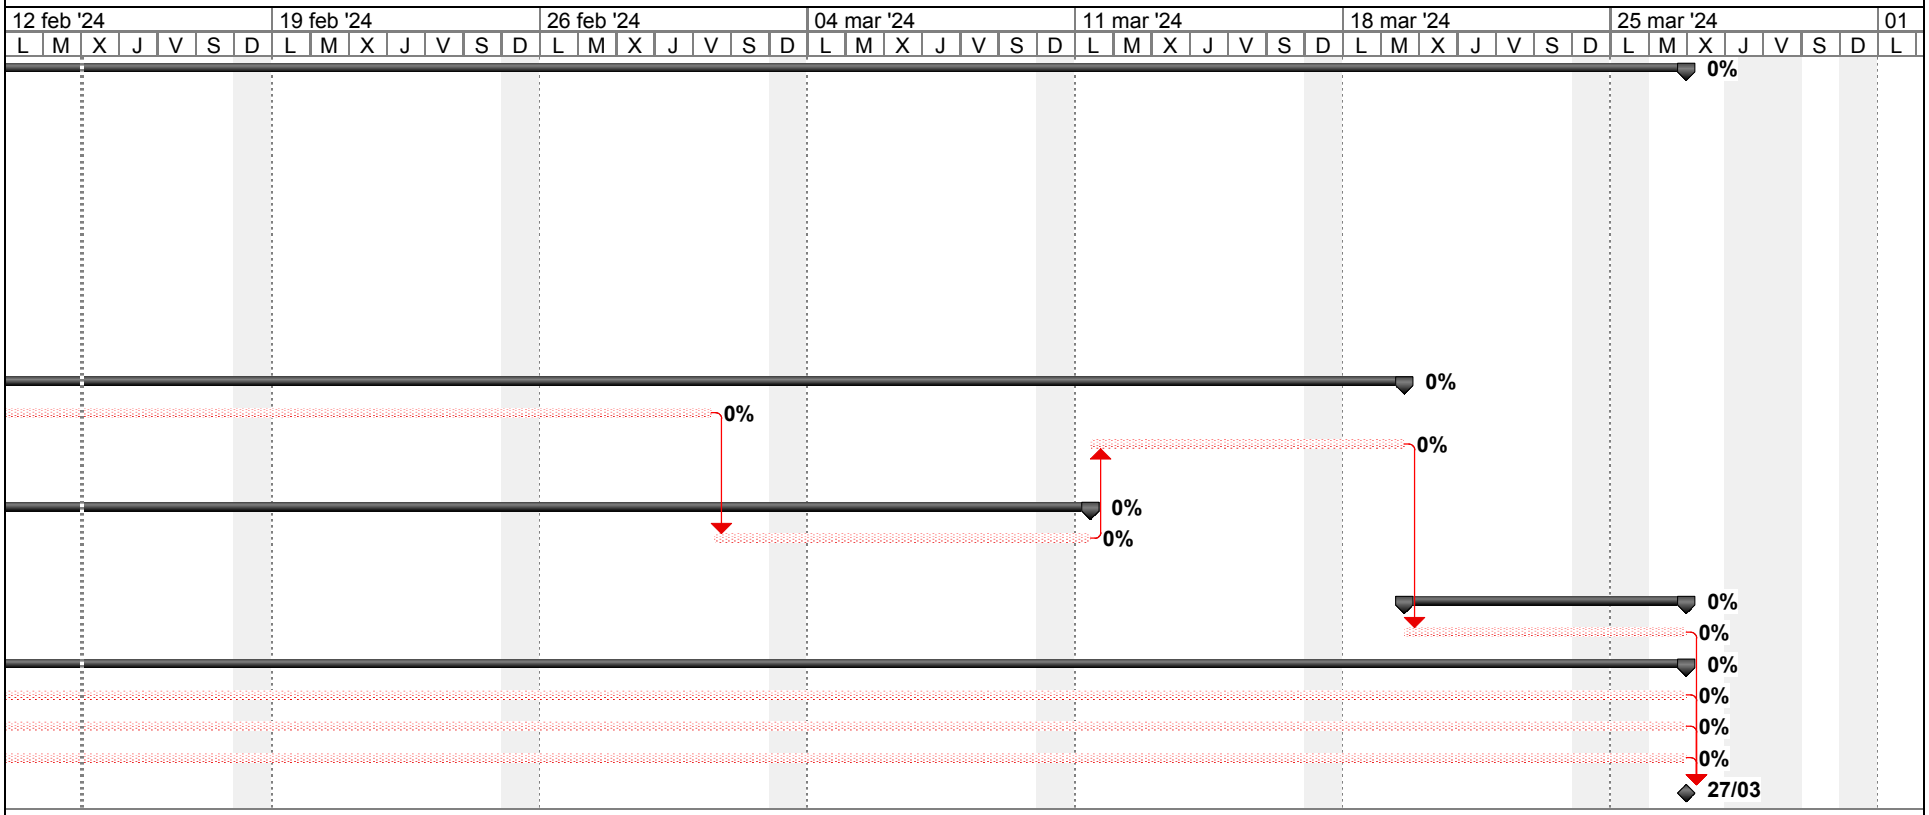

Proyecto: PROG.CHINÚPAVIMENTO
Fecha: lun 27/02/24

Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
Tarea		Hito		Fecha límite	
División		Progreso del resumen			
Progreso de tarea		Resumen			
