

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FÚTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA "LUIS F. GÓMEZ NIÑO" CACOM N°2 - VILLAVICENCIO (META).

FECHA	HORA	ANOTACIÓN	FIRMA
29/12/2023	09:15	SE INGRESA AL SITIO DE OBRA EN COMPAÑÍA DEL SR. TE ÁLVARO BOHÓRQUEZ Y AT. ANDRÉS PAEZ, REALIZANDO RECORRIDO DE OBRA CANCHA Y SALONES A INTERVENIR. SE SOLICITA UN SITIO PARA INSTALACIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA Y SE ASIGNA UN KIOSKO PARA ACOPIO DE MATERIAL Y SALÓN DE ESTUDIO PARA OFICINA PERSONAL RESIDENTE OBRA Y SISO.	
30/12/2023	07:00	INGRESO A SITIO DE OBRA CON 1 OFICIAL DE OBRA, 2 AYUDANTES, ING. RESIDENTE. SE REALIZA REPLANTEO Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS.	
	11:30	SE INGRESA MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO Y ARENA DE RÍO.	
	14:30	INGRESO A OBRA 100 BULTOS DE CEMENTO.	
	17:00	SALIDA DEL PERSONAL DE OBRA SE DEJAN NIVELES DE EXCAVACIÓN Y PENDIENTE PARA ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA.	
01/12/2023	09:00	SE REALIZA INGRESO A OBRA, SE PRESENTA DEMORA POR PARTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA GUARNICIÓN, PRESENTANDO RETRASO EN EL INGRESO	
	11:00	SE INICIA FUNDIDA DE SOBRECIMIENTO EN ESPESOR DE 0,15 m CON PENDIENTE DE 1,5% SE TOMAN MEDIDAS Y SE REALIZA ADECUACIÓN DE TUBERÍA DE 3" PARA DESAGÜES INTERNOS DE CANCHA CADA 5 m Y SEPARACIÓN DE 4 m DESDE EL CENTRO 2/4 DE CANCHA.	
	16:30	FINALIZA FUNDIDA DE PRIMER 1/4 DE CANCHA POR COSTADO MÁS LARGO, SE UTILIZA FIBRA POLIPILEO EN REEMPLAZO DE MALLA ELECTROSOLDADA	

FECHA	HORA	ANOTACIÓN	FIRMA
02122023	08:00	SE REALIZA INGRESO PERSONAL DE OBRA 01 ING. RESIDENTE, 01 PROFESIONAL SISO, 01 OFICIAL 03 AYUDANTES.	
	09:00	SE REALIZA FUNDIDA TRAMO 02 EJE LONGITUDINAL SE VERIFICA QUE NO HAYA AGRIETAMIENTO DE PRIMER TRAMO FUNDIDO, SE HIDRATA Y SE CONTINÚA CON FUNDIDA MANUAL (TROMPO).	
	13:00	SE FINALIZA FUNDIDA VERIFICANDO NIVELES Y DESAGÜES.	




04122023	07:00	SE REALIZA INGRESO PERSONAL DE OBRA 01 RESIDENTE DE OBRA, 01 PROFESIONAL SISO, 01 OFICIAL 04 AYUDANTES. SE REALIZA ESTIRAMIENTO Y VERIFICACIÓN CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL DE OBRA X PARTE DE PROF. SISO. SE REALIZA JORNADA ADMINISTRATIVA ELENADO DE FORMULARIOS PARA INGRESO.	
0	09:00	SE INICIA FUNDIDA DE PLACA SOBRECIMIENTO ESPESOR ± 7 cm EN TRAMO 2. SE VERIFICAN MAESTRAS Y CONTINUIDAD DE PENDIENTE 1,5%.	
	16:30	FINALIZA FUNDIDA TRAMO #2 CON FIBRA SINTÉTICA NO SE OBSERVA AGRIETAMIENTO DEL TRAMO #1 Y 1/4 DE TRAMO #2.	
5122023	09:00	SE REALIZA INGRESO PERSONAL DE OBRA 01 RESIDENTE, 01 PROF. SISO, 01 OFICIAL, 03 AYUDANTES. SE SE PRESENTA A LABORAR 01 AYUDANTE SE REALIZA RETIRAMIENTO POR PARTE DE PROFESIONAL SISO. SE INICIA FUNDIDA TRAMO #3	




	10:15	INICIA LLUVIA FUERTE SE SUSPENDE ACTIVIDAD DE FUNDIDA.	
	16:30	SE PROCEDE SALIDA DEL PERSONAL SE SUSPENDIÓ FUNDIDA POR CONDICIONES DE CLIMA.	
/22023	07:00	INGRESA PERSONAL DE OBRA 01 ING. RESIDENTE, 01 PROF. SISO, 01 OFICIAL, 03 AYUDANTES. SE RETOMA FUNDIDA DE TRAMO #3 SUSPENDIDO POR CONDICIONES DE CLIMA.	


FECHA	HORA	ANOTACIÓN	FIRMA
	08:00	SE CORRIGE TUBERÍA DE DESAGÜE INTERNA DE CANCHA, UBICADA EN TERCER TRAMO DEBIDO A LA FALTA DE PENDIENTE NECESARIA PARA EVACUAR EFICIENTEMENTE EL AGUA DE ESCORRENTÍA. SE REALIZA PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍA	





	11:00	SE INICIA ACTIVIDAD DE FUNDIDO DE PLACA DE SOBRECRIJO EN TRAMO #3, RESPETANDO PENDIENTES.	
	16:30	FINALIZA ACTIVIDAD DE FUNDIDA SIN CONTRATIEMPOS.	



	16:40	FINALIZA LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE GRADERÍA CON HIDROLAVADORA Y ÁCIDO PARA SER PINTADAS SEGÚN COLOR QUE DEFINA POR LA SUPERVISIÓN	
07/12/2023	07:00	SE INGRESA A SITIO DE OBRA 01 ING. RESIDENTE, 01 PROFESIONAL SISO, 01 OFICIAL, 04 ESTUDIANTES SIN INCONVENIENTES. HACE BUEN CLIMA Y SE INICIA PREPARATIVOS PARA FUNDIR FINALIZACIÓN DE 3ER TRAMO EN CONCRETO DE ESPECIFICACIÓN DE 3500 PSI PARA CANCHA SINTÉTICA.	
	10:00	SE VERIFICAN NIVELES DE 4TO TRAMO, ENCONTRANDO QUE DICHO TRAMO SE ENCUENTRA A UN DESNIVEL DE 17 CM DE DIFERENCIA, POR LO TANTO SE AUTORIZA FUNDIR A ESA PROFUNDIDAD Y ESPESOR PARA CONSERVAR PENDIENTE DE 1,5%	



	16:30	FINALIZA FUNDIDA 4 TRAMO SIN INCONVENIENTE CONSERVANDO PENDIENTES Y BANQUEOS ACABADO FINAL.	
	17:00	FINALIZA ACTIVIDAD DE LAVADO GRADERÍA COMPLETA Y SE DEFINE POR LA SUPERVISIÓN PINTARLA EN [illegible]	

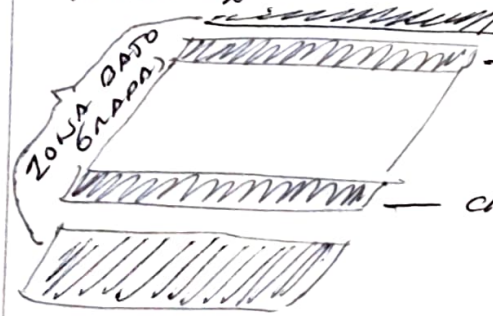FECHA	HORA	ANOTACIÓN	FIRMA.
09 12 2023	08:00	SE INGRESA A LA OBRA OI INGENIERO RESIDENTE OI SISO, OI OFICIAL, OS AYUDANTES. SE INICIA ACTIVIDAD DE PINTURA EPOXICA SOBRE GRADERÍA DE ALTO TRAFICO AVALADA POR LA SUPERVISIÓN ASÍ COMO EXCAVACIÓN LATERAL PARA CANAL DE DESAGÜE EN DOBLE NIVEL CON PROFUNDIDAD DE 0,40 m * 0,30 * SEGÚN DISEÑO.	
			
	09:00	SE CONTINÚA ACTIVIDAD DE CURADO DE PLACA PARA QUE ALCANCE LA RESISTENCIA ADECUADA PARA LA INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE 30 mm. SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES.	
	16:30	FINALIZA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN DE CANALES PERIMETRALES QUEDANDO SITIO DE OBRA SEÑALIZADO PERIMETRALMENTE PARA EVITAR ACCIDENTES.	
11 12 2023	08:00	SE PRESENTA INCONVENIENTE A LA HORA DE INGRESO POR PARTE DE GUARDIA DE COMPLEJO POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LISTADOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD LO COMPLETOS.	
	09:00	SE REALIZA MAÑANA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCIÓN ESTUDIOS DE SEGURIDAD	
	13:00	SE INICIA FUNDIDA DE CANALES LATERALES SEGÚN DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL., ASÍ MISMO SE RELLENA DE ALISTA SUPERFICIE BAJO GRADAS PARA FUNDIR SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA. AVALADA POR LA SUPERVISIÓN	
			
12 2023	07:00	SE REALIZA INGRESO A SITIO DE OBRA, EN LA NOCHE SE PRESENTAN LLUVIAS QUE IMPIDEN CONTINUAR CON ACTIVIDAD DE PINTURA SOBRE GRADAS ACTIVIDAD QUE PRESENTA UN AVANCE DEL 50%. SE CONTINÚA CON FUNDIDA BAJO GRADERÍA SIN CONTRATIEMPOS.	

FECHA	HORA	ANOTACIÓN	FIRMA.
13/12/2023	07:00	INGRESA EL PERSONAL DE OBRA 01 ING. CIVIL, 01 PROFESIONAL SISO, 01 OFICIAL, 03 AYUDANTES. SE REALIZA ACTIVIDAD DE PINTURA, EXCAVACIÓN PARA ACOMETIDA ELECTRICA Y DE SOM LLUVIA PARA ILUMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA.	
	16:30	SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES SIN NOVEDADES.	
14/12/2023	07:00	INGRESA PERSONAL DE OBRA 01 ING. RESIDENTE 01 PROFESIONAL SISO, 01 OFICIAL Y 03 AYUDANTES SE REALIZAN ACTIVIDAD DE PINTURA Y EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTES PERIMETRALES DE CANCHA SINTÉTICA	
	14:30	LLEGADA DE POSTES PERIMÉTRALES PARA MINCADO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD. POR VISITAS DOMICILIARIAS A OFICIAL Y UN AYUDANTE.	
15/12/2023	07:00	INGRESA PERSONAL A OBRA 01 ING. CIVIL, 01 PROFESIONAL SISO, 02 AYUDANTES, 01 OFICIAL. SE INICIA ACTIVIDAD DE HINCADO DE POSTES PERIMETRALES DE CANCHA, 06 EN TOTAL.	
	14:00	FINALIZA ACTIVIDAD DE PINTADO DE GRADAS.	
	15:00	POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO PEDIDO DE GRAMA 50 MM, SIN AFECTACIÓN A ITEM CONTRACTUAL, NI QUE GENERE VALORES ADICIONALES AL CONTRATO, NI MODIFICACIÓN DEL MISMO. EN CONTRAPRESTACIÓN SE AUTORIZA ACTIVIDAD DE PINTURA ADICIONAL A GRADERÍA DE COLISEO EXISTENTE.	
16/12/2023	07:00	SE INGRESA PERSONAL DE OBRA 01 ING. CIVIL 01 PROF. SISO, 01 OFICIAL, 03 AYUDANTES. SE REALIZA EXCAVACIÓN DE CANALES DE CANCHA HASTA CANAL AGUAS LLUVIAS AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.	
	10:00	LLEGADA DE GRAMA SINTÉTICA DE 50 MM SOLICITADO POR LA SUPERVISIÓN SIN NOVEDAD.	
18/12/2023	07:00	INGRESA PERSONAL DE OBRA 01 ING. CIVIL, 01 PROF. SISO, 01 OFICIAL, 01 ELECTRICO, 01 INSTALADOR GRAMA, 03 AYUDANTES. SE INICIA CABLEADO ELECTRICO, (ADICIONAL), ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LA GRAMA SINTÉTICA, PRESENTACIÓN DEL TAPETE Y MEDIDAS DE CORTE.	
	16:30	SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NINGUNA NOVEDAD.	

FECHA	HORA	ANOTACIÓN	FIRMA
19/12/2023	07:00	SE PERMITE INGRESO A OBRA DE 01 ING. CIVIL, 01 PROFESIONAL SISO, 01 INSTALADOR GRAMA SINTETICA, 01 ELÉCTRICO, 01 OFICIAL 02 AYUDANTES. POR MOTIVOS DE LLUVIA EN HORAS DE LA NOCHE Y MADRUGADA NO SE REALIZA PEGADO DE SUPERFICIES DE GRAMA SINTETICA TENIENDO EN CUENTA QUE PARA EL CORRECTO PEGADO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE SECO Y LIMPIO. SE CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE CABLEADO A PUNTOS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, PINTURA CIELO RASO Y AJUSTE DE PIEZAS DE CIELO RASO A SEDE COLEGIO SALONES PRIMARIA, Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A CANCHA.	
	16:30	SE FINALIZA JORNADA EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS.	
20/12/2023	07:30	SE PERMITE EL INGRESO A PERSONAL DE OBRA POR CONDICIONES PERSISTENTES DE LLUVIA NO SE PERMITE EL SECADO COMPLETO DE PAÑETES DE GRAMA, SITUACIÓN QUE RETRASA EL PEGADO DEFINITIVO DE PLIEGUES Y EL CORTE DE LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, SE AVANZA EN LAS INSTALACIÓN DE CABLEADO, PINTURA SALONES Y PASILLOS DEL COLEGIO Y RECORTE DE LÍNEAS DE DEMARCACIÓN.	
	16:30	SE RETIRA EL PERSONAL DE OBRA SIN NOVEDAD.	
21/12/2023	07:00	SE PERMITE INGRESO A PERSONAL DE OBRA, SE RETOMAN ACTIVIDADES DE PINTURA, SALONES SECADO DE PLIEGUES PARA PEGADO TAPETE CANCHA SINTETICA, INSTALACIÓN PUNTOS ELECTRICO, TABLERO Y CIRCUITO DE LUCES.	
	10:00	LLEGADA DE GRANO DE CAUCHO Y ARENA DE SILICE PARA CANCHA SINTETICA. LA CANCHA TODAVÍA PRESENTA HUMEDAD DEBAJO DEL TAPETE, SE VERIFICAN ORIENTES Y PUNTOS MAL DE MANERA ADECUADA	
22/12/2023	07:00	SE PERMITE EL INGRESO A PERSONAL DE OBRA POR CONDICIONES FAVORABLES DE CLIMA SE INICIA LA INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y PEGADO DE TAPETE DE GRAMA SINTETICA.	
	16:30	SE SUSPENDE ACTIVIDAD POR CONDICIONES DE CLIMA. LLUVE ESPORADICAMENTE	

FECHA	HORA	ANOTACIÓN	FIRMA
23/12/2023	07:00	SE PERMITE EL INGRESO AL PERSONAL DE OBRA SE RETOMAN ACTIVIDADES DE PEGADO DE PLUMOS DE GRAMA SINTETICA, PINTURA SALONES Y DESMONTE DE CIELO RASO	
	16:30	SE RETIRA EL PERSONAL DE OBRA SIN NOVEDAD	
24/12/2023	07:30	SE PERMITE EL INGRESO AL PERSONAL DE OBRA SE CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE PUNTOS ELECTRICOS, Y PUESTA A PUNTO DE CIRCUITOS. SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE DEMARCACIÓN DE CANCHAS.	
	13:00	SE RETIRA EL PERSONAL DE OBRA SIN NOVEDAD	
26/12/2023	07:30	DIA: SE RETOMAN ACTIVIDADES EL DIA 26/12/23 SE REALIZA INGRESO A SITIO DE OBRA, SE CONTINÚA CON LA DEMARCACIÓN DE LA CANCHAS SINTETICA, ESPARCIDO DE ARENA DE SILICE Y GRANO DE CAUCHO, SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES Y CRONOMETRO DIGITAL LUMINARIA PANEL LED 60X60 EN SALONES, ESTRUCTURADO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC.	
	17:00	SE SOLICITA PERMISO A LA INTERVENTORÍA PARA EXTENDER JORNADA LABORAL HASTA LAS 22:00 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE OBRA Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	
	22:00	SE RETIRA EL PERSONAL DE OBRA SIN NOVEDADES.	
27/12/2023	07:30	SE PERMITE EL INGRESO A OBRA DEL PERSONAL. SE CONTINÚA CON EXTENDIDA DE GRANO DE CAUCHO Y ARENA DE SILICE; SE INSTALA LUMINARIA LED EN SALONES Y SE RETOCA DETALLES DE PINTURA.	
	11:00	LLEGA MALLA PERIMETRAL Y SE INICIA INSTALACIÓN SE SOLICITA PERMISO PARA LABORAR HASTA 22:00 HORAS, SE INSTALA PUERTA BATIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS SE INSTALA Y TIEMPLA MALLA EN ARCOS, SE REFUERZO PUNTOS PENALES Y CENTROS.	
		SE FINALIZA ACTIVIDADES EN SALONES Y CANCHA SINTÉTICA SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA. SE DEJA NOVEDAD POR LA INTERVENTORÍA SIN NOVEDAD.	
