	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

CONTRATO No	2546	**DE**	2023	**FECHA ACTA**	**DD**	**MM**	**AA**		**COMITE**
					26	12	2023		15

CONTRATISTA	SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S NIT. 900.356.395-7 R/L. EDGAR JIMENEZ CARREÑO
OBJETO	REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARIA DE MOVILIDAD		
HORA DE INICIO:	12:50 PM	**HORA FINAL:**	
CONVOCA:	SECRETARIA DE MOVILIDAD – INTERVENTORIA – CONTRATISTA- DESPACHO		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE MOVILIDAD		
VALOR	TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($3.119.029.300) M/TE		
MODIFICATORIA N°1	TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 3.119.013.720,00) M/CTE		
MODIFICATORIA N°2	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 4.476.364.155,00) M/CTE		
PLAZO	TRES (3) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
CONTRATO INTER No	2577 DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023 NIT. 901.741.067-0 R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
OBJETO	INTERVENTORIA PARA REALIZAR LA MODERNIZACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
VALOR	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($197.959.817,00) M/CTE		
MODIFICATORIA N°1	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($284.579.613,00) M/CTE		
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	4 DE MARZO DEL 2024		
SUPERVISOR			
APOYO SUPERVISION			


OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:
1. Avance de obra 2. actividades pendientes por ejecutar parcial 1 3. terminación armario san Gregorio, respuesta planeación. 4. definición 3 bases para semáforo incluidas en la adicional.

5. entrega de reprogramación ajustada a la adicional suscrita.
6. constitución de reservas presupuestales
7. llegada de equipos e instalación según programación


SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1			
2			
3			
4			

LOCALIZACION DEL PROYECTO

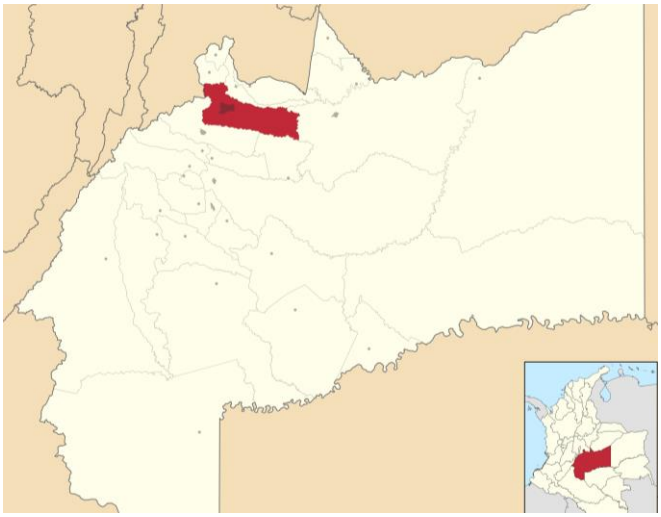



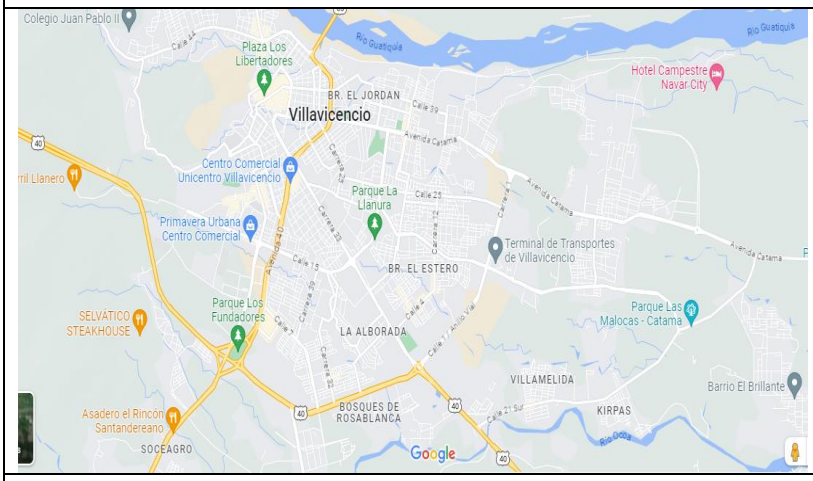




Referencia	No	Direccion	Pto de refrencia (Interseccion Semaforica)	Numero de Grupos	Controlador
		AVENIDA 40			
Corredor Ecologico	1	Av 40 con calle 11	KIA	7	1
Corredor Ecologico	2	Av 40 con Cra 38	Registraduria	4	1
Corredor Ecologico	3	Av 40 con Cra 26	San benito	6	1
Corredor Ecologico	4	Av 40 con calle 25G	C.C Unicentro	5	1
		TOTALES AVENIDA 40			**4**
		CALLE 15			
Corredor Ecologico	5	Cra 37D con calle 15	ETB	3	1
Corredor Ecologico	6	Cra 36 con calle 15	8va de la esperanza	3	1
Corredor Ecologico	7		Dominos	6	1
Corredor Ecologico	8	Cra 45 con calle 15	Colegio Dptal CDE	5	1
Corredor Ecologico	9	Av 40 con calle 15	C.C Villacentro	5	1
Corredor Ecologico	10	Cra 40 con calle 15	C.C Primavera	7	1
Corredor Ecologico	11	Cra 43 con calle 15	Clinica Ocular	6	1
		TOTALES CALLE 15			**7**

		INTERSECCIONES CON EQUIPOS NUEVOS		Numero de Grupos	Controlador
Interseccion Con Equipo Nuevo	12	Calle 39 X Cra 30	Cruz Roja	2	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	13	Calle 41 X Cra 30	Contraloria	2	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	14	Cra 29 X Calle 36	Iglesia Divino Niño	5	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	15	Cra 29 X Calle 35	Bomberos	4	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	16	Cra 25 X Calle 35	Colegio Caldas	5	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	17	Cra 24 A X Calle 35	San Gregorio	3	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	18	Cra 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	5	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	19	Cra 1 X Calle 35	Cai Catama	4	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	20	Cra 1 x Calle 15 (Anillo Vial)	Terminal de Transportes	6	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	21	Cra 34 X Calle 1 (Anillo Vial	Alcala	5	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	22	Anillo Vial X Cra 36	chevrolet	4	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	23	Cra 34 X Calle 35	Barzal Bajo	2	1
Interseccion Con Equipo Nuevo	24	Cra 32 x Calle 35	Parque del Hacha	8	1
		TOTALES INTERSECCIONES CON EQUIPO NUEVO			**13**


ANALISIS DEL ALCANCE SEGÚN MODIFICATORIA N°2

CAPITULO	VALOR CAPITULO	%
OBRAS CIVILES	$ 456.393.183,00	10,20%
SEMAFORIZACION	$ 2.163.097.840,00	48,32%
ESTRUCTURA METALICA	$ 81.379.728,00	1,82%
COMPONENTES ELECTRICOS	$ 981.720.101,00	21,93%
COMPONENTES ELECTRONICOS	$ 89.342.066,00	2,00%
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEMAFORICO	$ 83.120.061,00	1,86%
SUMINISTROS	$ 621.311.176,08	13,88%
VALOR TOTAL	**$ 4.476.364.155,08**	**100,00%**

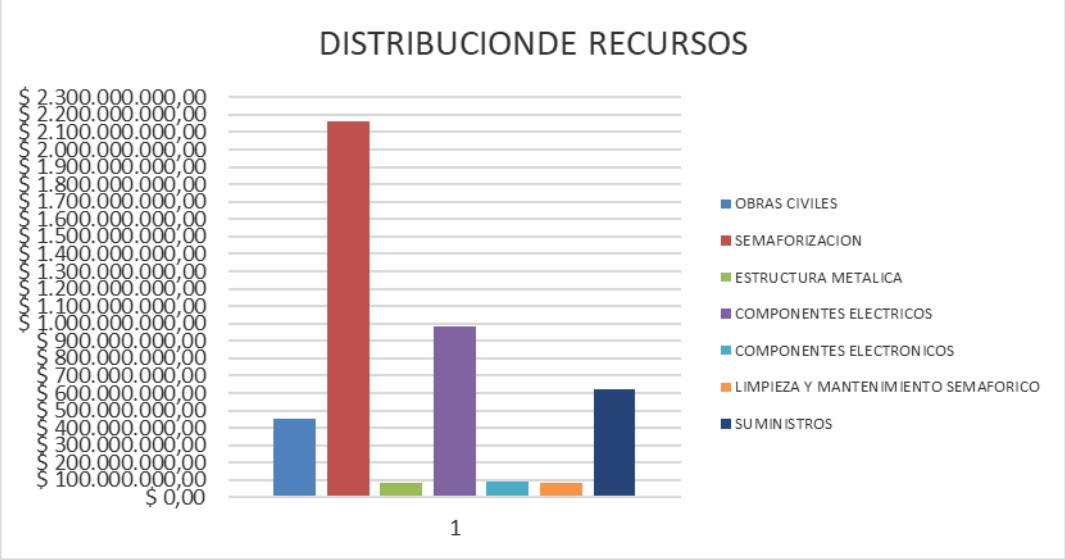


ANÁLISIS DE AVANCE Y ATRASOS SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA:

Fecha de inicio:	05 de septiembre de 2023		
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023		
Fecha de terminación actualizada	4 de marzo 2024		
Plazo Inicial:	3 meses y 27 días		
Plazo actualizado	6 meses		
Días transcurridos:	112 días		
% transcurrido en tiempo:	61,68%		
Avance programado $:	$ 902.761.597,90	% avance programado	20,167%
Avance ejecutado $:	$1.548.418.219,60	% avance ejecutado	34,59%
Atraso o avance	$ 645.656.621,70	% atraso o avance	14,4237%

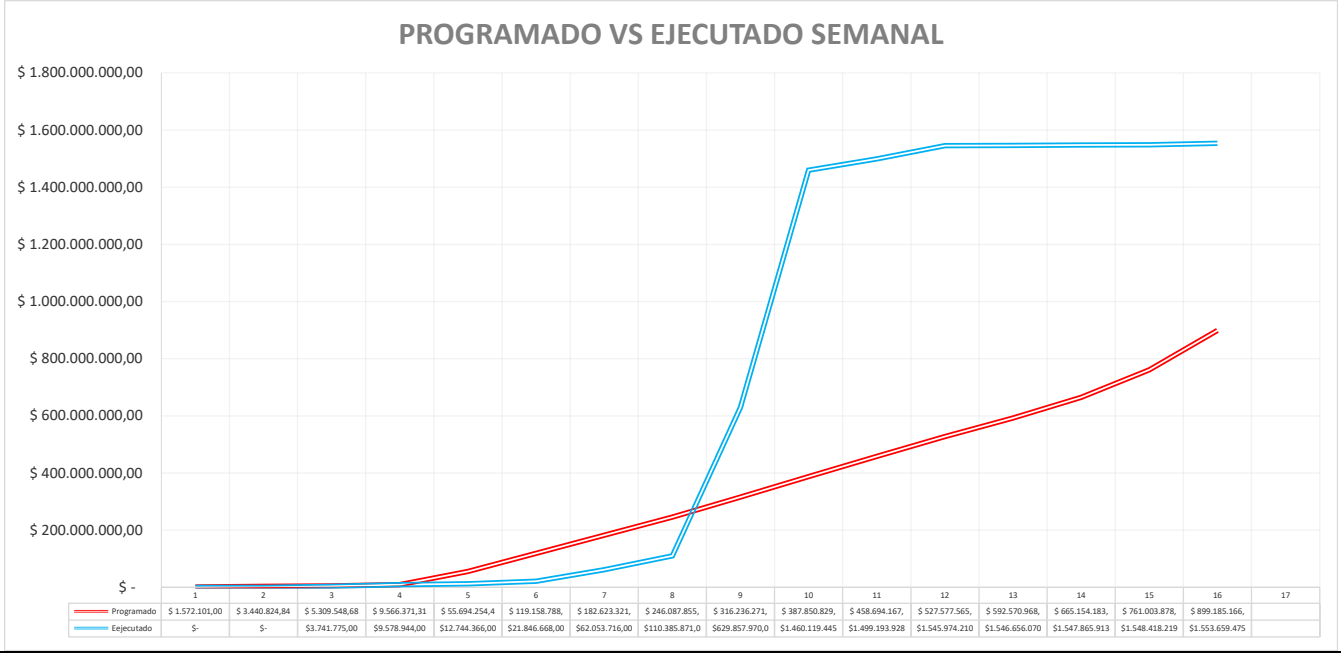

CAPITULO	VALOR CAPITULO	%	VALOR PROG POR CAPITULO	% PROG	EJECUTADO CAPITULO	% EJECUTADO	ATRASO	ADELANTO	%
OBRAS CIVILES	$ 456.393.183,00	10,20%	$ 456.393.184,04	100,00%	$ 274.118.887,60	60,06%	$ 182.274.296,44	$ -	-39,94%
SEMAFORIZACION	$ 2.163.097.840,00	48,32%	$ 86.159.616,22	3,98%	$ 998.509.355,00	46,16%	$ -	$ 912.349.738,78	42,18%
ESTRUCTURA METALICA	$ 81.379.728,00	1,82%	$ 16.568.790,37	20,36%	$ -	0,00%	$ 16.568.790,37	$ -	-20,36%
COMPONENTES ELECTRICOS	$ 981.720.101,00	21,93%	$ 231.007.310,07	23,53%	$ 195.000.000,00	19,86%	$ 36.007.310,07	$ -	-3,67%
COMPONENTES ELECTRONICOS	$ 89.342.066,00	2,00%	$ 14.730.201,20	16,49%	$ 24.892.208,00	27,86%	$ -	$ 10.162.006,80	11,37%
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEMAFORICO	$ 83.120.061,00	1,86%	$ 51.076.998,64	61,45%	$ 25.626.250,00	30,83%	$ 25.450.748,64	$ -	-30,62%
SUMINISTROS	$ 621.311.176,08	13,88%	$ 46.825.497,32	7,54%	$ 30.271.518,90	4,87%	$ 16.553.978,42	$ -	-2,66%
VALOR TOTAL	**$ 4.476.364.155,08**	**100,00%**	$ 902.761.597,86		$ 1.548.418.219,50	34,59%	$ 276.855.123,94	$ 922.511.745,58	

MES	SEMANA	DEL	AL	$ PROGRAMADO	$ ACUMULADO	% PROGRAMADO	% ACUMULADO	$ EJECUTADO	$ ACUMULADO	% EJECUTADO	% ACUMULADO
MES 1	SEMANA 1	4/09/2023	10/09/2023	$ 1.572.101,00	$ 1.572.101,00	0,035%	0,035%	$ -	$ -	0,00%	0,00%
	SEMANA 2	11/09/2023	17/09/2023	$ 1.868.723,84	$ 3.440.824,84	0,042%	0,077%	$ -	$ -	0,00%	0,00%
	SEMANA 3	18/09/2023	24/09/2023	$ 1.868.723,84	$ 5.309.548,68	0,042%	0,119%	$ 3.741.775,00	$ 3.741.775,00	0,08%	0,08%
	SEMANA 4	25/09/2023	1/10/2023	$ 4.256.822,63	$ 9.566.371,31	0,095%	0,214%	$ 5.837.169,00	$ 9.578.944,00	0,13%	0,21%
	SEMANA 5	2/10/2023	8/10/2023	$ 46.526.824,71	$ 56.093.196,02	1,039%	1,253%	$ 3.165.422,00	$ 12.744.366,00	0,07%	0,28%
MES 2	SEMANA 6	9/10/2023	15/10/2023	$ 63.826.236,72	$ 119.919.432,74	1,426%	2,679%	$ 9.102.302,00	$ 21.846.668,00	0,20%	0,49%
	SEMANA 7	16/10/2023	22/10/2023	$ 63.826.236,72	$ 183.745.669,46	1,426%	4,105%	$ 40.207.048,00	$ 62.053.716,00	0,90%	1,39%
	SEMANA 8	23/10/2023	29/10/2023	$ 63.826.236,72	$ 247.571.906,18	1,426%	5,531%	$ 48.332.155,00	$ 110.385.871,00	1,08%	2,47%
	SEMANA 9	30/10/2023	5/11/2023	$ 70.510.119,12	$ 318.082.025,30	1,575%	7,106%	$ 519.472.099,00	$ 629.857.970,00	11,60%	14,07%
MES 3	SEMANA 10	6/11/2023	12/11/2023	$ 71.976.261,07	$ 390.058.286,37	1,608%	8,714%	$ 830.261.475,00	$ 1.460.119.445,00	18,55%	32,62%
	SEMANA 11	13/11/2023	19/11/2023	$ 71.205.041,70	$ 461.263.328,07	1,591%	10,304%	$ 39.074.483,00	$ 1.499.193.928,00	0,87%	33,49%
	SEMANA 12	20/11/2023	26/11/2023	$ 69.245.100,79	$ 530.508.428,86	1,547%	11,851%	$ 46.780.282,00	$ 1.545.974.210,00	1,05%	34,54%
	SEMANA 13	27/11/2023	3/12/2023	$ 65.355.105,77	$ 595.863.534,63	1,460%	13,311%	$ 681.860,00	$ 1.546.656.070,00	0,02%	34,55%
	SEMANA 14	4/12/2023	10/12/2023	$ 72.944.918,56	$ 668.808.453,19	1,630%	14,941%	$ 1.209.843,00	$ 1.547.865.913,00	0,03%	34,58%
MES 4	SEMANA 15	11/12/2023	17/12/2023	$ 96.113.795,31	$ 764.922.248,50	2,147%	17,088%	$ 552.306,60	$ 1.548.418.219,60	0,01%	34,59%
	SEMANA 16	18/12/2023	24/12/2023	$ 137.839.349,40	$ 902.761.597,90	3,079%	20,167%	$ -	$ 1.548.418.219,60	0,00%	34,59%
	SEMANA 17	25/12/2023	31/12/2023	$ 328.060.324,10	$ 1.230.821.922,00	7,329%	27,496%				
	SEMANA 18	1/01/2024	7/01/2024	$ 359.729.366,60	$ 1.590.551.288,60	8,036%	35,532%				
MES 5	SEMANA 19	8/01/2024	14/01/2024	$ 359.729.366,60	$ 1.950.280.655,20	8,036%	43,568%				
	SEMANA 20	15/01/2024	21/01/2024	$ 359.729.366,60	$ 2.310.010.021,80	8,036%	51,605%				
	SEMANA 21	22/01/2024	28/01/2024	$ 359.729.366,60	$ 2.669.739.388,40	8,036%	59,641%				
	SEMANA 22	29/01/2024	4/02/2024	$ 357.550.481,80	$ 3.027.289.870,20	7,988%	67,628%				
MES 6	SEMANA 23	5/02/2024	11/02/2024	$ 356.609.599,70	$ 3.383.899.469,90	7,967%	75,595%				
	SEMANA 24	12/02/2024	18/02/2024	$ 354.913.727,30	$ 3.738.813.197,20	7,929%	83,523%				
	SEMANA 25	19/02/2024	25/02/2024	$ 352.392.232,90	$ 4.091.205.430,10	7,872%	91,396%				
	SEMANA 26	26/02/2024	3/03/2024	$ 346.535.240,50	$ 4.437.740.670,60	7,741%	99,137%				
	SEMANA 27	4/03/2024	10/03/2024	$ 38.623.484,79	$ 4.476.364.155,00	0,863%	100,000%				

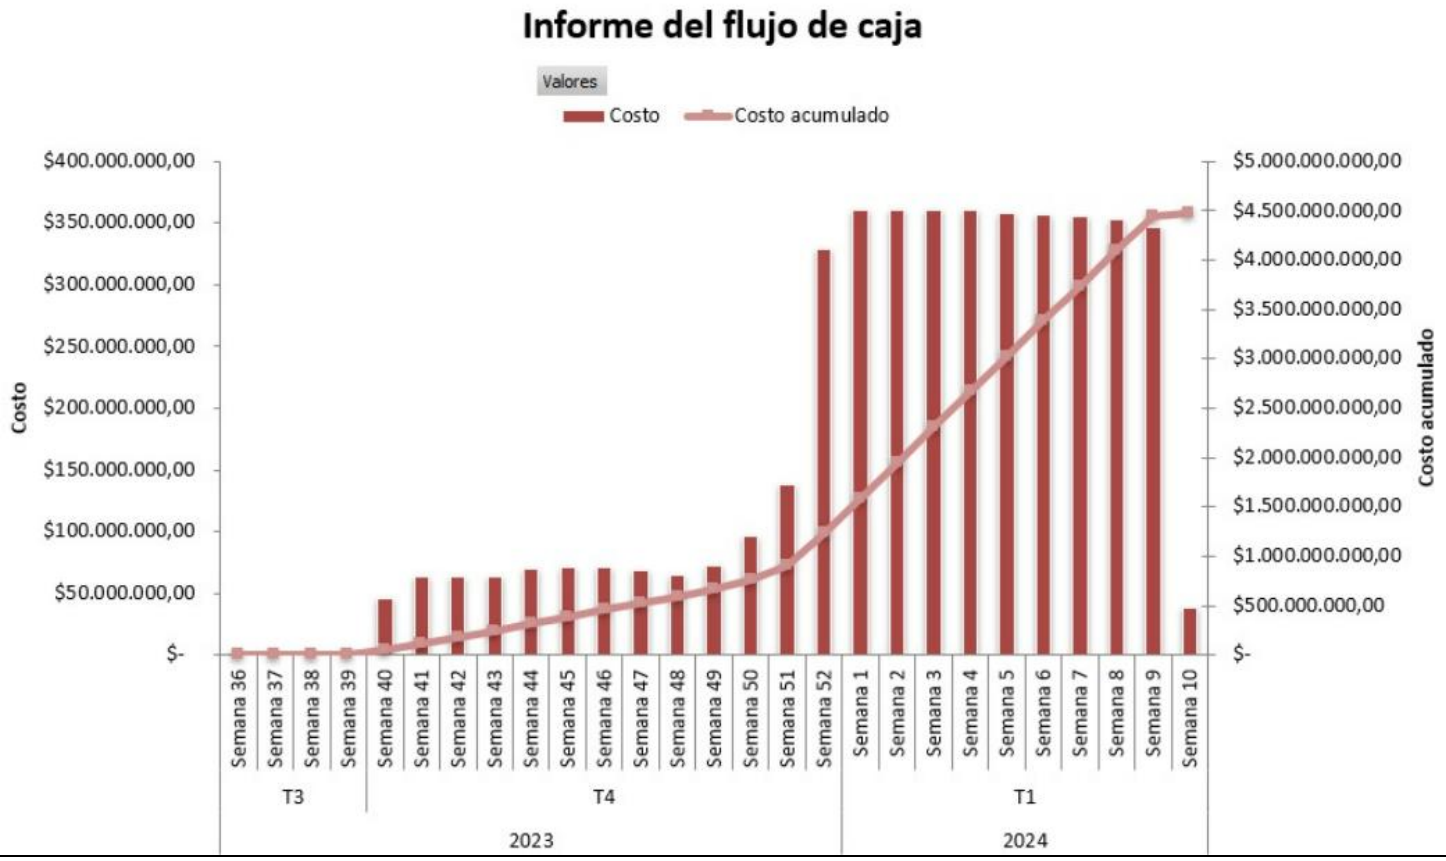

PERSONAL DE OBRA:

Personal administrativo:	3
Operadores maquinaria	0
Total	**3**
Personal operativo ayudantes:	2
Maestro de obra	1
Oficiales	0
Técnicos eléctricos	0
Jefe soldador	0
Soldadores	0
Total	**3**
Total, personal:	**6**

Frente de trabajo	Cantidad	Personal
Obras Civiles	1	3
Semaforización	0	0
Estructura Metálica	0	0
Componentes eléctricos	0	0
Componentes Electrónicos	0	0
Limpieza y Mantenimiento semafórico	0	0
Suministros	0	0

FRENTES DE TRABAJO:

EQUIPOS Y MAQUINARIA:


Equipo	Cantidad
Grúa extensión Montaje estructura Metal/postes	0
Equipo de soldadura	0
Hidro lavadora	0
Escalerilla Trans. Vertical	0
Herramienta menor	1


MATERIALES EN OBRA:

Descripción	Cantidad
Varilla 3/8	270
Bultos de cemento	190
Lonas de Mixto	660
Tubo eléctrico 2”	136
Curvas 2”	84

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	MANO DE OBRA - LEGALIZACION, PARAFISCALES, SALARIOS Y JORNALES	$ 175.712.171,00	$ 175.712.171,00	$ 175.712.171,00	$ -
2	COMPRA DE CONTROLADORES Y SEMAFOROS	$ 608.399.239,00	$ 608.399.239,00	$ 608.399.239,00	$ -
3	TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES	$ 34.000.000,00	$ 20.301.504,00	$ 20.301.504,00	$ 13.698.496,00
4	COMPRA CABLES, KIT SOLAR Y MATERIALES	$ 70.811.940,00	$ 84.510.436,00	$ 84.510.436,00	$ (13.698.496,00)
5	DESCUENTO 5% FOSE	$ 46.785.440,00	$ 46.785.440,00	$ 46.785.440,00	$ -
TOTAL		**$ 935.708.790,00**	**$ 0,00**	**$ 935.708.790,00**	**$ -**

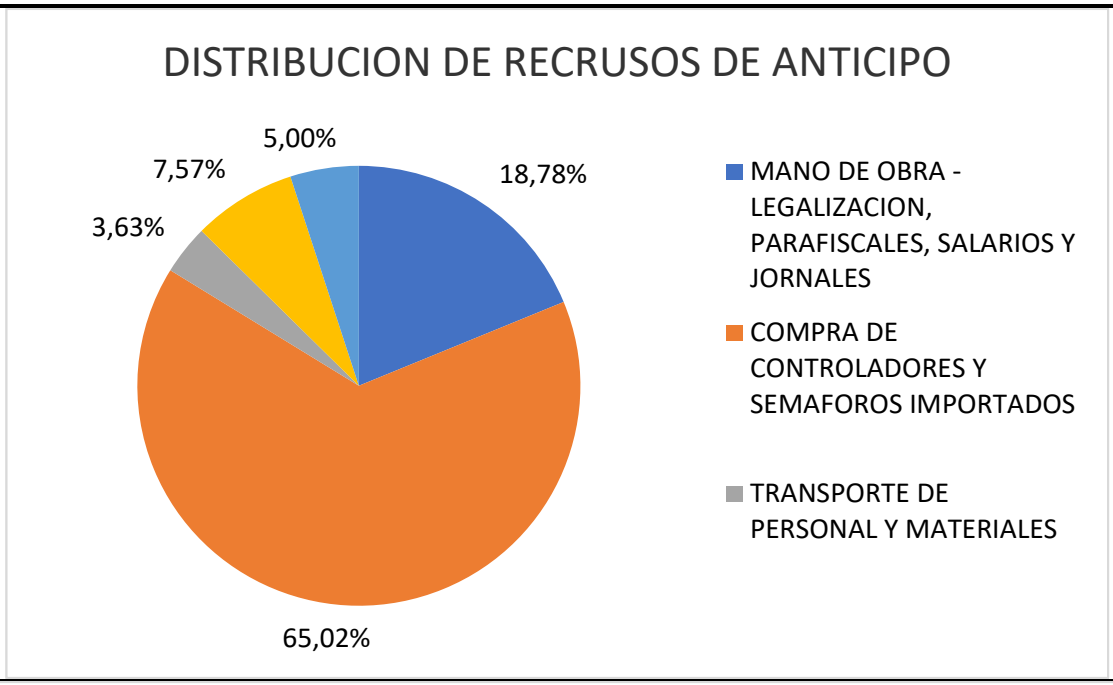

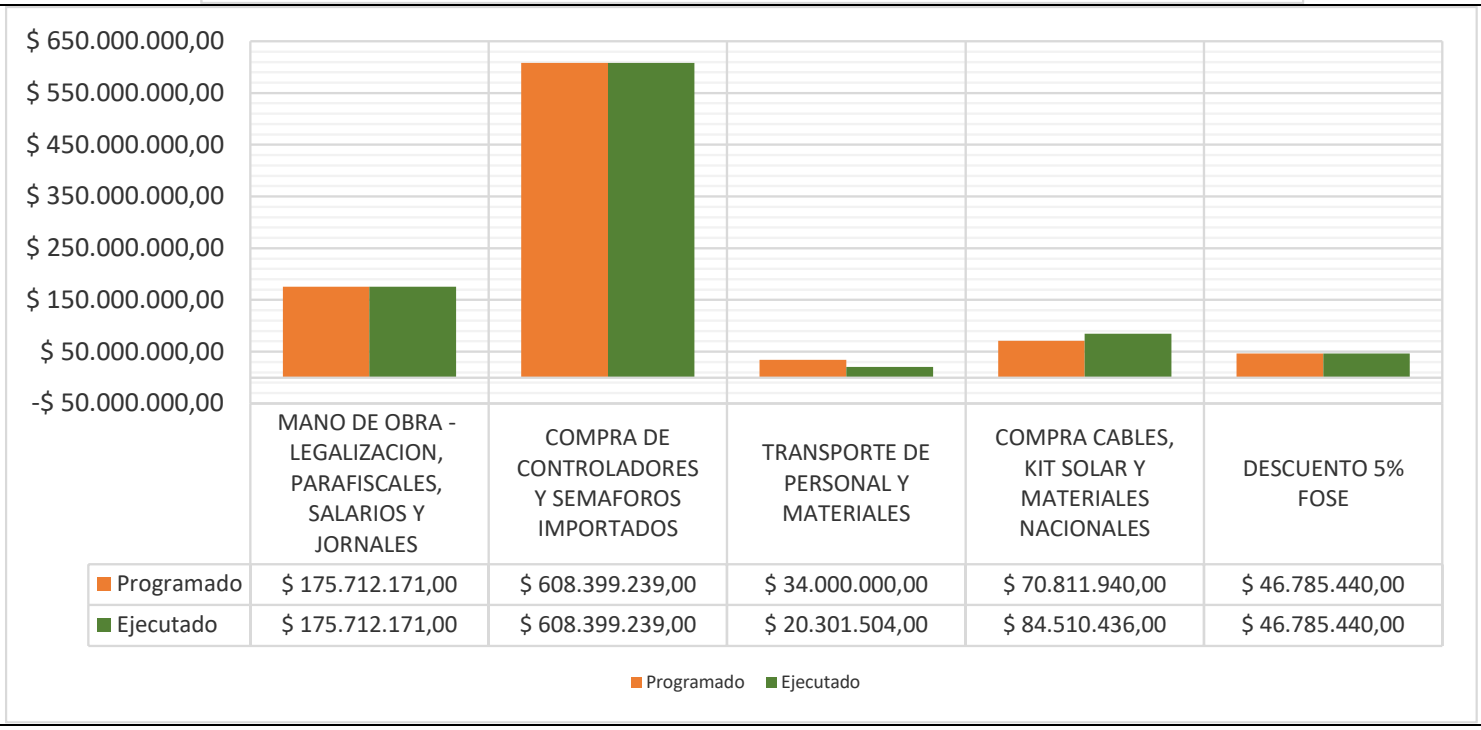

	MANO DE OBRA - LEGALIZACION, PARAFISCALES, SALARIOS Y JORNALES	COMPRA DE CONTROLADORES Y SEMAFOROS IMPORTADOS	TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES	COMPRA CABLES, KIT SOLAR Y MATERIALES NACIONALES	DESCUENTO 5% FOSE
Programado	$ 175.712.171,00	$ 608.399.239,00	$ 34.000.000,00	$ 70.811.940,00	$ 46.785.440,00
Ejecutado	$ 175.712.171,00	$ 608.399.239,00	$ 20.301.504,00	$ 84.510.436,00	$ 46.785.440,00

DESARROLLO DE LA REUNION Y OBSERVACIONES:

En el comité realizado con la participación de la Supervisión y el equipo de obra, se abordaron diversos aspectos del proyecto con el objetivo de asegurar su correcta ejecución. Interventoría de obra realiza el balance general, el resumen ejecutivo del estado de avance de obra a fecha y corte del sábado, 23 de diciembre de 2023, con el fin de esclarecer los avances en noción del tiempo y presupuesto, se sabe que la fecha de inicio fue el 5 de septiembre de 2023 y la fecha de terminación actualizada según modificatoria n°2 es el 4 de marzo de 2024, con un Plazo actualizado de 6 meses, y que, a la fecha de este comité, se cuenta con 112 días transcurridos, que en valor porcentual según adición es un valor de 34,71%.

La interventoría manifiesta los temas a tratar el día de hoy y son:
1. Avance de obra
2. actividades pendientes por ejecutar parcial 1
3. terminación armario san Gregorio, respuesta planeación.
4. definición 3 bases para semáforo incluidas en la adicional.
5. entrega de reprogramación ajustada a la adicional suscrita.
6. constitución de reservas presupuestales
7. llegada de equipos e instalación según programación

La supervisión manifiesta, dado a que la secretaria de planeación no dio Respuesta al oficio enviado en el mes de noviembre para la aclaración de espacio publico en las intersecciones de san Gregorio y barzal bajo, por la localización de los gabinetes en concreto, la supervisión realizara un oficio en respuesta a estas dos intersecciones, donde se explique y aclare que el andén es espacio público. Y así poder continuar con los trabajos de obras civiles en la intersección de san Gregorio.

La interventoría manifiesta que las actividades físicas que se han realizado de obra civil, los 24 armarios en concreto, están totalmente resanados en la parte exterior y queda pendiente resanar internamente, ya que las rejas están soldadas. En la intersección de ETB se realizo prueba de vandalismo dejando 3 candados toda la noche, y al otro día se habían llevado los candados. El día de hoy se están soldado 43 tapas fundidas con la lamina y quedan soldadas para prevenir robos. Se esta ejecutando una actividad que no está presupuestada, se demuele parte de la caja existen y se coloca la nueva base y se funde concreto y se solda la tapa.

La interventoría manifiesta la importancia de liquidar el anticipo. Con soportes, ordenes de operación, rendimientos y soportes y se radica. Ya que fue gastado en su totalidad.

El contratista manifiesta que para este periodo y dado el porcentaje ejecutado se podría pasar una parcial N2 de los siguientes items: PEDESTAL CON GABINETE EN CONCRETO REFORZADO CON REJA ANTIVANDALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO, SUMIN E INST SEMAFOROS VEHIC 200m.m. LED A MASTIL, SUMIN E INST SEMAFOROS VEHIC 200m.m. LED A MEMSULA T2, Semaforo Peatonal S3 - 2 X 200 Mastil, Desmonte semaforo S1, S2 y S3, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T1, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T1X, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 6 METROS Y ESTRUCTURA AJUSTABLE EN ALUMINIO PARA SOPORTAR 2 PANELES SOLARES DE 300 WATTS, SUMIN E INST MENSULAS 5.5 O 4.5 M INC ANCLAJE CONC, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 2X10 AWG PARA ACOMETIDA ELECTRICA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMAFOROS VEHICULARES, SUMINEINST CABLE DE CONTROL 4X16 AWG A 600 V, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MONOCRISTALINO DE 300 WATTS EN POSTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR PARA SISTEMA DE PANELES SOLARES - 24 Voltios DC a 110 VAC-60 Hz, Sistema de Polo a Tierra Para Paneles Solares y Equipos de Control, Suministro e instalación de desarrollo electrónico para normalización de intersecciones semaforizadas, Incluye sistema de respaldo eléctrico, SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE GEL DE CICLO PROFUNDO 120 Ah A 12 VOLTIOS, SUMINISTRO DE

PLATAFORMA WEB - SERVICIO POR UN AÑO - INCLUYE MODULO DE COMUNICACIÓN.

La interventoría manifiesta que se realizara revisión de las cantidades ejecutadas para la parcial y se realizara observaciones al contratista.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS


No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1				
2				
3				
4				

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL COMITÉ








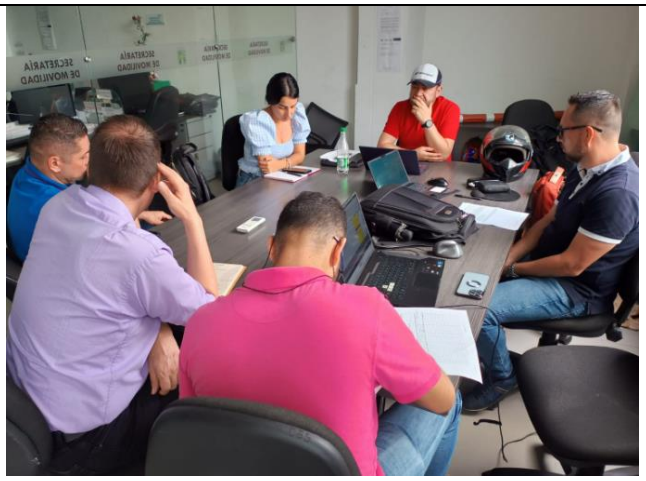

LISTA DE ASISTENCIA

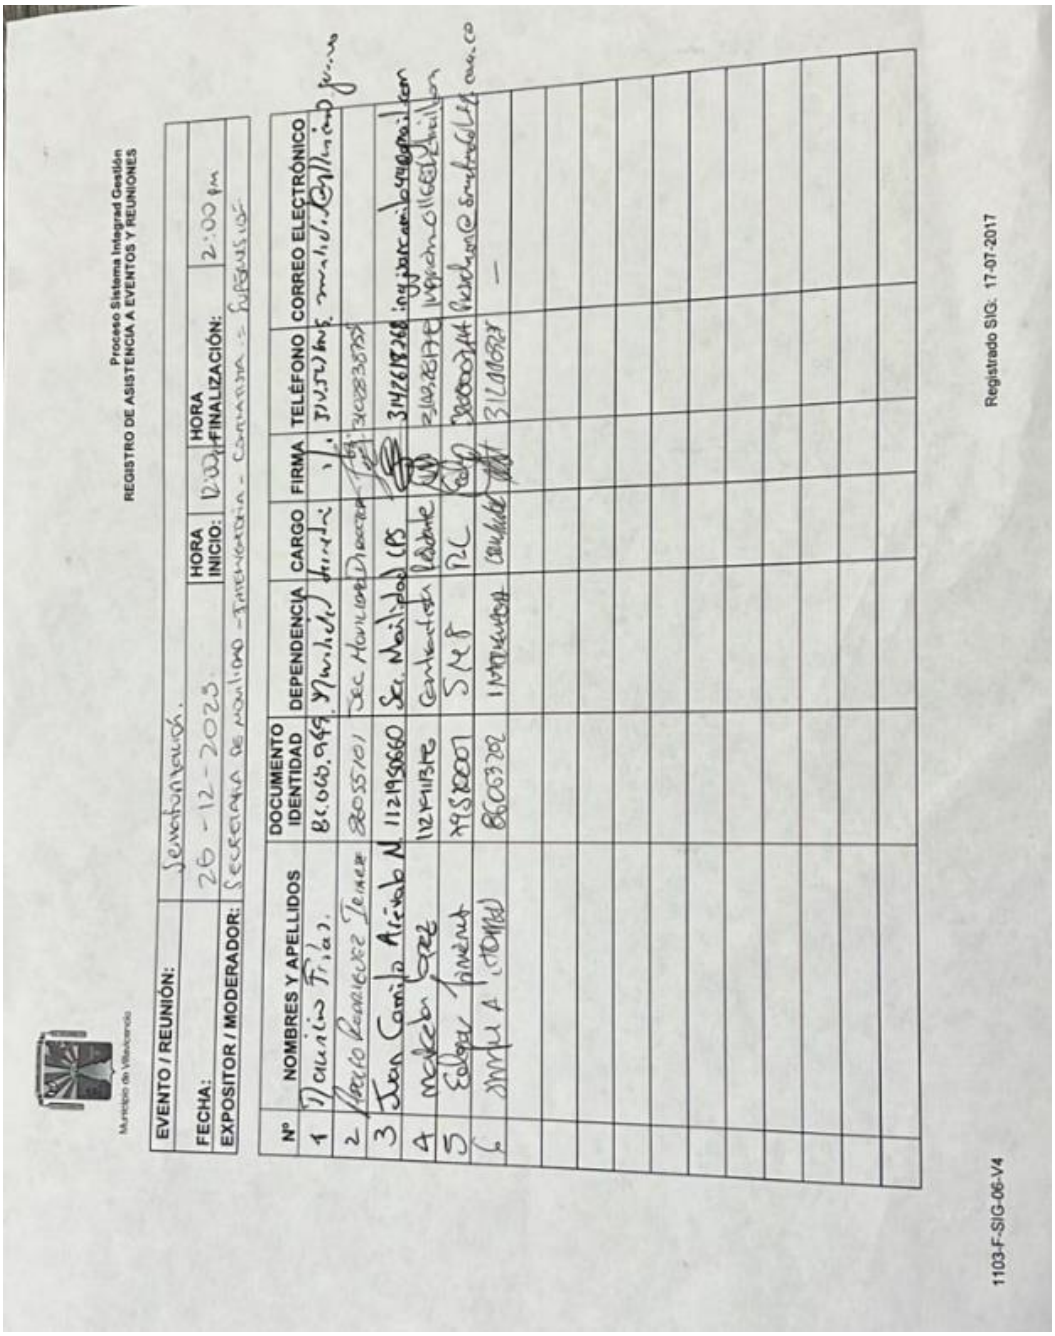

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

Municipio de Villavicencio

EVENTO / REUNIÓN: Sesión ordinaria.
FECHA: 26-12-2023 HORA INICIO: 12:00 pm HORA FINALIZACIÓN: 2:00 pm
EXPOSITOR / MODERADOR: Secretaría de Movilidad - Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Mauricio Frías.	86.060.949	Secretaría de Movilidad	Secretario		3125760	mauricio.frias@villavicencio.gov.co
2	Mario Rodríguez Tejada	80551101	Sec. Movilidad	Director		3102835758	
3	Juan Camilo Alcalde M.	1121950660	Sec. Movilidad	CPS		3147618268	ingjuancamilo@gmail.com
4	Mercedes Cruz	1121911376	Contratista	Abogada		3143182748	Mercedescruz1@hotmail.com
5	Edgar Jiménez	79580007	SMS	PC		3208003144	Mecharge@smsvillavicencio.com.co
6	JAIME A. (TORRES)	86063202	INTENDENCIA	CONDUCTOR		3114108927	—

Registrado SIG: 17-07-2017

1103-F-SIG-06-V4
