EL SUSCRITO SUPERVISOR
CERTIFICA

Que el contrato No. 285 de 2023, se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Nombre del Contratista	**Número Nit o C.C. y lugar expedición**	**No. informe**		
DC PROJECT S.A.S R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA	NIT. 901.410.401-8 C.C N° 1.061.686.538 de Popayán Cauca.	1	de	2

Fecha de presentación			**Periodo del informe:**		**Municipio prestación del servicio**
Día	**Mes**	**Año**	**De**	**Al**	
22	FEBRERO	2024	16/01/2024	14/02/2024	Mocoa

Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓ TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓ PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SE MOCOA EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA D MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUT TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA". DEL PLAN DE FOMENT 2023.		
Tipo de contrato:	Obra		
Fecha de Inicio	16/01/2024	**Fecha de Terminación**	14/02/2024
Plazo	45 días		
Valor total del contrato	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS ($ 179.995.091) MDA/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS Y GASTOSDIRECTOS E INDIRECTOS		
Prorrogas	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Adiciones	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Suspensiones	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Modificatorios	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Interventoría	No hubo interventoría. Se contrató un profesional Ingeniero Electrico como apoyo a la supervisión. El contrato es por OPS, por un valor de ocho millones de pesos $ 8.000.000.oo		
Nueva fecha de terminación	N/A		
Forma de pago	El INSTITUTO cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera; PAGOS POR ACTAS PARCIALES. Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de		

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

	recibo parciales, para el trámite de pago de la primera acta parcial, el contratista deberá demostrar haber ejecutado mínimo un 50% de la obra física y para el trámite de pago de la segunda acta parcial deberá acreditar haber ejecutado mínimo un 40% de la obra física, Para el trámite de cada acta parcial el contratista deberá aportar los siguientes documentos; informe de las actividades ejecutadas en la cual deberá contener registro fotográficos de la obra ejecutada, copia de la bitácora, planillas de los aportes a seguridad social y parafiscales del tiempo ejecutado, y Factura comercial del servicio prestado. PAGO FINAL: El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar la obra en las condiciones requeridas y de la presentación de informes requeridos con registros fotográficos y demás anexos propios de la ejecución y del recibo final de obra previa certificación de cumplimiento el supervisor de la entidad, sus informes y la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar y acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista. Este pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; así como, recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO 1º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos. PARÁGRAFO 2º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional. PARÁGRAFO 3º.- EL Instituto no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. PARÁGRAFO 4º.- Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó que el contratista cumplió con el pago a sus aportes al Sistema General de seguridad social integral (salud, pensiones, ARL) según lo establece el contrato. Además, anexa certificado expedido por el contador Robinson Fernando Vega Mavisoy, con Tarjeta Profesional T.P 167769-T, donde expone que el representante legal de la empresa DC PROJECT S.A.S con NIT. 901.410.401-8, ALEJANDRO QUINTANA ANACONA, identificado con cédula 1.061.686.538 de Popayán Cauca, se encuentra en Paz y Salvo, con los aportes Parafiscales y Seguridad Social de los empleados de la empresa.

La (s) planilla (s) aportada (s) se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
9462016461	2024/02/12	Pensión mes de enero y salud febrero

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el producto presentado y aprobado por el supervisor del contrato y por el apoyo a la supervisión, ingeniero German Chamorro y la factura electrónica de venta No. DC1 47 Ver. UBL 2.1 fecha 08/02/2024, AUTORIZO el pago PARCIAL por la suma de Ciento cinco millones trescientos veinticinco mil ciento sesenta y un pesos con diez centavos ($105,325,161.10) MDA/CTE

DOCUMENTOS SOPORTES (entregados)

ESTADOS FINANCIEROS	
CONTRATOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 179.995.091
Valor total de adiciones	$ 0
Valor total de reducciones	N/A
Valor total del Contrato	$ 179.995.091
Valor total pagado	$ 0
Valor a pagar en la presente certificación	$ 105.325.161,10
Saldo a favor del Contratante	$ 74.669.929,9

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2024.

_____

JUAN CARLOS CALVACHE ALOMÍA
CC 98.384.386 De Pasto (Nariño)
Cargo o Vinculación: PLANEACIÓN SUPERVISOR

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

Factura Electrónica De Venta No. DC1 47
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 dias
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 14

Fecha de Validación: 09/02/2024 09:21 AM
Fecha de Generación: 08/02/2024 09:21 AM
Fecha de Vencimiento: 23/02/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : DC PROJECT SAS
Razón Social: DC PROJECT S.A.S
NIT: 901410401-8
Teléfono: + (57) 312 2595903
Correo Electrónico: dcprojectsas@gmail.com
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
NIT: 800247940-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: atencionalusuario@itp.edu.co
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	242	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1.00	unidad	2,374,000.00	2,374,000.00	0	0.00	**2,374,000.00**
2	243	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1.00	unidad	17,629,950.00	17,629,950.00	0	0.00	**17,629,950.00**
3	244	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2.00	unidad	2,581,480.00	5,162,960.00	0	0.00	**5,162,960.00**
4	245	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2.00	unidad	1,852,400.00	3,704,800.00	0	0.00	**3,704,800.00**
5	246	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	UND	360.00	unidad	4,649.00	1,673,640.00	0	0.00	**1,673,640.00**
6	247	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	UND	25.00	unidad	61,750.00	1,543,750.00	0	0.00	**1,543,750.00**
7	248	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,8	UND	1.00	unidad	7,863,387.00	7,863,387.00	0	0.00	**7,863,387.00**
8	249	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	UND	1.00	unidad	12,190,650.00	12,190,650.00	0	0.00	**12,190,650.00**
9	254	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1.00	unidad	1,603,910.00	1,603,910.00	0	0.00	**1,603,910.00**
10	256	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CER	UND	20.00	unidad	1,029,000.00	20,580,000.00	0	0.00	**20,580,000.00**
11	ADM	ADMINISTRACION 22%	ADMI	1.00	unidad	16,351,950.34	16,351,950.34	0	0.00	**16,351,950.34**
12	IMP	IMPREVISTO 3%	IMP	1.00	unidad	2,229,811.41	2,229,811.41	0	0.00	**2,229,811.41**
13	UTL	UTILIDAD 5%	UTI	1.00	unidad	3,716,352.35	3,716,352.35	0	0.00	**3,716,352.35**
14	218	DERECHOS DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR OPERADOR DE RED	unid	1.00	unidad	8,700,000.00	8,700,000.00	0	0.00	**8,700,000.00**

Detalles:
Son: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS CON DIEZ CENTAVOS
CUFE :
e200603a5cde78cbc70c8bceb17e7b4efbdce13c03131834156d5a8ac55ae8cfbf33f5be6819e1d4504770ac26b61626

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764065239388 entre los rangos de Facturación del 47 al 200 usando el prefijo DC1 con vigencia entre las fechas 2024-02-08 al 2025-02-08.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 105,325,161.10
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 105,325,161.10
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 105,325,161.10
Total a pagar :	COP 105,325,161.10
Saldo Restante :	COP105,325,161.10

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764065239388 entre los rangos de Facturación del 47 al 200 usando el prefijo DC1 con vigencia entre las fechas 2024-02-08 al 2025-02-08.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas	

Nombre del contratista	DC PROJECT S.A.S.	C.C. o NIT	901410401
Dirección	CR 29 10 16, BARRIO CONDOMINIO NORTE - MOCOA, PTYO	Telefono	3114773419
Correo electrónico	dc.projectsas@gmail.com	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	285	Vigencia	2023
Valor del contrato	$179.995.091,00	Numero de Proceso	ITP-SAMC-012-2023
Tipo de contrato	CONTRATOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO (ITP)	Fecha generación	2024-02-13
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA". DEL PLAN DE FOMENTO 2023	Fecha de Contrato	2023-12-18

BBVA
13 FEB 2024
0598-SUCURSAL MOCOA
RECIBIDO CON PAGO

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Instituto Tecnológico del Putumayo	$5.400.000,00	227498	(415)8000000031548(8020)000022749B(3900)0054000000
Total	$5.400.000,00		GERALDIN ALEJANDRA LOSADA PARRA

BBVA

TERM: XA55 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240213
OFIC: 0598 31548 IMP ESTAMP PROITP PUTUM CONVENIO: 0031548
USER: C802090 CUENTA : 0013-0598-0200291664 HORA : 15:45

REFERENCIA NO. 1 000022749B PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000013136
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 5,400,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 5,400,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e200603a5cde78cbc70c8bceb17e7b4efbdce13c03131834156d5a8ac55ae8cfbf33f5be6819e1d4504770ac26b61626

Número de Factura: DC1-47
Fecha de Emisión: 08/02/2024
Fecha de Vencimiento: 23/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DC PROJECT SAS
Nombre Comercial: DC PROJECT SAS
Nit del Emisor: 901410401
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Teléfono / Móvil:
Correo: dcprojectsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800247940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: atencionalusuario@itp.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	242	UND	94	1,00	$ 2.374.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.374.000,00
2	243	UND	94	1,00	$ 17.629.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.629.950,00
3	244	UND	94	2,00	$ 2.581.480,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.162.960,00
4	245	UND	94	2,00	$ 1.852.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.704.800,00
5	246	UND	94	360,00	$ 4.649,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.673.640,00
6	247	UND	94	25,00	$ 61.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.543.750,00
7	248	UND	94	1,00	$ 7.863.387,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.863.387,00
8	249	UND	94	1,00	$ 12.190.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.190.650,00
9	254	UND	94	1,00	$ 1.603.910,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.603.910,00
10	256	UND	94	20,00	$ 1.029.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.580.000,00
11	ADM	ADMI	94	1,00	$ 16.351.950,34	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.351.950,34
12	IMP	IMP	94	1,00	$ 2.229.811,41	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.229.811,41
13	UTL	UTI	94	1,00	$ 3.716.352,35	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.716.352,35
14	218	unid	94	1,00	$ 8.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.700.000,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-09 09:22:28
Documento generado el: 2024-02-09 14:22:16
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			105.325.161,10
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			105.325.161,10
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			105.325.161,10
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	105.325.161,10

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065239388 Rango desde: 47 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-02-08

<AttachedDocument xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#">
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<ds:Signature Id="id-19517bbd-32bd-4611-a177-12f5aa16024e">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference Id="id-19517bbd-32bd-4611-a177-12f5aa16024e-ref0" URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>RrjVDMzdaZwdcuXSrxuiECOUCpJ8rDKhhheldic7U1I=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-19517bbd-32bd-4611-a177-12f5aa16024e-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Ssnwk/uxeFId64Yrcs6dB3moV9hGajqhSeiyvKzpYhE=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-19517bbd-32bd-4611-a177-12f5aa16024e-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Ssnwk/uxeFId64Yrcs6dB3moV9hGajqhSeiyvKzpYhE=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>aP0LRiQRQDbKDQCVqSXLtP287K85ck1tB6blDvQIgzORPknj7JUGmvDY9OQSvurJ
fMJHrS/7FjPWOWyOevB5LXs+NdbOJZPOhmwR48iIrSSvi/YUXAc2a/JjyTZNhrb2
sdrzAqVSOEqGN/8bIJWXJdGe40JwWZHZNgdeS2zYmUO+8JZcMPSbNzRZlu2GlDZS
IXPK302iJGs7sGvoQdg0fgUjFmahkyhfXbyqPd7nlUqP+4bRurMdzOoHX1vZYTU3
iUM9LwOecqamadMSKxPUjVojVG/2c6Lzpda+ajNQLwFnqnNf3qaqaTul8aL/WeBv
dMa7AAvJtcFqIEMwv3hh5g==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="id-19517bbd-32bd-4611-a177-12f5aa16024e-keyinfo">
<ds:X509Data>

<ds:X509Certificate>MIIIWzCCBkOgAwIBAgIISa9atJs1hfkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwg
bYxIzAhBgkq
hkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRF
UyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MjEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2Vy
dGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDAS
BgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yMzA3MTcwNTAwMDBa
Fw0yNDA3MTYwNDU5MDBaMIIBQjEjMCEGA1UECQwaQ0FSUkVSQSA1MCAjIDk3QSBT
VVIgLSAxNTAxLTArBgkqhkiG9w0BCQEWHkpVTElBTi5CQVJSSUVOVE9TQEFYQ0VT
LkNPTS5DTzEXMBUGA1UEAxMOQ0FERU5BIFMgLiBBIC4xEzARBgNVBAUTCjg5MDkz
MDUzNDAxNjA0BgNVBAwTLUVtaXNvciBGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhIC0gUGVy
c29uYSBKdXJpZGljYTE6MDgGA1UECxMxRW1pdGlkbyBwb3IgQW5kZXMgU0NEIEFj
IDI2IDY5QyAwMyBUb3JyZSBCIE9mIDcwMTETMBEGA1UEChMKVEVDTk9MT0dJQTEU
MBIGA1UEBxMLTEEgRVNUUkVMTEExEjAQBgNVBAgTCUFOVElPUVVJQTELMAkGA1UE
BhMCQ08wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaqreQjs+Z24Uf
Huy83qRgN0Mig7oHXEGnuL7dJXUOFXzp2+VsMT7rQxNycXtNhDjef9Tg64vG8M3r
Ycbs7yVT3FPWd8LAv9Fyglq3wPNzfBeqOBEL4Ajbwej+RY1El7/7jiVKJqUnYqA6
oKqplr50EZyG4dGoW/FMVq48gRDnEPC5Dlpjgmc+CxnV0Ia9EXTHQlHEtdAhri85
Uwe9VPCy3lRTZRvAvVwOuXm9xJLA8GKvaVeJdwrz0cHmXUoTaA8wPHYSJ11zmcTU
wpcQ0phoowC57uhlTA3HURJ83dfajcJq1dazJl87NIkMMVVrt84J2gEskUXNzUUM
FVLdBM/lAgMBAAGjggLcMIIC2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFDpX
UNB3Gz7Wi+r/l5nX/4QCSCkPMDcGCCsGAQUFBwEBBCswKTAnBggrBgEFBQcwAYYb
aHR0cDovL29jc3AuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMCkGA1UdEQQiMCCBHkpVTElBTi5C
QVJSSUVOVE9TQEFYQ0VTLkNPTS5DTzCCAbgGA1UdIASCAa8wggGrMIIBVQYNKwYB
BAGB9EgBAgYFADCCAUIwggE+BggrBgEFBQcCAjCCATAeggEsAEwAYQAgAHUAdABp
AGwAaQB6AGEAYwBpAPMAbgAgAGQAZQAgAGUAcwB0AGUAIABjAGUAcgB0AGkAZgBp
AGMAYQBkAG8AIABlAHMAdADhACAAcwB1AGoAZQB0AGEAIABhACAAbABhACAAAUABD
ACAAZABlACAARgBhAGMAdAB1AHIAYQBjAGkA8wBuACAARQBsAGUAYwB0AHIA8wBu
AGkAYwBhACAAeQAgAEQAUABDACAAZQBzAHQAYQBiAGwAZQBjAGkAZABhAHMAIABw
AG8AcgAgAEEAbgBkAGUAcwAgAFMAQwBEAC4AIABDAPMAZABpAGcAbwAgAGQAZQAg
AEEAYwByAGUAZABpAHQAYQBjAGkA8wBuADoAIAAxADYALQBFAEMARAAtADAAMAA0
MFAGDSsGAQQBgfRIAQEBBwAwPzA9BggrBgEFBQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5k
ZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBDX0FuZGVzU0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggr
BgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5h
bmRlc3NjZC5jb20uY28vQ2xhc2VJSXYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQU8ds8LM9AGKes
B9EeFUm3TLz3xoswDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAR
pg3J9lAEjp3B3Mt+bI2+Uk8SQ8UgS4pntapWvdMPdm6q/pC0mIZWcA8wwC5pFeti
qcRk436RQ5uWN24ie+57D0iH4iKFmXTiBAq6vKsRQs6HQXzsMJ+yztl9JVPH45K8
Mp2+5R6RFordCD6zMluyYRoDohEnCinHjI6PTEogl/7b06LQgW8Ho2Z66P75afqZ
6jFyRz+go3BXV+2N9J3aivDvmc/V90BQrrSsGsxYTMum09UW2PILRbBzgMdRvzr+
N2wXnh/i9j3J/oMpKyQEhLABaT7/5JPVzDvAHsI3NC9754SQjBpVVxhc7ClLy6BS
UGJtNUdv/o4PCsDvYEUzCyeTcyDw9Xj9N3U2PEIouAZaBlIzSUE8RxjqfR5IQPZC
ut+OYdyah2Bj6GYl08tGIKUJPbTPpqwJ2Wu+rsfADBvmZa8eM4ZRROXbMuxflKTp
ymf5aXmjOojx7eViHvo2phvJ44OFoNCt/eKMvrBbn1ZBKQIuFpG/BLP0gqcOtodV
uuUrKWF3x2SzKIwnYxEqFiTJF/uaSQpL4P3GOFQNh9Rvf38rLJUcoUJ0VerMz/LF
80aHGau6g+yxHRiy3jcuzy9jEWSOo6SyaV+a0acnGOiq1+3oGoSQ1Ks9oY1eEy9I
bIlCAIyejvZAZztV11ChtRScMsjubVKr2m879xTHMg==</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>2qq3kI7PmduFHx7svN6kYDdDIoO6B1xBp7i+3SV1DhV86dvlbDE+60MTcnF7T
YQ4 3n/U4OuLxvDN62HG7O8lU9xT1nfCwL/RcoJat8Dzc3wXqjgRC+AI28Ho/kWNRJe/
+44lSialJ2KgOqCqqZa+dBGchuHRqFvxTFauPIEQ5xDwuQ5aY4JnPgsZ1dCGvRF0
x0JRxLXQIa4vOVMHvVTwst5UU2UbwL1cDrl5vcSSwPBir2lXiXcK89HB5l1KE2gP

MDx2Eiddc5nE1MKXENKYaKMAue7oZUwNx1ESfN3X2o3CatXWsyZfOzSJDDFVa7fO
CdoBLJFFzc1FDBVS3QTP5Q==</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object>
<xades:QualifyingProperties Target="#id-19517bbd-32bd-4611-a177-
12f5aa16024e" Id="id-ca2ee4e0-7f82-47cf-b5e5-d0478ebd2f6d">
<xades:SignedProperties Id="id-19517bbd-32bd-4611-a177-12f5aa16024e-
signedprops">
<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2024-02-09T09:22:29.034504-05:00</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>
<xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>+7hyZ39F5lpJhYip84UZtOvxm77f5pOs0KO5h60yOSU=</ds:DigestVa
lue>
</xades:CertDigest>
<xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de
certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2,
E=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>5309562217437693433</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
<xades:SignaturePolicyIdentifier>
<xades:SignaturePolicyId>
<xades:SigPolicyId>
<xades:Identifier>https://s3.amazonaws.com/efactura.resources/politicadef
irmav2.pdf</xades:Identifier>
<xades:Description>Política de firma para facturas electrónicas de la
República de Colombia</xades:Description>
</xades:SigPolicyId>
<xades:SigPolicyHash>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestVa
lue>
</xades:SigPolicyHash>
</xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier>
<xades:SignerRole>
<xades:ClaimedRoles>
<xades:ClaimedRole>third party</xades:ClaimedRole>
</xades:ClaimedRoles>
</xades:SignerRole>
</xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>

```
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>Documentos adjuntos</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>DC147</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2024-02-09</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>14:22:29-05:00</cbc:IssueTime>
<cbc:DocumentType>Contenedor de Factura Electrónica</cbc:DocumentType>
<cbc:ParentDocumentID>DC147</cbc:ParentDocumentID>
<cac:SenderParty>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>DC PROJECT S.A.S</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAg
encyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901410401</cbc:CompanyID>
<cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID>
<cbc:Name>IVA</cbc:Name>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:SenderParty>
<cac:ReceiverParty>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO
DELPUTUMAYO</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAg
encyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800247940</cbc:CompanyID>
<cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID>
<cbc:Name>IVA</cbc:Name>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:ReceiverParty>
<cac:Attachment>
<cac:ExternalReference>
<cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode>
<cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
<cbc:Description>
<![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <Invoice
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateCo
mponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicCompon
ents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionCo
mponents-2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd"> <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent>
<sts:DianExtensions> <sts:InvoiceControl>
<sts:InvoiceAuthorization>18764065239388</sts:InvoiceAuthorization>
<sts:AuthorizationPeriod> <cbc:StartDate>2024-02-08</cbc:StartDate>
<cbc:EndDate>2025-02-08</cbc:EndDate> </sts:AuthorizationPeriod>
<sts:AuthorizedInvoices> <sts:Prefix>DC1</sts:Prefix>
<sts:From>47</sts:From> <sts:To>200</sts:To> </sts:AuthorizedInvoices>
</sts:InvoiceControl> <sts:InvoiceSource> <cbc:IdentificationCode
listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode> </sts:InvoiceSource>
<sts:SoftwareProvider> <sts:ProviderID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="0" schemeName="31">890930534</sts:ProviderID> <sts:SoftwareID
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">49fab599-4556-4828-a30b-852a910c5bb1</sts:SoftwareID> </sts:SoftwareProvider>
<sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">089e6f5004cf4c031a353b2f9c722858b75f6b5c3c45ed40c526c6190a08ccc81de45640ce0dfe272994a342cb5c55aa</sts:SoftwareSecurityCode>
<sts:AuthorizationProvider> <sts:AuthorizationProviderID
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="4"
schemeName="31">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
</sts:AuthorizationProvider> <sts:QRCode>NroFactura=DC147
NitFacturador=901410401 NitAdquiriente=800247940 FechaFactura=2024-02-08
HoraFactura=09:21:50-05:00 ValorFactura=105325161.10 ValorIVA=0.00
ValorOtrosImpuestos=0.00 ValorTotalFactura=105325161.10
CUFE=https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e200603a5cde78cbc70c8bceb17e7b4efbdce13c03131834156d5a8ac55ae8cfbf33f5be6819e1d4504770ac26b61626</sts:QRCode> </sts:DianExtensions> </ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension> <ext:UBLExtension><ext:ExtensionContent><ds:Signature
Id="id-766dcbe4-3de2-4c73-85c2-00be123a1cf2"> <ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> <ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference Id="id-766dcbe4-3de2-4c73-85c2-00be123a1cf2-ref0" URI="">
<ds:Transforms> <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</ds:Transforms> <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Hb8nVSmSZYgLc3+CD40N3z5JI8urzq4qoY/8/koeEfw=</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="#id-766dcbe4-3de2-4c73-85c2-00be123a1cf2-ref0"> <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>

<ds:DigestValue>Ya6RUbk/OixvFpavGrQGUDEONm1EMlGVdI+WZNHKlMI=</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="#id-766dcbe4-3de2-4c73-85c2-00be123a1cf2-ref0"> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Ya6RUbk/OixvFpavGrQGUDEONm1EMlGVdI+WZNHKlMI=</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>wWCNT6qkoY0iHkbCJBTboWvyBQIYENSZeC1GqEPV95cMZSYvFyJ5ohaQVOrVb8W6
p9T9a0yvNbq06HAQexL6dSW5IAdO1jDkoEozGy/bQfGZQHPogsMoSSIij9fRI55A
tM035As/xS8tEk4ccnMVpIBFQXgo6Wgzutyc3CqG8ReqyLKSxLEzWYk2Knv4/q72
Mdzdv3BgIOydusmmjaojuQZ1H4udt9F8Sm7YPjXrk/lLHJd93FtiBaWiLAzRsw6n
WMh1GDHAwjyJbnYbo+WFS4rZeS/YxUIGI9Lv9N8dSAieGpP6jM6FZSIzTY2hbtPW
uwxU7L7sGDSQtnAwPDT9LA==</ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="id-766dcbe4-3de2-4c73-85c2-00be123a1cf2-keyinfo"> <ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIIWzCCBkOgAwIBAgIISa9atJs1hfkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkq
hkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MjEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDASBgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yMzA3MTcwNTAwMDBaFw0yNDA3MTYwNDU5MDBaMIIBQjEjMCEGA1UECQwaQ0FSUkVSQSA1MCAjIDk3QSBTVVIgLSAxNTAxLTArBgkqhkiG9w0BCQEWHkpVTElBTi5CQVJSSUVOVE9TQEFYQ0VTLkNPTS5DTzEXMBUGA1UEAxMOQ0FERU5BIFMgLiBBIC4xEzARBgNVBAUTCjg5MDkzMDUzNDAxNjA0BgNVBAwTLUVtaXNvciBGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhIC0gUGVyc29uYSBKdXJpZGljYTE6MDgGA1UECxMxRW1pdGlkbyBwb3IgQW5kZXMgU0NEIEFjIDI2IDY5QyAwMyBUb3JyZSBCIE9mIDcwMTETMBEGA1UEChMKVEVDTk9MT0dJQTELMBIGA1UEBxMLTEEgRVNUUkVMTEExEjAQBgNVBAgTCUFOVElPUVVJQTELMAkGA1UEBhMCQ08wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaqreQjs+Z24UfHuy83qRgN0Mig7oHXEGnuL7dJXUOFXzp2+VsMT7rQxNycXtNhDjef9Tg64vG8M3rYcbs7yVT3FPWd8LAv9Fyglq3wPNzfBeqOBEL4Ajbwej+RY1El7/7jiVKJqUnYqA6oKqplr50EZyG4dGoW/FMVq48gRDnEPC5Dlpjgmc+CxnV0Ia9EXTHQlHEtdAhri85Uwe9VPCy3lRTZRvAvVwOuXm9xJLA8GKvaVeJdwrz0cHmXUoTaA8wPHYSJ11zmcTUwpcQ0phoowC57uhlTA3HURJ83dfajcJq1dazJl87NIkMMVVrt84J2gEskUXNzUUMFVLdBM/lAgMBAAGjggLcMIIC2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFDpXUNB3Gz7Wi+r/l5nX/4QCSCkPMDcGCCsGAQUFBwEBBCswKTAnBggrBgEFBQcwAYYbaHR0cDovL29jc3AuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMCkGA1UdEQQiMCCBHkpVTElBTi5CQVJSSUVOVE9TQEFYQ0VTLkNPTS5DTzCCAbgGA1UdIASCAa8wggGrMIIBVQYNKwYBBAGB9EgBAgYFADCCAUIwggE+BggrBgEFBQcCAjCCATAeggEsAEwAYQAgAHUAdABpAGwAaQB6AGEAYwBpAPMAbgAgAGQAZQAgAGUAcwB0AGUAIABjAGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQBkAG8AIABlAHMAdADhACAAcwB1AGoAZQB0AGEAIABhACAAbABhACAAUABDACAAZABlACAARgBhAGMAdAB1AHIAYQBjAGkA8wBuACAARQBsAGUAYwB0AHIA8wBuAGkAYwBhACAAeQAgAEQAUABDACAAZQBzAHQAYQBiAGwAZQBjAGkAZABhAHMAIABwAG8AcgAgAEEAbgBkAGUAcwAgAFMAQwBEAC4AIABDAPMAZABpAGcAbwAgAGQAZQAgAEEAYwByAGUAZABpAHQAYQBjAGkA8wBuADoAIAAxADYALQBFAEMARAAtADAAMAA0MFAGDSsGAQQBgfRIAQEBBwAwPzA9BggrBgEFBQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBDX0FuZGVzU0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5hbmRlc3NjZC5jb20uY28vQ2xhc2VJSXYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQU8ds8LM9AGKesB9EeFUm3TLz3xoswDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQARpg3J9lAEjp3B3Mt+bI2+Uk8SQ8UgS4pntapWvdMPdm6q/pC0mIZWcA8wwC5pFetiqcRk436RQ5uWN24ie+57D0iH4iKFmXTiBAq6vKsRQs6HQXzsMJ+yztl9JVPH45K8Mp2+5R6RFordCD6zMluyYRoDohEnCinHjI6PTEogl/7b06LQgW8Ho2Z66P75afqZ6jFyRz+go3BXV+2N9J3aivDvmc/V90BQrrSsGsxYTMum09UW2PILRbBzgMdRvzr+

N2wXnh/i9j3J/oMpKyQEhLABaT7/5JPVzDvAHsI3NC9754SQjBpVVxhc7ClLy6BS
UGJtNUdv/o4PCsDvYEUzCyeTcyDw9Xj9N3U2PEIouAZaBlIzSUE8RxjqfR5IQPZC
ut+OYdyah2Bj6GYl08tGIKUJPbTPpqwJ2Wu+rsfADBvmZa8eM4ZRROXbMuxflKTp
ymf5aXmjOojx7eViHvo2phvJ44OFoNCt/eKMvrBbn1ZBKQIuFpG/BLP0gqcOtodV
uuUrKWF3x2SzKIwnYxEqFiTJF/uaSQpL4P3GOFQNh9Rvf38rLJUcoUJ0VerMz/LF
80aHGau6g+yxHRiy3jcuzy9jEWSOo6SyaV+a0acnGOiq1+3oGoSQ1Ks9oY1eEy9I
bIlCAIyejvZAZztV11ChtRScMsjubVKr2m879xTHMg==</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data> <ds:KeyValue> <ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>2qq3kI7PmduFHx7svN6kYDdDIoO6B1xBp7i+3SV1DhV86dvlbDE+60MTcnF7T
YQ4 3n/U4OuLxvDN62HG7O8lU9xT1nfCwL/RcoJat8Dzc3wXqjgRC+AI28Ho/kWNRJe/
+44lSialJ2KgOqCqqZa+dBGchuHRqFvxTFauPIEQ5xDwuQ5aY4JnPgsZ1dCGvRF0
x0JRxLXQIa4vOVMHvVTwst5UU2UbwL1cDrl5vcSSwPBir2lXiXcK89HB5l1KE2gP
MDx2Eiddc5nE1MKXENKYaKMAue7oZUwNx1ESfN3X2o3CatXWsyZfOzSJDDFVa7fO
CdoBLJFFzc1FDBVS3QTP5Q==</ds:Modulus> <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue> </ds:KeyValue> </ds:KeyInfo>
<ds:Object><xades:QualifyingProperties Target="#id-766dcbe4-3de2-4c73-
85c2-00be123a1cf2" Id="id-00b2e2bd-2556-44f2-866a-
784be8314cf9"><xades:SignedProperties Id="id-766dcbe4-3de2-4c73-85c2-
00be123a1cf2-
signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-02-
09T09:22:16.348502-
05:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:Cer
tDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>+7hy
Z39F5lpJhYip84UZtOvxm77f5pOs0KO5h60yOSU=</ds:DigestValue></xades:CertDige
st><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes
SCD, OU=Division de certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A.
Clase II v2,
E=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>5309562217
437693433</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:
SigningCertificate><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolic
yId><xades:SigPolicyId><xades:Identifier>https://s3.amazonaws.com/efactur
a.resources/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier><xades:Description>Po
lítica de firma para facturas electrónicas de la República de
Colombia</xades:Description></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:
DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>dMoM
vtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolic
yHash></xades:SignaturePolicyId></xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:
SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>third
party</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:
SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProp
erties></ds:Object></ds:Signature></ext:ExtensionContent></ext:UBLExtensi
on></ext:UBLExtensions> <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID> <cbc:ProfileID>DIAN 2.1:
Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID> <cbc:ID>DC147</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-
SHA384">e200603a5cde78cbc70c8bceb17e7b4efbdce13c03131834156d5a8ac55ae8cfb
f33f5be6819e1d4504770ac26b61626</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2024-02-
08</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>09:21:50-05:00</cbc:IssueTime>
<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note/>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode>

<cbc:LineCountNumeric>14</cbc:LineCountNumeric><cac:AccountingSupplierPar
ty> <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID> <cac:Party>
<cac:PartyName> <cbc:Name>DC PROJECT SAS</cbc:Name> </cac:PartyName>
<cac:PhysicalLocation> <cac:Address> <cbc:ID>86001</cbc:ID>
<cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
<cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode> <cac:AddressLine>
<cbc:Line>BRR ALTOS DE LA COLINA</cbc:Line> </cac:AddressLine>
<cac:Country> <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
<cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name> </cac:Country>
</cac:Address> </cac:PhysicalLocation> <cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>DC PROJECT S.A.S</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901410401</cbc:CompanyID> <cbc:TaxLevelCode listName="48">R-
99-PN</cbc:TaxLevelCode> <cac:RegistrationAddress> <cbc:ID>86001</cbc:ID>
<cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
<cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode> <cac:AddressLine>
<cbc:Line>BRR ALTOS DE LA COLINA</cbc:Line> </cac:AddressLine>
<cac:Country> <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
<cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name> </cac:Country>
</cac:RegistrationAddress> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID>
<cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>DC PROJECT
SAS</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31"
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales)">901410401</cbc:CompanyID>
<cac:CorporateRegistrationScheme> <cbc:ID>DC1</cbc:ID>
<cbc:Name>77240</cbc:Name> </cac:CorporateRegistrationScheme>
</cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact>
<cbc:ElectronicMail>dcprojectsas@gmail.com</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact> </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty><cac:AccountingCustomerParty>
<cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID> <cac:Party>
<cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="1" schemeName="31">800247940</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>INSTITUTO
TECNOLOGICO DELPUTUMAYO</cbc:Name> </cac:PartyName>
<cac:PhysicalLocation> <cac:Address> <cbc:ID>86001</cbc:ID>
<cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
<cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode> <cac:AddressLine>
<cbc:Line/> </cac:AddressLine> <cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode> <cbc:Name
languageID="es">Colombia</cbc:Name> </cac:Country> </cac:Address>
</cac:PhysicalLocation> <cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO
DELPUTUMAYO</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="1"

schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">800247940</cbc:CompanyID>
<cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
<cac:RegistrationAddress> <cbc:ID>86001</cbc:ID>
<cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
<cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode> <cac:AddressLine>
<cbc:Line/> </cac:AddressLine> <cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode> <cbc:Name
languageID="es">Colombia</cbc:Name> </cac:Country>
</cac:RegistrationAddress> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID>
<cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO
DELPUTUMAYO</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="1"
schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">800247940</cbc:CompanyID>
<cac:CorporateRegistrationScheme> <cbc:Name>77240</cbc:Name>
</cac:CorporateRegistrationScheme> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact>
<cbc:ElectronicMail>atencionalusuario@itp.edu.co</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact> </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty><cac:PaymentMeans> <cbc:ID>2</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansCode>45</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:PaymentDueDate>2024-
02-23</cbc:PaymentDueDate> <cbc:PaymentID>Transferencia
Bancaria</cbc:PaymentID> </cac:PaymentMeans> <cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">105325161.10</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="COP">0.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:TaxInclusiveAmount
currencyID="COP">105325161.10</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:AllowanceTotalAmount
currencyID="COP">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:ChargeTotalAmount
currencyID="COP">0.00</cbc:ChargeTotalAmount> <cbc:PayableAmount
currencyID="COP">105325161.10</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">2374000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">242</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">2374000.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>2</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">17629950.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">243</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">17629950.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>3</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">2.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">5162960.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">244</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">2581480.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">2.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>4</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">2.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">3704800.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">245</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">1852400.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">2.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>5</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">360.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">1673640.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">246</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="COP">4649.00</cbc:PriceAmount>
<cbc:BaseQuantity unitCode="94">360.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price>
</cac:InvoiceLine> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>6</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">25.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">1543750.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">247</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="COP">61750.00</cbc:PriceAmount>
<cbc:BaseQuantity unitCode="94">25.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price>
</cac:InvoiceLine> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>7</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">7863387.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">248</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">7863387.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>8</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">12190650.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">249</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">12190650.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity

unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>9</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">1603910.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">254</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">1603910.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>10</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">20.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">20580000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">256</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">1029000.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">20.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>11</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">16351950.34</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>ADMI</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">ADM</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">16351950.34</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>12</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">2229811.41</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>IMP</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">IMP</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">2229811.41</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>13</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">3716352.35</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>UTI</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">UTL</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount
currencyID="COP">3716352.35</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>14</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">8700000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Description>unid</cbc:Description> <cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">218</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item>
<cac:Price> <cbc:PriceAmount

currencyID="COP">8700000.00</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity
unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity> </cac:Price> </cac:InvoiceLine>
</Invoice>]]>
</cbc:Description>
</cac:ExternalReference>
</cac:Attachment>
<cac:ParentDocumentLineReference>
<cbc:LineID>1</cbc:LineID>
<cac:DocumentReference>
<cbc:ID>DC147</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-
SHA384">e200603a5cde78cbc70c8bceb17e7b4efbdce13c03131834156d5a8ac55ae8cfb
f33f5be6819e1d4504770ac26b61626</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2024-02-08</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType>
<cac:Attachment>
<cac:ExternalReference>
<cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode>
<cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
<cbc:Description>
<![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"
standalone="no"?><ApplicationResponse
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateCo
mponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicCompon
ents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionCo
mponents-2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-
2"> <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent>
<sts:DianExtensions> <sts:InvoiceSource> <cbc:IdentificationCode
listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for
Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdent
ificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode> </sts:InvoiceSource>
<sts:SoftwareProvider> <sts:ProviderID schemeID="4" schemeName="31"
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales)">800197268</sts:ProviderID> <sts:SoftwareID
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareID> </sts:SoftwareProvider>
<sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">...</sts:SoftwareSecurityCode> <sts:AuthorizationProvider>
<sts:AuthorizationProviderID schemeID="4" schemeName="31"
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales)">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
</sts:AuthorizationProvider> </sts:DianExtensions>
</ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> <ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent><ds:Signature
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-f6616d8e-
49c6-4586-b831-696631e06a2f"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"

/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="Reference-74a04030-462f-41c3-8075-a1be8acdfe48" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>k5usCiOtrstMj2PpSyGyKSCUSzufpZEOTbS0MmO+bAU=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo" URI="#Signature-f6616d8e-49c6-4586-b831-696631e06a2f-KeyInfo"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>xOwIu9XMII0MRfgAK42JvMJT367/DfgEXq2A3mXNsR8=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-Signature-f6616d8e-49c6-4586-b831-696631e06a2f-signedprops"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>SWWw/O2aWLkN04ZLYLXgMP98tEagJTZzbICULMVabEQ=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="SignatureValue-f6616d8e-49c6-4586-b831-696631e06a2f">Qj/hbir+1+w8TwZN+Co8E5DG4WxkT3QiKNNlF5pAZq+3o27OUwQGPciKphZ
h0HgE9rD/4QQgrJWx/nqhVwj5c4dUKh62Taw9oSTjJFvw+hc9RPcWIYs8vgNgb52pIKQKixpq
+sjRm9jDYHboZFCEaM6VaxV4Hwib/Xr1RZg3Iz10Jay9ERqpF6TAG3ysJ+A8EFP5sZMItbLJZ
FZJJcPIzZHY/MiEWvI5bp9+C/eaunv2q4ryOj4S6ROMh90HmJlzOYEU57XNGMHWApkhoJVHb9
7pBhusdID6MwsYoos+GHV6FfjXU4/Nc6LF72S4WGvbIfo0i0DfGG62dmb9hE9XQQ==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="Signature-f6616d8e-49c6-4586-b831-696631e06a2f-KeyInfo"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIHRDCCBSygAwIBAgIKDmtVC6CNWpj
+6zANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tLmNvMSUw
IwYDVQQDExxBdXRvcmlkYWQgU3Vib3JkaW5hZGEgMDEgR1NFMQwwCgYDVQQLEwNQS0kxDDAKB
gNVBAoTA0dTRTEUMBIGA1UEBxMLQm9nb3RhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMB4XDTIyMTEyMz
IzMzE0N1oXDTI0MTEyMjIzMzE0NlowggEVMR0wGwYDVQQJDBRDQVJSRVJBICA3ICMgNkMgLSA
1NDEjMCEGA1UEDQwaRkVQSiBHU0UgQ0wgNzcgNyA0NCBPRiA3MDExFDASBgNVBAgMC0JPR09U
QSBELkMuMRQwEgYDVQQHDAtCT0dPVEEgRC5DLjELMAkGA1UEBhMCQ08xOzA5BgNVBAMMMlUuQ
S5FLiBESVJFQ0NJT04gREUgSU1QVUVTVE9TIFkgQURVQU5BUyBOQUNJT05BTEVTMQwwCgYDVQ
QpDANOSVQxEzARBgNVBAUTCjgwMDE5NzI2ODQxGjAYBgNVBAsMEURJUkVDQ0lPTiBHRU5FUkF
MMRowGAYKKwYBBAGkZgEDAgwKODAwMTk3MjY4NDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAJIJVVr5Z/geqFnqZVOvACJDNjL1ZABOVxb+91h/hk/bxs1W5GgQ/a2J1jTpWsyct
WzVIN1A7q7GvZt0joi3Vu24lI9Y17bcP0v4HpGssI2iv5ssrP7jfT5mXAdaVYHROaGPeYILXy
27sPdL66fFDBF9NgWzA80Zw14ECOnbxZ2cXeMABFrL0qOc9v1aWJJrpsqRNazC8x7uBig+qrh
pqwPF+1vQQSh2qPxpUqmaRiEUDmgMbHmzYX5VBLH1mZPkI9OTK8gSnFMhIGQ9VSG3X0iq0DrN
sN34rSfQNDjwBMjs3Fl8liHoySLS+T5NJJ2iyWYtg23f2ZLFWlNptxylWusCAwEAAaOCAiAwg
gIcMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUQbzUOXi4g6MXGgiaqbgEAgkt2JkwaAYIKw
YBBQUHAQEEXDBaMDIGCCsGAQUFBzAChiZodHRwczovL2NlcnRzMi5nc2UuY29tLmNvL0NBX1N
VQjAxLmNydDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cHM6Ly9vY3NwMi5nc2UuY29tLmNvMGwGA1UdEQRl
MGOBFm5heWliZXRzcGpAaG90bWFpbC5jb22GSWh0dHBzOi8vZ3NlLmNvbS5jby9kb2N1bWVud
G9zL2NlcnRpZmljYWNpb25lcy9hY3JlZGl0YWNpb24vMTYtRUNELTAwMS5wZGYwgYMGA1UdIA
R8MHoweAYLKwYBBAGB8yABBA0waTBnBggrBgEFBQcCARZbaHR0cHM6Ly9nc2UuY29tLmNvL2R
vY3VtZW50b3MvY2FsaWRhZC9EUEMvRGVjbGFyYWNpb25fZGVfUHJhY3RpY2FzX2RlX0NlcnRp
ZmljYWNpb25fVjE0LnBkZjAnBgNVHSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFB
wMBMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHBzOi8vY3JsMi5nc2UuY29tLmNvL0NBX1NVQjAxLm
NybDAdBgNVHQ4EFgQUqhofrrDAdQXSp8cbwnhCp9VvSTgwDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMA0GCSq
GSIb3DQEBCwUAA4ICAQCWTUrin96f6b1MxoGDy8T0oAa8saNkETNmtz12rFQCl/SsA98cFG9s
9EEJTaAxJyVYCxLMSg1TI2qXP1fH3C+Vh5lOhtdg+GCOJ7XDQdBBKch87rVYpYm9N2bK4YmK4

NazxnpgpZaT2gvgYvfb7ddYUHdOy6f5zpbOBwliuGxSGXHKROfmyX+tBqtkc7HFE9Jt1BJBAQ
XG80I34+R9CcEt1ZYKJ6ZiBRH4fclvkW2VL/P2kuUqHsB0a4+bmAB1aAS/4tqgNrEf7I309Ie
VWoccQNAsAK5xupSQoQEGAmudblmNOYto9DfnjtEXIvaD1SPi5k01DX7W38jMwYEn9lbv27t0
LgvP1yP5lfYjMUcxt7p6zVhHisFe8DiT89mfvxRBxwocgKiUAeC7IuGCtNq5Db7tiiCCZWcNG
diuXFJq3o4yHKZP9zoO/XZQGZZCY+EdnWpLpQPIbDwyvjc4CpB0BpAUiCF14hb3dWjQu9pFtH
8wPAeNEM/HI/JuB+qgZ3T62C4EbkWvffqD/rGBVpD0aAXtXt7i5ps2mGWxiVLLPd8RjN4aGmE
rTUY4AsWOODUVY9KKuFCDW8TaOAbMtciUVJ1Fhw4GJHUI70jcwmaag8FqP/nt1UaYp3p9qPXs
kt0UnwbA1l2m0zAj3VaRvDrfpQvN9i2UfBhtCbYxYh9WLg==</ds:X509Certificate></ds
:X509Data><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>kglVWvln+B6oWeplU68AIk
M2MvVkAE5XFv73WH+GT9vGzVbkaBD9rYnWNOlazJy1bNUg3UDursa9m3SOiLdW7biUj1jXttw
/S/gekaywjaK/myys/uN9PmZcB1pVgdE5oY95ggtfLbuw90vrp8UMEX02BbMDzRnDXgQI6dvF
nZxd4wAEWsvSo5z2/VpYkmumypE1rMLzHu4GKD6quGmrA8X7W9BBKHao/GlSqZpGIRQOaAxse
bNhflUEsfWZk+Qj05MryBKcUyEgZD1VIbdfSKrQOs2w3fitJ9A0OPAEyOzcWXyWIejJItL5Pk
0knaLJZi2Dbd/ZksVaU2m3HKVa6w==</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent
></ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue></ds:KeyInfo><ds:Object
Id="XadesObjectId-9c44a9c7-8ab3-4f3e-a815-
05492241f5aa"><xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties-
d4c73d34-6b7a-4db4-8e34-ad60d5638a72" Target="#Signature-f6616d8e-49c6-
4586-b831-696631e06a2f"><xades:SignedProperties Id="xmldsig-Signature-
f6616d8e-49c6-4586-b831-696631e06a2f-
signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-02-
09T09:22:28+00:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert
><xades:CertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>y3nFbBGB1gFi98Lqjh5h3ItZ60ysAEH+o6ZPIxn4egQ=</ds:Digest
Value></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO,
L=Bogota D.C., O=GSE, OU=PKI, CN=Autoridad Subordinada 01 GSE,
E=info@gse.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>680930605443088
93515499</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:S
igningCertificate><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicy
Id><xades:SigPolicyId><xades:Identifier>https://facturaelectronica.dian.g
ov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier><xades:D
escription /></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:Digest
Value></xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId></xades:SignaturePo
licyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>s
upplier</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xade
s:SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:Data
ObjectFormat ObjectReference="#Reference-74a04030-462f-41c3-8075-
a1be8acdfe48"><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType><xades:Encoding>UT
F-
8</xades:Encoding></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProper
ties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></
ds:Signature></ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions> <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>1</cbc:CustomizationID> <cbc:ProfileID>DIAN
2.1</cbc:ProfileID> <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>14512349</cbc:ID> <cbc:UUID schemeName="CUDE-
SHA384">5fdacb2872eda99c8a9f2884d5a1675ab84c7cddecceaba571a2944b74a24632b
845771a0d7375bec7ece2aa9237fab9</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2024-02-
09</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>09:22:28-05:00</cbc:IssueTime>

<cac:SenderParty> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="4" schemeName="31">800197268</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID> <cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> </cac:SenderParty> <cac:ReceiverParty> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName>DC PROJECT S.A.S</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31">901410401</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID> <cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> </cac:ReceiverParty> <cac:DocumentResponse> <cac:Response> <cbc:ResponseCode>02</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>Documento validado por la DIAN</cbc:Description> </cac:Response> <cac:DocumentReference> <cbc:ID>DC147</cbc:ID> <cbc:UUID schemeName="CUFE-SHA384">e200603a5cde78cbc70c8bceb17e7b4efbdce13c03131834156d5a8ac55ae8cfbf33f5be6819e1d4504770ac26b61626</cbc:UUID> </cac:DocumentReference> <cac:LineResponse> <cac:LineReference> <cbc:LineID>1</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cac:Response> <cbc:ResponseCode>0000</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>0</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> <cac:LineResponse> <cac:LineReference> <cbc:LineID>2</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cac:Response> <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> <cac:LineResponse> <cac:LineReference> <cbc:LineID>3</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cac:Response> <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> </cac:DocumentResponse> </ApplicationResponse>]]> </cbc:Description> </cac:ExternalReference> </cac:Attachment> <cac:ResultOfVerification> <cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:ValidatorID> <cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode> <cbc:ValidationDate>2024-02-09</cbc:ValidationDate> <cbc:ValidationTime>09:22:28-05:00</cbc:ValidationTime> </cac:ResultOfVerification> </cac:DocumentReference> </cac:ParentDocumentLineReference> </AttachedDocument>

Gmail **DC PROJECT S.A.S <dcprojectsas@gmail.com>**

ACTUALIZACION POLIZA CONTRATO 285-2023 DC PROJECT SAS

2 mensajes

DC PROJECT S.A.S <dcprojectsas@gmail.com> 31 de enero de 2024, 9:52 a.m.
Para: YULY PATRICIA CHANCHI GUAMANGA <ypchanchi@itp.edu.co>

Cordial Saludo

Envío Pólizas actualizadas para su respectiva revisión y aprobación para cargar a plataforma de SECOP II.

--
Cordialmente,

CARLOS ANDRES LOPEZ CAMACHO
Aux Contable
DC Project S.A.S
Cel. 3192224823

2 archivos adjuntos

DLF143664A_POLIZA_41_44_101278533_1.pdf
2968K

DLF143664A_POLIZA_41_44_101278533_2.pdf
2808K

YULY PATRICIA CHANCHI GUAMANGA <ypchanchi@itp.edu.co> 31 de enero de 2024, 11:24 a.m.
Para: "DC PROJECT S.A.S" <dcprojectsas@gmail.com>

Buen día,
Proceder a cargarlas en el SECOP II numeral de condiciones.
Gracias,

[Texto citado oculto]

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	◉ Sí ○ No
Fecha de notificación de prórroga	2/01/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No			
Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No			
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	◉ % del valor del contrato	10,000000	Fecha de vigencia (desde)	18/12/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	◉ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18/12/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/12/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/12/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) 5/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 19/12/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(31/01/2024 12:10:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acc
CO1.WRT.13569091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	80.997.790,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	6/03/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle	
CO1.WRT.13233546	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	80.997.790,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle	
CO1.WRT.13220517	Seriedad de la oferta	-	18.000.000,00 COP	-	11/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle	

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Barrio Luis Carlos Galan

Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa

País COLOMBIA

Departamento Putumayo

Municipio Mocoa

Dirección Barrio Luis Carlos Galan

Código postal 860001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

	1	Barrio Luis Carlos Galan	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión

INFORME DE APROBACION POR SUPERVISION

CONTRATO DE OBRA No. 285 DEL 2023

OBJETO:

"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA"

CONTRATISTA DE OBRA:

DC PROJECT S.A.S.
R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA

SUPERVISOR:

GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ

PERIODO DEL INFORME:

16 DE ENERO DE 2024 A 14 DE FEBRERO DE 2024

1. INTRODUCCION


El presente informe parcial No. 01, contempla la información correspondiente a la ejecución del contrato de obra No. 285 DE 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA"** Suscrito entre el Instituto Tecnológico del Putumayo ITP y DC PROJECT S.A.S. representada legalmente por Alejandro Quintana Anacona, el cual ha desarrollado las actividades contractuales en el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El sitio de ejecución del proyecto es en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Putumayo ITP. El cual requiere de la construcción de la línea de media tensión y transformación trifásica para el coliseo y edificio de 8 aulas e iluminación perimetral del instituto tecnológico del putumayo sede Mocoa.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato es ejecutado en la república de Colombia, Departamento del Putumayo, casco urbano de la ciudad de Mocoa.

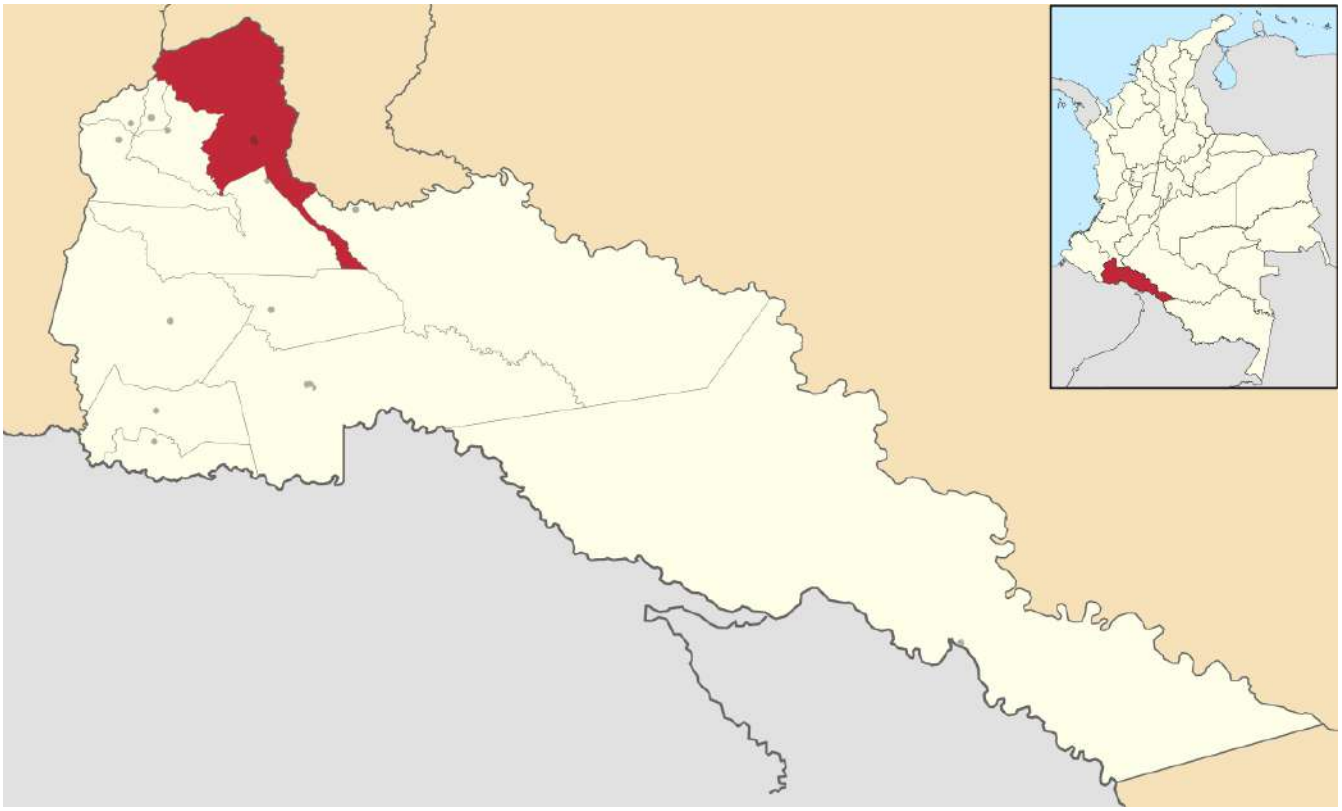

4. RESUMEN EJECUTIVO Y CONTRACTUAL

4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 285 de 2023.

CONTRATO DE OBRA N°	285 DEL 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	DC PROJECT S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO ITP.
APOYO A SUPERVISIÓN	GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS. ($179.995.091) MCTE IVA incluido, gastos directos e indirectos y demás impuestos que correspondan.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO 2024
FECHA DE TERMINACION	01 DE MARZO 2024

4.2. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO (AVANCE)

4.2.1. AVANCE FISICO: a la fecha del presente informe, el contrato de obra presenta un avance físico representado en los siguientes ítems.

1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO

4.2.2. AVANCE EN TIEMPO: a la fecha del presente informe, el contrato de obra presenta un avance en tiempo del 64,4%.

PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO VIGENTE	VEINTE (29) DIAS
AVANCE (%)	64,4%

4.2.3. AVANCE FINANCIERO: a la fecha del presente informe, el contrato presenta un avance del 59%, correspondiente a los siguientes valores:

VALOR INICIAL	$ 179.995.091,00
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO	$ 105.325.161,10
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 105.325.161,10
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 105.325.161,10**

5. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

5.1. PRESUPUESTO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**				
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360,00	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**				
2,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	$ 5.369.930,00	$ 5.369.930,00
2,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	UND	3,00	$ 426.649,00	$ 1.279.947,00
2,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	$ 2.195.100,00	$ 2.195.100,00
2,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**				
3,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37,00	$ 974.600,00	$ 36.060.200,00
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	27,00	$ 1.029.000,00	$ 27.783.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 126.996.224,00**
	ADMINISTRACION			**22%**	**$ 27.939.169,00**
	IMPREVISTOS			**3%**	**$ 3.809.887,00**
	UTILIDAD			**5%**	**$ 6.349.811,00**
	DERECHOS DE CONEXIÓN OPERADOR DE RED				**$ 8.700.000,00**
	CERTIFICACION RETIE				**$ 6.200.000,00**
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 179.995.091,00**

5.2. PRESUPUESTO EJECUTADO

En el periodo reportado del 16 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**				
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360,00	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**				
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**				
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	20,00	$ 1.029.000,00	$ 20.580.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 74.327.047,00**
	ADMINISTRACION			**22%**	**$ 16.351.950,34**
	IMPREVISTOS			**3%**	**$ 2.229.811,41**
	UTILIDAD			**5%**	**$ 3.716.352,35**
	DERECHOS DE CONEXIÓN OPERADOR DE RED				**$ 8.700.000,00**
	CERTIFICACION RETIE				**$ 0,00**
	COSTO TOTAL AVANCE DE OBRA				**$ 105.325.161,10**

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE CONTRATISTA

6.1. Control de pólizas

El contrato cuenta con póliza de seguro que ampara el contrato, de la firma SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit. 860.009.578-6 y presenta el siguiente estado:

Póliza de cumplimiento entidad estatal No. 41-44-101278533

- Anexo 0: con fecha de expedición 18/12/2023.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	18/12/2023	05/08/2024	$ 17.999.509.10
Calidad de los Elementos	18/12/2023	05/08/2024	$ 17.999.509.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/12/2023	05/02/2027	$ 8.999.754.55
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 01 días		$35.999.018.20

- Anexo 1: con fecha de expedición 30/01/2024.
- Anexo 2: con fecha de expedición 30/01/2024.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	16/01/2024	03/09/2024	$ 17.999.509.10
Calidad de los Elementos	16/01/2024	03/09/2024	$ 17.999.509.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	06/03/2027	$ 8.999.754.55
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 01 días		$35.999.018.20

6.2. Actos administrativos

Los actos suscritos durante el desarrollo del contrato fueron los siguientes:

- **Acta de inicio,** de fecha 16 de enero de 2024, se inicia ejecución del contrato.

6.3. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

Se verifico el pago de salud y aportes parafiscales del equipo de trabajo mediante planilla integrada de los meses del periodo del informe.

PERSONAL		DICIEMBRE 2023	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	**$ 2.222.600**	**9462012794**
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		

PERSONAL		ENERO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.230.600	9462016461
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		

Se verifica la afiliación de salud, pensión y ARL del personal contratado por obra el día 19 de diciembre del 2023.

PERSONAL CONTRATADO				
NOMBRE	CARGO	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva de seguros
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva de seguros
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA	Nueva EPS	Porvenir	Positiva de seguros
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva de seguros

6.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

6.4.1. CONTROL TECNICO

En el aspecto técnico se ejerce la supervisión y control garantizando el correcto cumplimiento de las obligaciones convenidas entre las partes contratantes, de esta manera es necesario llevar un control sobre el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes y verificar que la ejecución de estos avances y actividades se realicen conforme al alcance y términos de referencia, a la propuesta técnica económica y a las especificaciones pactadas en el contrato de obra.

Otra de las actividades correspondientes al aspecto técnico es Resolver las dudas sobre la interpretación de documentos, planos, especificaciones, pruebas, ensayos y términos de referencia y dar recomendaciones e instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de actividades y normas de diseño.

También hace parte de este aspecto la revisión de cantidades de obra, elaboración de bitácora, realizar comités técnicos y velar por la obtención de la mejor calidad en toda la obra.

6.4.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

Se ha realizado el control administrativo del proyecto, cumpliendo con la elaboración y suscripción de los actos administrativos presentados durante el periodo, la elaboración de informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual y se ha mantenido contacto permanente con el instituto Tecnológico del Putumayo ITP sobre el estado y desarrollo del contrato, así como de los eventos que han dado lugar a las suspensiones y reanudación de este.

Se ha realizado vigilancia al cumplimiento por parte del contratista, de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y que se apliquen las normas de seguridad industrial de cumplimiento obligatorio, así como también el cumplimiento de pagos de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales del contratista, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra.

Por otro lado, dentro de las actividades administrativas, se ha cumplido con la afiliación del equipo de trabajo a los sistemas de salud y pensiones y se ha brindado atención a las reclamaciones, sugerencias y solicitudes realizadas por el contratista.

6.4.3. CONTROL FINANCIERO

Las actividades desarrolladas en el aspecto financiero corresponden a cuidar de que se efectué una adecuada programación financiera, se realiza revisión de las cuentas presentadas por el contratista para tramites de pago y se vela para que la ejecución financiera se ajuste al programa de ejecución del proyecto.

6.5. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

- A la fecha del presente informe no se han presentado inconvenientes relevantes en el desarrollo de la obra.

6.6. CONCLUSIONES

1. Las obras se ejecutan de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato de obra y tienen un avance del 59%.

2. Se tiene un avance en tiempo del 64,4%, por lo que se recomienda intensificar la ejecución de obra, para que no se generen retrasos en tiempo de ejecución del contrato.

3. El contratista cumple a satisfacción con la seguridad industrial y salud ocupacional del personal que labora en el proyecto, mediante la dotación de elementos de seguridad y afiliaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores.

4. Se anexa registro fotográfico general de la ejecución de obra.

5. Se espera para el día 16 de febrero la visita del organismo de inspección RETIE, de acuerdo a información dada por el contratista.

GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a la Supervisión
Instituto Tecnológico del Putumayo. I.T.P.

GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO





GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión





GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión





GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión









GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA

IES Vigilada por: La educación es de todos Mineducación

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 01

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: DC PROJECT SAS
SUPERVISOR: INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

FECHA ACTA: 14 de febrero de 2024

Mediante la presente acta, DC PROJECT S.A.S, en calidad de contratista y CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA, como director de obra, MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO rector ITP, en calidad de supervisor, JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA, en calidad de profesional universitario area de planeacion ITP, JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS profesional de apoyo en el área de Planeación ITP como apoyo a la supervision, dejan constancia de las cantidades de obra ejecutadas a la fecha en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		SALDO	
			CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES**												
1.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1.00	$ 2,374,000.00	$ 2,374,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,374,000.00	1.00	$ 2,374,000.00	0.00	$ -
1.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1.00	$ 17,629,950.00	$ 17,629,950.00	0.00	$ -	1.00	$ 17,629,950.00	1.00	$ 17,629,950.00	0.00	$ -
1.3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2.00	$ 2,581,480.00	$ 5,162,960.00	0.00	$ -	2.00	$ 5,162,960.00	2.00	$ 5,162,960.00	0.00	$ -
1.4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2.00	$ 1,852,400.00	$ 3,704,800.00	0.00	$ -	2.00	$ 3,704,800.00	2.00	$ 3,704,800.00	0.00	$ -
1.5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360.00	$ 4,649.00	$ 1,673,640.00	0.00	$ -	360.00	$ 1,673,640.00	360.00	$ 1,673,640.00	0.00	$ -
1.6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25.00	$ 61,750.00	$ 1,543,750.00	0.00	$ -	25.00	$ 1,543,750.00	25.00	$ 1,543,750.00	0.00	$ -
1.7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1.00	$ 7,863,387.00	$ 7,863,387.00	0.00	$ -	1.00	$ 7,863,387.00	1.00	$ 7,863,387.00	0.00	$ -
1.8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1.00	$ 12,190,650.00	$ 12,190,650.00	0.00	$ -	1.00	$ 12,190,650.00	1.00	$ 12,190,650.00	0.00	$ -
2	**EQUIPO DE MEDIDA**												
2.1	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1.00	$ 5,369,930.00	$ 5,369,930.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,369,930.00
2.2	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	UND	3.00	$ 426,649.00	$ 1,279,947.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 1,279,947.00
2.3	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1.00	$ 2,195,100.00	$ 2,195,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,195,100.00
2.4	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1.00	$ 561,000.00	$ 561,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 561,000.00
2.5	TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250ª	UND	1.00	$ 1,603,910.00	$ 1,603,910.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,603,910.00	1.00	$ 1,603,910.00	0.00	$ -
3	**SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A**												
3.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37.00	$ 974,600.00	$ 36,060,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	37.00	$ 36,060,200.00
3.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	27.00	$ 1,029,000.00	$ 27,783,000.00	0.00	$ -	20.00	$ 20,580,000.00	20.00	$ 20,580,000.00	7.00	$ 7,203,000.00
TOTAL					**$ 126,996,224.00**		**$ -**		**$ 74,327,047.00**		**$ 74,327,047.00**		**$ 52,669,177.00**
ADMINISTRACION (A)			**22%**		**$ 27,939,169.28**		**$ -**		**$ 16,351,950.34**		**$ 16,351,950.34**		**$ 11,587,218.94**
IMPREVISTOS (I)			**3%**		**$ 3,809,886.72**		**$ -**		**$ 2,229,811.41**		**$ 2,229,811.41**		**$ 1,580,075.31**
UTILIDAD (U)			**5%**		**$ 6,349,811.20**		**$ -**		**$ 3,716,352.35**		**$ 3,716,352.35**		**$ 2,633,458.85**
TRAMITES ANTE EL OR (Derechos de Conexión, Matrícula Y D.N.A.)					**$ 8,700,000.00**		**$ -**		**$ 8,700,000.00**				**$ -**
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP (Según Factura - incluye impuestos y deducciones)					**$ 6,200,000.00**		**$ -**						**$ 6,200,000.00**
VALORES TOTALES DEL CONTRATO					**$ 179,995,091**		**$ -**		**$ 105,325,161.10**		**$ 74,327,047.00**		**$ 74,669,930**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 179,995,091**
VALOR ACUMULADO	$ -	
VALOR ACTA Nº 1	**$ 105,325,161.10**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 74,669,930.10**	
SUMAS IGUALES	**$ 179,995,091**	**$ 179,995,091**

Vo.Bo. CONTRATISTA		**Vo.Bo. INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO**					
		SUPERVISOR DEL CONTRATO		**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION**		**PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION**	
NOMBRE	DC PROJECT SAS	**NOMBRE**	MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO	**NOMBRE**	JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA	**NOMBRE**	GERMAN CHAMORRO
FIRMA		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	

PROJECT S.A.S
Ingenieria a su Servicio

INFORME DE OBRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

CONTRATO 285 DE 2023



Mocoa, Putumayo.
Febrero de 2024

INFORME DE OBRA

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA

CONTRATISTA:

DC PROJECT S.A.S

R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA

PERIODO DEL INFORME:

16 DE ENERO DE 2024 A 14 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE ENTREGA INFORME:

14 DE FEBRERO DE 2024

Contenido

1 INTRODUCCION 4
2 LOCALIZACION ESPECIFICA 4
3 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
4 AVANCE DE OBRA 6
4.1 AVANCE FISICO 6
4.2 AVANCE EN TIEMPO 6
4.3 AVANCE FINANCIERO 6
5 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO 7
5.1 ITEMS CONTRATADOS 7
5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
6.3 FORMA DE PAGO 9
6.4 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 10
7 CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA 10
8 NOVEDADES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 10
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN FUNCION DEL PROYECTO 11

1 INTRODUCCION

El presente informe consiste en la ejecución del contrato en mención; construcción de la línea de media tensión y transformación trifásica para el coliseo y aulas nuevas del instituto tecnológico del putumayo - ITP, en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Para la transformación de energía se construye armario eléctrico para gabinete con barraje trifásica intemperie para 6 totalizadores, para buen funcionamiento y distribución del flujo de energía.

2 LOCALIZACION ESPECIFICA

El proyecto se encuentra ubicado en distintos puntos de las instalaciones del Instituto Tecnológico del Putumayo ITP, en la ciudad de Mocoa, Putumayo.



3 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°	285 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	DC PROJECT S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO ITP.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS. ($179.995.091) MCTE IVA incluido, gastos directos e indirectos y demás impuestos que correspondan.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

4 AVANCE DE OBRA

A continuación, se presentan los componentes y la proyección de actividades finales, de la ejecución de la obra del presente contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, cantidades y demás consideraciones para cada caso según lo contratado.

4.1 AVANCE FISICO

De acuerdo a las actividades ejecutadas y el reporte de avance físico, en el periodo del reporte se ejecutó el 59% del objeto contractual, por lo tanto, se cuenta con un óptimo desarrollo del proyecto acorde a los tiempos de ejecución y los establecidos de acuerdo al cronograma de obra presentado.

4.2 AVANCE EN TIEMPO

A la fecha del presente informe, la obra presenta un avance en tiempo del 64.4% de acuerdo a la siguiente información.

PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	16 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION	01 de marzo de 2024
PERIODO DEL INFORME	16 de enero 2024 a 14 de febrero 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO	VEINTEINUEVE(20) DÍAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	64.4%

4.3 AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe del contrato de obra 285 de 2023, presenta un avance financiero del 59% de acuerdo a los siguientes valores.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 179.995.091,00
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0,00
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	$ 105.325.161,10
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	59%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 74.669.929,90
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	**$ 105.325.161,10**

5 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

5.1 ITEMS CONTRATADOS

ITEM	DETALLE	UND
1	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**	
1.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND
1.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND
1.3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML
1.6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML
1.7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND
1.8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL
2	**EQUIPO DE MEDIDA.**	
2.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND
2.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	UND
2.3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND
2.4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND
2.5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND
3	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**	
3.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND
3.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas durante el periodo del 16 de enero de 2024 al 05 de febrero de 2024 se describen de acuerdo a los ítems contratados y se llevaron a cabo las siguientes actividades con el registro fotográfico:

DESCRIPCIÓN			PROYECTO CONTRATADO			ACTA PARCIAL No. 01		
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**
1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**							
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360,00	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00	360,00	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**							
2,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	$ 5.369.930,00	$ 5.369.930,00	0,00	$ 5.369.930,00	$ 0,00
2,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	UND	3,00	$ 426.649,00	$ 1.279.947,00	0,00	$ 426.649,00	$ 0,00
2,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	$ 2.195.100,00	$ 2.195.100,00	0,00	$ 2.195.100,00	$ 0,00
2,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00	0,00	$ 561.000,00	$ 0,00
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**							
3,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37,00	$ 974.600,00	$ 36.060.200,00	0,00	$ 974.600,00	$ 0,00
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	27,00	$ 1.029.000,00	$ 27.783.000,00	20,00	$ 1.029.000,00	$ 20.580.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 126.996.224,00**		**TOTAL COSTO DIRECTO**	$ 74.327.047,00
				ADMINISTRACION 22%	**$ 27.939.169,00**		**ADMINISTRACIÓN**	$ 16.351.350,34
				IMPREVISTOS 3%	**$ 3.809.887,00**		**IMPREVISTOS**	$ 2.229.811,41
				UTILIDAD 5%	**$ 6.349.811,00**		**UTILIDAD**	$ 3.716.352,35
				DERECHOS DE CONEXIÓN OPERADOR DE RED	**$ 8.700.000,00**			$ 8.700.000,00
				CERTIFICACION RETIE	**$ 6.200.000,00**			$ 0,00
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 179.995.091,00**		**TOTAL**	**$ 105.325.161,10**

Las obras ejecutadas en el periodo del informe, corresponden a la construcción de la línea de media tensión y transformación trifásica para el coliseo y las aulas nuevas del instituto tecnológico del putumayo - ITP, en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.

Anexo registro fotográfico y descripción de actividades de la obra.

6.3 FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA el valor de la obra resultante del presente proceso de la siguiente manera.

1. Pago por Acta Parcial.

La entidad cancelará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante la presentación de actas de recibo parciales de obra, el contratista deberá demostrar haber ejecutado mínimo un 50% de la obra física y para el trámite de pago de la segunda acta parcial deberá acreditar haber ejecutado mínimo un 40% de la obra física.

2. Pago final

El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar la obra en las condiciones requeridas y de la presentación de informes requeridos con registros fotográficos y demás anexos propios de la ejecución y del recibo final de obra, previa certificación del cumplimiento expedida por la interventoría y el visto bueno del supervisor de la entidad, los informes respectivos y las planillas que demuestren el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar y acta de liquidación.

Pagos realizados

Al contratista de obra se le han realizado los siguientes pagos

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$ 179.995.091,00
Valor parcial pagado	$ 0,00
Valor presente informe	$ 105.325.161,10
Saldo pendiente por pagar	$ 74.669.929.90

6.4 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL		DICIEMBRE 2023	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.222.600	9462012794
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
TOTAL			

PERSONAL		ENERO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.230.600	9462016461
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
TOTAL			

Se presenta planillas como soporte de pago de salud pensión, riesgos y parafiscales del mes de diciembre de 2023 y enero de 2024 anexos al presente informe. (Anexo planillas PILA)

7 CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA


- Durante la obra el contratista realizó actividades encaminadas a la protección ambiental de la zona.
- Se dispuso puntos para el almacenamiento adecuado de residuos naturales del área y residuos sólidos de la obra.
- Se tuvo especial cuidado con las zonas verdes de las instalaciones del Instituto; para no perjudicar las diferentes especies de árboles que hay en el lugar.

8 NOVEDADES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Hasta la fecha no se ha presentado dificultades significativas o de impacto que modifiquen el rendimiento de la obra.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN FUNCION DEL PROYECTO

- Se ha ejecutado el 59% del objeto contractual
- El valor ejecutado en el presente informe del contrato de obra 285-2023 es de $105.325.161,10 y el valor pendiente por ejecutar es por la suma de $ 74.669.929,90 valores que son el producto de multiplicar el valor unitario de cada ítem contratado, por la cantidad requerida en la obra donde el saldo pendiente de ejecución fue calculado por la diferencia entre el valor contractual y el valor ejecutado.



ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
C.C. 1.061.686.538
REPRESENTANTE LEGAL
DC PROJECT S.A.S

Anexo 1. Registro fotográfico y descripción de actividades ejecutadas.

1.1 SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 511






1.2 SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711- TRANSFORMADOR DE 75KVA





1.3 SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711



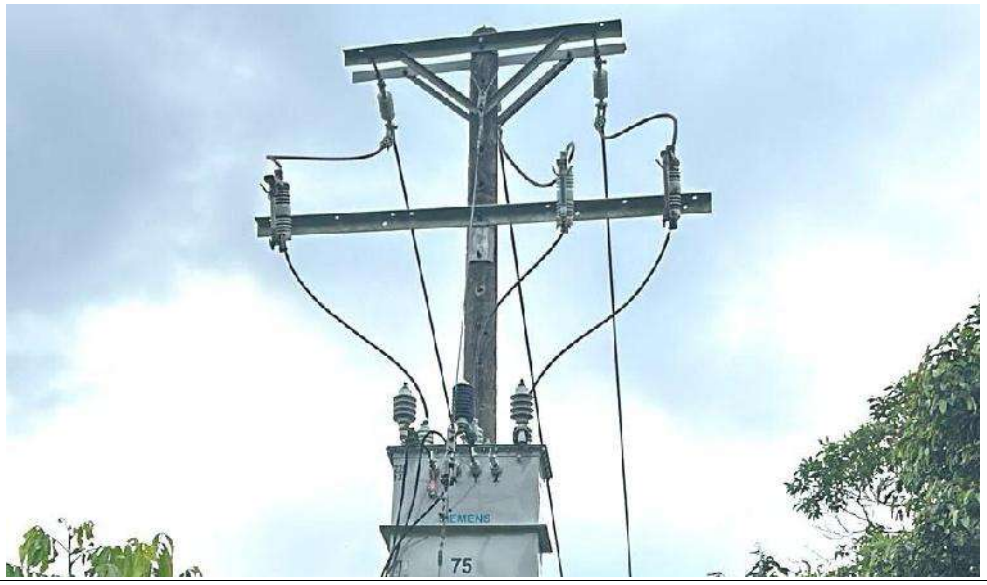

1.4 SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550





1.5 SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR





1.6 SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0







1.7 SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE





1.8 CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO





2.5 SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250ª





3.2 SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO


CERTIFICA:

Que el ingeniero **ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**, identificado con C.C 1.061.686.538, en calidad de representante legal, de la empresa DC PROJECT S.A.S. con NIT No. 901.410.401-8 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el ARTÍCULO 50 de la ley 789 de diciembre de 2002 y el ARTÍCULO 23 de la LEY 1150 de 2007.

Dado en Mocoa, Putumayo a los cuatro (04) días del mes de Febrero de 2024

ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY
Contador Público Titulado
T.P 167769-T

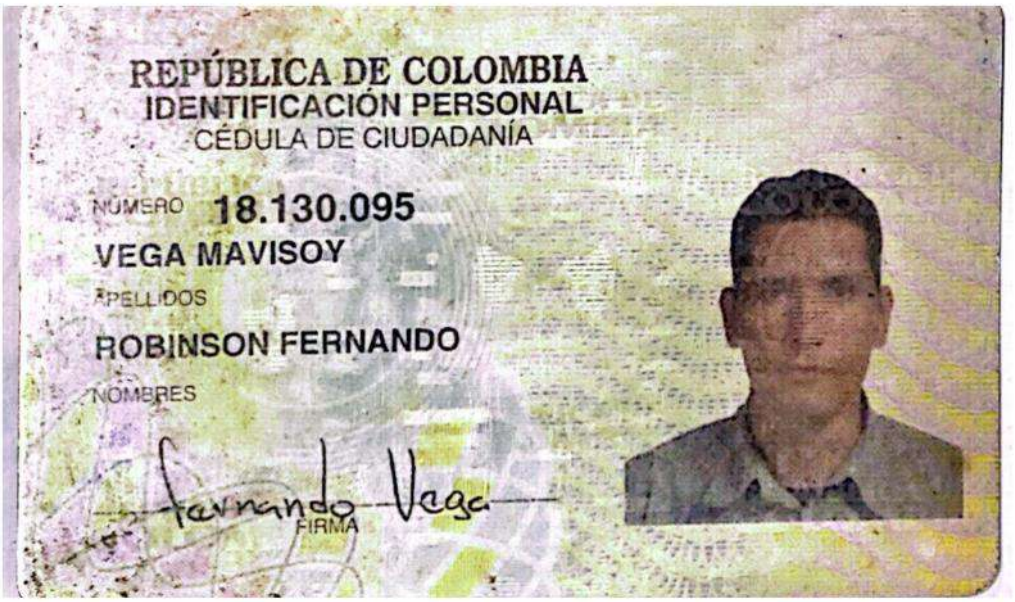

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 18.130.095

VEGA MAVISOY

APELLIDOS

ROBINSON FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1983

MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

04-OCT-2001 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2300100-00929241-M-0018130095-20170802 0056873023A 2 9910074346

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CECA6A4A2DE8CEEE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18130095 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 167769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



167769-T

ROBINSON FERNANDO
VEGA MAVISOY
C.C. 18130095
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD CESMAG

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 174914

FIRMA DEL TITULAR

95219

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CECA6A4A2DE8CEEE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18130095 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 167769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



167769-T

ROBINSON FERNANDO
VEGA MAVISOY
C.C. 18130095
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD CESMAG

PRESIDENTE


DANIEL SARMIENTO PAVAS 174914

FIRMA DEL TITULAR

95219

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

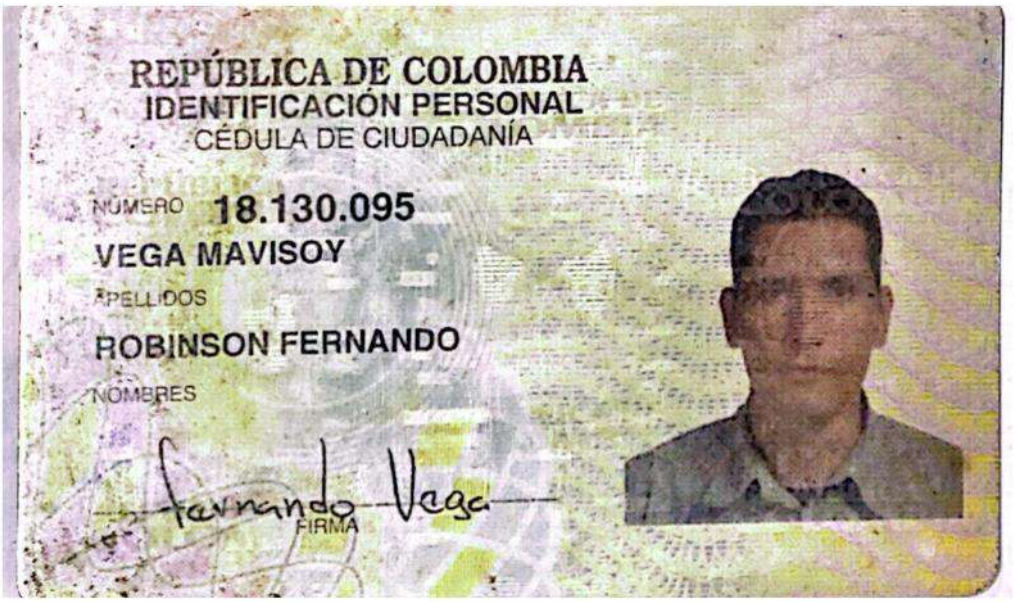

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 18.130.095

VEGA MAVISOY

APELLIDOS

ROBINSON FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1983

MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

04-OCT-2001 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2300100-00929241-M-0018130095-20170802 0056873023A 2 9910074346

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO CONDOMINIO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	451103952	9462016461	E	2024/02/02	2024/02/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$2,230,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13352109	ARAQUE CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	1124862605	CHAMORRO PABLO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	1123324852	PANTOJA RUTH	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	1124861171	PAZMIÑO CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(4)**					**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$650,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$260,300**		**$5,200,000**	**$260,000**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,000	$0	$839,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$0	$629,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$209,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$260,300	$0	$262,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$260,300	$0	$262,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$209,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$208,000	$0	$209,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$650,000	$0	$655,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$650,000	$0	$655,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$156,000	$0	$157,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$156,000	$0	$157,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$104,000	$0	$105,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$104,000	$0	$105,000
TOTAL				**4**	**$2,210,300**	**$0**	**$2,230,600**

2024/02/12 02:33 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14972346768

(415)7707212489984(8020) 000001497234676 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DC PROJECT S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CARR 29 10 16 BRR CONDOMINIO NORTE

42. Correo electrónico dcprojectsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 7 7 3 4 1 9	3 1 9 2 2 2 4 8 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 2 0 0 9 0 9	4 6 6 3	2 0 2 0 0 9 0 9	4 2 9 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 15 / 10 : 39: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUINTANA ANACONA ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962804043

(415)7707212489984(8020) **000001496280404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 9 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 9 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 7 7 2 4 0	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	4 6	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 9 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 1 0 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962804043

(415)7707212489984(8020) **000001496280404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 9 1 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 6 8 6 5 3 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
QUINTANA	ANACONA	ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962804043

(415)7707212489984(8020) **000001496280404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 7 3 5 3 5 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALAS	GOMEZ	ALICIA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 9 1 0	2 0 2 1 0 2 0 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **DC PROJECT S.A.S.**, identificado(a) con NIT número **901.410.401-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0598427789** aperturada el **22 de septiembre del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **25 de enero del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0598427789**
Cuenta de 16 dígitos:**0598000200427789**
Cuenta de 20 dígitos:**00130598000200427789**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
