## CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3323-2023

## OBJETO:
## "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO".

# INFORME DE SUPERVISION

**PERIODO: 30/DICIEMBRE/2023 AL 31/ENERO/2024**

**San Juan de Pasto, Enero de 2024.**

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código: SIVIC FTO 35-2<br>Versión: 02<br>Vigente desde: 2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION: | 31 de enero de 2024. | CON CORTE: | 31 de enero de 2024 |

**1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS**

| | |
|---|---|
| PROCESO DE CONTRATACION: | Contratación Directa. |
| CONVENIO MACRO No: | Convenio Interadministrativo. |
| CONVENIO No.: | Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 del 28 de junio de 202 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDP No.: | 2023060415.<br>Cuenta 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2022003520100-53290-16-1.3.3.1.00. : Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica-SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación. | FECHA: 14 de junio de 2023. | $ 2.900.000.000,00 |
| REGISTRO No: | 2023061318.<br>Cuenta 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2022003520100-53290-16-1.3.3.1.00. : Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica-SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación. | FECHA: 28 de junio de 2023. | $ 2.839.026.698,88 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Aunar esfuerzos Administrativos, Técnicos, Financieros y Administrativos entre el departamento de Nariño y el municipio de San Pablo para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Construcción Muro de Protección para mitigar el riesgo de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros del casco urbano del municipio de San Pablo" |

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO | Código SIVEYC FTO 35-2<br>Versión 0 0<br>Vig: 23/05/2016 |

| | | |
|---|---|---|
| MODIFICACION No. 01-2023: | No. y fecha: 01 del 11 de agosto de 2023. | Detalle: Aclaratorio de textos en cláusulas contractuales |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | Municipio de San Pablo.<br>Representante Legal: Ricardo Emiro Gómez Lasso (suscripción de Convenio Interadministrativo)- Ing. Mario Trujillo Cerón - Alcalde Municipio de San Pablo.<br>NIT 800.099.143-2.<br><br>Contratista de Obra Civil:<br>Diego Reinel Fernandez Ordoñez. |
| CONTRATISTA INTERVENTORIA: | Municipio de San Pablo.<br>Representante Legal: Ricardo Emiro Gómez Lasso (suscripción de Convenio Interadministrativo)- Ing. Mario Trujillo Cerón - Alcalde Municipio de San Pablo.<br>NIT 800.099.143-2.<br><br>Contratista de Interventoría:<br>Antonio José rosada Bedoya. |
| SUPERVISOR: | Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre.<br>Secretario de Infraestructura y Minas. |
| PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - AREA TECNICA: | Ing. Ana Cristina Vela Perdomo.<br>Profesional Universitaria SIMD. |
| PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - AREA JURIDICA: | Dra. María Natalia Cualtán O.<br>Abogada Contratista SIMD. |
| META FISICA | Muro de contención de Longitud = 200 metros. |
| VALOR DEL CONVENIO: | $ 2.844.026.698,88 |
| APORTE DEPARTAMENTO: | $ 2.839.026.698,88 |
| OBRA CIVIL: | $ 2.653.806.566,58 |
| INTERVENTORIA: | $ 185.220.132,30. |
| APORTE MUNICIPIO: | $5.000.000,00 - Estudios y Diseños del Muro de Contención. |
| FECHA DE INICIACION: | 31 de julio de 2023. |

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código SIVEYC FTO.35-2<br>Versión 0 0<br>Vig 23/05/2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLAZO DEL CONVENIO: | Diez (10) meses. | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 30 de mayo de 2024. | | | |
| SUSPENSION: | - | | | |
| REINICIO: | - | | | |
| PORCENTEJE ANTICIPO: | 40% | | | |
| TOTAL ANTICIPO: | $ 1.135.610.679,55 | | | |
| VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC. | $ 1.850.361.224,99 | | | |
| GARANTIAS: | Aseguradora Solidaria. | | | |
| Póliza No.: | 436-47-994000058928. | | | |
| % AVANCE FISICO EN OBRA | % PROGRAMADO | 72,45% | % EJECUTADO: | 69,98% |
| % AVANCE FINANCIERO | % PROGRAMADO | 72,45% | % EJECUTADO | 69,98% |
| META FISICA A LA FECHA | 1 | Atención de emergencia - Muro de Contención. | | |

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS<br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO | Código : SIVEYC.FTO.35-<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

**2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO**

**ASPECTOS TECNICOS:**

El Departamento de Nariño suscribió con el municiplo de San Pablo el Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 del 28 de junio de 2023 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos Administrativos, Técnicos, Financieros y Administrativos entre el departamento de Nariño y el municipio de San Pablo para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Construcción Muro de Protección para mitigar el riesgo de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros del casco urbano del municipio de San Pablo", por un término de diez (10) meses, iniciando el 31 de julio de 2023 hasta el 30 de mayo de 2024.

El municipio de San Pablo como ejecutor del proyecto adelantó la contratación de los contratos de Obra Civil e Interventoría derivados del convenio.

- Obra Civil con el Contratista Diego Reinel Fernandez Ordoñez, con quien se suscribió el Confiato de Obra No. UM 103.1-2D-10-16 del 11 de agosto de 2023, par valor de S2.653.806.566,58. con un plazo de ejecución de 10 meses y con una iniciación de obra del 22 de agosto de 2023. Mediante Otrosí No. 1, se modifica la cláusula Sexta "Plazo del contratoy cronograma estimado de obra a ocho (08) meses.

- Interventoría con el Contratista Antonio José Rosada Bedoya, con quien se suscribió el Contrato de Interventoría No. UM 130.1-20-10-17 del 11 de agosto de 2023, por valor de $185.220.132,30, con un plazo de ejecución de 10 meses y con una inlciación de obra del 22 de agosto de 2023. Mediante Otrosí No. 1, se modifica la cláusula Sexta "Plazo del contratoy cronograma estimado de obra a ocho (08) meses.

Según Informe de Interventoría Semanal, la obra civil lleva una ejecución del 68,41%.

Interventoría informa en los Informes Semanales y Mensual, a la Secretaría de Infraestructura y Minas, los avances de la obra civil del muro de protección en ua longitud de 126,00 metros lineales, así:

- Desvío de la quebrada Bateros, el cual se ha realizado en su totalidad, es decir en una longitud de 202 metros lineales. Las lluvias presentes en la región han ocasionado que el Contratista de Obra vuelva a realizar el Desvio del cauce de la quebrada Bateros y se haya generado daños en la nivelación del terreno y formaletas que se habían realizado para la fundición del concreto ciclópeo. Interventoría informa que ésta actividad por el invierno presentado ha generado en varias oportunidades dificultades en los trabajos y ha sido necesario realizar nuevamente el desvio de la quebrada en los sectores de la obra.

- Excavaciones en Conglomerado: 1.063,88 M3 y en Roca: 455,95 M3.
- Demolición de estructuras.
- Transporte de material sobrante de la obra.
- Concreto Ciclópeo para cimentación: 218,54 M3.
- Concreto Reforzado, resistencia 4.000 PSI, para zarpas, cuerpo de muro: 342,92 M3.
- Acer de refuerzo Fy 420 Mpa, para cimentación, zarpas y cuerpos de muro: 32.883 Kgs.
- Entibado para Muro.
- Relleno para estructuras:157,30 M3.
- Desmonte de tres (03) puentes peatonales.
- Desmonte de muro en ladrillo y malla, en una longitud de 65 metros.

Interventoría informa que las estructuras de contención y protección de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros, ya fue realizada por sus propietarios, evitando de esta manera el riesgo de caída y así atenten con sus vidas.


Además, informa que el Personal tanto de Obra Civil como de Interventoría aprobados para la ejecución del contrato se mantiene con su vinculación a Salud, Pensión y Riesgos.

Que en la obra se ha utilizado equipos como: rotomartillos para la demolición de rocas, retroexcavadora de orugas y herramienta menor.

A los concretos empleados se han tomado muestras de laboratorio para ensayos de compresión en los concretos de las zapatas, y cuerpo del muro de protección.

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

Se tramitó por parte del Municipio de San Pablo el pago del Anticipo del Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 por valor del Cuarenta por ciento (40%) que equivale a: Mil ciento treinta y cinco millones seiscientos diez mil seiscientos setenta y nueve pesos con cincuenta y cinco centavos ($1.135.610.679,55), a través del cargue del aplicativo SISCAR Mi Pai Nariño; Así como también el Pago Parcial No. 01 el 29 de noviembre de 2023 por valor total de Mil ciento noventa y un millones doscientos cincuenta mil novecientos nueve pesos con siete centavos ($1.191.250.909,07) para un valor neto de Setecientos catorce millones setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cuatro centavos ($714.750.545,44), previa entrega de los documentos técnicos y legales requeridos para realizar los pagos.

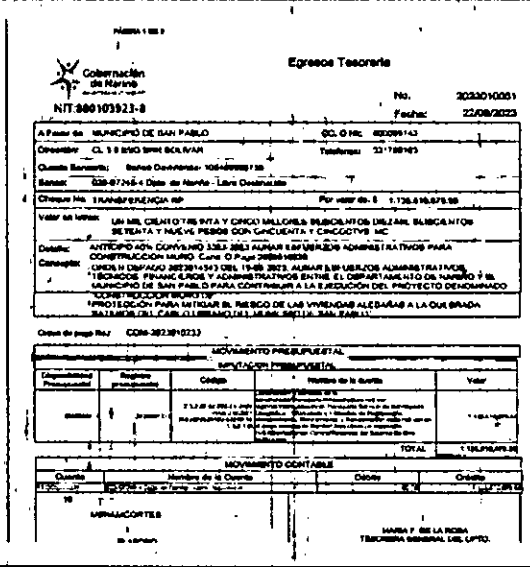

Egresos Tesorería

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

No. 2023010051

Fecha: 22/08/2023

A Favor de: MUNICIPIO DE SAN PABLO CC. O Nit: 800099143

Dirección: CL 5 5 B50 BRR BOLIVAR Teléfonos: 3217985165

Cuenta Bancaria: Banco Davivienda 108400000138

Banco: 039-97249-4 Dpto de Nariño - Libre Destinación

Cheque No: 1 TRANSFERENCIA INF Por valor de: $ 1.135.610.679,55

Valor en letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS M/C

Detalle: ANTICIPO 40% CONVENIO 3323 2023 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA

Concepto: CONSTRUCCION MURO Cont. O Pago 399901 0039

CRDN N DSPACHO 3823914 9/3 DEL 19-09- 2023 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION MURO DE

PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATANOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO"

Orden de pago No: CON-3823910233

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.1.2.02.02.009.1.1.1

**ASPECTOS LEGALES :**

Se encuentra legalizado el Modificatorio No. 01 de 2023 al Convenio Interadministrativo No. GN3323- 2023, en el Departamento Administrativo de Contratación de Nariño - DAC, con el apoyo de la Dra. Eliana Cruz, Abogada Contratista de Apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Minas.

**3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se solicitó a Interventoría continuar con el control y seguimiento a las actividades contratadas, llevando bitácora de trabajo suscrita por Contratista de Obra Civil y de Interventoría, además del Personal de los Contratistas.

- Se recuerda la solicitud realizada al Municipio de San Pablo, atender la situación de riesgo de las viviendas aledañas a la construcción del muro de contención teniendo en cuenta que éstas viviendas hasta con tres niveles de construcción se encuentran en el aire, teniendo en cuenta que su cimentación no existe, motivo por el cual es necesario tomar las medidas necesarias para su desalojo y demolición de los niveles de las viviendas afectados pr la ola invernal. Al respecto, los propietarios de las viviendas han realizado refuerzos a la cimentación y estructura de las viviendas en el área aledaña a la quebrada Bateros.

- Se recordó y solicitó al Municipio de San Pablo y a Interventoría la entrega de los Informes Semanales y del Informe Mensual con cinco (05) días de antelación para revisión.

Aprobó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre.
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD.
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. Luis Alberto Castillo.
Sub-Secretario de Infraestructura y Vías - SIMD.
Gobernación de Nariño.


Proyecto: Ing. Ana Cristina Vela Perdomo
Profesional Universitaria - SIMD.
Gobernación de Nariño.

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS<br>FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION | Código. SIVEYC.FTO.35-7<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

## 7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (ESTADO FINAL)

CONVENIO No.: GN3323-2023.

| CAP. | ACT | DETALLE - ACTIVIDADES | VR CONTRATADO | VR EJECUTADO | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Particular 1 | Desvío temporal de cause quebrada lateros con material seleccionado recubierto con estopas de polisileno. | $ 26.176.755,80 | $ 26 176 755,80 | $ - | 0% |
| 1.02 | Particular 2 | Excavación en material conglomerado | $ 45 232.375,63 | $ 44 327 728,12 | $ (904 647,51) | -2% |
| 1.03 | 210 2 1 P | Excavación en roca. | $ 58 516.211,05 | $ 57 345 886,83 | $ (1.170 324,22) | -2% |
| 1.04 | 201 7 | Demolición de estructuras incluye desalojo. | $ 7 587 211,31 | $ 7.587.211,31 | $ - | 0% |
| 1.05 | 900.2.2 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m) medidos a partir de cien metros (100 m). | $ 13 667.475,28 | $ 13 667.475,28 | $ - | |
| 1.06 | 639.1.7 P | Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI - 40% Rajón, mezclado in situ. | $ 134 355.119,42 | $ 124 148.678,40 | $ (10 206 441,02) | |
| 1.07 | 630 1.3.1 P | Concreto reforzado resistencia 4000 PSI, mezclado in situ | $ 877 506 587,88 | $ 750 353 405,25 | $ (127 153 182,63) | |
| 1.08 | 640.1 | Acero de refuerzo Fy 420 Mpa | $ 711.889 138,79 | $ 630 160 587,90 | $ (81 728 550,89) | |
| 1.09 | Particular 3 | Entibado para muro. | $ 43,371 242,85 | $ 43.371.242,85 | $ - | |
| 1.10 | 610 2 | Relleno para estructuras con recebo. | $ 321.127 277,41 | $ 101 869 967,94 | $ (219 257 309,47) | |
| 1.11 | 673.2 | Material granular drenante para filtro. | $ 24 129 008,10 | $ - | $ (24 129.008,10) | |
| 1.12 | 673 1.1 P | Geotextil NT 2500. | $ 15.623 250,24 | $ - | $ (15 623 250,24) | |
| 1.13 | 663.1 P | Tubería de plástico tipo PVC 2" para lagrimales. | $ 3 549.361,66 | $ 2 779 251,80 | $ (770 109,86) | |
| 1.14 | 663.1 P | Tubería de plástico tipo PVC perforada 4". | $ 9.346.459,20 | $ - | $ (9 346 459,20) | |
| 1.15 | Particular 4 | Desmonte de puentes en madera existentes Ancho=1 3 m, longitud 20 metros incluye desalojo. | $ 2.849.542,80 | $ 2.849 542,80 | $ - | |
| 1.16 | Particular 5 | Desmonte de muro en ladrillo y malla de cerramiento en mal estado incluye desalojo. | $ 3.869.299,20 | $ - | $ (3 869 299,20) | |
| 1.17 | Particular 6 | Cerramiento en malla eslabonada h=1,5 m, con tubería metálica, angulos de 1" para borde de la malla, columnetas en concreto h=0,5m y muro en ladrillo comun a la vista. | $ 46.156 510,40 | $ 2.849.542,80 | $ (43.306 967,60) | |
| 1.18 | Particular 7 | Puertas metálicas en malla de cerramiento de 1 m x 2 m y tubo de 1 1/2". | $ 1 389.661,00 | $ 2.733.744,00 | $ 1 344 083,00 | |
| 1.19 | Particular 8 | Andenes en concreto de 3000 PSI, espesor 0,1 m (incluye malla electrosoldada 5mm). | $ 20.775 955,20 | $ - | $ (20.775.955,20) | |
| 2.01 | 201.7 | Demolición de estructuras de pavimento incluye desalojo | $ 14 383 082,84 | $ - | $ (14 383 082,84) | |
| 2.02 | 310.1 | Conformación de la calzada existente | $ 816 602,20 | $ - | $ (816.602,20) | |
| 2.03 | 210 2 2 | Excavación en material común de la explanación y canales incluye escombrera. | $ 7.979 822,92 | $ - | $ (7.979 822,92) | |
| 2.04 | 900.2.2 | Transporta de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m). | $ 2.920 602,10 | $ - | $ (2 920 602,10) | |
| 2.05 | 311 1 | Mejoramiento a través de afirmado | $ 41.143.620,86 | $ - | $ (41 143 620,86) | |
| 2.06 | 330.3.2 | Base granular clase C gradación gruesa | $ 13 483.766,79 | $ - | $ (13.483.766,79) | -100% |
| 2.07 | 500 1.2 P | Pavimento en concreto hidráulico - NT1 - MR 3,8 Mpa. | $ 91.701 077,83 | $ - | $ (91 701 077,83) | -100% |
| 2.08 | 672.1 | Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo (0,20 x 0,15 m) | $ 10.776 438,40 | $ - | $ (10.776 438,40) | -100% |
| 2.09 | 640 1 | Acero de refuerzo Fy 420 Mpa | $ 3.177.151,80 | $ - | $ (3.177.151,80) | -100% |
| 2.10 | 710.1.1 | Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lámina retrorreflectiva tipo IV (75x75 cm). | $ 1 585.032,80 | $ - | $ (1 585 032,80) | -100% |
| 2.11 | 700 1 | Líneas de demarcación con pintura en frío | $ 922.761,84 | $ - | $ (922 761,84) | -100% |
| | | Implementar PAGA. | $ 60.821.042,54 | $ 37.366 495,14 | $ (23 454 547,40) | -39% |
| | | Implementar Plan de Manejo Ambiental | $ 36.975 122,46 | $ 19 892 538,74 | $ (17 082 583,72) | -46% |
| | | Interventoría. | $ 185.220.132,30 | $ 118.540 884,67 | $ (66 679.247,63) | -36% |
| | | COSTO TOTAL | $ 2.839.026.698,88 | $ 1.986.020.939,63 | $ (853 005.759,25) | -30% |

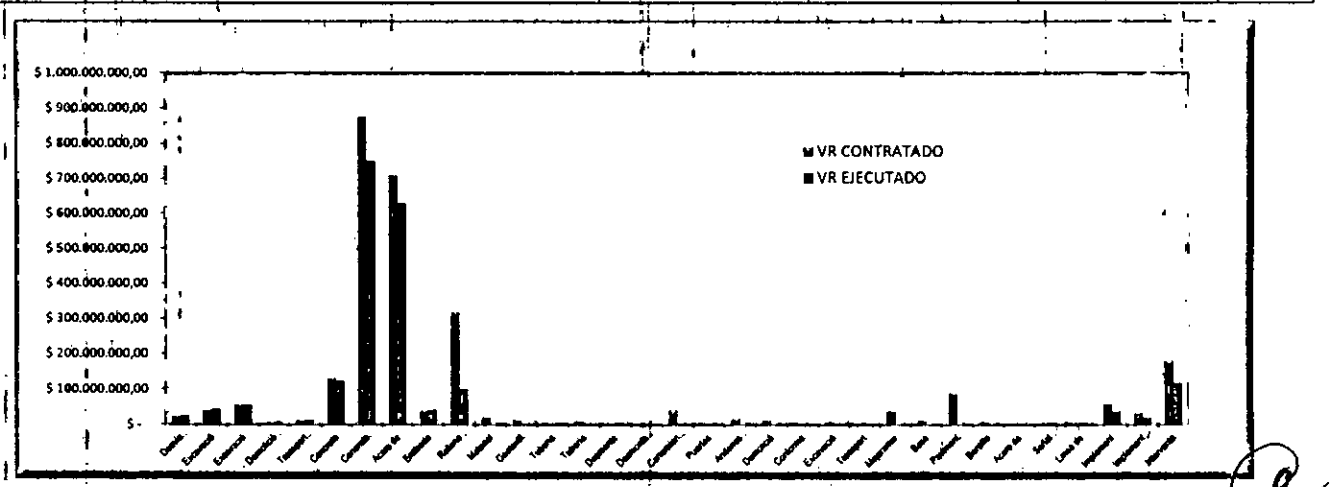

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO** | Código.: SIVEYC.FTO.35-4<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Acopio de materiales de obra.



Foto 2: Excavación en material conglomerado y roca.



Foto 3: Fundación concreto ciclópeo.

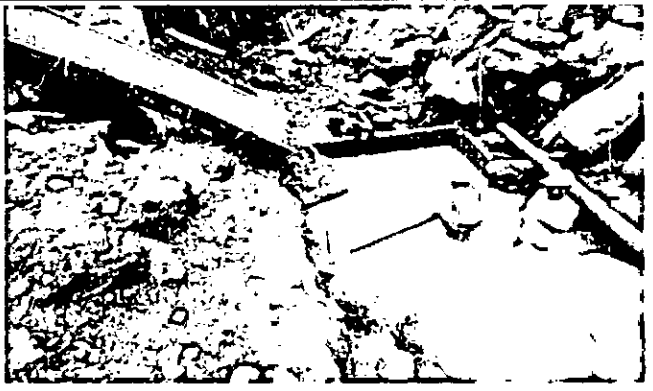


Foto 4: Fundación concreto ciclópeo.



Foto 5: Fundición muro de protección de H = 5,00 metros.

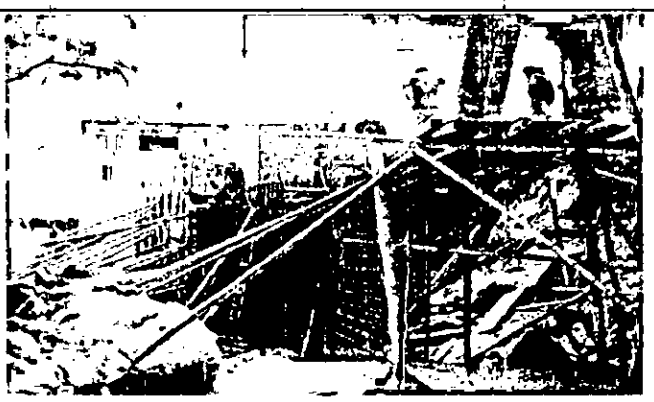


Foto 6: Fundición muro de protección de H = 5,00 metros.

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto 11: Limpieza de concreto ciclópeo de muros K0+070,0 a la K0+053,5.




Foto 12: Amarre de acero para refuerzo horizontal del muro de protección.

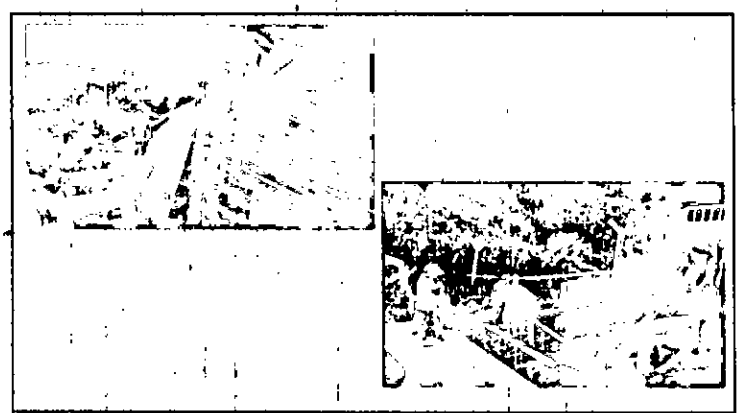


Foto 7: Fundición muro de protección H = 5 m, entre las abscisas K0+023,4 a K0+017.
Fundición muro de protección H = 5 m, entre las abscisas K0+105,7 a K0+100,5.



Foto 8: Formaleta de muro de H = 5 m, entre las abscisas K0+031,1 a K0+053,5.

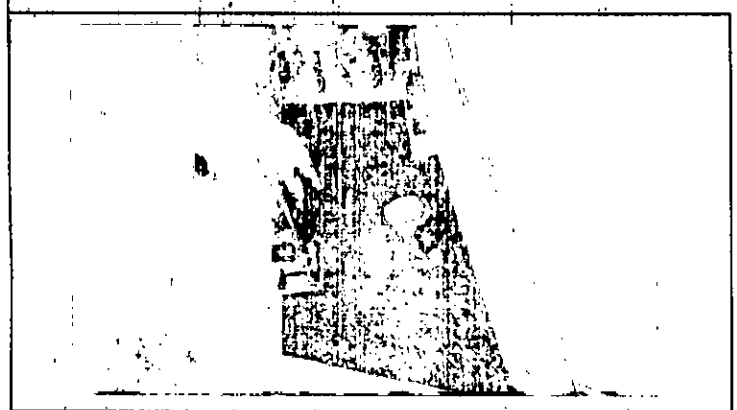


Foto 9: Relleno de muro entre las absciaas K0+133 a la K+105,7.



Foto 10: Fundición de muro de 5m entre las abscisas K0+021 a la K0+031,1.

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS<br>FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO | Código SIVEYC FTO 35-5<br>Versión 0 0<br>V.A 23/05/2018 |

5. INFORME FINANCIERO

| CONVENIO No.: | GN3323-2023. |
|---|---|

| ACTAS | FECHA | VR. TOTAL | ACUMULADO | AMORT. ANTICIPO | VR. NETO | VR EGRESO | TOTAL DESC | COM EGRESO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anucipo 40% | 22 de septiembre de 2023 | $ 1 135.610 679,55 | | | | $ 1 135.610 679,55 | $ 0,00 | 2023010051 | 22 de septiembre de 2023 |
| Acta Pago Parcial No 01 | 29 de noviembre de 2023 | $ 1 191 250.909,07 | $ 2 326 861.588,62 | $ 476 500 363,63 | $ 714 750 545,44 | $ 714 750.545,44 | $ 476 500 363,63 | 2023017402 | 23 de diciembre de 2023 |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | |
| | | $ 2.326.861.588,62 | | $ 476.500.363,63 | $ 714.750.545,44 | $ 1.850.361.224,99 | $ 476.500.363,63 | | |

| | |
|---|---|
| AVANCE FISICO | 69,93% |
| AVANCE FINANCIERO | 69,68% |

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS<br>FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO<br>CONTROL POLIZAS | Código.: SIVEYC.FTO.35-6<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

## 6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No.: GN3323-2023.

| | |
|---|---|
| GARANTIAS: | Aseguradora Solidaria de Colombia. |
| Póliza No.: | 436-47-994000058928. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO 0 | | FECHA APROBACION: | 26/07/2023 | FECHA EXPEDICION: | | 30/06/2023 |
| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
| Cumplimiento. | $ 284.402.669,89 | 10% | 28-jun-23 | 28-oct-24 | Actualización según Acta de Inicio. | O 270 |
| Anticipo. | $ 1.061.522.627,00 | 100% | 28-jun-23 | 28-oct-24 | Actualización según Acta de Inicio. | O |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 1 | | FECHA APROBACION: | 1/08/2023 | FECHA EXPEDICION: | | 1/08/2023 |
| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
| Cumplimiento. | $ 284.402.669,89 | 10% | 31-jul-23 | 30-nov-24 | Actualización según Acta de Inicio. | O 303 |
| Anticipo. | $ 1.061.522.627,00 | 100% | 31-jul-23 | 30-nov-24 | Actualización según Acta de Inicio. | O |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 2 | | FECHA APROBACION: | Sin aprobación 23/08/2023 | FECHA EXPEDICION: | | 18/08/2023 |
| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
| Cumplimiento. | $ 284.402.669,89 | 10% | 28-jun-23 | 30-nov-24 | Actualización según Modificatorio No. 01. | O 303 |
| Anticipo. | $ 1.061.522.627,00 | 100% | 28-jun-23 | 30-nov-24 | Actualización según Modificatorio No. 01. | O |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 3 | | FECHA APROBACION: | 4/09/2023 | FECHA EXPEDICION: | | 4/09/2023 |
| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
| Cumplimiento. | $ 284.402.669,89 | 10% | 31-jul-23 | 30-nov-24 | Actualización según Modificatorio No. 01. | O 303 |
| Anticipo. | $ 1.061.522.627,00 | 100% | 31-jul-23 | 30-nov-24 | Actualización según Modificatorio No. 01. | O |
