INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1617 No. **2023** , MUNICIPIO DE **VILLA RICA**– DEPARTAMENTO DE **CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **NOVIEMBRE** DE **2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	*''AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA-CAUCA''*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	*Calle 18 – Cra 4ª-Esquina*		
BENEFICIARIO:	Municipio de Villa Rica – Cauca		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.909.216.663
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.909.216.663
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26/09/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERNANDO DE JEÚS PÉREZ PÉREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO	22/06/2023	03/10/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	FAVIO DIOMEDEZ ROSERO	25/06/2023	18/09/2023
	PAULA MACARENA MORALES	18/09/2023	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 660-47-994000024641	29/06/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/06/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 29/06/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000,00		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.909.216.663,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Presentación de cuenta de cobro. 2. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 3. Suscripción del acta de inicio. 4. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. 5. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 6. Suscripción del acta de inicio. 7. Aprobación de Póliza.	N/A	08/2023	$1.309.147.498,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.309.147.498,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	$ 581.843.333,00	28/06/2023	29/05/2025
	Calidad de servicio			

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
LOP-001-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		$ 199.641.480,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE		NIT 901771924
	YURI HANEY LOPEZ BANGUERO		C.C 1.049.8050
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	

Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 199.641.480,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
MVR-CM-003-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		$ 96.974.000,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES		NIT 901772948
	TATIANA JANETH CERON DIAZ		C.C. 1.143.832.729
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 96.974.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
LOP-001-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		$ 2.418.653.183,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE		NIT 901771924
	YURI HANEY LOPEZ BANGUERO		C.C 1.049.8050
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 2.418.653.183,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
MVR-CM-003-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		$ 193.948.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES		NIT 901772948
	TATIANA JANETH CERON DIAZ		C.C. 1.143.832.729
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 193.948.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

COMPONENTE TÉCNICO-NOVIEMBRE

- ***20.11.2023*** *La supervisión del Ministerio cita al Municipio a reunión virtual el día 23 de noviembre, con el fin de hacer seguimiento a a la ejecución y avance del Convenio.*

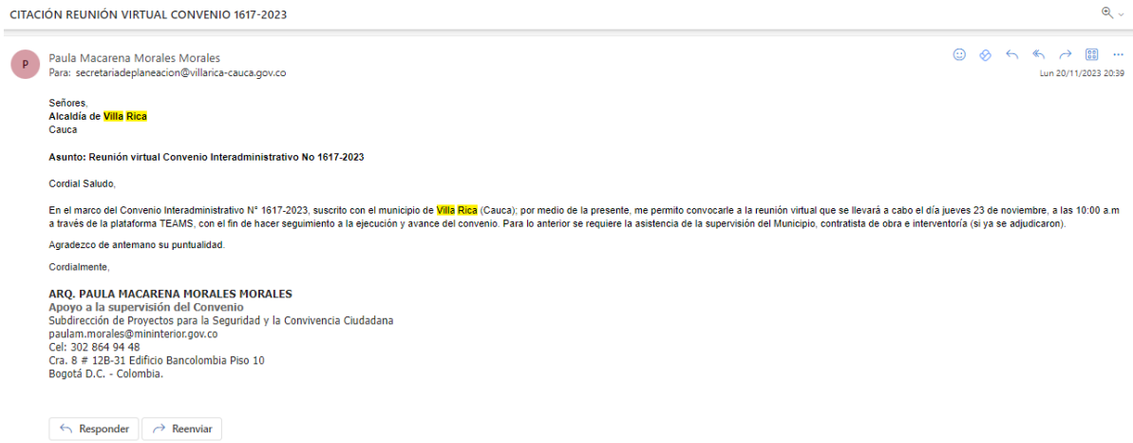

CITACIÓN REUNIÓN VIRTUAL CONVENIO 1617-2023

Paula Macarena Morales Morales
Para: secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co
Lun 20/11/2023 20:39

Señores,
Alcaldía de Villa Rica
Cauca

Asunto: Reunión virtual Convenio Interadministrativo No 1617-2023

Cordial Saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo N° 1617-2023, suscrito con el municipio de Villa Rica (Cauca); por medio de la presente, me permito convocarle a la reunión virtual que se llevará a cabo el día jueves 23 de noviembre, a las 10:00 a.m a través de la plataforma TEAMS, con el fin de hacer seguimiento a la ejecución y avance del convenio. Para lo anterior se requiere la asistencia de la supervisión del Municipio, contratista de obra e interventoría (si ya se adjudicaron).


Agradezco de antemano su puntualidad.

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co
Cel: 302 864 94 48
Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10
Bogotá D.C. - Colombia.

Responder Reenviar

- ***23.11.2023*** *Toda vez que no se conecta ninguna persona al comité citado por esta supervisión, se remite correo al Municipio, solicitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales con respecto a la asistencia de comités y reuniones virtuales.*

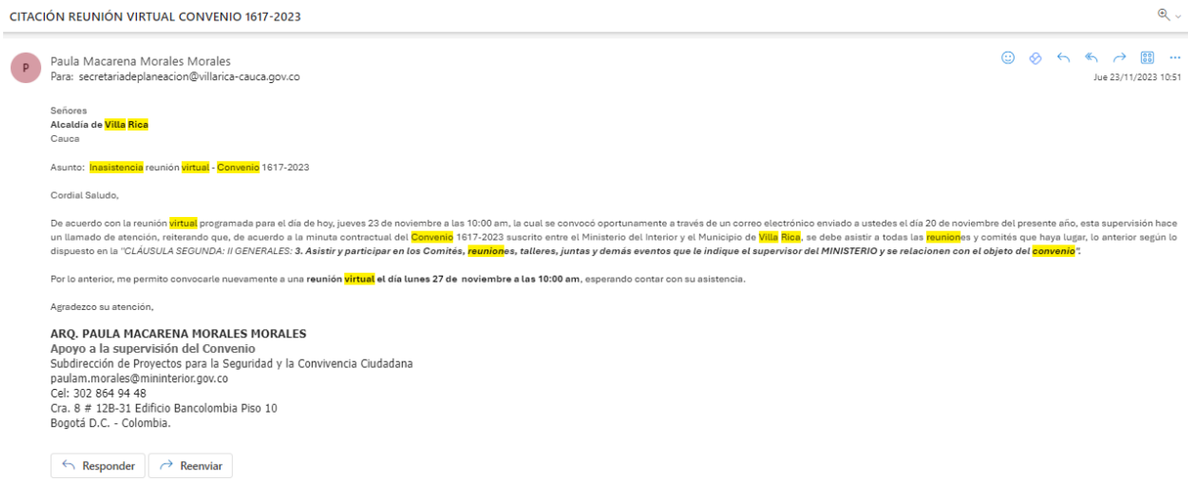

CITACIÓN REUNIÓN VIRTUAL CONVENIO 1617-2023

Paula Macarena Morales Morales
Para: secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co
Jue 23/11/2023 10:51

Señores
Alcaldía de Villa Rica
Cauca

Asunto: Inasistencia reunión virtual - Convenio 1617-2023

Cordial Saludo,

De acuerdo con la reunión virtual programada para el día de hoy, jueves 23 de noviembre a las 10:00 am, la cual se convocó oportunamente a través de un correo electrónico enviado a ustedes el día 20 de noviembre del presente año, esta supervisión hace un llamado de atención, reiterando que, de acuerdo a la minuta contractual del Convenio 1617-2023 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Villa Rica, se debe asistir a todas las reuniones y comités que haya lugar, lo anterior según lo dispuesto en la *"CLÁUSULA SEGUNDA: II GENERALES:* ***3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del MINISTERIO y se relacionen con el objeto del convenio****".*


Por lo anterior, me permito convocarle nuevamente a una **reunión virtual el día lunes 27 de noviembre a las 10:00 am**, esperando contar con su asistencia.

Agradezco su atención,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co
Cel: 302 864 94 48
Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10
Bogotá D.C. - Colombia.

Responder Reenviar

- ***27.11.2023*** *Se cita a comité virtual al Municipio el día 27 de noviembre, con el fin de revisar el avance en la ejecución del Convenio. No obstante, nuevamente no se conecta ninguna persona. Se envía correo al Municipio requiriendo el cumplimiento de obligaciones. El Municipio indica que ya no tiene acceso al correo a que el Ministerio está enviando las solicitudes.*

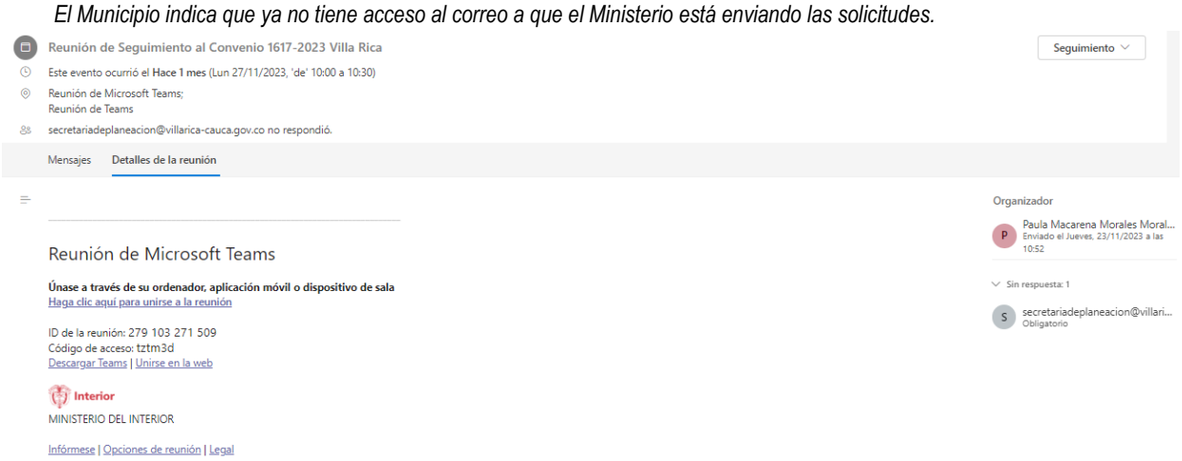

Reunión de Seguimiento al Convenio 1617-2023 Villa Rica
Seguimiento
Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Lun 27/11/2023, 'de' 10:00 a 10:30)
Reunión de Microsoft Teams;
Reunión de Teams
secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co no respondió.
Mensajes Detalles de la reunión

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 279 103 271 509
Código de acceso: tztm3d
Descargar Teams | Unirse en la web

Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

Organizador
Paula Macarena Morales Moral...
Enviado el Jueves, 23/11/2023 a las 10:52
Sin respuesta: 1
secretariadeplaneacion@villari...
Obligatorio

COMPONENTE FINANCIERO:
A la fecha se han desembolsado $1.309.147.498,00

COMPONENTE JURÍDICO:
El convenio se encuentra vigente hasta el 26/09/2024

ANEXOS:
-Informe de supervisión del Municipio
-Extracto bancario

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

No hay avances por parte de la supervisión del Ministerio durante este periodo, debido que, como ya se mencionó, el Municipio dejó de asistir a comités virtuales en dos oportunidades. Se inicia posible incumplimiento con la próxima inasistencia.

No obstante, durante este periodo, el Municipio avanzó en las siguientes actividades:

-El día **01 de noviembre** de 2023, se publica en la plataforma SECOP I, el documento que corresponde a la respuesta frente a las observaciones del informe de evaluación preliminar, se publican los informes de evaluación técnica y jurídica.

-El día **07 de noviembre** se realiza la audiencia de adjudicación del proceso contractual y se publica el acta que la soporta.
-El día **08 de noviembre** se publica en la plataforma la resolución de adjudicación del proceso.
-EL día **08 de noviembre** de 2023, se publica en la plataforma SECOP I, el documento que corresponde a la resolución de adjudicación del proceso.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

HERNANDO DE JESÚS PÉREZ PÉREZ Supervisor Convenio No. 1617 de 2023 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	Paula Macarena Morales **PAULA MACARENA MORALES MORALES** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON
