MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3023 DE 2023

ACTA No. 5 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 28 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, FEBRERO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 18
5.1. Correspondencia Enviada 18
5.2. Correspondencia Recibida 18
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
7. ANEXOS 19

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de Enero de 2024. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

Continua el estado de la superficie de rodadura en afirmado con alto deterioro ya que se requiere de material adicionado para atender los baches continuos y de severidad alta, así como la perdida de material granular. El personal de mantenimiento rutinario realizó la actividad provisional de bacheo manual con material de las zonas laterales para atención inicial con el objetivo de evitar sitios de riesgo de accidentalidad. Así mismo, continua la necesidad de adición de material y acondicionamiento de los accesos a los puentes y pontones: Dedoyaco (PR30+0060), Cañoseco (PR36+0400), Dantayaco (PR36+0940).

En referencia a las estructuras que presentan daños, se tiene: puente Guascayaco, Puente Tambor y Puente Congor, los cuales se intervienen en la ejecución del contrato de obra No.985 de 2022.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3023 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 7).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$208.938.177,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.938.177
	Valor Básico: $205.390.522
	Valor IVA: $ 3.547.655
Modificación No.2 de 2023	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.584.013
	Valor Básico: $205.042.372
	Valor IVA: $ 3.541.641
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $ 12.188.060.
Valor total:	$220.772.073 M/Cte. incluido IVA.
Prórroga No.1:	Hasta el 31 de enero de 2024.
Suspensión No.1:	Desde el 29 de enero hasta 27 de febrero de 2024. Fecha de reanudación 28 de febrero de 2024.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 29 de febrero de 2024.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de enero de 2024, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Limpieza manual de cunetas en tierra.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
2/01/2024	36+200	36+750		X	1.100	6	SOL
3/01/2024	24+500	24+800		X	600	10	SOL
4/01/2024	24+800	25+500		X	1.400	7	SOL
9/01/2024	46+100	46+900		X	1.600	7	SOL
10/01/2024	44+100	44+200		X	200	4	SOL
13/01/2024	30+120	30+300		X	360	9	SOL
	55+100	55+300		X	400	4	SOL
15/01/2024	26+700	29+100		X	4.800	6	SOL
18/01/2024	30+400	31+500		X	2.200	6	LLUVIA
19/01/2024	33+600	34+500		X	1.800	6	SOL
24/01/2024	33+250	33+550		X	600	6	SOL
TOTAL					**15.060**	**71**	

Registro fotográfico 02/01/2024.





Registro fotográfico 03/01/2024.





Registro fotográfico 04/01/2024.





Registro fotográfico 09/01/2024.





Registro fotográfico 13/01/2024.





Registro fotográfico 15/01/2024.





- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
2/01/2024	36+200	36+750	330	7	SOL
4/01/2024	24+800	25+500	392	6	SOL
9/01/2024	45+500	46+800	767	6	SOL
10/01/2024	44+000	45+500	855	9	SOL
11/01/2024	29+550	29+850	171	7	SOL
	44+000	44+300	171	6	SOL
12/01/2024	29+100	29+550	257	7	SOL
	29+850	30+120	151	6	SOL
13/01/2024	30+120	30+300	101	9	SOL
15/01/2024	26+700	29+100	1.440	7	SOL
16/01/2024	35+600	35+900	174	7	SOL
17/01/2024	37+080	37+150	42	6	SOL
	36+800	36+950	90	6	SOL
	35+850	35+920	42	6	SOL
	35+100	35+500	240	6	SOL
18/01/2024	30+400	31+500	638	7	LLUVIA
19/01/2024	33+600	34+500	531	7	SOL
22/01/2024	25+500	26+300	464	6	SOL
23/01/2024	35+850	36+400	330	6	SOL
24/01/2024	33+250	33+550	180	6	SOL
	36+600	36+700	60	6	SOL
25/01/2024	36+900	36+950	30	3	SOL
	37+300	37+500	120	3	SOL
	37+700	38+700	590	7	SOL
27/01/2024	40+250	40+800	319	8	SOL
TOTAL			**8.484,50**	**160**	

Registro fotográfico 02/01/2024.









Registro fotográfico 04/01/2024.





Registro fotográfico 09/01/2024.





Registro fotográfico 13/01/2024.





Registro fotográfico 15/01/2024.





Registro fotográfico 16/01/2024.





Registro fotográfico 17/01/2024.






Registro fotográfico 18/01/2024.





Registro fotográfico 19/01/2024.



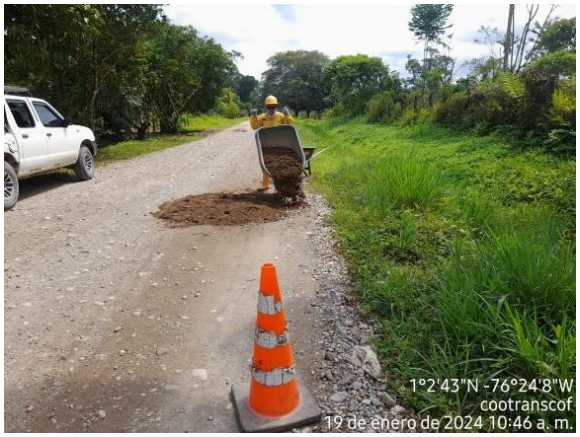

Registro fotográfico 22/01/2024.





Registro fotográfico 23/01/2024.





Registro fotográfico 24/01/2024.





Registro fotográfico 25/01/2024





Registro fotográfico 27/01/2024.





- Rocería y desmonte manual.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER			
22/01/2024	24+500	25+700	1.200	1,20	0,90	2.520,00	7	SOL
23/01/2024	25+700	27+000	1.300	1,30	1,00	2.990,00	7	SOL
24/01/2024	27+000	29+100	2.100	1,50	1,20	5.670,00	7	SOL
TOTAL						**11.180,00**	**21**	

Registro fotográfico 22/01/2024.





Registro fotográfico 24/01/2024.





- Limpieza manual de cauces

FECHA	PR		UNIDAD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
20/01/2024	32+450	32+486	36,00	13	LLUVIA
	36+035	36+080	45,00	13	LLUVIA
TOTALES			**81,00**	**26,00**	

Registro fotográfico 20/01/2024





- Recolección de basuras

FECHA	PR		LONG (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
17/01/2024	24+500	24+502	2,00	6	SOL
TOTAL			**2,00**	**6**	





- Jardinería.

FECHA	PR		LONG (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
27/01/2024	37+000	37+600	600,00	6	SOL
TOTAL			**600,00**	**6**	

Registro fotográfico 27/01/2024





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA S.A.S - AMV2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: 1 AL 28 DE ENERO DE 2024

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																																RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Esta actividad se realiza en el PR24+0800 al PR26+0300, PR29+0100 al 29+0550, PR29+0850 al PR30+0300, PR30+0400 al PR31+0500, PR33+0250 al PR33+0500, PR33+0600 al PR34+0500, PR35+0100 al PR35+0500, PR35+0800 al PR35+920, PR35+0850 al PR36+0750, PR37+0080 al PR37+0150, PR37+0300 al PR37+0500, PR37+0700 al PR38+0700, PR40+0250 al PR40+0800, PR44+0000 al PR44+0500, PR45+0500 al PR46+0800
	E																																		
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																		Esta actividad se realiza en el PR24+0500 al PR25+0500, PR26+0700 al PR29+0100, PR30+0120 al PR30+0300, PR30+0400 al PR31+0500, PR33+0250 al PR33+0550, PR33+0600 al PR34+0500, PR36+0200 al PR36+0750, PR44+0100 al PR44+0200, PR46+0100 al PR46+0900, PR55+0100 al PR55+0300.
	E																																		
Limpieza encoles y descoles	P																																		
	E																																		
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																		
	E																																		
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																		
	E																																		
Limpieza de pequeñas obras	P																																		
	E																																		
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																		
	E																																		
Limpieza manual de lecho de río	P																																		Se realizó en el PR32+045 y en el PR36+0035
	E																																		
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																		
	E																																		
Despeje de derrumbes	P																																		No se presentaron derrumbes para atender duarnte este periodo
	E																																		
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																		
	E																																		
Limpieza de postes de referencia	P																																		
	E																																		
Rocería y desmonte	P																																		Se realiza desde el PR24+0500 al PR29+0100, el resto del tramo su rocería se encuentra por debajo de los 30 cm.
	E																																		
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																		Se realiza desde el PR34+0250 al PR34+0340 y en el PR35+0700 al PR35+0800, los demás árboles en derecho de vía se encuentran podados y la vía tiene buena visibilidad
	E																																		
Arborización	P																																		
	E																																		
Jardinería (empradización)	P																																		Se realiza limpieza y mantenimiento de plántulas y semillas sembradas en el PR37+0200 al PR37+0500
	E																																		
Pintura de mojones y reposición	P																																		
	E																																		
Recolección de basuras	P																																		Se realizó clasificación de residuos sólidos (basuras) en el PR 24+0500, en los contenedores instalados
	E																																		
Otros	P																																		Se realiza relleno en el estribo del Puente Guayuyaco (PR29+0100), Pontón Platanilla (PR35+0390) y Puente Inchiyaco (PR36+0035)
	E																																		
Emergencias	P																																		No se presentaron emergencias durante el periodo
	E																																		
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																		Monitoreo y vigilancia a la via a cargo
	E																																		

PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (18/12/2023)
Valor Contractual Final:	$469.804.749 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórroga No.1:	Hasta el 29 de febrero 2024.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 29 de febrero 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
En el presente periodo no se remitieron oficios			

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
24/01/2024	Sin número	Anderson Devia – RL cooperativa	Solicitud Suspensión No.1 del Contrato 3023-2023

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, ya que se presentan baches continuos de severidad alta y perdida de material, por lo cual es necesario la atención de este tramo con actividad de mayor duración, tal como, la conformación de calzada con adición de material, recarga de grava o perfilado, para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto seguridad, comodidad y costos para los usuarios.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 05 de febrero de 2024.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 2971 DE 2023

ACTA No. 5 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 28 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ). LOTE 6.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A. NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARÁ. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, FEBRERO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 22
5.1. Correspondencia Enviada 22
5.2. Correspondencia Recibida 22
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
7. ANEXOS 23

1. INTRODUCCIÓN

En el presente se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de enero de 2024. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento Corazón del Putumayo C.T.A. tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 2+0750 (EL PORVENIR) y el PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

Para el mantenimiento rutinario de la vía 6501, la Administración Vial en coordinación con el personal de la cooperativa, llevaron a cabo las actividades de bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, rocería, limpieza de obras de arte y recolección de basuras, para mantener las condiciones de la infraestructura vial. El estado general de la vía es bueno, no obstante, hay tramos que necesitan de intervención de mantenimiento periódico, tal como, conformación de calzada y adición de material de afirmado.

Entre el 01 al 28 de enero de 2024, el contrato de mejoramiento y mantenimiento No.985 de 2022, no realizó actividades en la vía correspondientes al objeto contractual, por lo cual las

condiciones de la superficie de rodamiento disminuye apareciendo fallas en la capa de base, tales como baches, hundimientos, perdida de material.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	2971 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicios de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. Sectores 6501, Villagarzón - San José del Fragua, PR 2+0750 (El Porvenir) - PR 24+0000 (Río Caquetá). Lote 6.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado de Mantenimiento y Conservación de Vías Corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1.
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandará. C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$126.814.310 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.814.310
	Valor Básico: $124.661.073
	Valor IVA: $ 2.153.237
Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.599.351
	Valor Básico: $124.449.764
	Valor IVA: $ 2.149.587
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $7.397.501.
Valor total:	$133.996.852 M/Cte valor incluido IVA
Prórroga No.1:	Hasta el 31 de enero de 2024.
Suspensión No.1:	Desde el 29 de enero hasta 27 de febrero de 2024. Fecha de reanudación 28 de febrero de 2024.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 29 de febrero de 2024.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320-451 06 44
Domicilio Contratista:	Sector urbano, Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de enero de 2024, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
3/01/2024	2+750	2+880	78	8	LLUVIA
4/01/2024	2+880	3+050	102	8	SOL
5/01/2024	3+050	3+200	90	8	SOL
9/01/2024	3+200	3+390	114	8	LLUVIA
10/01/2024	3+390	3+600	130	8	SOL
11/01/2024	3+600	4+150	330	8	LLUVIA
12/01/2024	9+200	9+700	290	8	LLUVIA
13/01/2024	4+600	4+900	168	8	SOL
15/01/2024	4+900	5+150	150	8	SOL
16/01/2024	5+150	5+850	420	7	NUBLADO
17/01/2024	5+850	6+500	403	8	SOL
18/01/2024	6+500	6+800	195	8	LLUVIA
20/01/2024	19+900	20+100	120	7	LLUVIA
TOTAL			**2.590,20**	**102**	

Registro fotográfico 03/01/2024





Registro fotográfico 4/01/2024





Registro fotográfico 9/01/2024













Registro fotográfico 10/01/2024





Registro fotográfico 11/01/2024





Registro fotográfico 12/01/2024





Registro fotográfico 13/01/2024









Registro fotográfico 15/01/2024









Registro fotográfico 16/01/2024









Registro fotográfico 17/01/2024





Registro fotográfico 20/01/2024





- Limpieza manual de cunetas en tierra.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
4/01/2024	2+880	3+050		X	340	8	SOL
5/01/2024	3+050	3+200		X	300	8	SOL
9/01/2024	3+200	3+390		X	380	8	LLUVIA
12/01/2024	9+300	9+620		X	640	8	LLUVIA
17/01/2024	6+500	6+502		X	2	8	SOL
18/01/2024	6+700	6+702		x	2	8	LLUVIA
19/01/2024	20+100	20+400		X	600	4	LLUVIA
20/01/2024	19+900	20+100		X	400	7	LLUVIA
22/01/2024	18+900	19+400		X	1.000	4	SOL
23/01/2024	13+350	13+750		X	800	4	SOL
24/01/2024	13+750	14+300		X	1.100	4	SOL
25/01/2024	14+300	14+800		X	1.000	4	SOL
27/01/2024	14+800	15+100		X	600	4	SOL
TOTAL					**7.164,00**	**79**	

Registro fotográfico 04/01/2024





Registro fotográfico 05/01/2024





Registro fotográfico 09/01/2024





Registro fotográfico 10/01/2024





Registro fotográfico 12/01/2024





Registro fotográfico 17/01/2024





Registro fotográfico 19/01/2024





Registro fotográfico 20/1/2024





Registro fotográfico 22/1/2024





Registro fotográfico 23/01/2024









Registro fotográfico 24/01/2024









Registro fotográfico 25/01/2024





Registro fotográfico 27/01/2024





- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
19/01/2024	22+000	24+000	2.000	3600	4	LLUVIA
20/01/2024	21+000	22+000	1.000	2800	7	LLUVIA
22/01/2024	19+350	21+000	1.650	3630	4	SOL
23/01/2024	18+400	19+350	950	2185	4	SOL
24/01/2024	17+450	18+400	950	2375	4	SOL
25/01/2024	16+050	17+450	1.400	3080	4	SOL
27/01/2024	15+000	16+050	1.050	2100	4	SOL
TOTAL				**19770**	**31**	

Registro fotográfico 19/01/2024





Registro fotográfico 20/01/2024





Registro fotográfico 22/01/2024





Registro fotográfico 23/01/2024





Registro fotográfico 24/01/2024






Registro fotográfico 25/01/2024





Registro fotográfico 27/01/2024

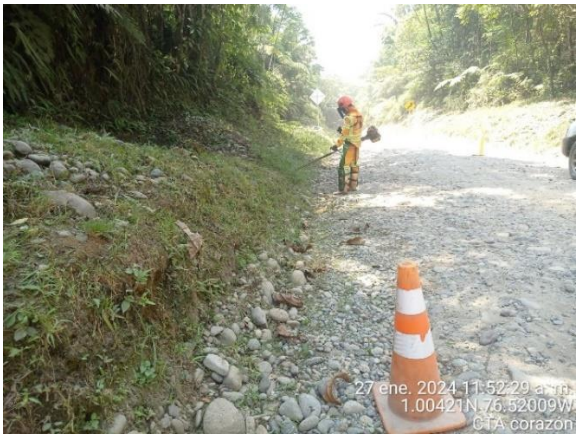



- Limpieza de obras de arte (alcantarillas >0.60m).

FECHA	PR		UND	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
27/01/2024	18+050	19+300	7	8	SOL

Registro fotográfico 24/01/2024





- Jardineria

FECHA	PR		LONG (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
27/01/2024	2+750	8+000	5250	4	SOL





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: 1 al 28 de enero de 2024

PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)

INDICADOR		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	OBSERVACIONES
Bacheo en Afirmado	P																								Se realizó en los PR2+0750 al PR4+0150, PR4+0600 al PR6+0800, PR9+0200 al PR9+0700, PR19+0900 al PR20+0100
	E																								
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																								Se realizó desde el PR2+0880 al PR3+0390, PR9+0300 al PR9+0620, PR13+0350 al PR15+0100, PR18+0900 al PR19+0400, PR19+0900 al PR20+0400
	E																								
Limpieza encoles y descoles	P																								Se realiz+o limpieza de encoles y descoles de alcantarillas desde el PR18+0050 al PR19+0300
	E																								
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																								
	E																								
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																								Limpieza de alcantarilas desde el PR18+0050 al PR19+0300
	E																								
Despeje de derrumbes	P																								No se presentaron derrumbes durante el periodo
	E																								
Limpieza de calzada	P																								
	E																								
Rocería y desmonte	P																								Se realizó desde el PR15+0000 al PR24+0000, el resto del tramo se encuentra por debajo de los 30 cm
	E																								
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																								
	E																								
Arborización	P																								Se realiza limpieza a plántulas sembradas en zona de derecho de via nacional
	E																								
Pintura de mojones y reposición	P																								
	E																								
Recoleccion de basuras	P																								Recolección de residuos sólidos (basuras) desde el PR2+0750 al PR8+0000
	E																								
Otros	P																								
	E																								
Emergencias	P																								No se presentaron emergencias durante el periodo
	E																								
Vigilancia y monitoreo	P																								INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VÍA A CARGO EN HORAS DE LA MAÑANA, MEDIO DÍA Y TARDE
	E																								

PROGRAMADO EJECUTADO PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA; (18/12/2023)
Valor Contractual Final:	$469.804.749 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórrogas No.1:	Hasta el 29 de febrero 2024.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 29 de febrero 2024.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
En el presente periodo no se remitieron oficios			

5.2. Correspondencia Recibida:

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
24/01/2024	Sin número	Servio Tulio David – RL cooperativa Corazón del Putumayo	Solicitud Suspensión No.1 del Contrato 3023-2023.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y según lo establecido en el manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 05 de febrero de 2024.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3002 DE 2023

ACTA No. 5 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 28 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) /4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 5.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA. NIT. 800.102.361-4. R/L MAIRA LEONELA BURBANO CHICANGANA. CC. No. 1.064.676.650 DE SOTARÁ - CAUCA**

MOCOA, FEBRERO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 23
5.1. Correspondencia Enviada 23
5.2. Correspondencia Recibida 23
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
7. ANEXOS 24

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía durante el periodo del 01 al 28 de enero de 2024. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía tiene a cargo los sectores comprendidos entre el PR 60+0300 (Ye Urcusique) y el PR 77+1000 (Mocoa) de la Carretera 4502 Santana – Mocoa; el sector entre el PR 0+0000 y el PR 1+0600 (paso nacional por Mocoa) de la Carretera 4503 Mocoa – Pitalito; y la vía Perimetral a Mocoa, con longitud total a atender de 21.83Km.

2.2. Estado de la vía

La carretera 4502, Santa Ana – Mocoa, sector La Ye de Urcusique - El Pepino – Mocoa, se encuentra en buen estado en general en cuento la superficie de rodamiento, con algunos sectores pendientes de intervención por perdida parcial de banca e inestabilidad de taludes, entre los cuales se tiene: PR61+0400 y PR65+0300 (instabilidad talud), PR70+0020 y PR70+0242 (perdida parcial de banca).

El tramo comprendido entre el PR60+0300 al PR67+0800 esta conformado por material de afirmado, por lo cual se realiza continuamente la actividad de bacheo con personal de la cooperativa para mantener la superficie de rodadura.

Entre las necesidades de la vía se requiere la demarcación vial horizontal y vertical para complementar la existente o en tramos de alta accidentalidad.

La carretera 4503, Mocoa – Pitalito, sector Paso Nacional por Mocoa, la superficie de rodadura consiste en estructura de pavimento en concreto rígido el cual presenta alto desgaste por alcanzar su vida útil, presentando deterioros tipo fisuras, grietas, baches, pulimento, cabezas duras, perdida de sello en juntas, parcheo, descascaramiento, entre otros, los cuales requieren atención por medio de intervención de actividades de mantenimiento periódico, rehabilitación o reconstrucción. Actualmente, se cuenta con el contrato de mantenimiento No. 3821 de 2023 para la recuperación de la estructura y superficie de rodadura del tramo vial a cargo de INVIAS, sin embargo, hasta la fecha no se inician actividades.

En la carretera Perimetral de Mocoa, el tramo vial cuenta con longitud 2.3Km en pavimento de concreto rígido, en general buen estado, con presencia de fisuras puntuales y algunas losas fracturadas.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3002 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. sectores 4502, Santa Ana - Mocoa, Ye Urcusique - Mocoa, PR 60+0300 - PR 77+1000 (Mocoa) /4503, Mocoa - Pitalito, Paso nacional por Mocoa, PR 0+0000 - PR 1+0600/carretera perimetral de Mocoa. lote 5.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía. NIT. 800.102.361-4
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Maira Leonela Burbano Chicangana. C.C. No. 1.064.676.650 de Sotará – Cauca.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	27 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$112.576.454 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.576.454
	Valor Básico: $110.664.968
	Valor IVA: $ 1.911.486

Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.385.630
	Valor Básico: $110.477.384
	Valor IVA: $ 1.908.246
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $ 4.690.686.
Valor total:	$117.076.316 M/Cte. incluido IVA.
Prorroga No.1:	Hasta el 31 de enero de 2024.
Suspensión No.1:	Desde el 29 de enero hasta 27 de febrero de 2024. Fecha de reanudación 28 de febrero de 2024.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 29 de febrero de 2024.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor de Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	312-658 13 50
Domicilio Contratista:	Vereda San José del Pepino, Mocoa, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de enero de 2024, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado Vía 4502 Santa Ana – Mocoa

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO VIA	AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL					
1/01/2024	61+800	62+500	700	6,20	434	2	SOL
2/01/2024	60+800	61+800	1.000	6,00	600	7	SOL
3/01/2024	60+300	60+800	500	5,80	290	5	SOL
15/01/2024	60+300	61+000	700	6,00	420	7	SOL
TOTAL			**2.900,00**		**1.744,00**	**21**	

Registro fotográfico 1/01/2024





Registro fotográfico 2/01/2024





Registro fotográfico 3/01/2024





Registro fotográfico 15/01/2024





- Limpieza manual de cunetas en la vía 4502 Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
2/01/2024	60+800	61+800		X	2.000,00	7	SOL
3/01/2024	60+300	60+800		X	1.000,00	5	SOL
5/01/2024	68+200	68+900	X		1.400,00	7	SOL
12/01/2024	70+000	70+400	X		800,00	7	SOL
	68+800	69+050	X		500,00	7	SOL
15/01/2024	60+300	61+000		X	1.400,00	7	SOL
16/01/2024	67+700	68+700	X	X	2.000,00	7	LLUVIA
17/01/2024	66+950	67+300	X	X	700,00	7	SOL
19/01/2024	68+700	70+500	X		3.600,00	7	SOL
20/01/2024	70+500	72+000	X		3.000,00	7	LLUVIA
22/01/2024	72+000	73+600	X		3.200,00	7	SOL
23/01/2024	73+600	74+100	X		1.000,00	7	SOL
24/01/2024	74+100	76+700	X		5.200,00	7	SOL
25/01/2024	76+700	78+000	X		2.600,00	7	SOL
TOTAL					**28.400,00**	**96**	

Registro fotográfico 02/01/2024





Registro fotográfico 03/01/2024





Registro fotográfico 05/01/2024





Registro fotográfico 12/01/2024





Registro fotográfico 15/01/2024





Registro fotográfico 17/01/2024





Registro fotográfico 19/01/2024






Registro fotográfico 22/01/2024





Registro fotográfico 23/01/2024



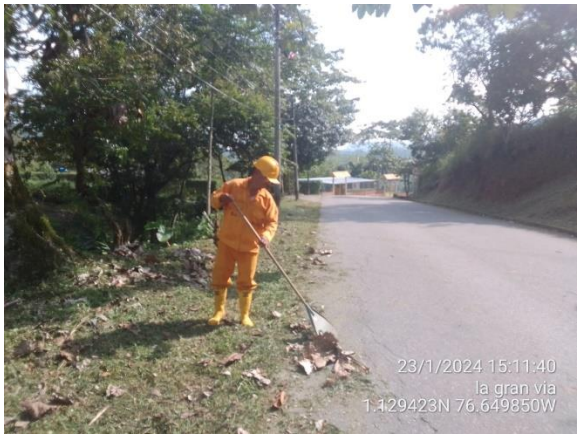

Registro fotográfico 24/01/2024





Registro fotográfico 25/01/2024





- Limpieza manual de cunetas Vía 4503 Mocoa – Pitalito (paso Nacional por Mocoa).

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
4/01/2024	1+300	1+600	X		600,00	7	SOL
27/01/2024	0+	1+600	X		3.200,00	7	SOL
TOTAL					**3.800,00**	**14**	

Registro fotográfico 04/01/2024





Registro fotográfico 27/01/2024





- Limpieza manual de cunetas Vía Perimetral Mocoa.

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
9/01/2024	0+	1+300	X		2.600,00	7	SOL
11/01/2024	1+300	2+300	X		2.000,00	7	SOL
TOTALES					**4.600,00**	**14**	

Registro fotográfico 09/01/2024





- Limpieza de obras de drenaje Vía 4503 Mocoa – Pitalito (paso Nacional por Mocoa).

FECHA	PR		CANTIDAD (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
18/01/2024	1+300	1+300	1	2	SOL
TOTALES			**1**	**2**	

Registro fotográfico 18/01/2024





- Rocería y desmonte manual en la vía 4502, Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
15/01/2024	60+300	60+600	660,00	7	SOL
16/01/2024	67+700	68+700	2.300,00	7	LLUVIA
17/01/2024	68+700	70+000	3.510,00	7	SOL
18/01/2024	70+500	71+500	1.900,00	7	SOL
19/01/2024	71+500	72+800	4.420,00	7	SOL
22/01/2024	72+800	74+000	3.000,00	7	SOL
23/01/2024	74+000	75+500	3.300,00	7	SOL
24/01/2024	75+500	76+700	2.520,00	7	SOL
25/01/2024	76+700	78+000	1.950,00	7	SOL
TOTALES			**23.560,00**	**63**	

Registro fotográfico 15/01/2024





Registro fotográfico 16/01/2024









Registro fotográfico 17/01/2024





Registro fotográfico 18/01/2024





Registro fotográfico 19/01/2024





Registro fotográfico 22/01/2024





Registro fotográfico 23/01/2024





Registro fotográfico 24/01/2024





Registro fotográfico 25/01/2024





- Rocería y desmonte manual Vía 4503 Mocoa – Pitalito (paso Nacional por Mocoa).

FECHA	PR		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
27/01/2024	0+	1+600	2.560,00	7	SOL
TOTALES			**2.560,00**	**7**	

Registro fotográfico 27/01/2024





- Rocería y desmonte manual en la vía Perimetral Mocoa

FECHA	PR		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
9/01/2024	0+	1+300	3.900,00	7	SOL
10/01/2024	1+300	2+300	2.700,00	7	SOL
TOTALES			**6.600,00**	**14**	

Registro fotográfico 9/01/2024





Registro fotográfico 10/01/2024





- Limpieza de postes de referencia via 4502 Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		CANTIDAD (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
16/01/2024	74+000	77+000	4,00	7	LLUVIA
TOTALES			**4,00**	**7,00**	





- Limpieza de postes de referencia via 4503 Mocoa – Pitalito (Paso nacional Mocoa).

FECHA	PR		CANTIDAD (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
16/01/2024	0+	1+600	1,00	7	LLUVIA
TOTALES			**1,00**	**7**	

- Limpieza de calzada via 4503 Mocoa – Pitalito (Paso nacional Mocoa).

FECHA	PR		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
4/01/2024	1+300	1+600	900	7	SOL
TOTALES			**900**	**7**	





- Recolección de residuos sólidos via 4502 Mocoa – Santa Ana.

FECHA	PR		LONG. TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
3/01/2024	60+300	60+800	1000	5	SOL
.			**1000**	**5**	





- Recolección de residuos sólidos via Perimetral Mocoa.

FECHA	PR		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
11/01/2024	0+	2+300	4600	7	SOL





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA
PERIODO: 1 al 28 de enero de 2024

INDICADOR		4502, SANTA ANA - MOCOA (PR 60+0300 - PR 77+1000)																	4503			PERIMETRAL MOCOA	OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	0	1	2	
Bacheo Carreteras Pavimentadas	P																						
	E																						
Parcheo Carreteras Pavimentadas	P																						Se realiza en los PR67+0380 en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR1+0130 vía 4503 Mocoa - Pitalito
	E																						
Bacheo en Afirmado	P																						Se realizó desde el PR60+0300 al PR62+0500 en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa
	E																						
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																						Se realizó esta actividad en los sitios más críticos entre los PR60+0300 al PR61+0800, PR65+0200 al PR65+0900, PR66+0950 al PR67+0300, 67+0700 al PR68+0700, PR68+0800 al PR77+1000, vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR1+0600, vía 4503 Mocoa - Pitalito; PR0+0000 al PR2+0300 vía Perimetral Mocoa sin código
	E																						
Limpieza encoles y descoles	P																						
	E																						
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																						
	E																						
Limpieza de obras >0,60 m2	P																						
	E																						
Limpieza de pequeñas obras	P																						Se realiza limpiez de Box Culvert en el PR1+0300, vía 4503 Mocoa - Pitalito
	E																						
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																						
	E																						
Limpieza manual de cauce de aguas (Lecho de rio)	P																						
	E																						
Despeje de derrumbes	P																						No se presentaron derrumbes durante el periodo
	E																						
Limpieza de calzada	P																						Se realizó PR1+0300 al PR1+0600 vía 4503 Mocoa - PItalito
	E																						
Rocería y desmonte	P																						Se realizó en el PR60+0300 al PR60+0900, desde el PR67+0700 al PR77+1000, vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR1+0600, vía 4503 Mocoa - Pitalito; PR0+0000 al PR2+0300 vía Perimetral Mocoa, sin código
	E																						
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																						Se realiza poda y recorte de árboles en el PR2+0200 al PR2+0300, vía Perimetral de Mocoa sin código. Los árboles en derecho de via nacional se encuentran podados y sin obstaculizar la visibilidad de los usuarios
	E																						
Recolección de Basuras	P																						Se realizó recolección de residuos sólidos desde el PR60+0300 al PR60+0800, vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR2+0300 vía Perimetral Mocoa sin código
	E																						
Limpieza de señales, defensas metálicas y mojones	P																						Se realiza limpieza de mojones desde el PR74+0000 al PR77+000 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+000 al PR1+0600 vía 4503 Mocoa - Pitalito
	E																						
Pintura de resaltos (reductores de velocidad)	P																						
	E																						
Emergencias	P																						No se presentaron emergencias durante el periodo
	E																						
Otros																							Se realiza obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario (señalización de sitios con cinta ñarcada) en el PR62+0500 al PR62+0530, PR62+0700 al PR62+0720, PR64+0400 al PR64+0420 en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa
Inspección y vigilancia	P																						INSPECCIÓN DE LAS VÍAS A CARGO 4502 Y 4503, Y CARRETERA PERIMETRAL MOCOA SE REALIZA EN JORNADA MAÑANA Y TARDE
	E																						

PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (18/12/2023)
Valor Contractual Final:	$469.804.749 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórroga No.1:	Hasta el 29 de febrero 2024.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 29 de febrero 2024.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
En el presente periodo no se remitieron oficios			

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
24/01/2024	Sin número	**Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía.** Ath. Sr Maira Burbano.	Solicitud Suspensión No.1 del Contrato 3002-2023.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y de acuerdo al manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 05 de febrero de 2024.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Via
