SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 24 - 09 - 2023** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 14 de septiembre de 2023 Al: 24 de septiembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 55,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: CALLE 48 N° 49 -31SEVILLA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip) SUPERVISOR: ALFONSO RENÈ SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,78%	0,78%
Valor básico de la Obra	$ 1.927.595,39	$ 1.927.595,4

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 247.127.614,00
Valor Actualizado:	$ 247.127.614,00
Plazo Inicial:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Plazo Actualizado:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 15 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 44.129.958,25
Valor Actualizado:	44.129.958,25
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

1. Actualmente el contrato de obra civil, se encuentra en etapa de legalización de la documentación, entrega de las hojas de vida del personal, afiliaciones del personal a laborar por parte del contratista,
2. Planificación y revisión de programación de obra que cumpla con los procedimientos pactados.
3. Actualmente en este momento el contrato de obra civil presenta un ***retraso de 0.78%*** de acuerdo con la programación presentada por el contratista.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Se identivica el deterioro de la fachada



Comentario: Se identifico el estado del cieloraso esta detrioro.


INFORME SEMANAL



Comentario: Se evidencia el deterioro de la parte externa (patio)



Comentario: Se puede notar el deterioro de los pisos

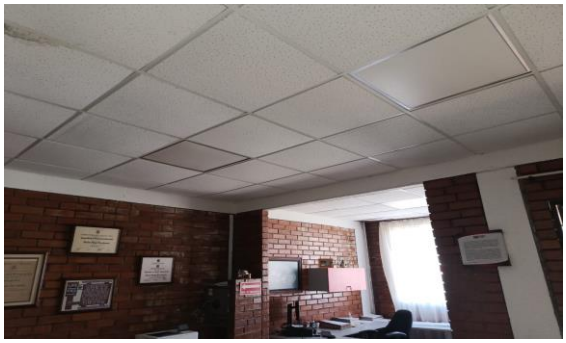

Comentario: se evidencia a la fecha cielo falso existente

OBSERVACIONES
1, En esta primera semana. No se realizaron actividades.
2. No se evidencia material en la obra para inicio de actividades
3, El día 11 de septiembre de 2023 mediante comunicado INT-TISB-1707-009 se hace solicitud de inicio de actividades en obra y documentación SST.
4. El día 19 de septiembre de 2023 mediante comunicado INT-TISB-1707-013 se hace necesaria la solicitud de suspensión de terminos para que el contratista se ponga al día en las actividades de ejecucion de acuerdo con la programación.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA

Matrícula No.: A08322006-92536604
