INFORME SEMANAL

Semana Número: 8 Del: 6 de noviembre de 2023 Al: 12 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 104,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
SEDE: CALLE 48 N° 49 -31SEVILLA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip)
SUPERVISOR: RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,21%	61,81%
Valor básico de la Obra	$ 37.588.110,09	$ 152.749.578,21

	SEMANAL	ACUMULADO	RETRASO
Obra Física Ejecutada (%)	20,55%	38,07%	23,74%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 50.785.155,30	$ 94.081.913,27	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 247.127.614,00
Valor Actualizado:	$ 247.127.614,00
Plazo Inicial:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Plazo Actualizado:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Fecha de Iniciación:	jueves 14 de septiembre del 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes 15 de diciembre 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 44.129.958,25
Valor Actualizado:	44.129.958,25
Plazo Inicial:	cinco (5) meses
Plazo Actualizado:	cinco (5) meses
Fecha de Iniciación:	jueves 14 de septiembre del 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves 28 de diciembre 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN ESTA SEMANA NUMERO 8 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

ITEM 1.10 DESMONTE DE CUBIERTA
ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA
ITEM 1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO
ITEM 1.34 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA
ITEM 1.67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL
ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM
ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO
ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO 2CM
NP ITEM 1.07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS
AL DIA DE HOY LA OBRA PRESENTA UN RETRASO DEL 20%

IMAGENES AVANCE



ITEM 1.67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL



ITEM 1.10 DESMONTE DE CUBIERTA



ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA



ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA



ITEM 6:16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO



ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM (AREA POSTERIOR DE LA ORIP-SEVILLA)



ITEM 1.37 DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO (AREA DE ATENCION AL PUBLICO)



ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PRESENTA RETRASO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS
ITEM: 1.42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)
ITEM: 1.34 DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS
ITEM: 1.42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)
ITEM: 1.43 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)
ITEM: 1.55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM
ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA

Matrícula No.: A08322006-92536604

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 1,04 DESMONTE DE CIELORRASO **UNIDAD** M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS Y PASILLOS	PISO 1	1,00	8,840	3,10						27,40
			4,70	3,20						15,04
			2,00	1,52						3,04
			1,00	9,44						9,44
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	54,92

CROQUIS

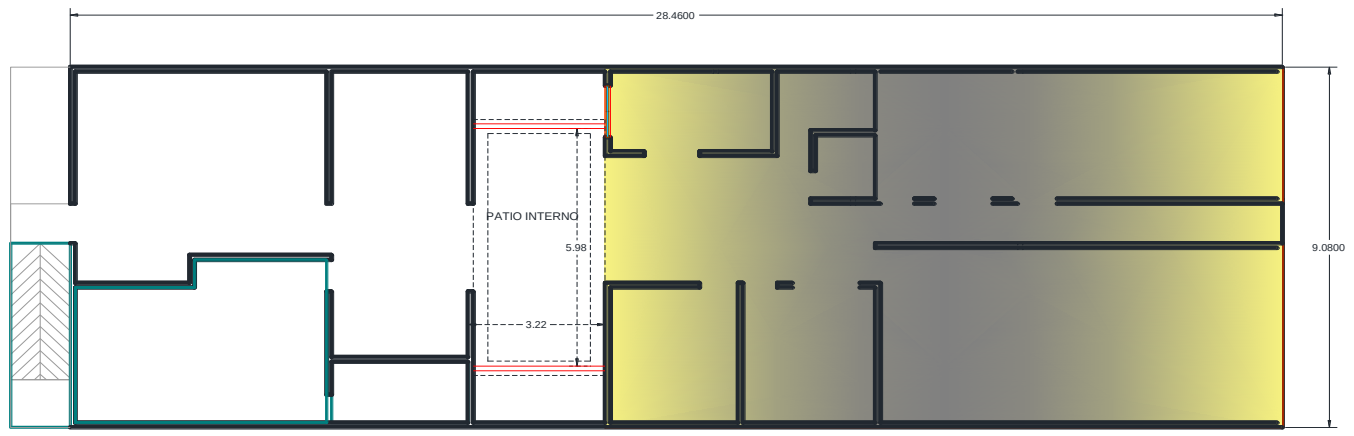

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 12 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE 1

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 1,07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | UNIDAD *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO DAMAS	PISO 1	1,00								1,00
BAÑO HOMBRES	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	2,00

CROQUIS



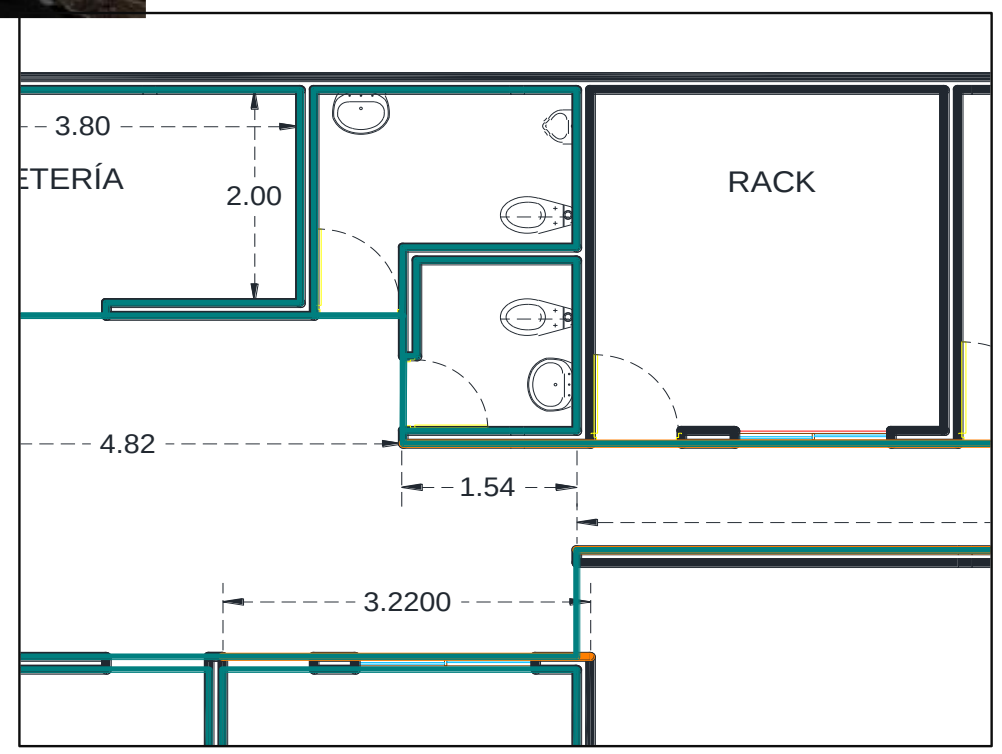

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 12 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 5 | DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR: ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 1,11 DESMONTE DE CUBIERTA | UNIDAD: M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,00						62,10
		1,00	9,70	9,00						87,30
		1,00	3,20	6,00						19,20
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	259,50

CROQUIS



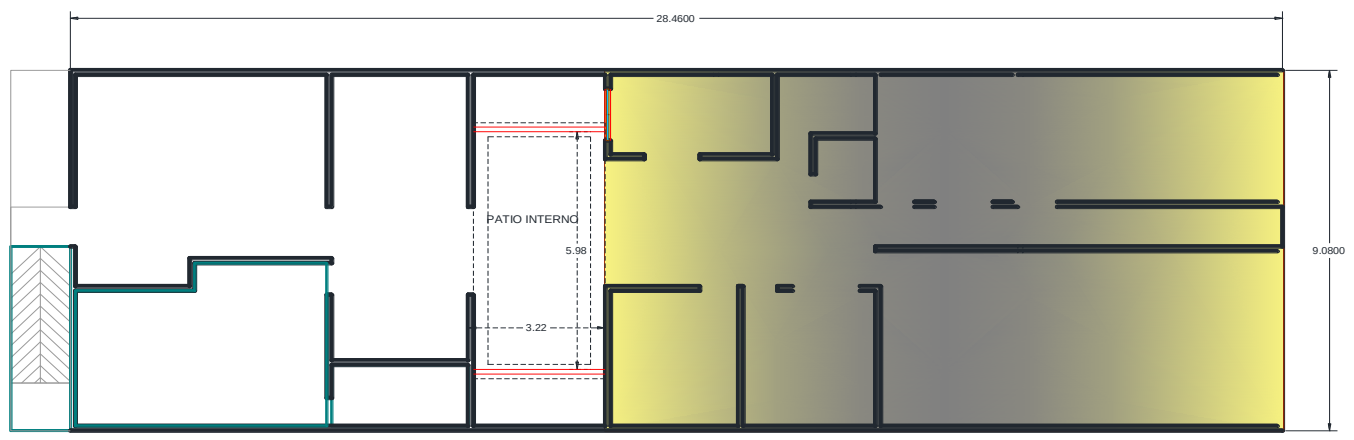

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 12 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 5 | DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR: ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 1,16 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | UNIDAD: *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,00						62,10
		1,00	9,70	9,00						87,30
		1,00	3,20	6,00						19,20
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	259,50

CROQUIS



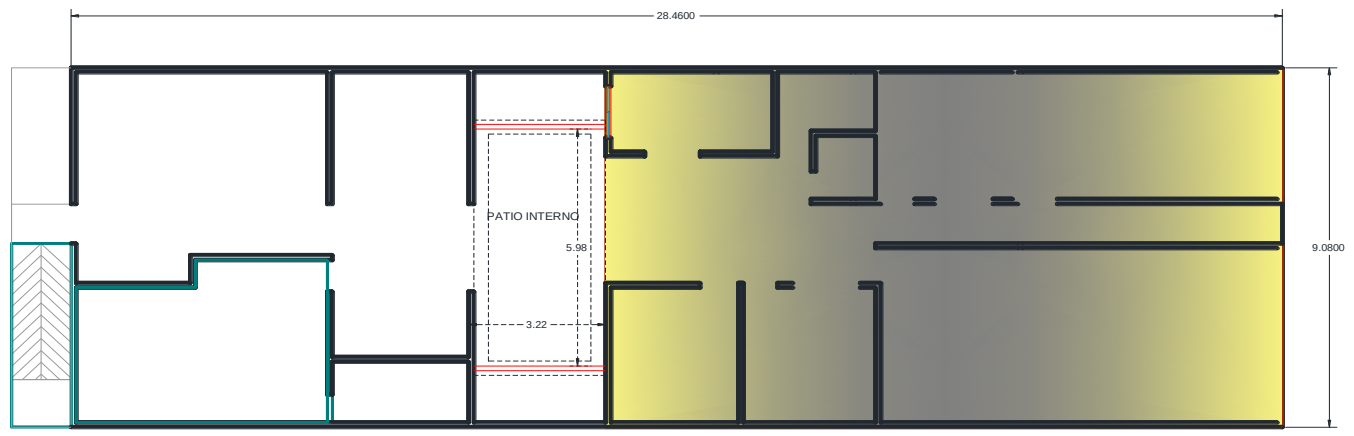

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ATENCION AL USUARIO	PISO 1	2,00								2,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	2,00

CROQUIS





Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,34 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	1,000		2,25					2,25	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	2,25	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 1,66 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO UNIDAD M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO DAMAS	PISO 1	1,00	6,230		2,50					15,58
BAÑO HOMBRES	PISO 1	1,00	8,830		2,50					22,08
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	37,65

CROQUIS



Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,36 DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	1,000		2,25					2,25	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	2,25	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,37 DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	1,000		2,25					2,25	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	2,25	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,43 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	1,000		2,25					2,25	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	2,25	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,47 REGATA SOBRE MURO+RESANE	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	1,000		2,25					2,25	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	2,25	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,50 DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00								1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	1,00	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *ITEM 1,57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA* UNIDAD *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	0,50								0,50	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	0,50	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	12,00								12,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	12,00	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM UNIDAD M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	*PISO 1*	*0,50*								*0,50*	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	0,50	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM:	ITEM 6,16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						60,84
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						30,87
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						62,65
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	154,36

CROQUIS



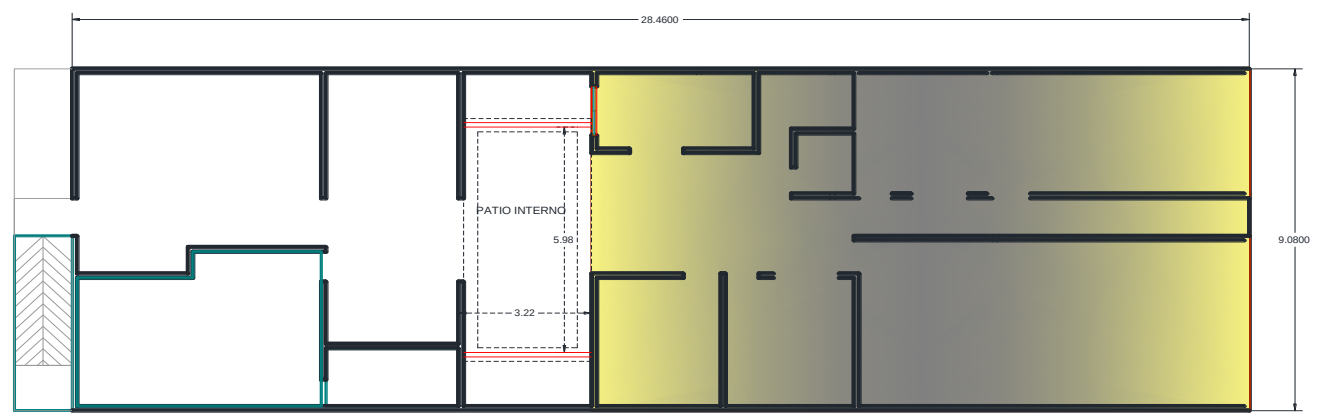

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 12 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 5 | DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 6,22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM **UNIDAD** M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						60,84
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						30,87
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						62,65
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	154,36

CROQUIS

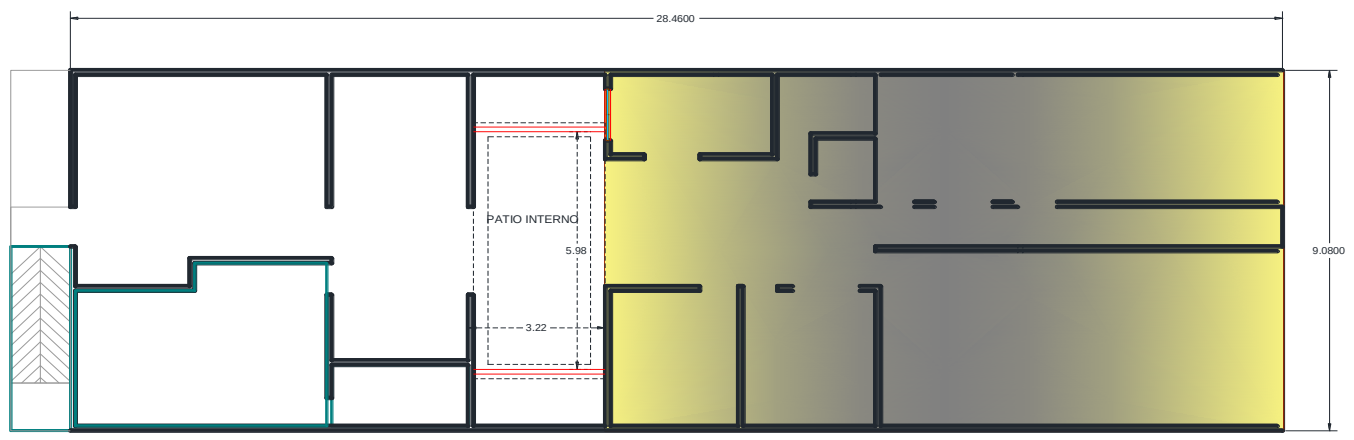

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 7,01 ESTUCO EXTERIOR	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	1,00	2,778	9,00						25,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	25,00

CROQUIS



Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 12 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 5 | DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 7,05 CERÁMICA FORMATO 25X35CM **UNIDAD** M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	-

CROQUIS

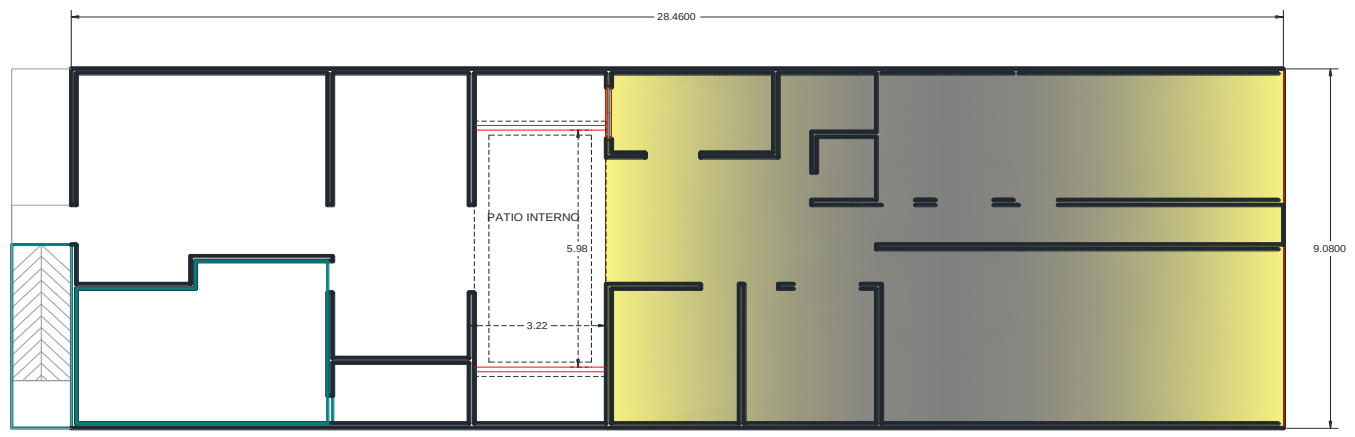

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DI[illegible] CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 12 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 5 DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS] UNIDAD M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	1,00	4,491	9,08						40,78
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										40,78

CROQUIS

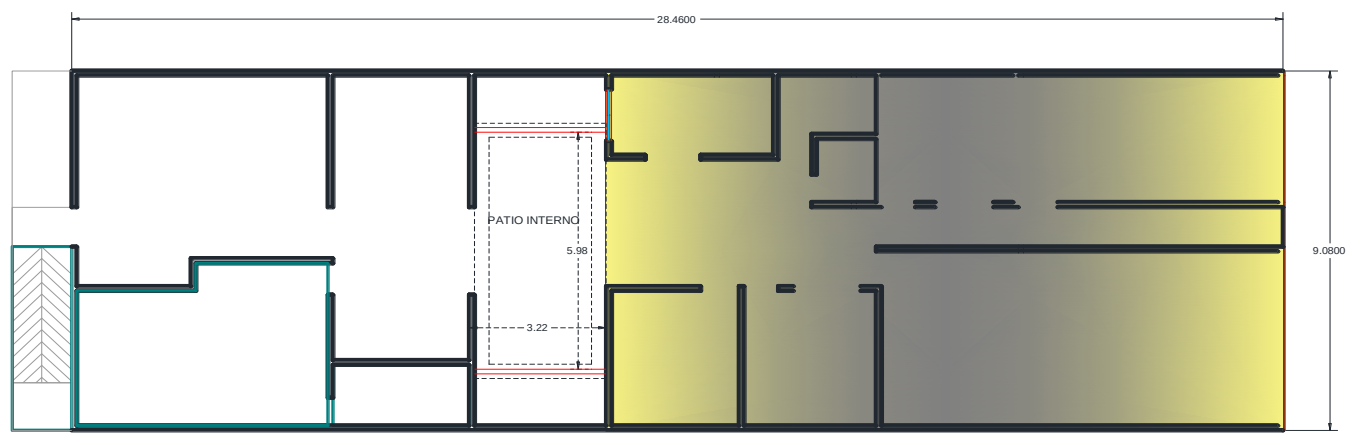

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 14,06 PISO CERÁMICO DURO PISO **UNIDAD** M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	1,00	4,491	9,08						40,78
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	40,78

CROQUIS

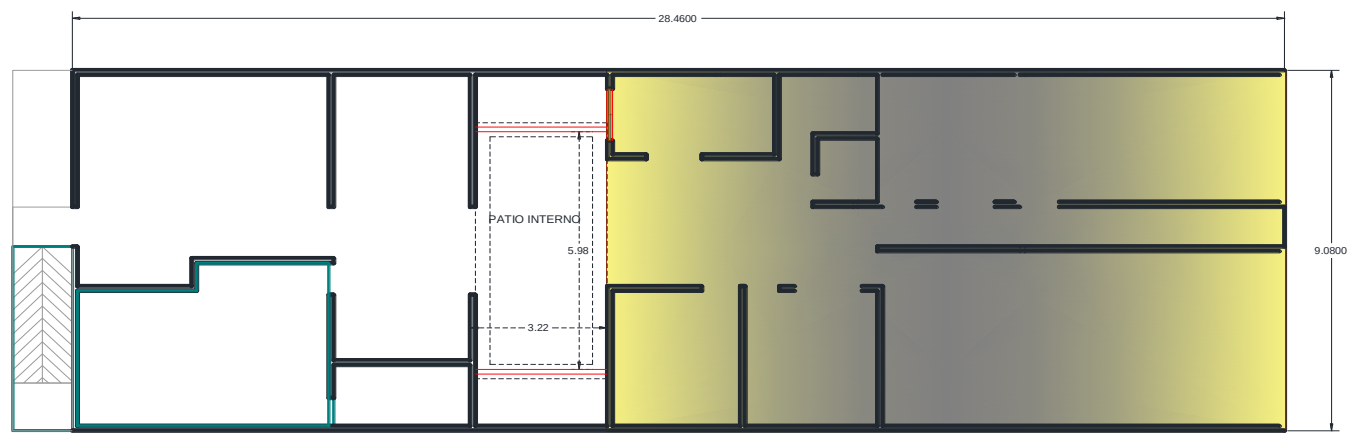

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DI[illegible]A CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5


CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM:	*ITEM 14,13 ALISTADO DE PISO 2CM*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL PUBLICO	PISO 1	1,00	4,491	9,08						*40,78*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	40,78

CROQUIS

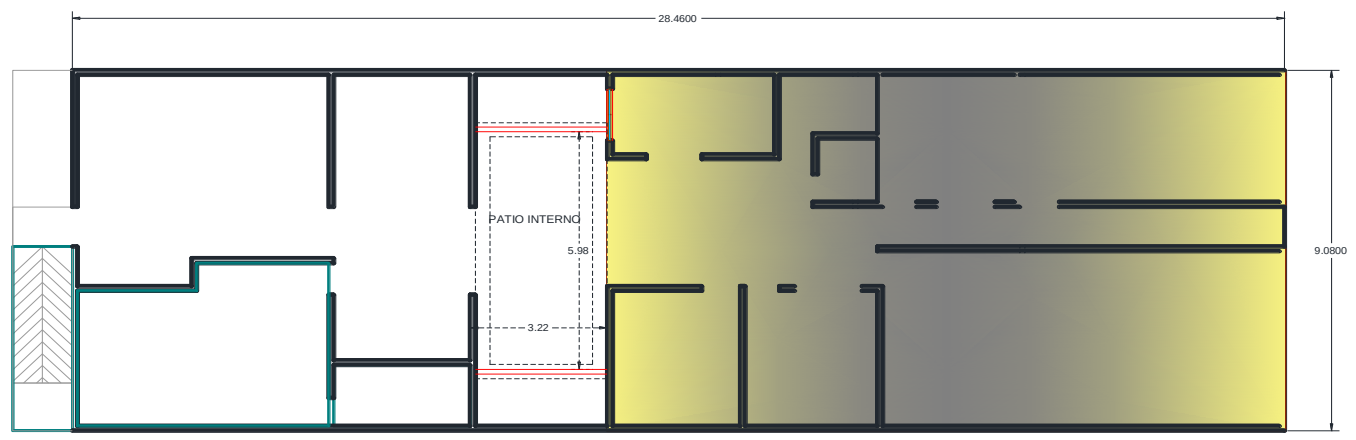

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 12 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 5 DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: ITEM 17,12 SALIDA SANITARIA INODORO 4" | UNIDAD M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO DAMAS	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										1,00

CROQUIS

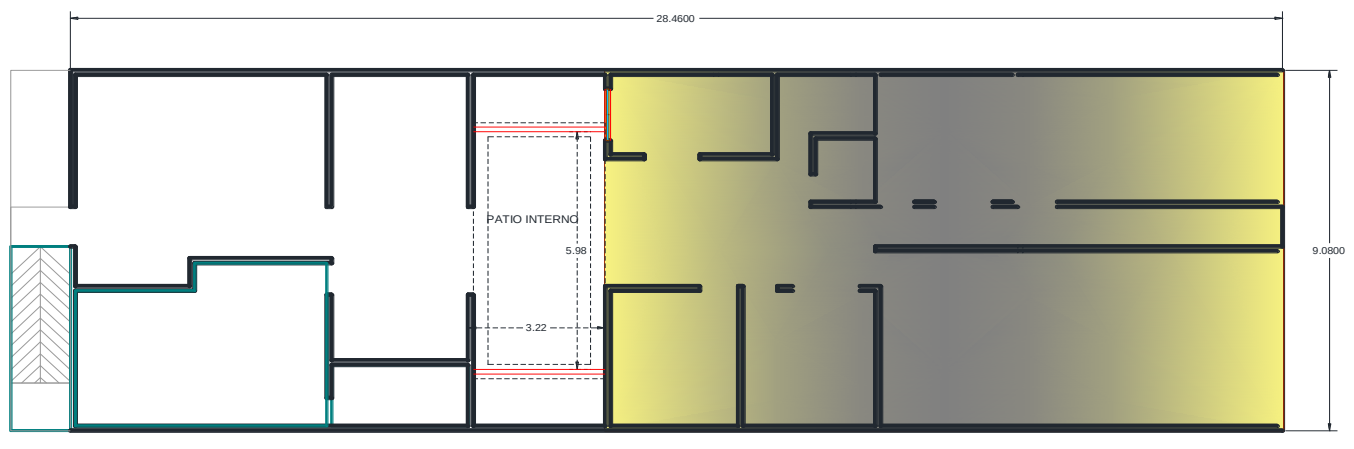

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *ITEM 17,14 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"* **UNIDAD** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO DAMAS	*PISO 1*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS

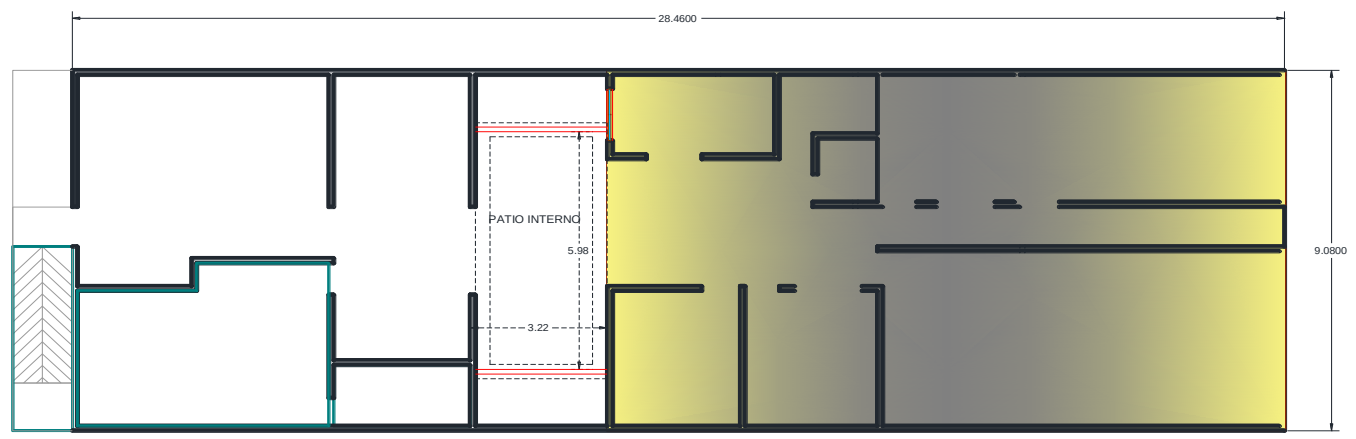

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	*ITEM 17,16 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO DAMAS	*PISO 1*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS



Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR
