SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 24 - 09 - 2023** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 27 de noviembre de 2023 Al: 3 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 125,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: CARRERA 56 N° 11a - 20 BARRIO SANTA ANITA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip) — SUPERVISOR: RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,57%	92,37%
Valor básico de la Obra programada:	$ 49.387.519,57	$ 694.356.953,28

	SEMANAL	ACUMULADO	ATRASO
Obra Física Ejecutada (%)	6,28%	76,99%	15,38%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 47.207.552,96	$ 578.708.423,77	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 751.712.626,70
Valor Actualizado:	$ 751.712.626,70
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 15 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 134.235.550,23
Valor Actualizado:	134.235.550,23
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

ITEM 1.57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

ITEM 1.74 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL

ITEM 7.03 RESANE DE MUROS

ITEM 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)

NP-05 PINTURA PARA REJAS

NP-06 PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 4 BOLILLOS HORIZONTALES)

NP-07 PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 2 BOLILLOS HORIZONTALES)

NP-08 PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 1 BOLILLOS HORIZONTALES)

NOTA: A ESTA FECHA. LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 15,38 % , SE LE SOLICITA AL COONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA. A LA SIGUIENTE SEMANA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL BALANCE

IMAGENES AVANCE





ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA (AREA DE DESCARGUE)

ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA (AREA DE DESCARGUE)





ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS


DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO





ITEM 7.03 RESANE DE MUROS (AREA DE FUNCIONARIOS PISO N° 1)

ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)

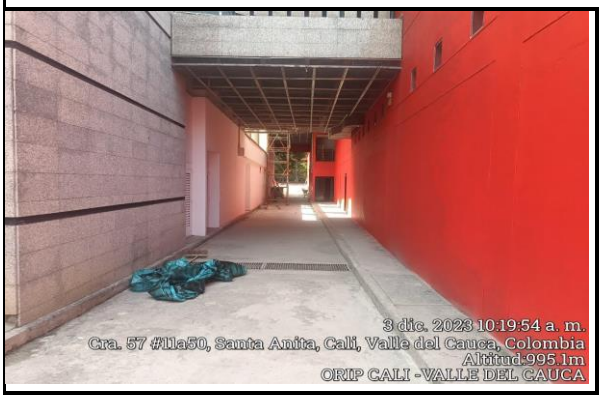



ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)	ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)
	
PINTURA PARA BARANDAS	PINTURA PARA BARANDAS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
NOTA:SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA Y APU QUE ESTAN PENDIENTE	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA.	**Firma:**
ITEM: 2.18 CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	**Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS**
ITEM: 2.19 CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	**Matrícula No.: A08192002- 78747710**
ITEM: 2.21 BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	**RESIDENTE DE OBRA**
ITEM: 3.02 BARANDA TUBO REDONDO	**Firma:**
ITEM: 3.20 ESPEJO BISELADO 5MM	**Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ**
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	**Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA**
ITEM: 10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1			CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.				CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,17	DESCRIPCION	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			v. PARCIAL	TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CUBIERTA	PISO 5	1,00	29,82	33,70							1.005,00
											-
	SUB TOTAL										1.005,00
	VIENE DE LA PAGINA DE										-
	TOTAL										1.005,00

CROQUIS

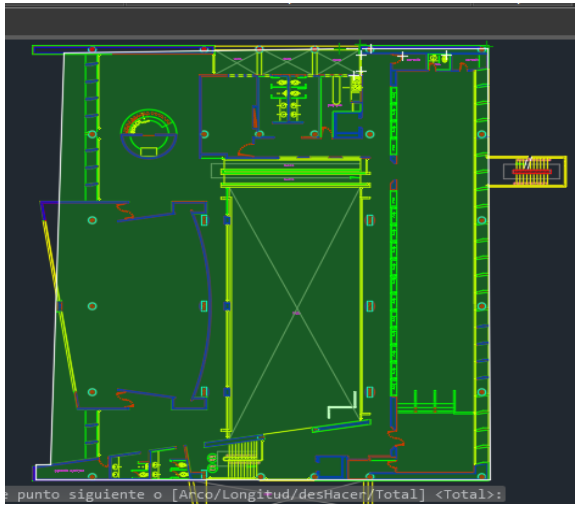

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA — FECHA: DIA 19 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE 2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO Nº	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO Nº	1707 - 2023
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.37	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UN	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PLAZOLETA DE ACCESO	PISO 1	1,00	33,82	19,33							653,76
	PISO 1	1,00	39,84		0,20						7,97
	PISO 1	8,00	27,53		0,07						15,42
	PISO 1	3,00	22,34		0,07						4,69
	PISO 1	16,00	7,47		0,07						8,37
	PISO 1	1,00	10,40		0,07						0,73
	PISO 1	4,00	4,34		0,07						1,22
	PISO 1	5,00	4,66		0,07						1,63
	PISO 1	4,00	5,13		0,07						1,44
	PISO 1	5,00	5,45		0,07						1,91
RAMPA DISCAPACITADO											
Tramo N° 1		*1,00*	*4,70*		0,20						0,94
		1,00	*5,15*		0,35						*1,80*
		1,00	*3,04*		0,55						*1,67*
		1,00	*5,50*		0,32						*1,76*
		1,00	*6,70*		0,27						*1,81*
		1,00	*6,70*		0,30						*2,01*
			SUB TOTAL								707,13
			VIENE DE LA PAGINA DE								
			TOTAL								707,13

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA — FECHA: DIA 19 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 2 | DE 2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO Nº	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO Nº	1707 - 2023
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.37	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UN	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
RAMPA DISCAPACITADO											
Tramo N° 2		1,0	3,04		0,60						1,82
		1,0	5,50		0,30						1,65
		1,0	6,70		0,27						1,81
		1,0	6,70		0,30						2,01
Tramo N° 3											
		1,00	*3,04*		*0,60*						1,82
		1,00	5,50		0,32						1,76
		1,00	*7,48*		*0,33*						*2,47*
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*
		1,00	*7,16*		*0,28*						*2,00*
		2,00	*1,50*		*0,16*						*0,48*
		1,00	*6,68*		*0,36*						*2,40*
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*
		1,00	*6,37*		*0,21*						*1,34*
		2,00	*1,50*		*0,17*						*0,51*
			SUB TOTAL								21,18
			VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2								*707,11*
			TOTAL								728,28

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.57	DESCRIPCION	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	UNI	U	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO										-
	PISO 1	1,00								1,00
	PISO 2	1,00								1,00
	PISO 3	2,00								2,00
	PISO 4	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2										-
TOTAL										5,00

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	15	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.66	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLAZOLETA	PISO 1	4,00	3,04		0,55					6,69
		4,00	5,15		0,35					7,21
		4,00	6,70		0,27					7,24
		4,00	6,70		0,30					8,04
		5,00	3,04		0,60					9,12
		5,00	6,51		0,36					11,71
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2										-
TOTAL										50,00

CROQUIS

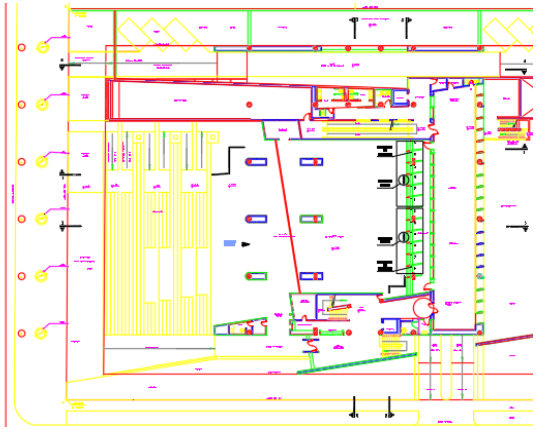

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,67	DESCRIPCION	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	UNI	M3	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PLAZOLETA DE ACCESO	104,00								104,00
	CUBIERTA	21,00								21,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										125,00

CROQUIS

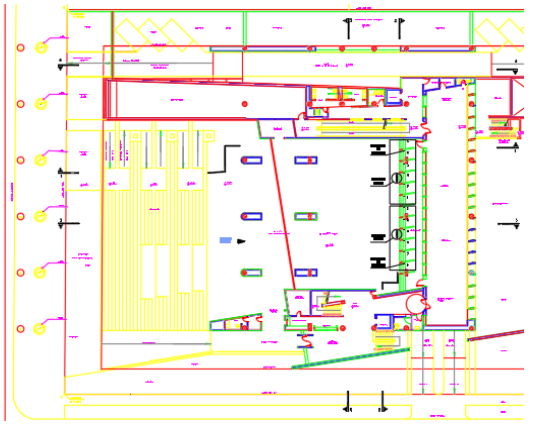

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,74	DESCRIPCION	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL	UNI	UN/DIA	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	120,00								120,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										120,00

CROQUIS

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	2	CARPINTERÍA EN MADERA	ITEM	2,09	DESCRIPCION	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UNI	UN	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
COCINA	SOTAN0									-
	PISO 1	1,00								1,00
	PISO 2	1,00								1,00
	PISO 3	1,00								1,00
	PISO 4	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										4,00

CROQUIS

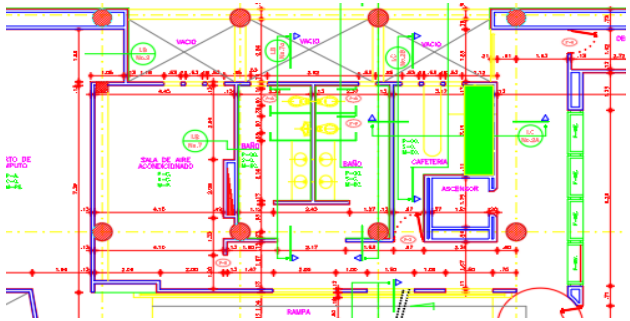

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	2	CARPINTERÍA EN MADERA	ITEM	2,10	DESCRIPCION	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
COCINA	SOTAN0									-
	PISO 1	1,00								1,00
	PISO 2	1,00								1,00
	PISO 3	1,00								1,00
	PISO 4	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										4,00

CROQUIS

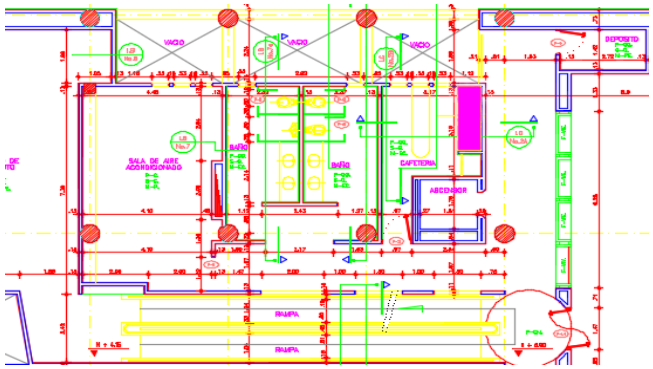

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**						**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**						**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**2**	CARPINTERÍA EN MADERA		**ITEM**	2,18	**DESCRIPCION**	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA		**UNI**	U	**UBICACIÓN** ORIP - CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	**LONGITUD**	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
	SOTAN0	4,00								4,00
	PISO 1	4,00								4,00
	PISO 2	4,00								4,00
	PISO 3	4,00								4,00
	PISO 4	4,00								4,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										20,00

CROQUIS

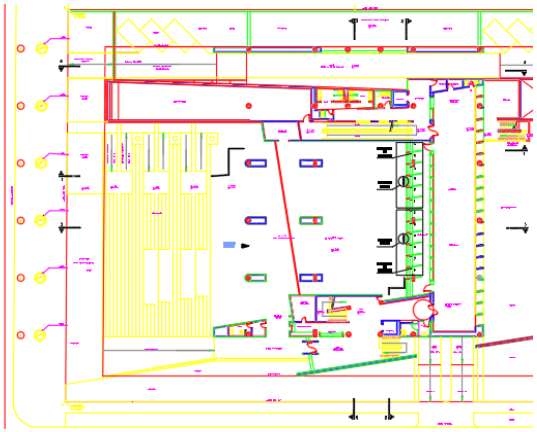

Observaciones

Luisa A Lara M.

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	2	CARPINTERÍA EN MADERA		ITEM	2,19	DESCRIPCION	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
	SOTAN0	1,00								1,00	
	PISO 1	2,00								2,00	
	PISO 2	2,00								2,00	
	PISO 3	2,00								2,00	
	PISO 4	2,00								2,00	
	CUBIERTA	1,00								1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										-	
TOTAL										10,00	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**						**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**						**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**2**	CARPINTERÍA EN MADERA		**ITEM**	2,21	**DESCRIPCION**	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	**UNI**	U	**UBICACIÓN**	ORIP - CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
ATENCION AL USUARIO	SOTAN0	1,00								1,00	
	PISO 1	4,00								4,00	
	PISO 2	5,00								5,00	
	PISO 3	5,00								5,00	
	PISO 4	5,00								5,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										-	
TOTAL										20,00	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**						**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**						**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**2**	CARPINTERÍA EN MADERA		**ITEM**	2,22	**DESCRIPCION**	MANTENIMIENTO DE MUEBLE		**UNI**	M	**UBICACIÓN** ORIP - CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
ARCHIVO	SOTANO	8,00	5,0							40,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										-	
TOTAL										40,00	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**									
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**3**	CARPINTERÍA METÁLICA	**ITEM**	3,02	**DESCRIPCION**	BARANDA TUBO REDONDO	**UNI**	M	**UBICACIÓN**	ORIP - CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
PLAZOLETA										-
	PISO 1	2,00	3,50							7,00
		1,00	14,41							14,41
		1,00	14,83							14,83
		1,00	16,47							16,47
		1,00	15,64							15,64
		1,00	14,41							14,41
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										82,76

CROQUIS

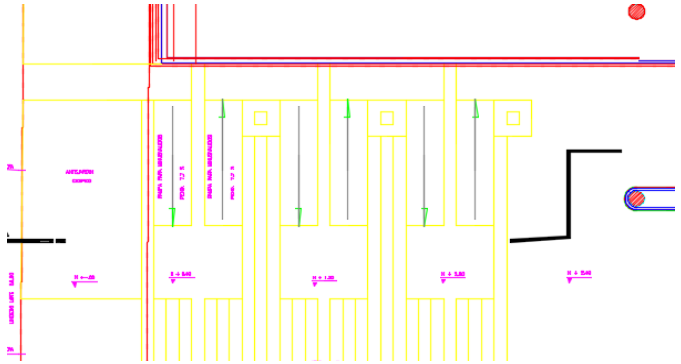

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	3	CARPINTERÍA METÁLICA		ITEM	3,20	DESCRIPCION	ESPEJO BISELADO 5MM	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PLAZOLETA										-	
WC - CABALLERO	PISO 1	1,00	1,70		1,00					1,70	
WC - DAMAS		1,00	1,40		1,00					1,40	
										-	
WC - CABALLERO	PISO 2	1,00	2,10		1,00					2,10	
WC - DAMAS		1,00	2,10		1,00					2,10	
										-	
WC - CABALLERO	PISO 3	1,00	2,10		1,00					2,10	
WC - DAMAS		1,00	2,10		1,00					2,10	
										-	
WC - CABALLERO	PISO 4	1,00	2,10		1,00					2,10	
WC - DAMAS		1,00	2,10		1,00					2,10	
WC - AUDITORIO										-	
WC - CABALLERO	PISO 4	1,00	1,85		1,00					1,85	
WC - DAMAS		1,00	2,30		1,00					2,30	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										-	
TOTAL										19,85	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	0,50								0,50
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										0,50

CROQUIS

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 6,16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						60,84	
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						30,87	
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						62,65	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	154,36	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 6,22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						60,84	
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						30,87	
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						62,65	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	154,36	

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 7,01 ESTUCO EXTERIOR	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	1,00	2,778	9,00						25,00
										-
										-
										-

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

PROCESO DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO

PROCEDIMIENTO: AVALÚO COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS

FORMATO: APERTURA DE CUENTA AVALÚOS ESPECIALES

Código: GCM-PR-FR-0001

Versión: 01

Fecha: 15 - 11 - 2022

OBJETO DEL FORMATO

Este formato permite registrar la información básica para la apertura de cuenta para los avalúos especiales, además de la información del solicitante y el predio objeto de avalúo.

SOLICITANTE

NOMBRE		**APELLIDOS**		**IDENTIFICACIÓN**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**		**CORREO ELECTRÓNICO**	
CIUDAD		**DEPARTAMENTO**		**PAÍS**	

PREDIO

NÚMERO PREDIAL	**DIRECCIÓN**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA**	**CHIP**	**ÁREA DE TERRENO**	**ÁREA CONSTRUIDA**	**ÁREA PRIVADA**	**ÁREA COMÚN**	**ÁREA TOTAL**	**ÁREA DE INFLUENCIA**

SNR

PROCESO: MESA DIVISORIA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

FORMATO: INVENTARIO DE CONDICIONES EXISTENTES

CÓDIGO:	MAN-PR-01-FT-01
VERSIÓN:	01
FECHA:	11 - 2022

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se realiza mantenimiento preventivo de las mesas divisorias de las instalaciones de la sede, con el fin de evitar inconvenientes, mejorar su estado y prolongar su vida útil.

RESPONSABLE:		CARGO:	
FECHA:		HORA INICIO:	HORA FIN:
CONTRATO:	SI	NO	NOMBRE CONTRATISTA:

ACTIVIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
		B	R	M	N	C	NA	
Estructura metálica	Estructura							
Estructura metálica	Soldaduras							
Estructura metálica	Pintura							
Estructura metálica	Tornillos							
Estructura metálica	Anclajes							
Estructura metálica	Nivelación							
Estructura metálica	Verticalidad							
Estructura metálica	Horizontalidad							
Estructura metálica	Limpieza							
Estructura metálica	Corrosión							
Estructura metálica	Deformaciones							
Estructura metálica	Fisuras							
Estructura metálica	Desprendimientos							
Estructura metálica	Humedad							
Estructura metálica	Moho							
Estructura metálica	Plagas							
Estructura metálica	Ventilación							
Estructura metálica	Iluminación							
Estructura metálica	Señalización							
Estructura metálica	Seguridad							
Estructura metálica	Accesibilidad							
Estructura metálica	Otros							

IMAGEN



OBSERVACIONES

FELIX ENG. - GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.S.
Nit 900.123.456-7 - Calle 10 No. 5-20, Bogotá D.C.

ANGEL DAVID MARTINEZ
Ingeniero Electricista
Matrícula Profesional No. 25202-123456 CND
Vigilancia Profesional No. 2570-123456 CND

SNR

PROCESO: MESA DIVISORIA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

FORMATO: INVENTARIO DE CONDICIONES EXISTENTES

CÓDIGO:	MAN-PR-01-FT-01
VERSIÓN:	01
FECHA:	11 - 2022

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se realiza mantenimiento preventivo de las mesas divisorias de las instalaciones de la sede, con el fin de evitar inconvenientes, mejorar su estado y prolongar su vida útil.

RESPONSABLE:		CARGO:	
FECHA:		HORA INICIO:	HORA FIN:
CONTRATO:	SI	NO	NOMBRE CONTRATISTA:

ACTIVIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
		B	R	M	N	C	NA	
Estructura metálica	Estructura							
Estructura metálica	Soldaduras							
Estructura metálica	Pintura							
Estructura metálica	Tornillos							
Estructura metálica	Anclajes							
Estructura metálica	Nivelación							
Estructura metálica	Verticalidad							
Estructura metálica	Horizontalidad							
Estructura metálica	Limpieza							
Estructura metálica	Corrosión							
Estructura metálica	Deformaciones							
Estructura metálica	Fisuras							
Estructura metálica	Desprendimientos							
Estructura metálica	Humedad							
Estructura metálica	Moho							
Estructura metálica	Plagas							
Estructura metálica	Ventilación							
Estructura metálica	Iluminación							
Estructura metálica	Señalización							
Estructura metálica	Seguridad							
Estructura metálica	Accesibilidad							
Estructura metálica	Otros							

IMAGEN

OBSERVACIONES

FELIX ENG. - GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.S.
Nit 900.123.456-7 - Calle 10 No. 5-20, Bogotá D.C.

ANGEL DAVID MARTINEZ
Ingeniero Electricista
Matrícula Profesional No. 25202-123456 CND
Vigilancia Profesional No. 2570-123456 CND

SNR

PROCESO: MESA DIVISORIA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

FORMATO: INVENTARIO DE CONDICIONES EXISTENTES

CÓDIGO:	MAN-PR-01-FT-01
VERSIÓN:	01
FECHA:	11 - 2022

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se realiza mantenimiento preventivo de las mesas divisorias de las instalaciones de la sede, con el fin de evitar inconvenientes, mejorar su estado y prolongar su vida útil.

RESPONSABLE:		CARGO:	
FECHA:		HORA INICIO:	HORA FIN:
CONTRATO:	SI	NO	NOMBRE CONTRATISTA:

ACTIVIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
		B	R	M	N	C	NA	
Estructura metálica	Estructura							
Estructura metálica	Soldaduras							
Estructura metálica	Pintura							
Estructura metálica	Tornillos							
Estructura metálica	Anclajes							
Estructura metálica	Nivelación							
Estructura metálica	Verticalidad							
Estructura metálica	Horizontalidad							
Estructura metálica	Limpieza							
Estructura metálica	Corrosión							
Estructura metálica	Deformaciones							
Estructura metálica	Fisuras							
Estructura metálica	Desprendimientos							
Estructura metálica	Humedad							
Estructura metálica	Moho							
Estructura metálica	Plagas							
Estructura metálica	Ventilación							
Estructura metálica	Iluminación							
Estructura metálica	Señalización							
Estructura metálica	Seguridad							
Estructura metálica	Accesibilidad							
Estructura metálica	Otros							

IMAGEN

OBSERVACIONES

FELIX ENG. - GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.S.
Nit 900.123.456-7 - Calle 10 No. 5-20, Bogotá D.C.

ANGEL DAVID MARTINEZ
Ingeniero Electricista
Matrícula Profesional No. 25202-123456 CND
Vigilancia Profesional No. 2570-123456 CND

SNR

PROCESO: MESA DIVISORIA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

FORMATO: INVENTARIO DE CONDICIONES EXISTENTES

CÓDIGO:	MAN-PR-01-FT-01
VERSIÓN:	01
FECHA:	11 - 2022

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se realiza mantenimiento preventivo de las mesas divisorias de las instalaciones de la sede, con el fin de evitar inconvenientes, mejorar su estado y prolongar su vida útil.

RESPONSABLE:		CARGO:	
FECHA:		HORA INICIO:	HORA FIN:
CONTRATO:	SI	NO	NOMBRE CONTRATISTA:


ACTIVIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
		B	R	M	N	C	NA	
Estructura metálica	Estructura							
Estructura metálica	Soldaduras							
Estructura metálica	Pintura							
Estructura metálica	Tornillos							
Estructura metálica	Anclajes							
Estructura metálica	Nivelación							
Estructura metálica	Verticalidad							
Estructura metálica	Horizontalidad							
Estructura metálica	Limpieza							
Estructura metálica	Corrosión							
Estructura metálica	Deformaciones							
Estructura metálica	Fisuras							
Estructura metálica	Desprendimientos							
Estructura metálica	Humedad							
Estructura metálica	Moho							
Estructura metálica	Plagas							
Estructura metálica	Ventilación							
Estructura metálica	Iluminación							
Estructura metálica	Señalización							
Estructura metálica	Seguridad							
Estructura metálica	Accesibilidad							
Estructura metálica	Otros							


IMAGEN


OBSERVACIONES

FELIX ENG. - GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.S.
Nit 900.123.456-7 - Calle 10 No. 5-20, Bogotá D.C.

ANGEL DAVID MARTINEZ
Ingeniero Electricista
Matrícula Profesional No. 25202-123456 CND
Vigilancia Profesional No. 2570-123456 CND

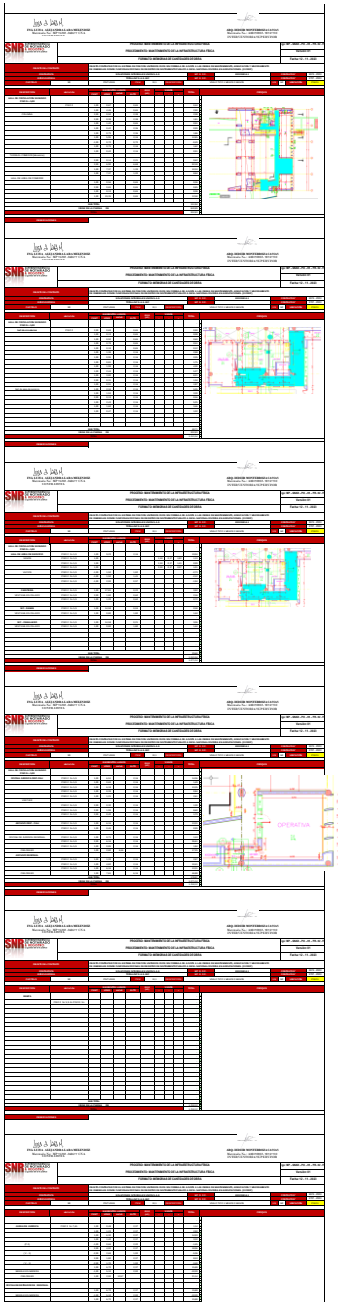


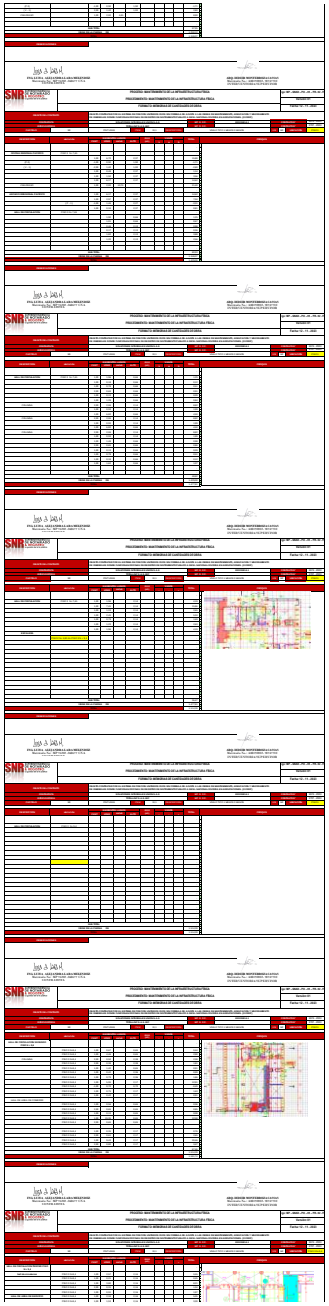


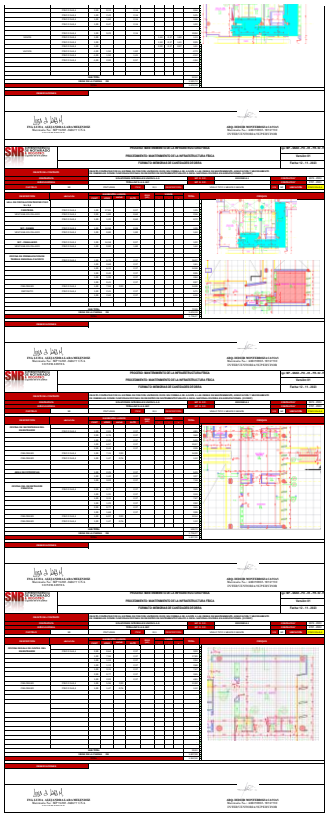

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES














SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S						NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC						NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	14	IMPERMEABILIZACION		ITEM	14.15	DESCRIPCION	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	UN	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLAZOLETA DE ACCESO	PISO 1	1,00	33,82	19,33						653,76
	PISO 1	1,00	39,84		0,20					7,97
	PISO 1	8,00	27,53		0,07					15,42
	PISO 1	3,00	22,34		0,07					4,69
	PISO 1	16,00	7,47		0,07					8,37
	PISO 1	1,00	10,40		0,07					0,73
	PISO 1	4,00	4,34		0,07					1,22
	PISO 1	5,00	4,66		0,07					1,63
	PISO 1	4,00	5,13		0,07					1,44
	PISO 1	5,00	5,45		0,07					1,91
RAMPA DISCAPACITADO										-
Tramo N° 1		1,00	4,70		0,20					0,94
		1,00	5,15		0,35					1,80
		1,00	3,04		0,55					1,67
		1,00	5,50		0,32					1,76
		1,00	6,70		0,27					1,81
		1,00	6,70		0,30					2,01
										-
	SUB TOTAL									707,11
	VIENE DE LA PAGINA DE									-
	TOTAL									707,11

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S						NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC						NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	14	IMPERMEABILIZACION		ITEM	14.15	DESCRIPCION	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	UN	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
RAMPA DISCAPACITADO										-
Tramo N° 2		1,0	3,04		0,60					1,82
		1,0	5,50		0,30					1,65
		1,0	6,70		0,27					1,81
		1,0	6,70		0,30					2,01
										-
Tramo N° 3										-
		1,00	3,04		0,60					1,82
		1,00	5,50		0,32					1,76
										-
		1,00	7,48		0,33					2,47
		2,00	1,50		0,18					0,54
		1,00	7,16		0,28					2,00
		2,00	1,50		0,16					0,48
		1,00	6,68		0,36					2,40
		2,00	1,50		0,18					0,54
		1,00	6,37		0,21					1,34
		2,00	1,50		0,17					0,51
										-
	SUB TOTAL									21,16
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2									707,11
	TOTAL									728,28

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página: 1 de
Código: FO-COING-556
Versión: 1
Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA	DD	15	MM	10	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)				
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800.205.914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,73	DESCRIPCIÓN	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	UNID.	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETE



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
PLAZOLETA					
	43,87	2,00		1	87,74
	19,33	2,00		1	38,66
	28,97	2,00		1	57,94

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	*ITEM 17,14 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO DAMAS	*PISO 1*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**						**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**						**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**10**	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	**ITEM**	10,04	**DESCRIPCION**	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS	**UNI**	M2	**UBICACIÓN**	ORIP - CALI	

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	**LONG**	**ANCHO**	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
AREA DE PLAZOLETA										-
	PISO 1 N 2,40		9,37		2,53					23,71
	PISO 1 N 2,00		4,50		2,90					13,05
	PISO 1 N 1,20		5,00		3,53					17,65
	PISO 1 N 0,40		2,06		4,29					8,84
	PISO 1 N 0,00		5,65		5,28					29,83
ZONA DE DESCARGUE	PISO N 1		17,96		6,00					107,76
	PISO N 1		9,41		4,15					39,05
	PISO N 1		12,18		5,54					67,48
	PISO N 1		10,26		6,00					61,56
	PISO N 1		4,75		3,50					16,63
	PISO N 1		13,87		5,24					72,68
	PISO N 1		22,62		5,00					113,10
	PISO N 1		10,26		6,00					61,56
	PISO N 1		26,00		4,10					106,60
	PISO N 1		17,73		4,60					81,56
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										821,05
VIENE DE LA PAGINA DE										
TOTAL										821,05

CROQUIS



OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	NP	NO PREVISTO	ITEM	NP.03	DESCRIPCION	ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES	UNI M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PLAZOLETA DE ACCESO	PISO 1	1,00	33,82	19,33							653,76
		1,00	39,84		0,20						7,97
		8,00	27,53		0,07						15,42
		3,00	22,34		0,07						4,69
		16,00	7,47		0,07						8,37
		1,00	10,40		0,07						0,73
		4,00	4,34		0,07						1,22
		5,00	4,66		0,07						1,63
		4,00	5,13		0,07						1,44
		5,00	5,45		0,07						1,91
RAMPA DISCAPACITADO											-
Tramo N° 1		*1,00*	*4,70*		*0,20*						*0,94*
		1,00	*5,15*		*0,35*						*1,80*
		1,00	*3,04*		*0,55*						*1,67*
		1,00	*5,50*		*0,32*						*1,76*
		1,00	*6,70*		*0,27*						*1,81*
		1,00	*6,70*		*0,30*						*2,01*
											-
	SUB TOTAL										707,11
	VIENE DE LA PAGINA DE										-
	TOTAL										707,11

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No. MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	NP	NO PREVISTO	ITEM	NP.03	DESCRIPCION	ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES	UNI M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
RAMPA DISCAPACITADO											-
Tramo N° 2		*1,0*	3,04		0,60						1,82
		1,0	5,50		0,30						1,65
		1,0	6,70		0,27						1,81
		1,0	6,70		0,30						2,01
Tramo N° 3											-
		1,00	*3,04*		*0,60*						*1,82*
		1,00	5,50		0,32						1,76
											-
		1,00	*7,48*		*0,33*						*2,47*
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*
		1,00	*7,16*		*0,28*						*2,00*
		2,00	*1,50*		*0,16*						*0,48*
		1,00	*6,68*		*0,36*						*2,40*
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*
		1,00	*6,37*		*0,21*						*1,34*
		2,00	*1,50*		*0,17*						*0,51*
											-
	SUB TOTAL										21,15
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2										*707,11*
	TOTAL										728,26

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No. MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	**NP**	NO PREVISTO		**ITEM**	5	**DESCRIPCION**	PINTURA PARA REJA METALICA		**UNI**	M2	**UBICACIÓN**	CERRAMIENTOO EXT

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
BAÑO DAMAS	PARTE FRONTAL	1,00	52,890		2,00					105,78
	PARTE LATERAL	1,00	64,10		2,00					128,20
	PARTE POSTERIOR	1,00	8,77		2,00					17,54
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA DE									-
	TOTAL									251,52

CROQUIS

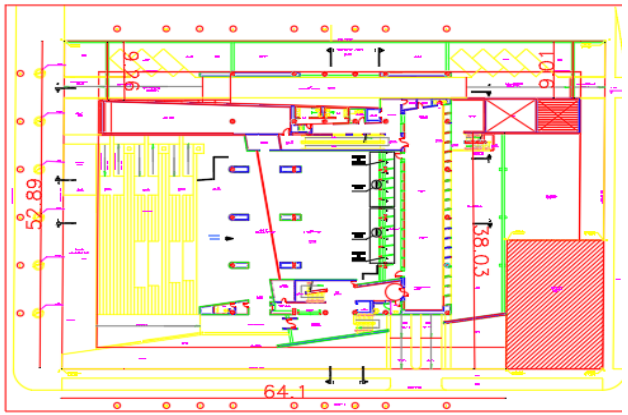

Observaciones

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	**NP**	NO PREVISTO		**ITEM**	NP-06	**DESCRIPCION**	PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 4 BOLILLOS HORIZONTALES)	**UNI**	M2	**UBICACIÓN**	ORIP CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
RAMPA										-
	SOTANO AL PISO 1	2,00	12,35							24,70
		2,00	12,30							24,60
		1,00	8,80							8,80
										-
										-
RAMPA	PISO 1 AL PISO 2	2,00	11,85							23,70
		2,00	11,78							23,56
ESCALERA	PISO 1 N+2,40 AL PISO 2 N+5,9	1,00	7,08							7,08
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9	1,00	3,70							3,70
COMEDOR	PISO 2 N+ 5,9	1,00	7,12							7,12
AREA DE SERVICIO		1,00	0,90							0,90
		1,00	1,88							1,88
										-
RAMPA	PISO 2 N+5,9 AL PISO 3 N+9,4	2,00	11,90							23,80
		2,00	11,95							23,90
ESCALERA	PISO 2 N+5,9 AL PISO 3 N+9,4	1,00	7,00							7,00
	PISO 3 N+7,65	1,00	1,88							1,88
HALL DE CIRCULACION	PISO 3 N+ 9,4	1,00	3,70							3,70
COMEDOR MESANINE	PISO 3 N+ 9,4	1,00	7,12							7,12
AREA DE SERVICIO	PISO 3 N+ 9,4	1,00	0,90							0,90
	PISO 3 N+ 9,4	1,00	1,88							1,88
		1,00	2,00							2,00
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										*198,22*

CROQUIS

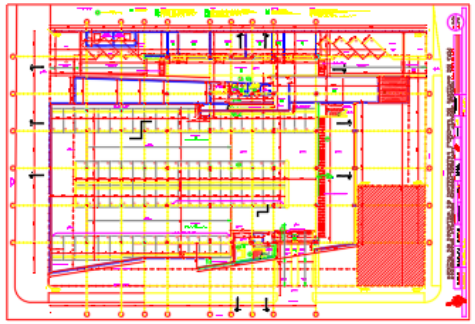

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**								
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**				**NIT O C.C.**	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**				**NIT O C.C.**		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	**NP**	NO PREVISTO	**ITEM**	NP-06	**DESCRIPCION**	PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 4 BOLILLOS HORIZONTALES)	UNI	M2	**UBICACIÓN** ORIP CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
RAMPA										-
RAMPA	PISO 3 N+9,4 AL PISO 4 N+12,9	1,00	11,53							11,53
		1,00	11,70							11,70
ESCALERA	PISO 3 N+9,4 AL PISO 4 N+12,9	1,00	7,50							7,50
HALL DE CIRCULACION	PISO 4 N+ 11,15	1,00	4,30							4,30
		1,00	5,80							5,80
		1,00	6,97							6,97
		1,00	1,80							1,80
										-
HALL DE CIRCULACION	PISO 4 N+ 12,9	1,00	2,00							2,00
		1,00	3,70							3,70
		1,00	0,90							0,90
		1,00	1,80							1,80
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										58,00
VIENE DE LA PAGINA DE										198,22
TOTAL										256,22

CROQUIS

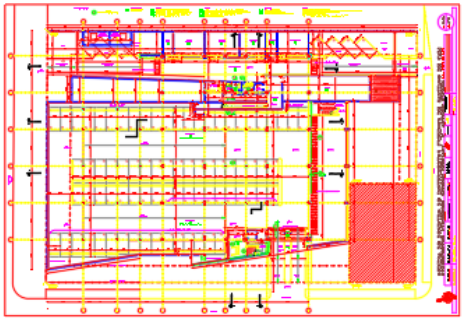

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	**NP**	NO PREVISTO		**ITEM**	NP-07	**DESCRIPCION**	PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 2 BOLILLOS HORIZONTALES)	**UNI**	M2	**UBICACIÓN**	ORIP-CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
	PISO 4 N+ 11,15									-
HALL DE CIRCULACION AUDITORIO	PISO 4 N+ 11,15	1,00	4,20							*4,20*
		1,00	*7,02*							*7,02*
		1,00	*7,02*							*7,02*
		1,00	*2,98*							*2,98*
		1,00								*1,00*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	NP	NO PREVISTO	ITEM	NP-07	DESCRIPCION	PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 2 BOLILLOS HORIZONTALES)	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP-CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ESCALERA	PISO 1 N+2,40 AL PISO 2 N+5,9	1,00	5,60							*5,60*	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9	*1,00*	*1,45*							*1,45*	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9	*1,00*	*4,25*							*4,25*	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9	*1,00*	*0,80*							*0,80*	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9	1,00	20,75							*20,75*	
ESCALERA	PISO 2 N+5,9 AL PISO 3 N+9,4	2,00	2,90							*5,80*	
	PISO 3 N+7,65	1,00	1,96							*1,96*	
	PISO 3 N+7,65	1,00	*1,00*							*1,00*	
	PISO 3 N+7,65	1,00	*1,70*							*1,70*	
	PISO 3 N+7,65	1,00	1,80							*1,80*	
	PISO 3 N+7,65	1,00	*6,82*							*6,82*	
	PISO 3 N+7,65	1,00	6,82							*6,82*	
	PISO 3 N+7,65	1,00	*2,52*							*2,52*	
										-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 3 N+ 9,4	1,00	4,80							*4,80*	
	PISO 3 N+ 9,4	*1,00*	*0,80*							*0,80*	
	PISO 3 N+ 9,4	*1,00*	*19,35*							*19,35*	
ESCALERA	PISO 3 N+9,4 AL PISO 4 N+12,9	1,00	7,50							*7,50*	
HALL DE CIRCULACION	PISO 4 N+ 12,9	1,00	4,80							*4,80*	
	PISO 4 N+ 12,9	*1,00*	*20,28*							*20,28*	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	*118,80*	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**								
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	**NP**	NO PREVISTO	**ITEM**	NP-07	**DESCRIPCION**	PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 2 BOLILLOS HORIZONTALES)	UNI	M2	**UBICACIÓN**	ORIP-CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ESCALERA	PISO 1 N+2,40 AL PISO 2 N+5,9									-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9									-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9									-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9									-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 2 N+ 5,9									-	
ESCALERA	PISO 2 N+5,9 AL PISO 3 N+9,4									-	
	PISO 3 N+7,65									-	
	PISO 3 N+7,65									-	
	PISO 3 N+7,65									-	
	PISO 3 N+7,65									-	
	PISO 3 N+7,65									-	
	PISO 3 N+7,65									-	
	PISO 3 N+7,65									-	
										-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 3 N+ 9,4									-	
	PISO 3 N+ 9,4									-	
	PISO 3 N+ 9,4									-	
										-	
ESCALERA	PISO 3 N+9,4 AL PISO 4 N+12,9									-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	-	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	11	IMPERMEABILIZACION	ITEM	11.06	DESCRIPCION	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
PLAZOLETA DE ACCESO	PISO 1	1,00	33,82	19,33							653,76	
	PISO 1	1,00	39,84		0,20						7,97	
	PISO 1	8,00	27,53		0,07						15,42	
	PISO 1	3,00	22,34		0,07						4,69	
	PISO 1	16,00	7,47		0,07						8,37	
	PISO 1	1,00	10,40		0,07						0,73	
	PISO 1	4,00	4,34		0,07						1,22	
	PISO 1	5,00	4,66		0,07						1,63	
	PISO 1	4,00	5,13		0,07						1,44	
	PISO 1	5,00	5,45		0,07						1,91	
RAMPA DISCAPACITADO											-	
Tramo N° 1		*1,00*	*4,70*		*0,20*						*0,94*	
		1,00	*5,15*		*0,35*						*1,80*	
		1,00	*3,04*		*0,55*						*1,67*	
		1,00	*5,50*		*0,32*						*1,76*	
		1,00	*6,70*		*0,27*						*1,81*	
		1,00	*6,70*		*0,30*						*2,01*	
											-	
	SUB TOTAL										707,11	
	VIENE DE LA PAGINA DE										-	
	TOTAL										707,11	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	11	IMPERMEABILIZACION	ITEM	11.06	DESCRIPCION	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
RAMPA DISCAPACITADO											-	
Tramo N° 2		1,0	3,04		0,60						1,82	
		1,0	5,50		0,30						1,65	
		1,0	6,70		0,27						1,81	
		1,0	6,70		0,30						2,01	
Tramo N° 3											-	
		1,00	*3,04*		*0,60*						1,82	
		1,00	5,50		0,32						1,76	
											-	
		1,00	*7,48*		*0,33*						*2,47*	
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*	
		1,00	*7,16*		*0,28*						*2,00*	
		2,00	*1,50*		*0,16*						*0,48*	
		1,00	*6,68*		*0,36*						*2,40*	
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*	
		1,00	*6,37*		*0,21*						*1,34*	
		2,00	*1,50*		*0,17*						*0,51*	
											-	
	SUB TOTAL										21,16	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2										*707,11*	
	TOTAL										728,28	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR
