SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 24 - 09 - 2023** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 13 Del: 11 de diciembre de 2023 Al: 14 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 136,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	CARRERA 56 N° 11a - 20 BARRIO SANTA ANITA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip)	SUPERVISOR	RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	ATRASO
Obra programada (%)	5,69%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	9,20%	97,04%	2,96%
Valor básico de la Obra programada:	$ 42.772.448,46	$ 751.712.626,70	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 69.157.561,66	$ 729.461.932,95	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 751.712.626,70
Valor Actualizado:	$ 751.712.626,70
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 15 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 134.235.550,23
Valor Actualizado:	134.235.550,23
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

ITEM 1.57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

ITEM 1.74 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL

ITEM 7.03 RESANE DE MUROS

ITEM 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)

NP-05 PINTURA PARA REJAS

NP-06 PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 4 BOLILLOS HORIZONTALES)

NP-07 PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 2 BOLILLOS HORIZONTALES)

NP-08 PINTURA PARA BARANDAS (BARANDA 1 BOLILLOS HORIZONTALES)

NOTA: A ESTA FECHA. LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 2.96 % , SE LE SOLICITA AL COONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA. A LA SIGUIENTE SEMANA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL BALANCE

IMAGENES AVANCE






ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA (AREA DE DESCARGUE)



ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA (AREA DE DESCARGUE)



ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

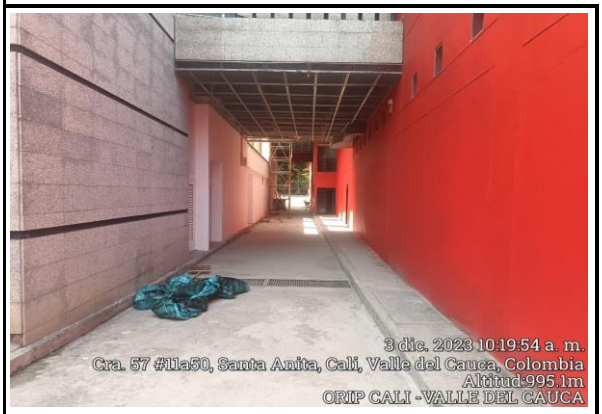

DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO



ITEM 7.03 RESANE DE MUROS (AREA DE FUNCIONARIOS PISO N° 1)



ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)



ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)	ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)
	
PINTURA PARA BARANDAS	PINTURA PARA BARANDAS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOTA:LOS SIGUIENTES SON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR	
ITEM 17-27 SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO)	
ITEM 19.04 PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM (ORIP - CALI)	**Firma:**
ITEM: 19.05 PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE (ORIP- CALI)	**Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS**
ITEM: 16.21 LAVAMANO PARA DISCAPACITADO (BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO)	**Matrícula No.: A08192002- 78747710**
ITEM: 17.29 ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR INCLUYE LLAVE DE PUS Y DESAGUE (BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO)	**RESIDENTE DE OBRA**
OBSERVACIONES (DETALLES)	
FILTRACIONES : POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA. PRESENTAR UNA PROPUESTA DE COMO VA A SUBSANAR ESTAS , YA QUE SE VIENEN PREASENTANDO EN EL SOTANO	
ITEM: 2.21 BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG (REVISAR LA INSTALACION, REGULANDO LA VELOCIDAD Y FUERZA DE CIERRE)	
ITEM: 2.22 MANTENIMIENTO DE MUEBLE (HAY DOS MUEBLES QUE LE FALTA INSTALAR Las PALANCAS DE MOVIMIENTO)	**Firma:**
ITEM: 3.02 BARANDA TUBO REDONDO (PRESENTA DETALLES DE PINTURA)	**Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ**
ITEM: 10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO (ALGUNAS ZONAS PRESENTAN MANCHAS O NO SE LAVARON, FAVOR SUBSANARLAS)	**Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA**
ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS (SE PRESENTAN DETALLES DETALLES EN ALGUNAS ZONAS Y OFICINAS)	
ITEM: 16.25 MOTOBOMBA 2,0 HP (ESTA EN OBRA, PERO LE FALTA LA GRANADA PARA PODER FUNCIONAR)	
NP-03 ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE (FALTA LAVARLO BIEN, PRESENTA MUCHO RESIDUO DEL CEMENTO)	
NP-05 PINTURA PARA REJA METALICA (PRESENTA OXIDO EN ALGUNAS PARTE FAVOR TOMAR DETALLES)	
NP-16 ANCLAJES PARA MANTENIMIENTO DE FACHADAS (FALTA INSTALARLOS)	
POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA SUBSANAR ESTAS ACTIVIDADES PENDIENTE	

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,17	DESCRIPCION	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CUBIERTA	PISO 5	1,00	29,82	33,70							1.005,00
											-
	SUB TOTAL										1.005,00
	VIENE DE LA PAGINA DE										-
	TOTAL										1.005,00

CROQUIS

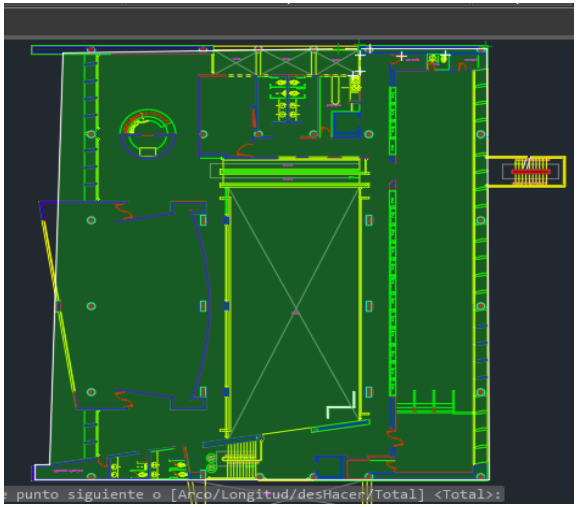

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.37	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PLAZOLETA DE ACCESO	PISO 1	1,00	33,82	19,33							653,76
	PISO 1	1,00	39,84		0,20						7,97
	PISO 1	8,00	27,53		0,07						15,42
	PISO 1	3,00	22,34		0,07						4,69
	PISO 1	16,00	7,47		0,07						8,37
	PISO 1	1,00	10,40		0,07						0,73
	PISO 1	4,00	4,34		0,07						1,22
	PISO 1	5,00	4,66		0,07						1,63
	PISO 1	4,00	5,13		0,07						1,44
	PISO 1	5,00	5,45		0,07						1,91
RAMPA DISCAPACITADO											-
Tramo N° 1		*1,00*	*4,70*		*0,20*						*0,94*
		1,00	*5,15*		*0,35*						*1,80*
		1,00	*3,04*		*0,55*						*1,67*
		1,00	*5,50*		*0,32*						*1,76*
		1,00	*6,70*		*0,27*						*1,81*
		1,00	*6,70*		*0,30*						*2,01*
											-
	SUB TOTAL										707,11
	VIENE DE LA PAGINA DE										-
	TOTAL										707,11

CROQUIS

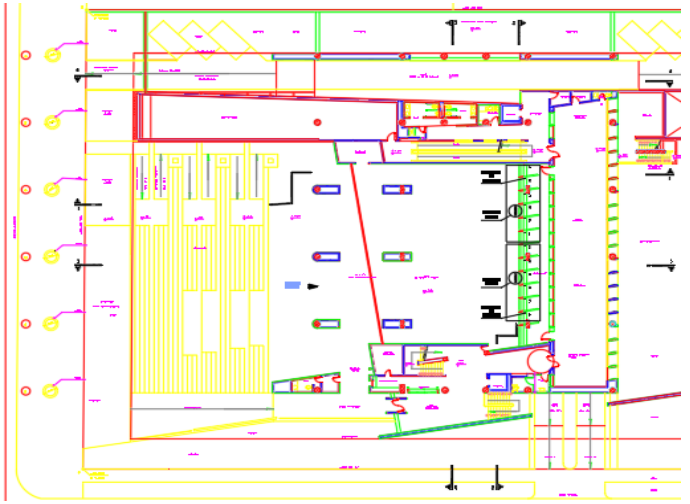

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.37	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
RAMPA DISCAPACITADO											-
Tramo N° 2		1,0	3,04		0,60						1,82
		1,0	5,50		0,30						1,65
		1,0	6,70		0,27						1,81
		1,0	6,70		0,30						2,01
Tramo N° 3											-
		1,00	*3,04*		*0,60*						1,82
		1,00	5,50		0,32						1,76
											-
		1,00	*7,48*		*0,33*						*2,47*
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*
		1,00	*7,16*		*0,28*						*2,00*
		2,00	*1,50*		*0,16*						*0,48*
		1,00	*6,68*		*0,36*						*2,40*
		2,00	*1,50*		*0,18*						*0,54*
		1,00	*6,37*		*0,21*						*1,34*
		2,00	*1,50*		*0,17*						*0,51*
											-
	SUB TOTAL										21,16
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2										*707,11*
	TOTAL										728,28

CROQUIS

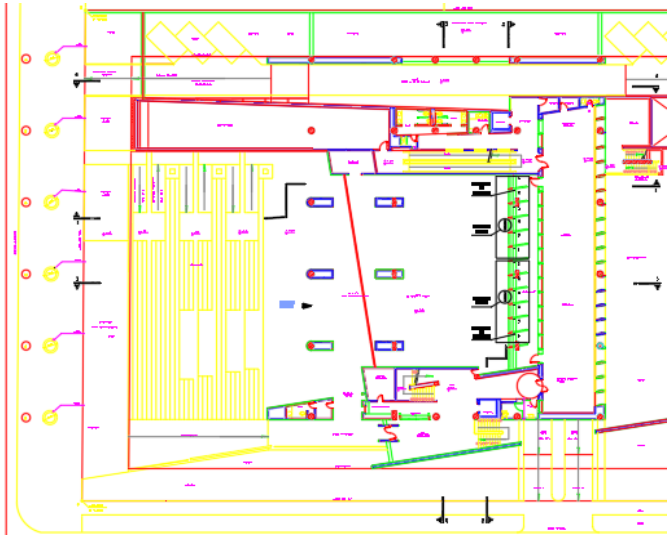

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.57	DESCRIPCION	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	UNI U	UBICACIÓN PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO										-
	PISO 1	1,00								1,00
	PISO 2	1,00								1,00
	PISO 3	2,00								2,00
	PISO 4	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2										-
TOTAL										5,00

CROQUIS



Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	15	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.66	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLAZOLETA	PISO 1	4,00	3,04		0,55					6,69
		4,00	5,15		0,35					7,21
		4,00	6,70		0,27					7,24
		4,00	6,70		0,30					8,04
		5,00	3,04		0,60					9,12
		5,00	6,51		0,36					11,71
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2										-
TOTAL										50,00

CROQUIS

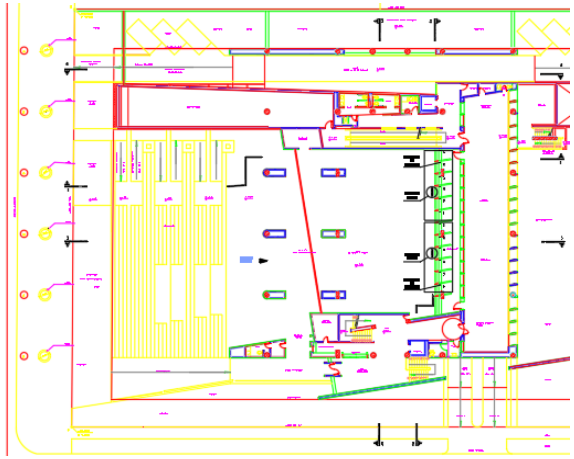

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,67	DESCRIPCION	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	UNI	M3	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PLAZOLETA DE ACCESO	104,00								104,00
	CUBIERTA	21,00								21,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										125,00

CROQUIS

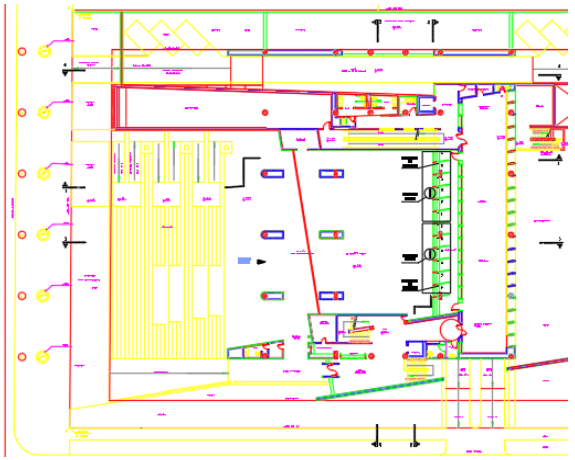

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1			CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.				CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	1	PRELIMINARES		ITEM	1,74	DESCRIPCION	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL	UNI	UN/DIA	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	120,00								120,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										-	
TOTAL										120,00	

Observaciones

Luisa A Lara M.

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	2	CARPINTERÍA EN MADERA	ITEM	2,09	DESCRIPCION	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UNI	UN	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
COCINA	SOTAN0									-
	PISO 1	1,00								1,00
	PISO 2	1,00								1,00
	PISO 3	1,00								1,00
	PISO 4	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										4,00

CROQUIS

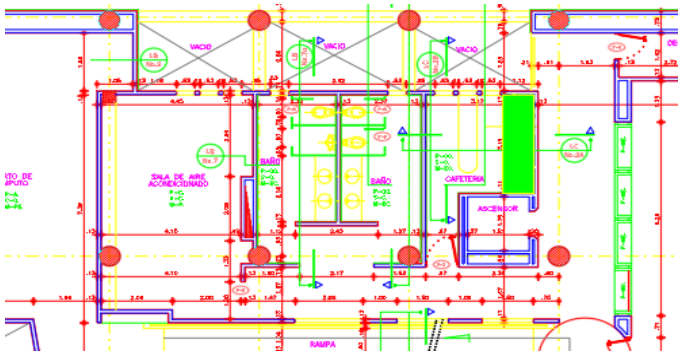

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	2	CARPINTERÍA EN MADERA	ITEM	2,10	DESCRIPCION	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
COCINA	SOTAN0									-
	PISO 1	1,00								1,00
	PISO 2	1,00								1,00
	PISO 3	1,00								1,00
	PISO 4	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										4,00

CROQUIS

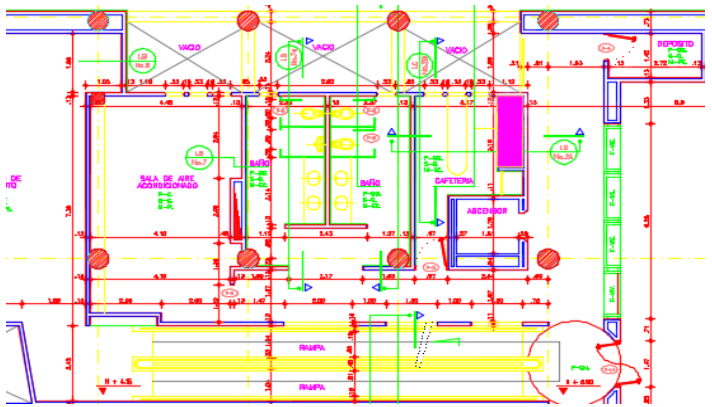

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**									
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**2**	CARPINTERÍA EN MADERA	**ITEM**	2,18	**DESCRIPCION**	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	**UNI**	U	**UBICACIÓN**	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	SOTAN0	4,00								4,00
	PISO 1	4,00								4,00
	PISO 2	4,00								4,00
	PISO 3	4,00								4,00
	PISO 4	4,00								4,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										20,00

CROQUIS

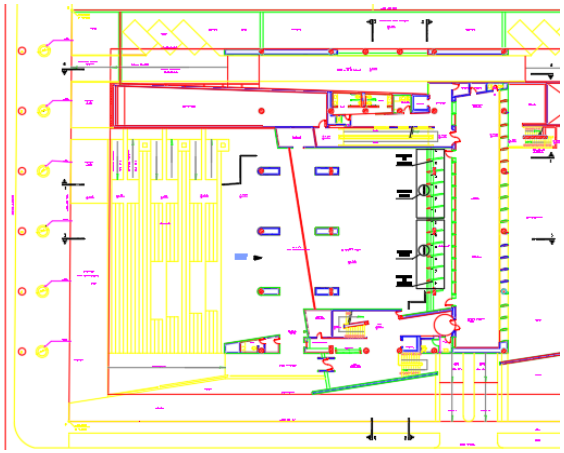

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**						**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**						**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**2**	CARPINTERÍA EN MADERA		**ITEM**	2,19	**DESCRIPCION**	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	**UNI**	U	**UBICACIÓN**	ORIP - CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
	SOTAN0	1,00								1,00	
	PISO 1	2,00								2,00	
	PISO 2	2,00								2,00	
	PISO 3	2,00								2,00	
	PISO 4	2,00								2,00	
	CUBIERTA	1,00								1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										-	
TOTAL										10,00	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	2	CARPINTERÍA EN MADERA	ITEM	2,21	DESCRIPCION	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	SOTAN0	1,00								1,00
	PISO 1	4,00								4,00
	PISO 2	5,00								5,00
	PISO 3	5,00								5,00
	PISO 4	5,00								5,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										20,00

CROQUIS

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	2	CARPINTERÍA EN MADERA	ITEM	2,22	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO DE MUEBLE	UNI	M	UBICACIÓN: ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ARCHIVO	SOTANO	8,00	5,0							40,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										40,00

CROQUIS

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	3	CARPINTERÍA METÁLICA		ITEM	3,02	DESCRIPCION	BARANDA TUBO REDONDO	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLAZOLETA										-
	PISO 1	1,00	3,93							3,93
		1,00	2,96							2,96
		1,00	8,27							8,27
		1,00	3,90							3,90
										-
		1,00	6,26							6,26
		1,00	8,37							*8,37*
		1,00	3,88							*3,88*
										-
		1,00	6,33							6,33
		1,00	8,39							8,39
		1,00	3,40							3,40
		1,00	19,60							19,60
RAMPA DE ACCESO		1,00	7,40							*7,40*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										82,69

CROQUIS

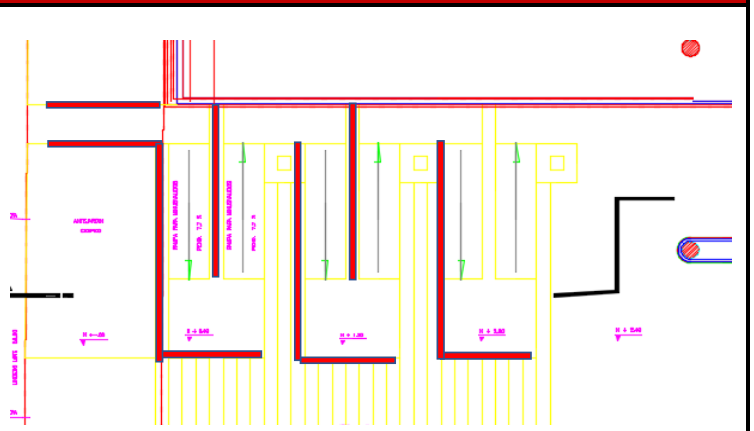

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**									
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**3**	CARPINTERÍA METÁLICA	**ITEM**	3,20	**DESCRIPCION**	ESPEJO BISELADO 5MM	**UNI**	M2	**UBICACIÓN**	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
										-
WC - CABALLERO	PISO 1	1,00	1,60		1,30					
WC - DAMAS		1,00	1,30		1,30					1,69
										-
WC - CABALLERO	PISO 2	1,00	2,00		1,22					2,44
WC - DAMAS		1,00	2,00		1,22					2,44
										-
WC - CABALLERO	PISO 3	1,00	2,00		1,22					2,44
WC - DAMAS		1,00	2,00		1,22					2,44
										-
WC - CABALLERO	PISO 4	1,00	1,91		1,22					2,33
WC - DAMAS		1,00	2,00		1,22					2,44
WC - AUDITORIO										-
WC - CABALLERO	PISO 4	1,00	1,80		1,30					2,34
WC - DAMAS		1,00	2,20		1,30					2,86
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										-
VIENE DE LA PAGINA DE										-
TOTAL										21,42

CROQUIS

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	0,50								0,50	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										-	
TOTAL										0,50	

Observaciones

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 6,16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						60,84
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						30,87
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						62,65
										-
										-
										-

ARQ: CARLÓS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 6,22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						60,84
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						30,87
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						62,65
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	154,36

CROQUIS

Observaciones

ARQ: CARLÓS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 7,01 ESTUCO EXTERIOR	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	1,00	2,778	9,00						25,00
										-
										-
										-

ARQ: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
MP. A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ESCALERA SOTANO	RECEPCION	1,00	6,05		2,38					14,40
			3,63		2,38					8,64
			0,42		2,38					1,00
			0,84		2,38					2,00
										-
	ESCALERA		4,86		3,28					15,94
			2,44		3,28					8,00
			4,21		3,28					13,81
	PARTE INF ESCALERA	10,03								10,03
	MUEBLE DE RECEPCION	2,00	1,50		1,00					3,00
		1,00	1,68		1,00					1,68
AREA DE SERVICIO SOTANO										-
ENFERMERIA	SOTANO N+1,35	1,00	21,79		2,29					49,90
	(P-5)	-2,00	1,00		2,20					-4,40
BAÑO		1,00	15,58		0,22					3,43
CAFETERIA		1,00	7,45		0,60					4,47
										-
CIRCULACION AREA DE SERVICIO		1,00	41,24		2,29					94,44
	(P-3)	-1,00	0,70		2,29					-1,60
	(P-4)	-1,00	1,26		2,20					-2,77
	(P-5)	-2,00	1,00		2,20					-4,40
	(P-6)	-2,00	1,50		2,20					-6,60
										-
SUB TOTAL										210,96
VIENE DE LA PAGINA DE										
TOTAL										210,96

CROQUIS

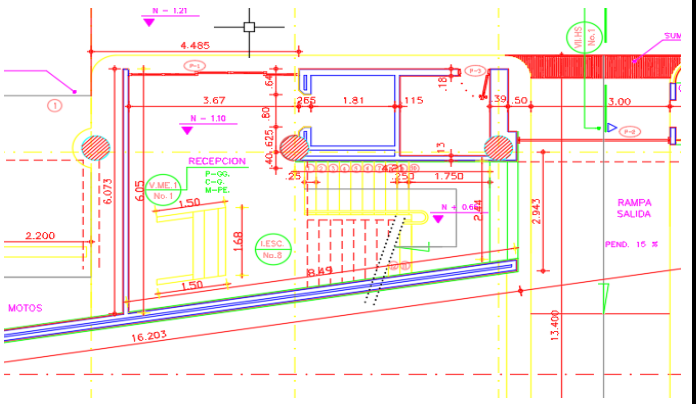

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1			CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.				CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CORRESPONDENCIA	PISO 1	1,00	11,44		2,30					26,31
HALL DE ACCESO DE FUNCIONARIOS	PISO 1	1,00	13,72		3,20					43,90
	PISO 1	1,00	2,45		0,55					1,35
	PISO 1	1,00	4,66		3,20					14,91
VIGAS AEREA	PISO 1	1,00	4,29		1,34					5,73
	PISO 1	1,00	4,09		2,84					11,60
	PISO 1	1,00	4,56		1,95					8,89
HALL DEL ASCENSOR										-
	PISO 1	1,00	0,42							0,42
		1,00	0,79							0,79
		1,00	6,54		2,17					14,19
PUERTA		-1,00	0,87		2,14					-1,86
		1,00	3,52		2,17					7,64
										-
		1,00	6,84		2,17					14,84
PUERTA		-1,00	1,47		2,14					-3,15
		1,00	4,55		2,30					10,47
		1,00	4,10		2,30					9,43
		1,00	0,92		2,30					2,12
		1,00	0,43		2,30					0,99
COLUMNA ESCALERA	PISO 1		1,79		2,17					3,88
										-
										-
SUB TOTAL										172,45
VIENE DE LA PAGINA DE										210,96
TOTAL										383,41

CROQUIS

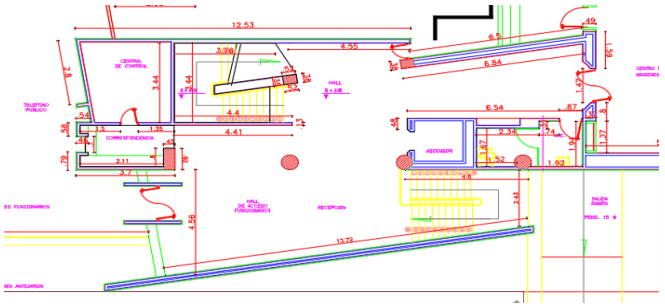

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F Versión: 01 Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - CALI

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CORRESPONDENCIA										-
	ESCALERA P1 AL P2	1,00	4,40		3,55					15,62
		1,00	4,34		3,55					15,41
		1,00	4,24		3,55					15,05
		1,00	3,44		3,55					12,21
	PARTE INF ESCALERA	12,31								12,31
AREA DE CENTRO DE OPERACIÓN Y IMÁGENES										-
		1,00	0,80		2,30					1,84
		2,00	0,37		2,30					1,70
		1,00	1,37		2,30					3,15
		1,00	5,93		2,30					13,64
		1,00	0,68		2,30					1,56
		1,00	1,59		2,30					3,66
		1,00	0,49		2,30					1,13
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										97,28
VIENE DE LA PAGINA DE										383,41
TOTAL										480,69

CROQUIS

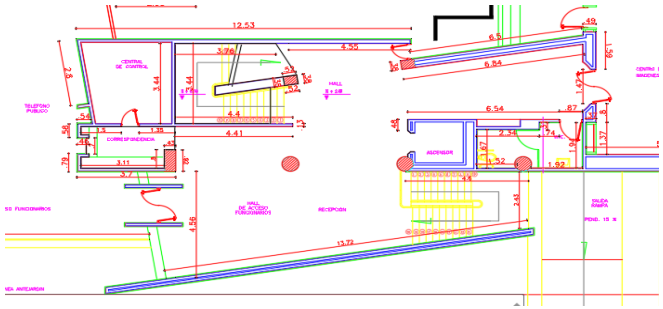

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**ıo: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**						
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**			**NIT O C.C.**	**800205914-1**	**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**			**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**13**	PINTURAS	**ITEM**	13,1	**DESCRIPCION**	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	**UNI** M2 **UBICACIÓN** ORIP - CALI

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	**LONG**	**ANCHO**	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
TERRAZA ACCESOA OFICINAS										-	
COLUMNAS	piso 1	3,00	1,53		4,47					20,52	
		6,00	2,30		2,53					34,91	
		3,00	0,90		2,53					6,83	
fachada	piso 1	1,00	2,63		2,53					6,65	
	piso 1	1,00	1,36		2,53					3,44	
	piso 1	1,00	21,00		0,55					11,55	
	piso 1	1,00	1,36		2,53					3,44	
	piso 1	1,00	2,80		2,53					7,08	
	piso 1	2,00	0,41		2,53					2,07	
	piso 1	1,00	0,13		2,53					0,33	
	piso 1	1,00	0,44		2,53					1,11	
	piso 1	1,00	0,77		2,53					1,95	
	piso 1	1,00	0,55		2,53					1,39	
SALA DE ATENCION AL PUBLICO										-	
COLUMNAS	Piso 1	6,00	2,95		2,53					44,78	
		6,00	0,90		2,53					13,66	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										159,73	
VIENE DE LA PAGINA DE										480,69	
TOTAL										640,42	

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
AREA DE SERVICIO HALL DE CIRCULACION	PISO 1	1,00	3,08		2,15					6,62
		1,00	1,43		2,15					3,07
		1,00	0,36		2,15					0,77
		2,00	0,39		2,15					1,68
		1,00	2,25		2,15					4,84
		1,00	0,13		2,15					0,28
		1,00	10,63		2,15					22,85
VACIOS		-1,00	1,50		1,75					-2,63
		-1,00	1,50		1,35					-2,03
		-1,00	1,50		0,90					-1,35
										-
VANOS VENTANA		2,00					1,50	0,13	1,75	0,85
		2,00					1,50	0,13	1,35	0,74
		2,00					2,00	0,13	0,90	0,75
		1,00	1,58		2,15					3,40
		1,00	3,86		2,15					8,30
		1,00	0,60		2,15					1,29
		1,00	0,73		2,15					1,57
		1,00	2,14		2,15					4,60
		1,00	0,13		2,15					0,28
		1,00	3,59		2,15					7,72
		1,00	2,36		2,15					5,07
		1,00	2,45		2,15					5,27
SUB TOTAL										73,96
VIENE DE LA PAGINA DE										640,42
TOTAL										714,38

CROQUIS

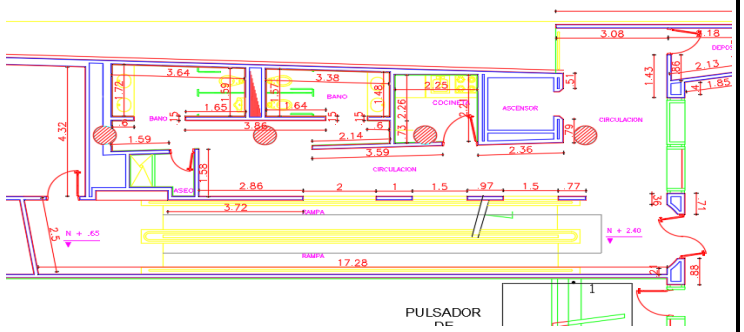

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
AREA DE SERVICIO HALL DE CIRCULACION										-
COCINETA	piso 1	1,00	2,36		0,28					0,65
	piso 1	1,00	2,25		0,28					0,62
	piso 1	1,00	2,29		0,28					0,63
	piso 1	1,00	0,83		0,28					0,23
WC - DAMAS										-
	piso 1	2,00	0,15		2,15					0,65
	piso 1	1,00	0,60		0,28					0,17
	piso 1	1,00	1,46		0,28					0,40
	piso 1	1,00	3,38		0,28					0,93
	piso 1	1,00	1,57		0,28					0,43
	piso 1	1,00	1,64		0,28					0,45
WC CABALLERO										-
	piso 1	2,00	0,15		2,15					0,65
	piso 1	1,00	1,64		0,28					0,46
	piso 1	1,00	1,59		0,28					0,45
	piso 1	1,00	3,64		0,28					1,02
	piso 1	1,00	1,72		0,28					0,48
CUARTO DE ASEO										-
	piso 1	1,00	8,94		0,28					2,50
										-
										-
										-
SUB TOTAL										10,70
VIENE DE LA PAGINA DE										714,38
TOTAL										725,08

CROQUIS

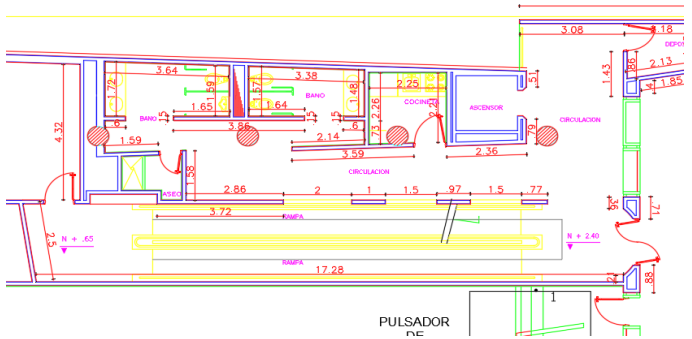

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONG	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
AREA DE RAMPA DEL PISO 1 ALPISO 2										-
		1,00	15,42		2,15					33,15
AREA DE VENTANA		-1,00	1,50		0,90					-1,35
		-1,00	2,00		1,35					-2,70
		-1,00	1,50		1,75					-2,63
PUERTA		-1,00	0,90		2,20					-1,98
										-
		1,00	2,50		2,15					5,38
		1,00	14,87		2,15					31,97
										-
AREA INFERIOR DE LA RAMPA		1,00	31,78							31,78
ARCHIVO MUERTO		1,00	10,32		2,15					22,19
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										115,81
VIENE DE LA PAGINA DE										725,08
TOTAL										840,89

CROQUIS

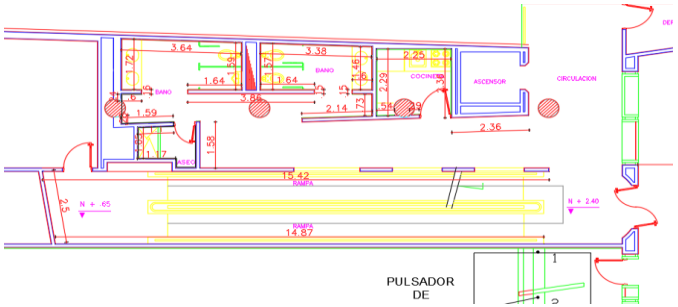

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
HALL DE CIRCULACION SEGUNDO PISO N + 5,90										-
	PISO 2	1,00	0,67		0,65					0,44
		1,00	4,46		0,65					2,90
COLUMNA		2,00	0,50		2,38					2,38
		2,00	0,38		2,38					1,81
		1,00	1,40		0,65					0,91
		1,00	0,42		2,36					0,99
		1,00	0,79		2,36					1,86
		1,00	5,95		2,16					12,85
		-1,00	0,70		0,70					-0,49
		1,00	0,75		2,16					1,62
		1,00	0,42		2,16					0,91
TERRAZA COMEDOR (Mesanine)										
		2,00	0,14		2,21					0,62
		2,00	6,90		6,68					92,18
		1,00	7,37		1,39					10,24
		1,00	7,37		1,20					8,84
HALL DE AREA DE COMEDOR										
		1,00	0,56		0,65					0,36
		2,00	0,65		0,65					0,85
		1,00	0,13		0,65					0,08
		1,00	19,35		0,65					12,58
										-
SUB TOTAL										151,94
VIENE DE LA PAGINA DE										840,89
TOTAL										992,83

CROQUIS

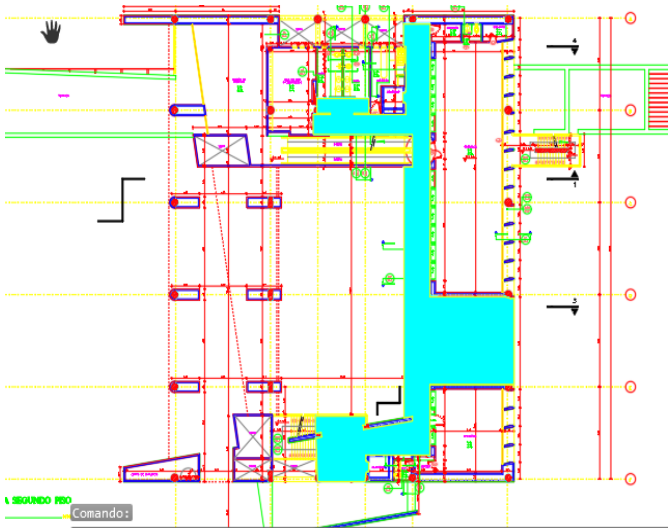

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023

CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
HALL DE CIRCULACION SEGUNDO PISO N + 5,90										-
hall de circulacion	PISO 2	2,00	0,69		0,65					0,90
		1,00	0,13		0,65					0,08
		1,00	0,92		0,65					0,60
		1,00	0,78		0,65					0,51
		1,00	0,18		0,65					0,12
		1,00	1,38		2,16					2,98
		1,00	0,95		2,16					2,05
		1,00	0,81		2,16					1,75
		1,00	1,99		2,16					4,30
		1,00	2,44		2,16					5,27
		1,00	3,80		2,16					8,21
		2,00	0,31		2,16					1,34
		1,00	0,91		2,16					1,97
hall de area de servicio		1,00	2,34		2,16					5,05
		1,00	1,53		2,16					3,30
		2,00	0,13		2,16					0,56
		1,00	2,43		2,16					5,25
		1,00	1,60		2,16					3,46
		1,00	0,47		2,16					1,02
										-
										-
										-
SUB TOTAL										48,71
VIENE DE LA PAGINA DE										992,83
TOTAL										1.041,54

CROQUIS

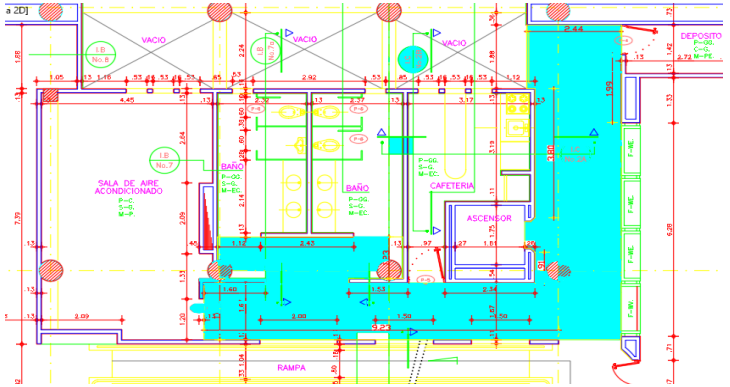

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM 13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI M2	UBICACIÓN PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONG	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
HALL DE CIRCULACION SEGUNDO PISO N + 5,90										-
HALL DE AREA DE SERVICIO	PISO 2 N+ 5,9	1,00	9,23		2,16					19,94
VANOS	PISO 2 N+ 5,9	1,00					1,50	0,17	1,82	1,13
	PISO 2 N+ 5,9	1,00					1,50	0,17	1,41	0,99
	PISO 2 N+ 5,9	1,00					2,00	0,17	0,97	1,01
VACIOS	PISO 2 N+ 5,9	-1,00	1,50		1,82					-2,73
	PISO 2 N+ 5,9	-1,00	1,50		1,41					-2,12
	PISO 2 N+ 5,9	-1,00	2,00		0,97					-1,94
										-
CAFETERIA	PISO 2 N+ 5,9	1,00	17,81		0,22					3,92
VENTANA EN CALADO	PISO 2 N+ 5,9	2,00	1,80		0,60					2,16
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	1,20		0,60					0,72
										-
WC - DAMAS	PISO 2 N+ 5,9	1,00	14,58		0,04					0,58
VENTANA EN CALADO	PISO 2 N+ 5,9	1,00	0,80		1,80					1,44
										-
WC - CABALLERO	PISO 2 N+ 5,9	1,00	14,58		0,21					3,06
VENTANA EN CALADO	PISO 2 N+ 5,9	1,00	0,80		1,80					1,44
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										29,60
VIENE DE LA PAGINA DE										1.041,54
TOTAL										1.071,14

CROQUIS

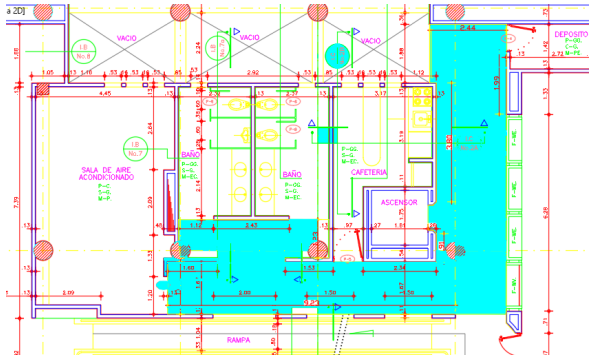

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
HALL DE CIRCULACION SEGUNDO PISO N + 5,90										-
OFICINA JURIDICA ORIP-CALI	PISO 2 N+ 5,9	1,00	6,51		2,16					14,06
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	0,69		2,16					1,49
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	6,18		2,16					13,35
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	0,39		2,16					0,84
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	1,21		2,16					2,61
VESTIER										
	PISO 2 N+ 5,9	2,00	0,30		2,16					1,30
	PISO 2 N+ 5,9	2,00	1,99		2,16					8,60
	PISO 2 N+ 5,9	2,00	0,40		2,16					1,73
ARCHIVO ORIP - CALI	PISO 2 N+ 5,9	1,00	6,16		2,16					13,31
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	0,46		2,16					0,99
										-
OFICINA DE JURIDICA REGIONAL	PISO 2 N+ 5,9	1,00	0,71		2,16					1,53
	PISO 2 N+ 5,9	2,00	6,16		2,16					26,61
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	0,85		2,16					1,84
CIELORASO		1,00	2,80	6,16						17,25
ARCHIVO REGIONAL										
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	1,33		2,16					2,87
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	4,82		2,16					10,41
	PISO 2 N+ 5,9	1,00	6,16		2,16					13,31
CIELORASO		1,00	7,61		6,16					46,88
SUB TOTAL										178,97
VIENE DE LA PAGINA DE										1.071,14
TOTAL										1.250,12

CROQUIS

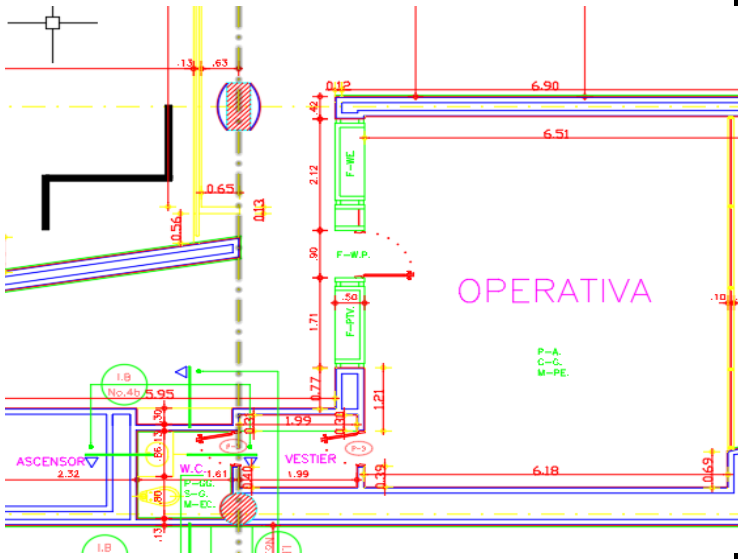

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h		
RAMPA										-	
	PISO 2 N+ 5,9 AL PISO 3 N+ 9,40									-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										1.250,12	
TOTAL										1.250,12	

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h		
										-	
JAREA DE JURIDICA	PISO 3 N+ 7,65	1,00	0,48		2,37					1,14	
		1,00	1,23		2,37					2,92	
		1,00	6,30		2,37					14,93	
		1,00	1,40		2,37					3,32	
(P-3)		-1,00	0,66		2,20					-1,45	
		2,00	4,00		2,37					18,96	
(V - 1)		-2,00	2,68		1,00					-5,36	
		2,00	1,80		2,37					8,53	
(V - 1)		-2,00	1,70		1,00					-3,40	
		1,00	6,70		2,37					15,88	
MUEBLE EN MADERA		-1,00	5,10		2,00					-10,20	
CIELORASO		1,00	2,00	10,57						21,14	
										-	
OFICINA REGISTRADOR DE REGIONAL PACIFICO										-	
		1,00	6,70		2,37					15,88	
MUEBLE EN MADERA		-1,00	5,10		2,00					-10,20	
		1,00	6,70		2,37					15,88	
(P-3)		-1,00	0,90		1,90					-1,71	
(V - 1)		2,00	1,40		1,00					2,80	
CIELORASO		1,00	2,00	4,45						8,90	
										-	
										-	
SUB TOTAL										97,95	
VIENE DE LA PAGINA DE										1.250,12	
TOTAL										1.348,07	

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1			CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.				CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h		
										-	
OFICINA REGIONAL PACIFICO	PISO 3 N+ 7,65									-	
		1,00	6,70		2,37					15,88	
(P-3)		-1,00	0,90		1,90					-1,71	
(V - 1)		-2,00	1,40		1,00					-2,80	
		1,00	0,48		2,37					1,14	
		1,00	1,50		2,37					3,56	
		1,00	6,17		2,37					14,62	
CIELORASO		1,00	2,00	10,70						21,40	
										-	
ARCHIVO RREGIONAL PACIFICO		1,00	6,17		2,37					14,62	
		1,00	2,97		2,37					7,04	
	(P - 1)	-1,00	1,46		2,27					-3,31	
		1,00	0,34		2,37					0,81	
HALL DE CIRCULACION	PISO 3 N+ 7,65									-	
			1,90		0,66					1,25	
			1,01		0,66					0,67	
			0,46		2,13					0,98	
			0,17		2,13					0,36	
			1,82		2,13					3,88	
			1,20		2,13					2,56	
										-	
										-	
SUB TOTAL										80,93	
VIENE DE LA PAGINA DE										1.348,07	
TOTAL										1.429,00	

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**						
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**			**NIT O C.C.**	**800205914-1**	**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**			**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**13**	PINTURAS	**ITEM**	13,1	**DESCRIPCION**	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI M2 **UBICACIÓN** PISO 1

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	**LONG**	**ANCHO**	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
										-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 3 N+ 7,65	1,00	1,96		0,66					1,29	
		1,00	0,18		0,66					0,12	
		1,00	0,78		0,66					0,51	
		2,00	0,69		0,66					0,91	
		1,00	0,13		0,66					0,09	
		1,00	1,28		0,66					0,84	
COLUMNA		2,00	2,06		2,14					8,82	
		1,00	0,93		2,14					1,99	
		1,00	6,82		0,66					4,50	
COLUMNA		2,00	2,06		2,14					8,82	
		1,00	0,93		2,14					1,99	
		1,00	6,82		0,66					4,50	
COLUMNA		2,00	2,06		2,14					8,82	
		1,00	0,93		2,14					1,99	
		1,00	1,48		0,66					0,98	
		2,00	0,65		0,66					0,86	
		1,00	0,13		0,66					0,09	
		1,00	0,78		0,66					0,51	
		1,00	0,18		0,66					0,12	
		1,00	1,62		0,66					1,07	
										-	
										-	
SUB TOTAL										48,82	
VIENE DE LA PAGINA DE										1.429,00	
TOTAL										1.477,81	

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1			CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.				CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
										-
HALL DE CIRCULACION	PISO 3 N+ 7,65	1,00	1,96		2,14					4,19
		1,00	7,41		2,14					15,86
		1,00	1,24		2,14					2,65
		1,00	2,45		2,14					5,24
		1,00	0,79		2,14					1,69
		1,00	1,23		2,14					2,63
		1,00	1,96		2,14					4,19
ESCALERA										-
	PISO 2 N+ 5,90 AL PISO 3 N + 9,4									-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										36,47
VIENE DE LA PAGINA DE										1.477,81
TOTAL										1.514,28

CROQUIS

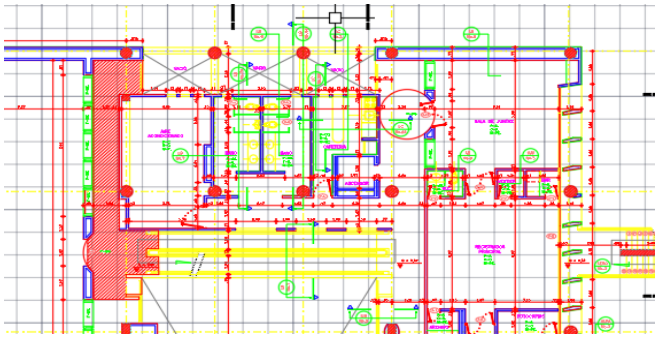

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**								
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**				**NIT O C.C.**	**800205914-1**		**CONTRATO N°**	1674 - 2023
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**				**NIT O C.C.**			**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CAPITULO	**13**	PINTURAS	**ITEM**	13,1	**DESCRIPCION**	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	**UNI**	M2	**UBICACIÓN**	PISO 1

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	**LONG**	**ANCHO**	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
										-	
HALL DE CIRCULACION	PISO 3 N+ 9,4										
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SUB TOTAL										-	
VIENE DE LA PAGINA DE										1.514,28	
TOTAL										1.514,28	

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1			CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.				CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 1

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
HALL DE CIRCULACION SEGUNDO PISO N + 9,4										-
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,67		0,65					0,44
	PISO 3 N+9,4	1,00	4,46		0,65					2,90
COLUMNA	PISO 3 N+9,4	2,00	0,50		2,38					2,38
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,38		2,38					1,81
	PISO 3 N+9,4	1,00	1,40		0,65					0,91
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,42		2,36					0,99
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,79		2,36					1,86
	PISO 3 N+9,4	1,00	5,95		2,17					12,91
	PISO 3 N+9,4	-1,00	0,70		0,70					-0,49
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,75		2,17					1,63
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,42		2,17					0,91
HALL DE AREA DE COMEDOR										
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,56		0,65					0,36
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,65		0,65					0,85
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,13		0,65					0,08
	PISO 3 N+9,4	1,00	19,35		0,65					12,58
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,65		0,65					
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,35		2,17					0,76
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,61		2,17					2,65
	PISO 3 N+9,4	1,00	9,43		2,17					20,46
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,80		2,17					3,47
SUB TOTAL										67,46
VIENE DE LA PAGINA DE										1.514,28
TOTAL										1.581,74

CROQUIS

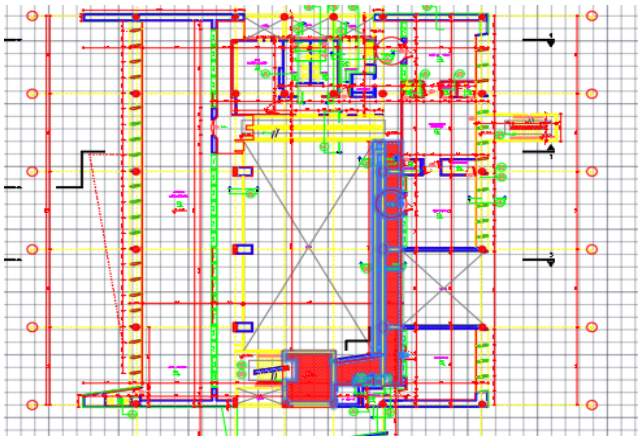

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2	UBICACIÓN	PISO 3 N+9,4

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
HALL DE CIRCULACION TERCER PISO N + 9,4										-
hall de circulacion	PISO 3 N+9,4	1,00	2,57		2,16					5,55
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,21		2,16					0,45
	PISO 3 N+9,4	1,00	3,80		2,16					8,21
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,31		2,16					1,34
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,91		2,16					1,97
HALL DE AREA DE SERVICIO	PISO 3 N+9,4	1,00	2,34		2,16					5,05
	PISO 3 N+9,4	1,00	1,53		2,16					3,30
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,13		2,16					0,56
	PISO 3 N+9,4	1,00	2,43		2,16					5,25
	PISO 3 N+9,4	1,00	1,60		2,16					3,46
	PISO 3 N+9,4	1,00	0,47		2,16					1,02
										-
	PISO 3 N+9,4	1,00	9,23		2,16					19,94
VANOS	PISO 3 N+9,4	1,00					1,50	0,17	1,82	1,13
	PISO 3 N+9,4	1,00					1,50	0,17	1,41	0,99
	PISO 3 N+9,4	1,00					2,00	0,17	0,97	1,01
VACIOS	PISO 3 N+9,4	-1,00	1,50		1,82					-2,73
	PISO 3 N+9,4	-1,00	1,50		1,41					-2,12
	PISO 3 N+9,4	-1,00	2,00		0,97					-1,94
										-
										-
										-
SUB TOTAL										52,44
VIENE DE LA PAGINA DE										1.581,74
TOTAL										1.634,18

CROQUIS

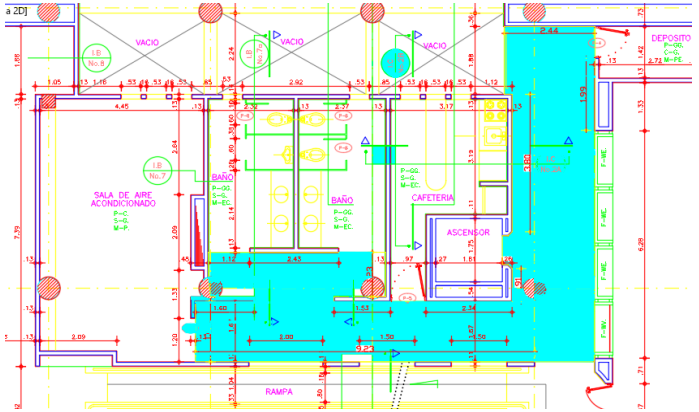

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC		NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI M2 — UBICACIÓN: PISO 3 N+9,4

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONG	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
HALL DE CIRCULACION TERCER PISO N + 9,4										-
CAFETERIA	PISO 3 N+9,4	1,00	17,81		0,07					1,25
VENTANA EN CALADO	PISO 3 N+9,4	2,00	1,80		0,60					2,16
	PISO 3 N+9,4	1,00	1,20		0,60					0,72
WC - DAMAS	PISO 3 N+9,4	1,00	14,58		0,08					1,09
VENTANA EN CALADO	PISO 3 N+9,4	1,00	0,80		1,80					1,44
WC - CABALLERO	PISO 3 N+9,4	1,00	14,58		0,07					1,02
VENTANA EN CALADO	PISO 3 N+9,4	1,00	0,80		1,80					1,44
OFICINA DE FORMALIZACION DE TIERRAS REGIONAL PACIFICO										
	PISO 3 N+9,4	1,00	6,78		2,37					16,07
		1,00	0,68		2,37					1,61
		1,00	6,15		2,37					14,58
		1,00	0,40		2,37					0,95
		1,00	1,20		2,37					2,84
		1,00	0,41		2,37					0,97
CIELORASO	PISO 3 N+9,4	1,00	7,04	2,00						14,08
DEPOSITO	PISO 3 N+9,4	1,00	2,41		2,37					5,71
		1,00	2,60		2,37					6,16
										-
										-
SUB TOTAL										72,09
VIENE DE LA PAGINA DE										1.634,18
TOTAL										1.706,27

CROQUIS

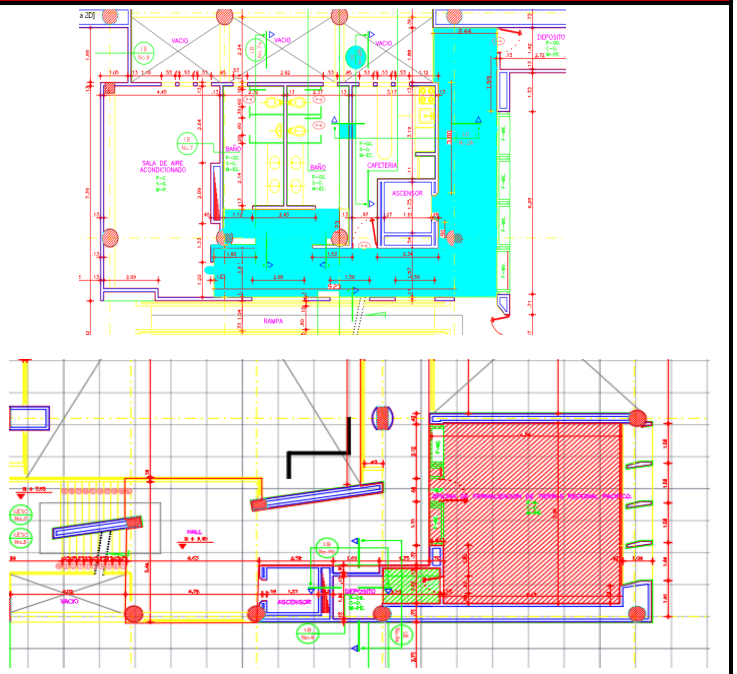

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710


CONTRATISTA	INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	...o: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC		NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI M2	UBICACIÓN	PISO 3 N+9,4

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONG	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
OFICINA DE SECRETARIAS DEL REGISTRADOR										-
	PISO 3 N+9,4	1,00	2,03		2,37					4,81
		2,00	0,76		2,37					3,60
		1,00	2,25		2,37					5,33
		1,00	6,57		2,37					15,57
		2,00	0,44		2,37					2,09
CIELORASO	PISO 3 N+9,4	1,00	7,15	2,00						14,30
CIELORASO	PISO 3 N+9,4	1,00	1,47	0,76						1,12
AREA DE FOTOCOPIAS		1,00	2,25		2,37					5,33
		1,00	1,42		2,37					3,37
		1,00	3,03		2,37					7,18
OFICINA DEL REGISTRADOR PRINCIPAL										-
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,77		2,37					3,65
		1,00	1,31		2,37					3,10
		1,00	3,15		2,37					7,47
		1,00	1,23		2,37					2,92
		2,00	0,77		2,37					3,65
		1,00	1,68		2,37					3,98
CIELORASO	PISO 3 N+9,4	1,00	6,07	2,00						12,14
CIELORASO	PISO 3 N+9,4	1,00	1,47	0,76						1,12
										-
SUB TOTAL										100,72
VIENE DE LA PAGINA DE										1.706,27
TOTAL										1.807,00

CROQUIS

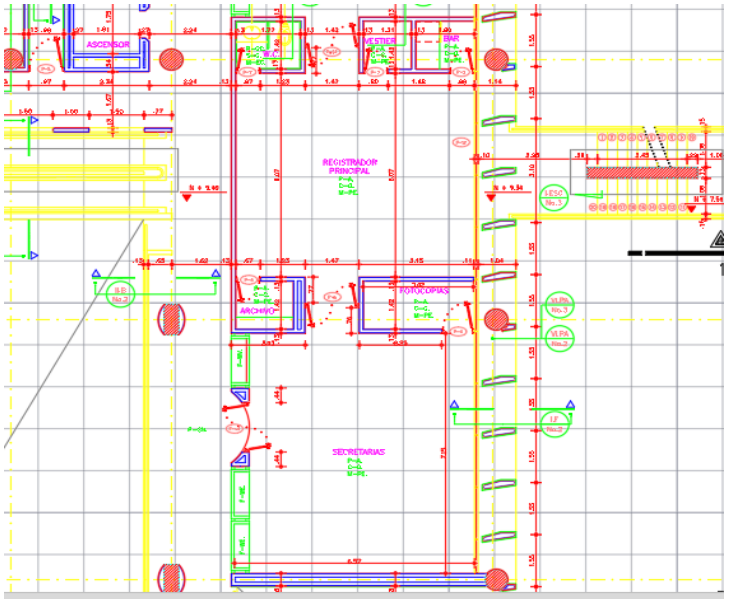

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	go: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - F
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC		NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI M2	UBICACIÓN	PISO 3 N+9,4

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONG	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINA DESALA DE JUNTAS DEL REGISTRADOR										-
	PISO 3 N+9,4	2,00	0,64		2,37					3,03
		1,00	7,55		2,37					17,89
		1,00	1,24		2,37					2,94
		1,00	1,13		2,37					2,68
		1,00	3,15		2,37					7,47
		2,00	0,77		2,37					3,65
		1,00	2,03		2,37					4,81
CIELORASO	PISO 3 N+9,4	1,00	5,96	2,00						11,92
CIELORASO	PISO 3 N+9,4	1,00	1,47	0,76						1,12
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										55,51
VIENE DE LA PAGINA DE										1.807,00
TOTAL										1.862,50

CROQUIS

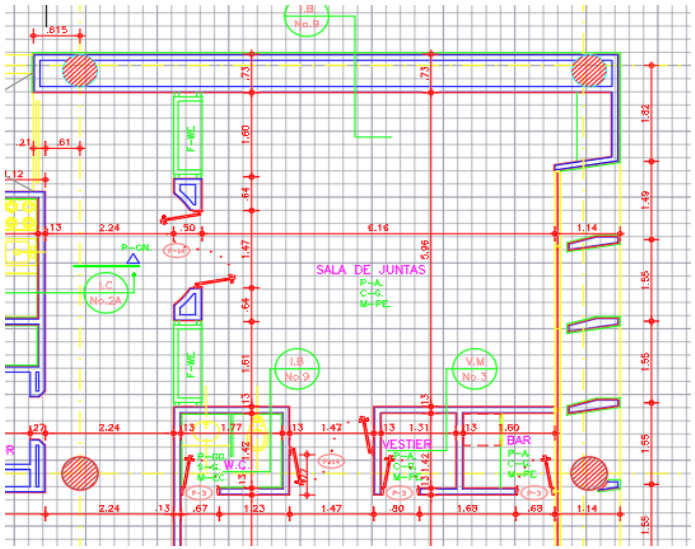

OBSERVACIONES

ING: LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No: MP 76202 -368677 CNA
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2017-04-14

FECHA	**DD**	15	**MM**	12	**AA**	2023		**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)			
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	13	PINTURAS	**ITEM**	13,1	**DESCRIPCIÓN**	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	PISO 4	

Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**HOJA: 1 DE 1**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		**TOTAL**
AUDITORIO					
WC. Caballeros	3,36	0,30		1	1,01
	1,95	0,30		1	0,59
	3,08	0,30		1	0,92
	1,41	0,30		1	0,42
	0,85	0,30		1	0,26
	0,13	2,30		1	0,30
	0,85	2,30		1	1,96
	1,02	2,30			
WC. Damas	3,04	0,30		1	0,91
	2,45	0,30		1	0,74
	3,13	0,30		1	0,94
	1,69	0,30		1	0,51
	1,29	0,30		1	0,39
	0,13	2,30		1	0,30
	1,29	2,30		1	2,97
	1,21	2,30		1	2,78
					0,00
					0,00
			SUBTOTAL		14,98
			VIENE DE LA PAGINA DE		
			TOTAL		**14,98**

OBSERVACIONES:
