	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	4/03/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/02/2024	**AL:**	29/02/2024
CONTRATO Nº	068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S CON NIT. 901.337.149-4		
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4"				
FECHA DE INICIO	19/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/02/2024		
VALOR INICIAL	$ 510.000.000,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 510.000.000,00				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

La suscripción del contrato se realizó el día 06-12-2023. La firma del acta de inicio fue el día 19-12-2023. Se realiza modificación del contrato y prorroga al contrato el día 26-12-2023 con fecha de finalización del contrato el 15 de febrero del 2024. Se realiza segunda modificación del contrato el 14-02-2024 prorrogando el contrato hasta el 16 de marzo de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Cemento		Demoledor	2	DIRECTOR DE OBRA	1	25	25	SI	INGENIERO CIVIL
		Arena		Pulidora Grande	1	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	ARQUITECTA
		Enchape Piso		Pulidoras pequeñas	3	PROFESIONAL ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	30	30	NO	Mediante oficio FAC-S-2024-006742-CE, se solicita al contratista la participación y visita del profesional
		Enchape Paredes		Arnes	4	RESIDENTE SISO	1	100	100	SI	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		Pegacor		Taladro	2	PROFESIONAL ASESOR INGENIERO HIDROSANITARIO	1	25	25	NO	Mediante oficio FAC-S-2024-006742-CE, se solicita al contratista la participación y visita del profesional
		Pintura		Cortadora enchape	2	INGENIERO ELECTRICISTA	1	20	20	NO	Mediante oficio FAC-S-2024-006742-CE, se solicita al contratista la participación y visita del profesional
				Lineas de vida	4	OFICIAL CIVIL	1	100%	100%	SI	PERSONAL OPERATIVO
				Andamios	2 Secciones	AYUDANTE CIVIL	6	100%	100%	SI	PERSONAL OPERATIVO
						TOTAL	13				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	68,28%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 7 (01 al 06 de febrero de 2024)	1,99%	**82,88%**	**89,00%**	**-6,12%**
Semana 8 (07 al 13 de febrero de 2024)	2,53%			
Semana 9 (14 al 20 de febrero de 2024)	2,53%			
Semana 10 (21 al 29 de febrero de 2024)	7,55%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA








AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**89,00%**
EJECUTADO		**82,88%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
BARRACAS SOLDADOS #1 CACOM 4	PROGRAMADO		**73,00%**
	EJECUTADO		**42,29%**
BARRACAS SOLDADOS #3 CACOM 4	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
KIOSCO TACTICO SOLDADOS CACOM 4	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
RANCHO COMEDOR SOLDADOS CACOM 4	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**78,90%**
RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**30,29%**
RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA	PROGRAMADO		**91,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	59	73	-14
Proyección	63	73	-10

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Ver anexo de registro fotografico

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
73	-4	19/02/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
-BARRACAS SOLDADOS #1 CACOM 4: Se realizo la demolición de acabado de piso y paredes existente, se realiza el desmonte de aparatos sanitarios, se inicia con la instalación del acabado de piso, la instalación de enchape sobre pared (duchas), instalación de puertas Cold Rolled (división de baños), se inicia con resanes en la fachada del alojamiento, actividades que aun se encuentran en ejecución. -BARRACAS SOLDADOS #3 CAMOM 4: Se realizó la aplicación de vinilo sobre pañetes al interior de la barraca, adicionalmente se realizó la pintura exterior con zócalo en color gris basalto, se instaló mesón para lavamanos, se realizó el aseo general al interior y exterior de la barraca, se culmina con todas las actividades previstas en este frente de obra. Se recibe el frente de obra - KIOSCO TACTICO SOLDADOS CACOM 4: Se realiza la demolición de caja de inspección existente, se realiza la construcción de caja de inspección de 0,6 x 0,6 m, con la fundición de piso en concreto de 3000 psi y los muros en ladrillo común, se realiza la instalación de luminarias led de 60x60 en el kiosko, se realiza la pintura tipo vinilo en muros existentes, se realiza la aplicación de pintura de estructura de cubierta con anticorrosivo y esmalte, en la cocina del kiosko se realiza la instalación de tomacorriente doble de 120v, se realiza la instalación de interruptor sencillo, cielo raso PVC de 9mm, instalación de alistado de mortero y baldosa cerámica, se instalan 02 ventanas fijas en lamina Cold Rolled, instalación de puerta en lamina Cold Rolled y la instalación de muro en superboard con su respectiva estructura y acabado. -RANCHO COMEDOR SOLDADOS CACOM 4: Se realiza la aplicación del acabado de piso en poliuretano, el cual no se recibe a satisfacción de acuerdo a que se evidencian poros y grietas, no cuenta con un color ni textura uniforme, novedad que fue reportad a través del oficio No. FAC-S-2024-007079-CE del 4 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN. Por lo que se solicita subsanar tal novedad en el menor tiempo posible. -RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA: A la fecha no se realizan actividades de obra, no obstante se han subido materiales de construcción como cemento, baldosa, arenillo y herramienta menor. -RANCHO Y COMEDOR FLANDES: Se realiza la aplicación de manto asfaltico en la canal de cubierta, se realiza el mantenimiento de cubierta en sitios especificos, se realiza lavado y se procede a instalar cinta asfáltica sobre goteras existentes se reemplazar los clips de la cubierta que se encontraban en mal estado, se realiza la instalación de media caña en granito pulido	BARRACAS SOLDADOS #1 CACOM 4	SI	X	NO	
	RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES	SI	X	NO	
	RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA	SI	X	NO	
	N/A	SI		NO	

OBSERVACIONES:
Mediante oficio No. FAC-S-2024-006742-CE del 29 de febrero de 2024, se solicita al contratista dar cumplimiento a las obligaciones del contrato estipuladas en el EDP y en el anexo "CONDICIONES GENERALES", toda vez que se han presentado novedades con la participación del equipo básico del contrato, como es el caso del ingeniero civil especialista en estructuras, el ingeniero hidrosanitario y el ingeniero electricista, los cuales hasta la fecha no han cumplido con la participación requerida en el contrato.
Adicionalmente se solicita al contratista implementar un plan de contingencia, toda vez que se encuentran actividades retrasadas, según la programación aprobada en el último modificatorio del contrato, las cuales corresponden a:
- Suministro e instalación de piso poliuretano SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRISCLARO en el rancho de tropa de Flandes.
- En el frente de obra de la María no se han iniciado actividades, se debe tener en cuenta quela Unidad va a apoyar subiendo los materiales al sitio, pero a pesar de las solicitudes de la supervisión de ir adelantando tal actividad, solo hasta el día 23 de febrero por parte del director de obra se envió la solicitud de carga.
-Se encuentran atrasadas las actividades de la barraca No.1 de soldados, toda vez que según programación de obra éste frente de obra debió entregarse el 06 de febrero de 2024

Mediante oficio No. FAC-S-2024-007079-CE del 4 de marzo de 2024 se informa al señor representante legal de la empresa la inconformidad por parte de la supervisión del acabado de piso en poliuretano aplicado en el rancho de tropa del GRUSE, toda vez que se evidencian poros y grietas, no cuenta con un color ni textura uniforme, de acuerdo a las especificaciones técnicas el piso en poliuretano SIKAFLOOR PURCEMGLOSSY 210 debe contar con esmalte Uretano brillante con partículas antideslizantes, de acuerdo a la hoja de dato del producto marca SIKA, este producto debe ser aplicado por profesionales con experiencia, se recomienda seguir las instrucciones de SIKA para la aplicación del mismo. Se le solicita la contratista subsanar la novedad lo antes posible, toda vez que este mismo acabado será aplicado en el frente de obra del Rancho de Flandes y en la María.

Mediante acta No. FAC-S-2024-016553-AG del 06 de marzo de 2024 Se convoca reunión con el fin de revisar los posibles incumplimientos relacionados en el oficio No.FAC-S-2024-006742-CE del 29 de febrero de 2024, se expresan consideraciones importantes para ser teniendas en cuenta por la ordenación del gasto, con el objetivo de prorrogar y modificar el contrato con las siguientes justificaciones expuestas: Condiciones meteorológicas, calidad del acabado de piso, fugas de agua en la barraca No.1
Se establecen compromisos de ambas partes para el llevar a feliz término el contrato como se relaciona a continuación:
COMPROMISOS CONTRATISTA:
- Asistencia del personal técnico (profesionales) a la obra para que emitan los debidos conceptos y planimetría según su especialidad.
- Subsanar la novedad presentada con el acabado de piso instalado en el rancho de tropa del CACOM-4, de acuerdo a que no cumple con lo solicitado.
COMPROMISOS SUPERVISION:
- Apoyar al personal contratista con el traslado de personal en ruta MELGAR- LA MARÍA, con el fin de que inicien con las actividades de obra el día 09 de marzo de 2024, lo anterior se realizará de acuerdo a disponibilidad de aeronave

NOVEDAD AIRES ACONDICIONADOS DEL RANCHO: Se procede a pasar revista de los aires instalados en el rancho de tropa del casino de CACOM-4, donde se evidencia un corto circuito sobre uno de ellos, por lo que se procede a verificar la novedad con el personal de técnicos en refrigeración de la Unidad, los cuales indican que se afectaron las tarjetas de ambos aires de acuerdo al corto, el contratista queda con el compromiso de subsanar la novedad de ambos aires acondicionados, toda vez que antes de iniciar la obra los aires se encontraban operativos y sin novedad.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 510.000.000,00	$ 510.000.000,00	$ 422.688.000,00	82,88%	$ 87.312.000,00	17%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 510.000.000,00	$ 510.000.000,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 510.000.000,00	Valor inicial del contrato
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
VALOR TOTAL	$ 510.000.000,00	Valor final del contrato
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	No incluye anticipo
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	$ 222.523.101,79	Corte de obra No.1 del 27 de diciembre de 2023
PAGO FINAL CXP 2023 (PAGADERAS 3ER TRIMESTRE DE 2024	$ 0,00	N/A
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 222.523.101,79	Corte de obra No.1

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Entregar APUS	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Entregar Programación de obra	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Programa SISOMA	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Libro de bitácora de la obra.	Si	Si	Si	Diligenciada en Obra
Contar con el personal mínimo requerido	Si	Si	Si	Ejecutado en Obra
Presentación Hojas de Vida y Estudios de seguridad para firmal	Si	Si	Si	Entregadas en fisico Al Supervisor
Personal Capacitado y con esperiencias	Si	Si	Si	Diligenciada en Obra
Aportes Seguridad Social -PARAFISCALES	Si	Si	Si	Enviada por correo electronico


13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se le recomienda al contratista buscar asesoria del fabricante SIKA, para subsnar la novedad del acabado de piso y poder implementar un plan de contingencia para cumplir a cabalidad con las obligaciones del contrato.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):


Para el mes de FEBRERO el estado del clima en su mayoría fue soleado, con algunos días lluvioso

ELABORO:



Supervisor. ST Pérez Benjumea Laura

REVISO:





Supervisor. ST Pérez Benjumea Laura


15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS #3, CACOM 4







MANTENIMIENTO KIOSCO TACTICO SOLDADOS, CACOM 4











MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA, CACOM 4



BARRACA DE SOLDADOS #1










PROYECTO

068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4

CONTRATISTA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

PERIODO DE CORTE DEL

31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

1. BTACORA DE OBRA……3
2. LOCALIZACION……..4
3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO ……5
4. POLIZAS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA…… 6
5. AVANCE OBRA……..7
6. RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS……..28
7. PERSONAL EN OBRA ……...34
8. PROGRAMACION DE OBRA……35
9. AVANCE DE OBRA VS PROGRAMACION……36

1. BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra.

2. LOCALIZACION

El lugar de ejecución del Contrato es: En la Base Aérea “TC. LUIS F. PINTO” Comando Aéreo de Combate N°4, KM 1 VÍA MELGAR – BOGOTÁ y sus zonas desconcentradas Flandes y La María.



3. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No	068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4
ACTA DE INICIO	martes, 19 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACION:	Sábado 16 de Marzo de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC
NOMBRE DEL SUPERVISOR	PEREZ BENJUMEA LAURA
NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE	PEREZ LOPEZ DANIELA ALEXANDRA
CONTRATISTA	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
NIT	
R/L CONTRATISTA	CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 510.000.000,00
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 16 de marzo de 2024
FECHA DEL CORTE	31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

4. POLIZAS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ASEGURADORA	**ASEGURADORA DE COLOMBIA**		
No DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	605-47-994000104893		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	6/12/2023	6/08/2024	204.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	6/12/2023	26/12/2026	51.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/12/2023	26/12/2028	25.500.000,00
ASEGURADORA	**ASEGURADORA DE COLOMBIA**		
No POLIZA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	605 -74 - 994000023279		

5. AVANCE DE OBRA

BARRACAS 3

9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

Se procede a resanar y estucar los puntos más críticos, luego se aplica con brocha vinilo el color blanco, y se aplica la primera capa de vinilo tipo 1 con rodillo de arriba hacia abajo, se deja secar y luego se vuelve a hacer el mismo procedimiento con la segunda y tercera capa, hasta que quede uniforme.





9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).

Se verifica que la parte a intervenir este en buenas condiciones, y se procede a aplicar con brocha para recortar,luego aplican la primera capa de pintura koraza uniformemente, se verifican las partes donde quede traslucida, se retoca y se aplican las dos siguientes manos, para dar un acabado correcto



13.3 LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.

Se realiza sobre la mampostería puntos de referencia para la construcción dentro de las márgenes, se procede a instalar las partes del mármol sobre lo existente, verificando su nivelación y coincidencia con los puntos hidráulicos instalados anteriormente, asi mismo se instalan las piezas de los salpicaderos, frenteros, todo se pega con resina. Se realiza limpieza, se verifican los niveles y ubicación de las láminas quedando en perfecto estado y con acabados finales.









15.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

Se realizan varias jornadas de aseo dentro y fuera del alojamiento, dejando totalmente aseado este punto para entregar a satisfacción de la supervisión.









INTERVENCION KIOSCO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

1.3 DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO

Se realiza la demolición de una caja de inspección que se tuvo que adecuar para conectar el desagüé desde el punto de la caseta.



4.4 CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)

Se realiza la instalación de la estructura donde van a ir sujetadas las láminas de eterboard, atornillando todo a la estructura a los perfiles existentes. Se procede a aplicar una capa de masilla para que su apariencia sea completamente lisa.






.

5.4 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.

Teniendo lista las dimensiones de la caja de inspección que anteriormente estaba construida y se tuvo que demoler, debido al mal estado en el que estaba, se realiza la excavación y se procede a verificar medidas externas e internas para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato. Se realiza la fundición de piso en concreto de 3000 Psi y se construye con ladrillo común.





6.1 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Previamente a la instalación de las luminarias se verifican con un probador de fases que no existan inversión de neutros y tierras, se procede a verificar circuitos existentes, se realiza instalación de tubería emt y el respectivo cableado según la norma RETIE, para luego proceder a realizar la instalación de luminarias.













6.2 MINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Se verifica todas las conexiones del sitio donde se realiza la actividad y se procede a realiza las pruebas con las fases y el neutro, se realizan las conexiones de los circuitos nuevos y se procede a instalar los tomacorrientes nuevos.





6.3 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Se verifica todas las conexiones del sitio donde se realiza la actividad y se procede a realiza las pruebas con las fases y el neutro, se realizan las conexiones de los circuitos nuevos y se procede a instalar los interruptores.






8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Luego de instalar la cubierta se procede a nivelar para instalar la estructura del cielo raso, después de esto se revisa que las instalaciones eléctricas previstas para este contrato se encuentren instaladas y se instala PVC de 9 mm.



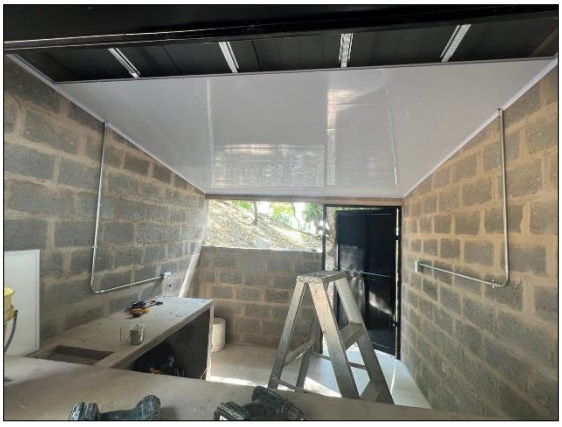



9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR

Se inicia verificando niveles y las pendientes del piso, se define la forma en como ira instalada la baldosa y se realiza el despiece y orden en que irán estas, dejando así los recortes en los lugares

menos visibles. Se prepara la pega, se dejan las baldosas hiladas y se procede a su instalación dejando las juntas hiladas y con igual espesor. Una vez fraguado la pega se procede a dejar emboquillado con cemento blanco.





9.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)

Se dio inicio a esta actividad dejando Limpia la superficie de piso, se verifican los niveles se continua con la humectación del área a intervenir, se procede a realizar las maestras horizontales a una distancia considerable para que las reglas queden apoyadas en sus extremos, y a continuación se Llenan entre los niveles de las maestras con mortero 1:4 a 4 cm de espesor. Se aplica acelerante y se enrasa la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa y al final se Verifican los niveles finales para aceptación.



10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

Una vez escarificadas las paredes, columnas y vigas a intervenir, se procede a resanar y estucar los puntos más críticos, luego se aplica con brocha vinilo el color blanco, y se aplica la primera capa de vinilo tipo 1 con rodillo de arriba hacia abajo, se deja secar y luego se vuelve a hacer el mismo procedimiento con la segunda y tercera capa, hasta que quede uniforme.










10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE

Se prepara superficie con limpieza manual con grata metálica, se revisa y corrige con anticorrosivo, se masillan algunas partes que se encontraban en mal estado, y se procede a aplica pintura blanca-anticorrosivo.

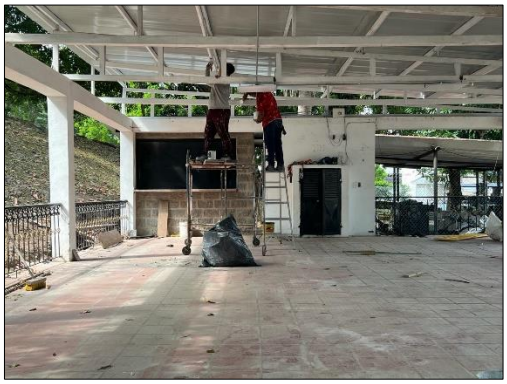







11.1 VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CON MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM

Se realiza diseño aprobado por supervisión, se procede a realizar la construcción de lo marcos, se limpia la superficie del ladrillo aburdajado, se rectifican niveles y plomos para su correcta ubicación, se realiza la instalación se deja soldada y reforzada con varilla de media, junto con la instalación de la malla en rombo que también queda debidamente soldada.













11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.

Se realiza diseño aprobado por supervisión, se procede a realizar la construcción del marco, se limpia la superficie del ladrillo aburdajado, se rectifican niveles y plomos para su correcta ubicación, se realiza la instalación se deja soldada y reforzada con varilla de media tanto en el marco como en la parte inferior del mismo para mayor seguridad.





RANCHO GRUSE

1.6 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA, INCLUYE ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO

Se realiza inspección de la cubierta completa, pero después de comenzar con la instalación, se presentaron algunos imprevistos, debido a que la estructura existente se encuentra en mal estado y totalmente desnivelada, se determinó retirar algunas cerchas, realizarles mantenimiento, como soldarlas, enderezarlas, y aplicar pintura anticorrosiva.









1.7 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO

se procede a retirar el cielo raso existente, lamina a lamina, y toda la estructura metálica, después se retira hasta el sitio autorizado para acopio del mismo, en una volqueta hasta la escombrera municipal. Cabe resaltar que, durante la ejecución del contrato, en el primer corte solo fue ejecutado un poco menos del 50% de este ítem, toda vez que no eran claras las cantidades que se iban a ejecutar por parte del apoyo a supervisión, adicional mes a mes se discriminan las cantidades ejecutadas de acuerdo al presupuesto establecido, en los diferentes informes de obra.





4.3 CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACACADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)





5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Se procede a nivelar para instalar la estructura del cielo raso, después de esto se revisa que las instalaciones eléctricas previstas para este contrato, se encuentren instaladas y se procede a tapar con PVC de 9 mm.






6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES.

Se realiza limpieza de la zona a intervenir, así mismo se protege la media caña instalada con cita de papel para que no le caiga producto, se verifica que el producto a aplicar se encuentre en perfectas condiciones y a la temperatura adecuada, para esta actividad se requirió de una cuadrilla de 6 personas debido a la complejidad para maniobrar e instalar el producto.






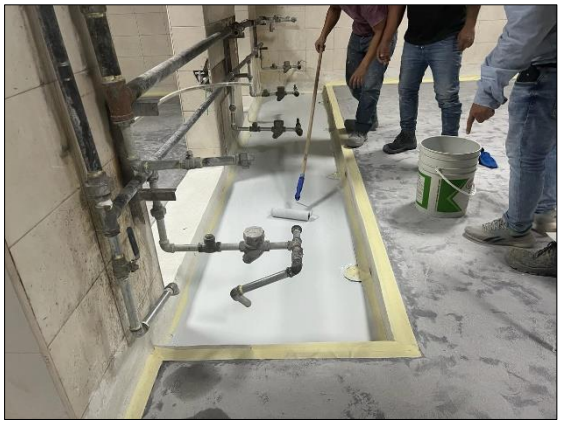



9.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

Se realiza jornada de aseo tanto en la cocina como en el comedor del rancho, dejando todo organizado y limpio, listo para realizar entrega a satisfacción de la supervisión.

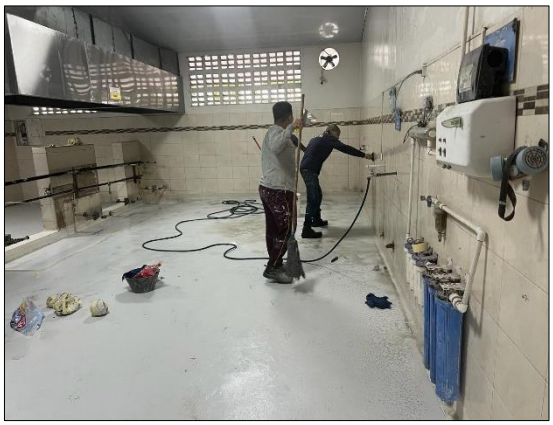



INTERVENCION RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM.

Se retiran residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia y se procede aplicar el manto asfaltico, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie.






8.1 MANTENIMIENTO A CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS DE SUJECCION DE TEJA EN LAMINA ONDULADA EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE TRAXX 3 CON ARANDELA DE GOMA, ALINEACION DE TEJAS CORRIDAS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA A 2 MANOS PARA INTEMPERIE.

Se realiza lavado de las partes de la cubierta a intervenir y se procede a instalar cinta asfáltica para las goteras existentes y clips de sujeción donde la cubierta se encuentra en mal estado.



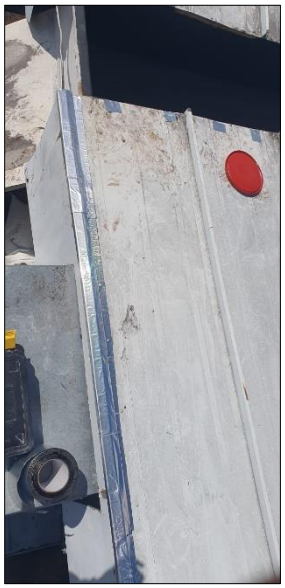


BARRACA 1.

1.1 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO.

Se realiza el retiro de las puertas metálicas y el retiro de marco sobre muros con medios mecánicos.



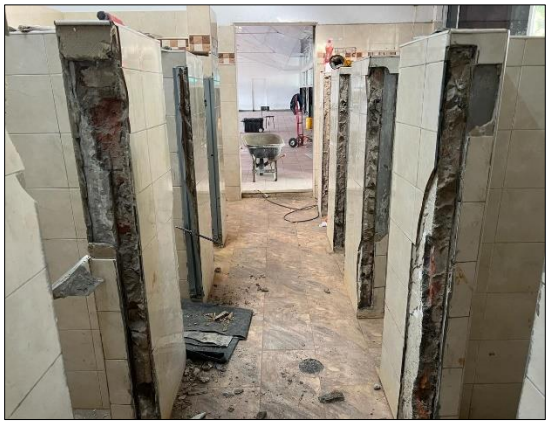

1.2 REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES

Se determina la altura donde se debe empezar la regata en la ducha, se realiza por todo el recorrido donde van las regaderas, luego se procede a retirar el material sobrante de la regata.





1.3 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES.

Al realizar esta actividad, se observa que gran parte de las paredes se encuentran levantadas, y una parte del pañete presenta deterioro por humedades anteriores, por lo que toda la pintura se retira de forma homogénea, el escombro producto de la escarificación se recoge y se deja en el sitio de acopio transitorio y luego se carga a una volqueta para dejar todo en la escombrera municipal.










1.4 REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO

Para esta actividad se delegan 3 personas con rotomartillo, se empieza a demoler el piso (previo desmonte de las marmitas y todos los implementos de la cocina) luego se recoge el escombro y se ubica en el sitio de acopio y se procede a demoler el piso del enchape, después se despeja

nuevamente el escombro dejando el lugar de trabajo limpio para continuar con otras actividades.

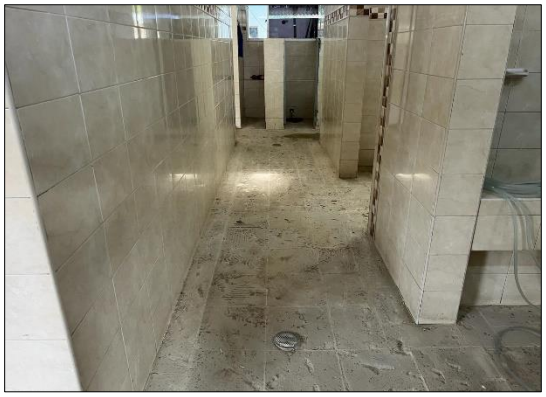

2.2 REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE).

La red que abastece los duchas se encuentra muy abajo y es de color gris, por lo que se aprovecha para realizar el cambio a tubería hidráulica y se hace la regata primero con pulidora, y luego con el rotomartillo, se hace el cambio de tubería, por lo que se toman un promedio de 1.8 m de regata por cada ducha.





2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Esta tubería se instala para abastecer la red hidráulica haciendo el cambio en los últimos 1.8 metros de la red de las duchas.





3.1 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)

Se realiza nivelación y preparación de superficies irregulares, se debe limpiar la superficie de piso, luego se revisó la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor, posterior a esto, se tapan los sifones existentes y se procede a la aplicación del mortero 1:5 según especificaciones técnicas del contrato con un espesor de 0.04mts







3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS, GUARDAESCOBA.

Se inicia verificando niveles y las pendientes del piso, se define la forma en como ira instalada la baldosa y se realiza el despiece y orden en que irán estas, dejando así los recortes en los lugares menos visibles. Se prepara la pega, se dejan las baldosas hiladas y se procede a su instalación dejando las juntas hiladas y con igual espesor. Una vez fraguado la pega se procede a dejar emboquillado con cemento color tabaco.



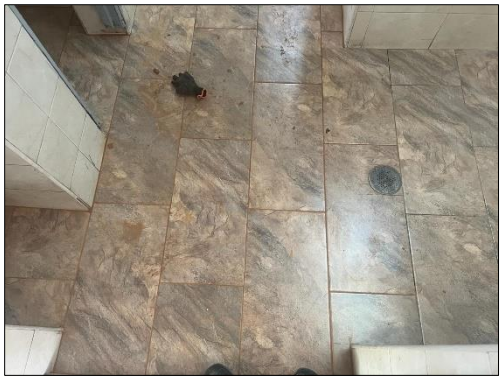



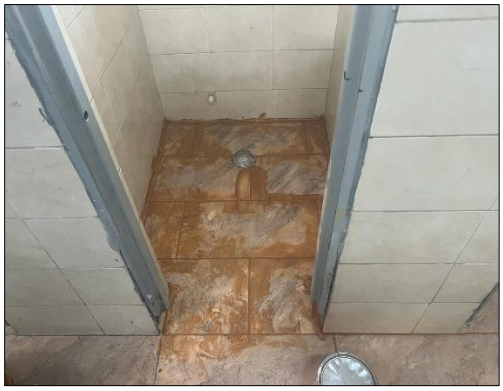

3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)

Se procede a realizar la nivelación de pared, dejando todo cimbrado, para comenzar la instalación sobre la segunda hilada, debido a que el enchape del piso no se ha instalado aún, en el transcurso de esta actividad, se presentaron diferentes inconvenientes para lograr unos acabados más pulidos toda vez, que las paredes no se encontraban aplomadas.





4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).

Una vez escarificadas las paredes a intervenir, se procede a resanar y estucar los puntos más críticos, luego se aplica la pintura para exteriores, y se aplica la primera capa pintura con rodillo de arriba hacia abajo, se deja secar y luego se vuelve a hacer el mismo procedimiento con la segunda y tercera capa, hasta que quede uniforme. Durante la ejecución de esta actividad, se reporta a supervisión que debido a las lluvias, las canales y cubierta del alojamiento que ya se encuentran en mal estado (tapadas, con goteras, llenas de oxido y cubierta y cielo raso en muy mal estado) han manchado todas las paredes del exterior, ya que les cae oxido, se represa el agua y cae sobre las paredes con bastante suciedad, por esta razón no se podría dar garantía de que al aplicar la pintura en las fachadas tenga la durabilidad y acabado que se espera, ya que se ha venido perdiendo tiempo y material estucando las paredes, así mismo se han tenido que resanar bastantes puntos por el deterioro que presenta el alojamiento, como grietas, humedad entre otras.







4 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBRA					
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	OBRA EJECUTADA CORTE No.2 (15/02/2024)		
			CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	%
	MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS #1, CACOM 4		-	**$ 25.471.321,15**	**51,25%**
1	**PRELIMINARES**		-	**$ 4.954.480,35**	**120,64%**
1.1	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	Un	9,00	$ 117.915,78	0,00%
1.2	REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	Ml	4,41	$ 63.587,63	0,00%
1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	M²	538,62	$ 2.744.985,90	0,93%
1.4	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M²	130,13	$ 2.027.991,03	-0,01%
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		-	**$ 870.229,33**	**100,00%**
2.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	Ml	18,00	$ 168.465,99	0,00%
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Ml	18,00	$ 291.125,46	0,00%
3	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**		-	**$ 11.056.308,16**	**103,66%**
3.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	71,91	$ 2.297.523,23	-0,03%

3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.	M²	65,00	$ 5.813.297,36	0,00%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)	M²	43,00	$ 2.945.487,57	-0,03%
4	**ACABADO DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**		**-**	**$ 8.590.303,31**	**57,76%**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	317,69	$ 8.590.303,31	0,01%
	MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS #3, CACOM 4			**$ 53.878.916,59**	**31,66%**
9	**ACABADOS DE MURO PINTURA Y/O ENCHAPES**			**$ 8.035.980,37**	**106,11%**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	455,72	$ 7.516.044,29	0,80%
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	24,19	$ 519.936,08	0,01%
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			**$ 16.169.420,89**	**100,00%**
13.3	LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	Ml	5,10	$ 4.549.604,93	0,00%
8	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**			**$ 1.307.599,77**	**61,45%**
15.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	319,00	$ 1.307.598,77	0,13%

	MANTENIMIENTO KIOSCO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4			**$ 24.003.242,68**	**53,30%**
1	**PRELIMINARES**			**$ 0,00**	**0,00%**
1.3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	Un	1,00	$ 27.563,11	0,00%
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**			**$ 187.287,24**	**145,00%**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M³	8,70	$ 187.287,24	-0,01%
4	**MAMPOSTERIA**			**$ 10.073.553,20**	**100,25%**
4.4	CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)	M²	28,44	$ 3.930.929,77	0,01%
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			**$ 2.225.789,41**	**125,10%**
5.4	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	Un	1,00	$ 408.838,17	0,00%
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**$ 2.362.697,05**	**100,00%**
6.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	5,00	$ 1.667.175,76	0,00%
6.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE	Un	3,00	$ 490.377,72	0,00%

	CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.				
6.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	2,00	$ 205.143,57	0,00%
8	**CIELORASO**			**$ 651.862,02**	**98,82%**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	8,40	$ 651.862,02	0,11%
9	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			**$ 830.311,43**	**98,82%**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR	M²	8,40	$ 561.937,17	0,13%
9.2	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	8,40	$ 268.374,25	0,26%
10	**ACABADOS DE MURO PINTURA Y/O ENCHAPES**			**$ 1.563.331,70**	**82,15%**
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	94,79	$ 1.563.331,70	-0,01%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M²	40,22	$ 1.247.641,61	0,00%
11	**CARPINTERIA METALICA**			**$ 1.415.592,99**	**82,76%**
11.1	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CON MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM	M²	4,08	$ 699.709,39	0,00%

11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	M²	2,00	$ 715.883,60	0,00%
	MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4			**$ 43.560.663,19**	**44,11%**
1	**PRELIMINARES**			**$ 3.453.581,31**	**21,09%**
1.6	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA , INCLUYE ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	Kg	144,00	$ 1.898.030,45	0,00%
1.7	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	M²	37,25	$ 429.476,70	0,00%
4	**PAÑETES**			**$ 270.852,67**	**94,11%**
4,3	CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)	M²	1,96	$ 270.852,67	0,00%
5	**CIELORASO**			**$ 2.936.483,18**	**15,14%**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	37,84	$ 2.936.483,18	0,00%
6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			**$ 14.873.899,40**	**87,43%**
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	M²	69,52	$ 12.974.888,03	0,08%
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS	Ml	62,00	$ 1.899.011,37	-0,01%

	UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.				
9	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**			**$ 409.824,24**	**55,20%**
9.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	99,98	$ 409.824,24	122,93%
	MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES			**$ 23.440.324,43**	**96,55%**
4	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			**$ 11.639.605,16**	**104,10%**
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM	M²	10,50	$ 521.934,38	0,00%
8	**CUBIERTAS**			**$ 2.196.145,11**	**714,00%**
8.1	MANTENIMIENTO A CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS DE SUJECCION DE TEJA EN LAMINA ONDULADA EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE TRAXX 3 CON ARANDELA DE GOMA, ALINEACION DE TEJAS CORRIDAS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA A 2 MANOS PARA INTEMPERIE	M²	71,40	$ 2.196.145,11	0,00%

5 PERSONAL EN OBRA

No.	Centro de costos	Cedula de Ciudadania	Nombre del Empleado	CARGO
1	Melgar	9847104	**Sigifredo Osorio Morales**	OFICIAL DE OBRA
2	Melgar	1.118.568.116	**Jhon Mario Saganome Camacho**	AYUDANTE DE OBRA
3	Melgar	1057590448	**Daniela Arbelaez Niño**	ARQUITECTA RESIDENTE
4	Melgar	17.343.101	**Carlos Albiar Marrero Vargas**	GERENTE
5	Melgar	74.814.250	**Felipe Andres Colina Aponte**	DIRECTOR DE OBRA
6	Melgar	91.446.378	**Iohan Alfonso Jimenez Cruz**	AYUDANTE DE OBRA
7	Melgar	1.077.868.994	**Gloria Isabel Ramos Oliveros**	INGENIERA SISO
8	Melgar	1.005.855.239	**Juan Camilo Rodriguez Lopez**	AYUDANTE DE OBRA
9	Melgar	74.814.899	**Nelson Gabriel Abril Perez**	MAESTRO DE OBRA
10	Melgar	1.098.628.386	**Duvan Armando Sanabria Diaz**	MAESTRO DE OBRA
11	Melgar	1.105.672.681	**Julian David Peña Rojas**	AYUDANTE DE OBRA
12	Melgar	1.193.287.861	**Jersson Camilo Peña Rojas**	AYUDANTE DE OBRA
13	Melgar	1.006.029.758	**Sergio Camilo Gutierrez Varon**	AYUDANTE DE OBRA
14	Melgar	1.106.892.337	**Willinton Gomez Rayo**	AYUDANTE DE OBRA
15	Melgar	1.059.813.850	**Osman Londoño Restrepo**	MAESTRO DE OBRA
16	Melgar	94.441.516	**Jhon Jairo Orobio Quiñones**	SOLDADOR

6 PROGRAMACION DE OBRA

Se anexa programación de obra con fecha del 19-12-20223 al 16-03-2024

7 AVANCE DE OBRA VS PROGRAMACION

Avance Financiero	Acumulado ($)	Acumulado (%)
Inversión Programada	$ 510.000.000	100,00%
Valor Ejecutado en Obra	$ 74.464.707	14,60%
Valor Facturado	$ 222.523.101,79	43,63%
Valor Pagado	$ 222.523.101,79	43,63%
valor total acumulado	$ 422.700.947,84	82,88%

31-01-2024 Día parcialmente nublado

Actividades Realizadas:

-Barracas 3.

-Se realiza Suministro e instalación de lavamanos comido en lamina de marmol. Iniciando con el Rayado sobre la mampos feria para tener las Referencias y Proceder a su ejecución del trazado.

-Suministro e instalación de luminarias en el alojamiento con sus respectivas Conexiones

-Flandes:

-Suministro e instalación de media Caña: se da continuidad a este proceso utilizando todos los materiales correctos pa. su instalación.

-Herramienta en obra: Rotomartillos, Herramienta menor. lamina mam.

-Personal en obra: Director de obra. Residente de obra, HS residente 2 maestros generales. 2 oficiales. 7 ayudantes 1 soldador.

PB

Daniela ARBELAEZ NIÑO
Residente de Obra.

St. Perez Benjumea Laura
Supervisión

1-02-2024 Día parcialmente nublado.

Actividades realizada

Barracas 3.

Suministro e instalacion de luminarias en el alojamiento, para este día se realizaron los recortes en el cielo Raso a estandia para que visiblemente quede amonicaso.

- Se procede con una cuadrilla a resanar detalles en los bang del alojamiento para comenzar a Subsanar y asi logi entregar esta barraca a conformidad por la supervisión.

Rancho de tropa:

-Se realizan arreglos de unas Tuberias que tenian fugas en la Parte de la cocina

-Flandes:

-Suministro en instalacion de mediaCaña: se continua con los Cortes y trazados simetricos para la instalacion utilizando todos los materiales acordes a las especificaciones Tecnicas del Contrato

Herramienta en obra: Rotomartillos, Pulidoras, y herramienta menor
Personal en Obra: Director de Obra, Residente de obra, HS Residente
2 maestros, 7 ayudantes, 2 oficiales y 1 Soldador.

PB.

DANIELA ARBELAEZ NIÑO
Residente de obra

ST. Perez Benjumea Laura
Supervisora

2-02-24 Día parcialmente Soleado.
Actividades Realizadas:
Barracas 3
-Se continuan con detalles de Pintura en el alojamiento, tanto en Pintura externa como interna.
-Se realiza jornada de aseo en los diferentes frentes de trabajo y se procede a hacer el retiro de material sobrante y de escombros fuera de la Unidad militar.
-Flandes:
-Se continua con el Suministro e instalación de la media Cara de la cocina del Rancho de Tropa.
Herramienta en obra: compresores, Pulidoras, Rotomartillos y herramienta menor
Personal en obra: Director de Obra, Residente de obra, HS Residente
2 maestros, 7 ayudantes, y 1 Soldador.

PB.

DANIELA ARBELAEZ NIÑO
Residente de obra.

ST. Perez Benjumea Laura
Supervisora

5-02-24 Día Parcialmente Nublado
Actividades Realizadas.
Flandes:
-Se continua con el Suministro y la instalación de la media cara, Teniendo en Cuenta todas las especificaciones tecnicas para su Construcción.
-Barracas 3
-Se continua con el Suministro y la instalacion de las luminarias, dejando todos los circuitos conectados.
-Se continuan con el aseo en los diferentes frentes de trabajo
Rancho de Tropa:
-Listado de piso en Morfero: Se termina de fundir el piso en donde estaban ubicadas las planchas

Herramienta en obra: Palidoras, Rotomartillos, Compresores y herramienta menor
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, HS Residente
2 maestros, 7 ayudantes, 2 oficiales y 1 soldador

PB
ST. Perez Benjumea Laura
Supervisora

Daniela ARBELAEZ NIÑO
Residente de obra.

6-02-2024 Dia Nublado
Actividades Realizadas.
Barracas 3.
Se termina la actividad de la instalacion de las luminarias en el alo Sanitario, asi mismo se continua con aseo y arreglando detalles en la pintura y baños para poder entregar a conformidad con la Supervision
-Se realiza inspeccion al alojamiento con la Supervisora St laura Perez y Se dejan por sentado los siguientes Compromisos o actividades por realizar:
-Detalles de pintura, arreglo de estuco, lijado y pintado de marco de puerta, arreglo de llave de lavamanos, arreglo de filos.
- Se comienza a desocupar la barraca para poder realizar aseo-
- Visita e inspeccion por parte de oficiales Kiosko:
Desencofrar los mesones, instalacion de perifileria para techo, instalacion de sobre piso. aseo
Poncho de Tropa.
- arreglo de pvc cocineta., no se logro terminar de instalar PVC debido a que enviaron nuevamente PVC que no corresponde el color.
Se hace inspeccion a toda la herramienta de la obra para verificar su buen estado
- la Ing. Arq. Residente se encuentra incapacitada

PB
ST. Perez Benjumea Laura
Supervisora

Director de Obra

07-02-2024.

Dia nublado.

Se tiene inspección de obra. se hace recorrido de actividades que se ejecutaron en el mes de diciembre de 2023.

Se revisa nuevamente con la arquitecta supervisora. ela borraca No 3. se hace unas sugerencias en los acabados por lo que se colocan 2 personas a realizar limpieza de los dormitorios y un oficial a detallar los baños.

en el frente tactico se continua con la fabricación de las ventanas y la puerta.

se instala el piso quedando pendiente dos baldosas.

Rancho de Tropa.

llega el PVC que se cambio por el tono que no. era el mismo que se estaba instalando y se termina de instalar las laminas que se habian desmontado en el comedor. y alejando todo el P.V.C

Flandes

Se continua con la instalación de la media caña

Herramienta: Pulidoras, Rotomartillo, compresor y herramienta Menor

Personal Director de obra, HSQ Residente.

1 Maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes y 1 soldador

Director de Obra

SI. Perez Benjumea Laura
Supervisora

Incapacidad Medica Residente de obra 4 dias

Powered by CamScanner

08-02-2024

Dia Nublado.

Se continua con la inspecion de Obra por Militares de Bogota.

Barracos 3.

se continua con las orreglos o los detalles de estuco y pintura en el interior del baño.

Kiosko tactico

Se termina de enchapar y se emboquilla el piso.

Se continua con la construccion de los ventanas y puertas.

Ranchon de Tropa.

Construccion de Medio baño en la cocina.

se comienza a estructurar el ala del Ranchon que dá contra la concha.

Filondes

Impermeabilizacion de la viga. limpieza de Teja y se comienza a tornillar los tejas que se soltaron.

Herramientas: Pulidoras, Rotomartillo, compresores y herramienta menor

Personal: Director de Obra, profesional HSQ Administrador de Obra, 1 Maestro, 3 oficiales 3 ayudades 1 soldador

Director de Obra

PB

ST. Perez Benjumea Laura
Supervisora

09-02-2024

Dia nublado.

Ranchon de Tropa

2 opiciales realizar detalles de pilas y. Resanes los pilas donde estan los casilleros

Powered by CamScanner

y se reconstruye la pared de acceso a los baños.
Se veelve a instalar. la cubierta pequeña que queda en la parte exterior de los baños debido a arreglo a la estructura.
Kiosko tactico.
Se continua con la construcion de. la puerta y los dos ventanas
Rancho de tropa.
se termina de estructurar el alero queda contra la concha y queda listo para instalacion del P.V.C
En la cocina se continua con la instalacion de la media caña.
Flondes
Se termina de instalar la emulsion asfaltica a la canal. se termina de atornillar la teja y se coloca cinta asfaltica por 15 cm de ancho por todas las uniones de Teja que se separe la parte superior de la teja tipo sandwich
Herramienta menor., pulidoras. Rotomartillo, compresora
Personal Director de Obra, Profesional HSQ., Administrador de obra, 1 Maestro, 3 oficiales 5 Ayudantes

Directora de Obra.

ST. Perci Benjamin Lopez
Supervisor

10-02-2024 Día Soleado.
Actividades Realizadas
Barracas 3.
-Detalles de pilos y Pedanes de pilos y Paredes donde se encuentran ubicados los Casilleros en las Carreras de las Ventanas
-Rancho de Tropa.
instalación de Pvc en el alero que queda contra la Concha.
-En la cocina Se continua Con la instalacion de la media Cañas y Se dejan Instaladas los Sifones que van ubicados en las Mam

Powered by CamScanner

tas.
Kiosko Tactico: -Se instala Cubierta en la Caseta ubicada en el Kiosko. Se continua con la Construccion de la puertas y las ventanas de la Caseta, dejandolas listas, Para comenzar a pulir y pintar.
Andes:
-Se termina de instalar la cinta aislante (Intumescente) marca Sika, para Unir las tejas y logra sellar donde se encontraban las goteras.
-el día de hoy no hubo luz en toda el día, lo cual atraso un poco el proceso de pulir la media Cara.
Herramienta en obra: Pulidoras, Rotomartillos, Compresores, equipo de alturas, equipo de soldadura y herramienta Menor.
Personal en obra: Residente de obra; 1 S Residente, 1 maestro 2 oficiales, 5 ayudantes, y 1 soldador

Daniela Perez Niño
Residente de Obra.

St. Perez Benjumea Laura
Supervisora

12-02-2024 Día soleado.
Barracas 3.
-Se continua con Resane de filos donde se encuentran los Cadilleros. y Pintura y Resane de los paredes internas del alojamiento.
-Se da inicio a la aplicacion de la pintura de la cubierta del color Solicitado por la supervisor que debe llevar la unidad militar de la Fa
-Se continua con jornada de aseo en los baños del alojamiento.
-Kiosko
-Se continua con la construccion de las puertas y ventanas, ya dan acabados, como pulir y pintar, para instalar dejan listas bisagras pasadores y chapas.
Radio de tropa:
-Se continua con la instalación del Puc en el alero que queda por la fachada principal del Radio. y Se continua Pulendo la Media Cara.
Herramienta en obra: Pulidoras, Rotomartillos, Compresores, equipo de alturas, equipo de soldadura y herramienta menor.

Personal en obra: Arquitecta Residente, Ms Residente, Director de obra, 2 maestros, 2 oficiales y 5 ayudantes, 1 soldador.

PB

Daniela ARBELAEZ NIÑO
Residente de obra.

St. Perez Restrepo Laura
Supervisora

3-02-2024 Día soleado.
Actividades Realizadas.
Barracas 3.
-Pintura y Resane de los Paredes internos del alojamiento
-Se continua con la aplicacion de la pintura de la Cubierta. del color solicitado por la supervicion.
-Se continua jornada de aseo en los baños del alojamiento.
Kiosko
El día de hoy se realiza la instalacion de la puerta de la caseta del kiosko, para la que tambien se le instala una Chapa izquierda Para mayor Seguridad.
-Se comienza el montaje de la Puerta Ventana de la fachada Principal de la Caseta, dejandola Completamente instalada.
Rancho de Tropa:
-Se Termina la instalacion del pvc en el alero y se instala el angulo de en este mismo punto.
-Se continuan puliendo la media cara, aplicando Cera, y detallando para darle un acabado final al granito pulido.
-Se realiza jornada de aseo en los diferentes frentes de trabajo, para Comenzar los entregas de los puntos que se han venido intervenido.
Herramienta en obra: pulidoras, Rotomartillos, Compresores, equipo de alturas, equipo de soldadura, y herramienta Menor
Personal en obra: Arquitecta Residente, Director de obra, Ms Residente, 2 maestro 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 soldador.

PB

Daniela ARBELAEZ NIÑO
Residente en obra.

St. Perez Laura

4-02-2024 Día lluvioso en la Mañana
Día nublado en horas de la Tarde.
Actividades Realizadas:

Powered by CamScanner

Kiosko:
Se empiezan a detallar las puertas de la cajeta y a pintar donde se tuvo que: macillar después de instaladas.
-Se arreglan detalles en la construcción de la cajeta.
Rancho de Ropa:
-Se continua con la instalación del Cielo Raso de la fachada posterior
-Se instalan Sifones metálicos y se dejan Puestas unas Pruebas de humedad en el piso de la cocina para verificar si ya es viable realizar la instalación del porcelanato.
-Se termina de hacer toda la parte electrica de la cocina y se Comienza la instalación de las luminarias dejando las instaladas por completo y en funcionamiento tanto en el Comedor como en la cocina.
Barracas 3
-Se continuan en jornada de aseo y adicional se realizan unos arreglos como Resanes y estuco Solicitados por la Supervisión
12- -Se continua con la aplicación de la Pintura gris Pal en la Cobertura del alojamiento.
Herramienta en obra: Rotamartillos, Compresores, equipo de soldadura, equipo de alturas, herramienta menor.
Personal en obra: Residente de obra, HS Residente, Director de obra 2 maestros, 2 oficiales, 5 ayudantes y 1 soldador.


DANIELA ARGENTINO
Residente de obra.

St. Capt. Laura
Supervisora

15-02-2024 Día Soleado.
Barracas 3
-Se continuan arreglando detalles de pintura y estuco en el alojamiento
-Se Continua Con la jornada de aseo en donde quedan las camas
-Se realiza visita Con la St. laura Banyuca y el Coronel Rozo y se dejan establecidos los siguientes compromisos para recibir a satisfacción el alojamiento:
1. Retirar los Rieles que se encuentran en las entradas de los ba y dejar Resanado y estucado esos Pullos que se encuentran

ocados.
2. Revisar toda la boquilla de los baños y arreglar algunos poros que quedaron sin emboquillar.
3 Terminar de pintar los Cerchas que estan ubicadas en la fachada Principal del alojamiento.
4 Resanar, estucar y Pintar muro donde descansa la cubierta en la fachada principal del alojamiento.
5. Cortar angulos donde se encontraba ubicada la Canal que se retiro.
Rancho de Tropa:
-Se continua con la instalacion de Puc en los aleros del rancho de tropa.
-Se comienza la instalación del piso en poliuretano en la cocina del Rancho Kiosko
-Se Comienza la conexion de los Circuitos para la instalacion de luminarias, Tomacorrientes e interruptores.
-Se da inicio al montaje de las puertas para la instalacion en los baños del alojamiento de Barracas 1.
-Se pinta viga Canal que va ubicado en el alero de la fachada Principal del Rancho de tropa.
Herramienta en obra: Compresores, equipo de soldadura, herramienta menor.
Personal en obra: Residente de obra, HS Residente, Director de obra, 2 maestros 2 oficiales, 5 ayudantes y 1 Soldador.

DANIELS ARBELAEZ NIVO.
Residente de obra.



Supervisora

6-02-2024 Día Soleado
Barracas 3.
-Se continua con jornada de aseo, y se comienza con los arreglos para dejar Subsanado y poder entregar a satisfaccion de la supervisión.
-Rancho de Tropa
Se continua con la instalacion de Pvc en los aleros del Rancho de tropa.
-Kiosko
-Se continua con las conexiones de los circuitos para la instalacion de las luminarias
-Se continua con el montaje de los Puertas de los baños de barracas 1

Powered by CamScanner

herramienta en obra: equipo de alturas, equipo de soldadura, Roladoras Rotomartillos y herramienta menor.
Personal en obra: Arquitecta Residente, Hs Residente, Director de obra 2 maestros, 2 oficiales 5 ayudantes y 1 soldador.

Daniela REBELLEZ UTTO.
Residente de obra

ST. Perez Laura.

17-02-2024 Día soleado.
Actividades Realizadas.
Barracas 3
-Se continuan con las observaciones señaladas por supervisión y se deja encerado en piso.
-Techo
-Se continua con pintura en las puertas y ventanas de la caseta ya dejandolas detalladas.
-Techo de tropa.
-Instalación de correa en todo el Techo
-Suministro de tuva corrientes que quedaban pendientes por instalar
Barracas 1:
-Se continua con la construcción de los marcos de las puertas de los baños del alojamiento.
-Techo: se deja instalado todo el circuito de luminarias y se realiza la instalación de tuva corrientes e interruptores
herramienta en obra: equipo de soldadura, Rotomartillos pulidora 5 compresores y herramienta menor.
Personal en obra: Arq Residente, Hs Residente, 2 maestros, 2 oficiales 5 ayudantes 1 soldador.

Daniela REBELLEZ.
Residente de obra.

ST. Perez Laura

19-02-2024 Día soleado.
Barracas 3
Se realiza la entrega total del alojamiento a supervisión, quedando recibida a satisfacción por la ST Laura Benjumea y el Mayor Ra

así mismo se realiza la entrega de una malla con los fuchos para su respectiva instalacion y 2 galones de pintura gris Brillante para pintar los locktos de dicho alojamiento, quedando Todo a satisfaccion, se realiza la entrega del alojamiento de Barracas 1, para comenzar su intervencion el día de mañana 20-02-2024

Rancho de Tropa:

-se continua con la instalacion del PVC en la cocina que queda ubicada a lado de la cocina.

-se empieza a picar la media Cara nuevamente, debido a que le caye ro residuos del poliuretano instalado en el paso de la cocina.

-Al comenzar con la instalación de la canal en la fachada principal se evidencia que esta quedaria debajo del voladizo de la cubierta y habria que cortarle 10 cm para poder instalar la canal y que quede completamente funcional, se le comunica el imprevisto a la Sta Laura Perez (supervisora) y aprueba el corte de la cubierta para la instalacion de la canal en todo el largo de la fachada.

-Frontis

-se termina las conexiones de las cajetas para la instalacion de la luminaria. los tomas y el interruptor que van ubicados.

-se programa visita al cerro la mona, para establecer Cantidades finales con la supervision.

Herramienta en obra: pulidoras, equipo de soldadura, taladros, herramienta menor.

Personal en obra: Ing Residente, HS Residente, Director de obra, Maestro 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 Soldador.

Daniel [illegible] Silvo.
Ing. Residente de obra.

DB.
Sta. Paola Laura

20-02-2024 Día Soleado

Actividades Realizadas:

Barraca 1

-se da inicio a la demolicion de los pisos ubicados en el baño del alojamiento

-se desmontan los sanitarios.

Rancho de Tropa:

se continua con la instalacion del PVC en la parte de la cocina al

bdo de la coaua del Rancho
-Se continua pulendo la media Caña de la Cocina, y se comienza Preparar el piso para aplicar la Resina que es el último paso del H del poliuretano establecido.
Kiosko
-Se instala cielo Raso de la Caseta ubicada en este punto
-Se Realiza Corte para ubicar la luminaria en la caseta
Rancho de tropa.
-Se continua con la instalacion de las canales que existian este punto, se entregan pintadas, soldadas y con arreglos en puntos donde se encontraba rota o totalmente Corroida.
Herramienta en obra: Arq Residente, HS Residente, Director de obra maestro general, 2 oficiales, 5 ayudantes y 1 soldador
Herramienta en obra: Pulidoras, equipo de Soldadura, Botamartillos herramienta menor.

Daniela [illegible] Nieto.
Residente de Obra.

12

21-02-2024 Día soleado
Actividades Realizadas
Barracas 1:
-Se continua con la demolicion de pisos en el baño del alojamiento.
-Se terminan de desmontar los sanitarios
-Se realiza el desmonte de los orinales.
-Se da inicio a la actividad de alistado de piso en mortero 1:5 E=0.04 MTS.
Rancho de tropa:
-Se continua pulendo la Media Caña - instalacion de la otra Canal
Kiosko:
-Se Realiza la aplicacion de pintura para la cubierta del kiosko
-Se empieza a pintar la estructura de la cubierta del kiosko.
Herramienta en obra: Pulidoras, equipo de Soldadura, Compresores, Botamartillos, equipo de alturas, herramienta menor.
Personal en obra: Arq Residente, HS Residente, Maestro general, 2 Oficiales, 5 ayudantes, 1 Soldador.

-Se solicita por parte de supervisión, que en el kiosko donde se encuentra ubicada la caseta, se tape con ladrillo común un espacio que quedo de una plataforma donde anteriormente se encontraba ubicada la otra caseta.

DANIELA ARRIETA NIÑO.
Arquitecta Residente.

22-02-2024 Día Nublado.

Barracas 1
-Se termina de fundir el sobre piso en las duchas.
-Se da inicio a la construcción de la Regata de 3" en el muro de los baños, incluyendo mortero para retiro de sobrantes.
Rancho de Tropa:
-Se continua pulendo media cara y piso para Realizar la aplicación de la Resina en el polvoretano de la cocina del Rancho.
Kiosko:
-Se continua Pintando la estructura de la cubierta con pintura blanca anticorrisiva
-Se comienza a construir muro en ladrillo común para tapar el hueco solicitado por la supervisión.
-Se comienza pañetando y estucando las columnas y vigas para aplicar Pintura.
Herramienta en obra: Compresores, Rotomartillos, Pulidoras, equipo de soldadura y herramienta Menor.
Personal en obra: Ing Residente, Hs Residente, Maestro de obra, 2 oficiales 5 ayudantes y 1 soldador.

Daniela Arrieta Niño.
Residente de obra

23-02-2024 Día Soleado
Actividades Realizadas.
Rancho de Tropa:
Se terminan todas las actividades previstas para este punto y se inicia el aseo para Realizar la entrega

a satisfacción por parte de supervisión.
Barracas 1:
- Se termina la construcción de la regata de 3" en los muros de la ducha. y se aplica mortero para luego enchapar.
- Se da inicio a la instalación de la cerámica del piso. en la zona de los sanitarios.
- Se empiezan a escarificar las paredes del alojamiento, pero en este proceso se evidencia que estas paredes se encuentran en muy mal estado, por lo que hay varios puntos que se deben resanar para poder estibar y pintar, para lo que queda acordado hacerlo y es aprobado por la supervisión.
- Se continua con la construcción de las puertas para los sanitarios.
Kiosko:
- Se termina de resanar el muro que se construyo al lado de la caseta y se da inicio a la pintura de la estructura del kiosko (columna y viga). y así mismo se empieza el aseo para realizar la entrega a satisfacción por sup
Daniela Benavidez Nino
Residente de obra.
24-02-2024.
Dia nublado.
Rancho de Tropa.
se realiza aseo en cocina, area del baño y. oficina dejando todo limpio
se detecta una fuga de agua de una parte que no se intervino, sin embargo se debe corregir.
se enchapa los baldosas de porcel que se donaron buscando las fugas que habian
Barracas 1.
enchape de piso del area de sanitarios y area de orinales
+ Resane exterior. despues de pañetar se comienza el estuco exterior.
+ Instalación de duchas, se requiere buen cambio de tubería de agua.

y se observa que 4 duchas estan en acero, por loque se va a preguntar como procedemos.
Personal. Administrador de obra, Director de obra, Residente de Obra, Residente SISO, 4 oficiales 5 Ayudantes
Herramienta = taladros, pulidoras, bonzadora, equipo de soldadura, carretillas y Herramienta menor.

Director de Obra

25-02-2024
Dia soleado.
Barroca 1.
instalacion de. 6 registros en la ducha y se comienza con el enchape de pared.
Se termina de enchapar el area de. sonitarios y. orinales, se deja un poco mas de la mitad el area de lavamanos.
Kiosko.
Se realiza un aseo perimetral.
Rancho de tropa
Se emboquilla el enchape de pared que se utilizo.
Se observa una fuga en la pared. por un tubo roto, es tuberia metalica., no hace parte del contrato pero es necesario arreglar.
Personal: Director de obra - Residente SISO y oficiales
Herramienta menor:, equipo de Soldadura carretillas, taladro, pulidora, cortadora

Director de Obra

2-2024 Día soleado.
Actividades Realizadas.
Barracas 1.
-Se continua con el enchape de piso en todo el baño del alojamiento y se va emboquillando el piso en la parte de los sanitarios.
-Se da inicio a la cerramiento de Pared Boreal en la parte de las duchas del alojamiento.
-Se continua escarificando y Rejanando las fachadas de la parte exterior del alojamiento.
Kiosko:
-Se instala ventana en malla en la cajeta
-Se empieza a estructurar la parte donde ira instalado todo el eterboard.
-Para la actividades que se deben ejecutar en Fluidos, se encuentran suspendidas, esto debido a que en la base no hay agua ni luz para poder continuar labores.

Herramienta en obra: Retomartillos, equipo de soldadura, Pulidoras y herramienta Menor
-Personal en obra: Arq Residente, Ing Residente, Director de obra, Maestro general, 2 Oficiales 5 ayudantes 1 Soldador.

Daniela Arbeláez Niño
Arq Residente de Obra.

1-02-2024 Día soleado.
Actividades Realizadas.
Barracas 1:
-Se realiza el desmonte de los marcos anteriormente instalados en las divisiones de los Sanitarios, durante esta actividad, se encuentra que los marcos estaban anclados a sus angulos. lo que genera que el retiro de estos ocasione daños en el enchape existente

para lo que se establece con supervisión, realizar retiro, suministro e instalación, donde ocurran daños al enchape.
- Se continua con el enchape de las paredes de las duchas y la instalación de pinguya y boquilla en el piso.
- Se continua Resanando, escarificando y estucado, la fachada de la parte exterior del alojamiento
- Kiosko:
Se continua estructurando y se empiezan a instalar las laminas del eterboard
Rancho de tropa:
- Se realizan subsanaciones solicitadas por supervisión para poder realizar la entrega a satisfacción.
Herramienta en obra: Pulidoras, equipo de soldadura, cortadoras-herramienta menor.
Personal en obra: Arq Residente, HS Residente, Maestros, 2 oficiales, 5 ayudantes y 1 soldador.

DANIELS ARBELAEZ NIÑO
RESIDENTE DE OBRA.

8-02-2024 Día soleado.
Actividades Realizadas.
Barraca 1:
- Se continua con el enchape de paredes en las duchas, e instalacion de Boquilla en piso
- Se continua actividad de Retiro de marcos en los divisiones de baños
- Kiosko:
- Se continua estructurando e instalando el eterboard al Rededor de la cubierta, sobre la perfilería existente.
Rancho de tropa
- Se continuan Realizando Subsanaciones en la cocina solicitadas por la Supervisión, Para que absolutamente toda la cocina quede funcional y no se Presente ningun imprevisto.
Personal en obra: Arq Residente, HS Residente, Maestros, 2 oficiales & ayudantes y 1 soldador
herramienta menor: Pulidoras, Rotomartillos, equipo soldadura, Cortadoras

Powered by CamScanner

y herramienta menor.

Daniela Arreola Nito.
Residente de obra.

29-02-2024 Día Soleado
Actividades Realizadas
-Barraca 1
Se continua con instalacion de Ceramica en Pared de duchas e instalacion de la Bogada.
-Suministro e instalacion de marcos en las divisiones de los Sanitarios.
-Se Continua con Rejones, aplicacion de estuco en todas las fachadas exteriores del alojamiento.
Kiosko:
-Se continua con la instalación del elevador ubicado sobre toda la viga aerea del kiosko.
Rancho de Tropa:
-Se Terminan todos los Requerimientos de la Supervisor que se debian Subsanar en la parte de la cocina para el Reabo a Satisfaccion de este punto.
Herramienta en obra= Pulidoras, Rotomartillos, equipo de soldadura y herramienta Menor.
Personal en obra: Arq Residente, Hs Residente, Maestros, Ayudantes Oficiales y 1 Soldador.

Daniela Arreola Nito
Residente de obra.

01-03-2024 Día soleado.
Actividades Realizadas.
Barraca 1:

Powered by CamScanner


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
0		**PROGRAMACION**	**27%**	**65 días**	**mar 19/12/**	**sáb 16/03/2**
1	**ITEM**	**INICIO**	**27%**	**65 días**	**mar 19/12/2**	**sáb 16/03/24**
2	**CAP 1**	**MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS #1, CACOM 4**	**0%**	**50 días**	**mar 9/01/24**	**sáb 16/03/24**
3	**1**	**PRELIMINARES**	**0%**	**3 días**	**mar 9/01/24**	**jue 11/01/24**
4	1.1	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	0%	4 días	mié 7/02/24	lun 12/02/24
5	1.2	REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	0%	5 días	mié 7/02/24	mar 13/02/24
6	1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	0%	5 días	mié 7/02/24	mar 13/02/24
7	1.4	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	0%	4 días	mié 7/02/24	lun 12/02/24
8	**2**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**0%**	**5 días**	**mar 13/02/2**	**lun 19/02/24**
9	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	0%	3 días	mar 13/02/24	jue 15/02/24
10	2.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	0%	5 días	mar 13/02/24	lun 19/02/24
11	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	0%	4 días	mar 13/02/24	vie 16/02/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
12	**3**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0%**	**10 días**	**lun 19/02/24**	**vie 1/03/24**
13	3.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	0%	4 días	lun 19/02/24	jue 22/02/24
14	3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE	0%	7 días	lun 19/02/24	mar 27/02/24
15	3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)	0%	10 días	lun 19/02/24	vie 1/03/24
16	**4**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**0%**	**12 días**	**mar 9/01/24**	**mié 24/01/24**
17	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	0%	12 días	mar 9/01/24	mié 24/01/24
18	**5**	**CARPINTERIA METALICA**	**0%**	**5 días**	**mar 13/02/2**	**lun 19/02/24**

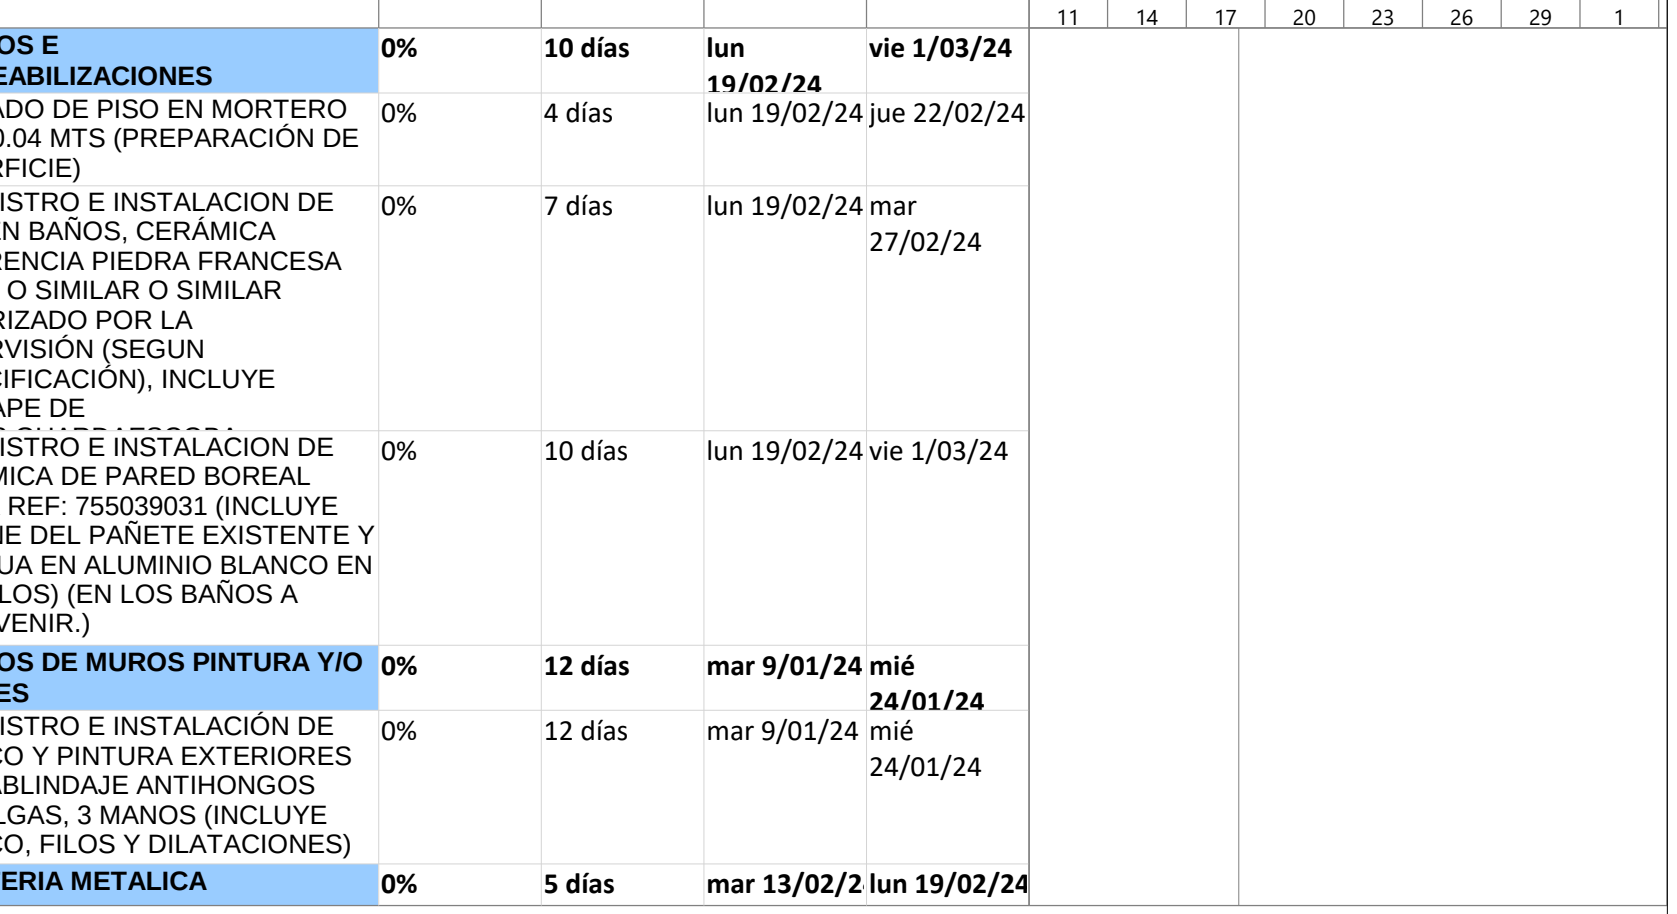


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
19	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS	0%	5 días	mar 13/02/24	lun 19/02/24
20	**6**	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**	**0%**	**4 días**	**lun 4/03/24**	**jue 7/03/24**
21	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL, ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.	0%	4 días	lun 4/03/24	jue 7/03/24
22	**7**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**0%**	**4 días**	**vie 8/03/24**	**mié 13/03/24**
23	7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL, ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	0%	4 días	vie 8/03/24	mié 13/03/24
24	7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	0%	3 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24




Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
25	7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	0%	3 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24
26	**8**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**0%**	**4 días**	**mié 13/03/2**	**sáb 16/03/24**
27	8.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	0%	4 días	mié 13/03/24	sáb 16/03/24
28	8.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	0%	4 días	mié 13/03/24	sáb 16/03/24
29		**MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No. 3, CACOM 4**	**82%**	**36 días**	**mar 19/12/23**	**mar 6/02/24**
30	**1**	**PRELIMINARES**	**100%**	**2 días**	**mar 19/12/2**	**mié 20/12/2**
31	1.1	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
32	1.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA , INCLUYE ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	100%	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
33	1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
34	1.4	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23

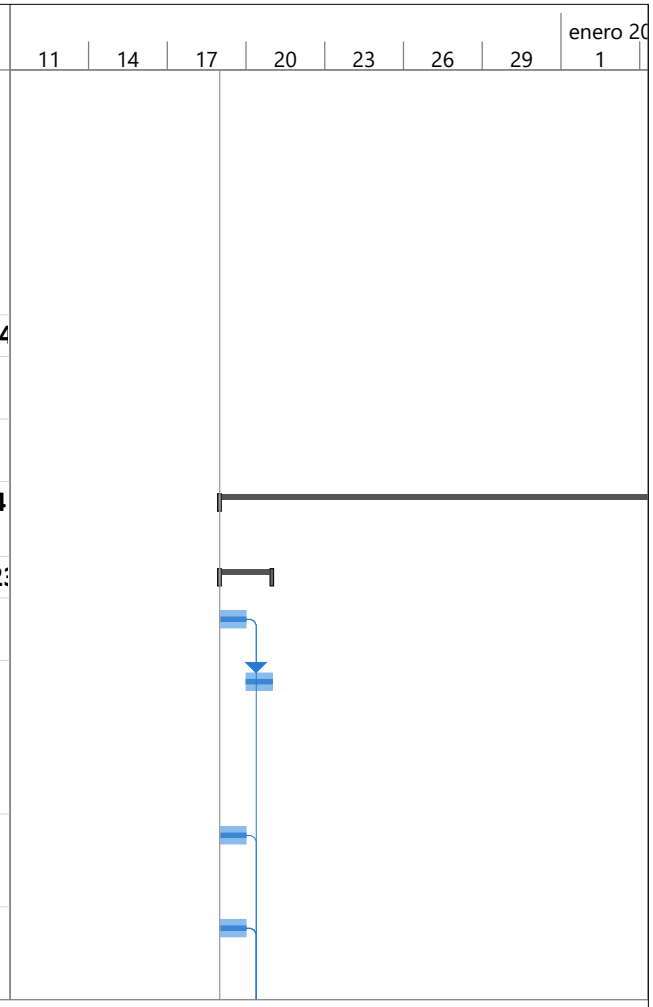

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
35	1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
36	1.6	REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
37	1.7	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BAÑOS MEDIA ALTURA INCLUYE ENTREGA AL ALMACÉN	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
38	1.8	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
39	1.9	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
40	**2**	**ESTRUCTURA**	**100%**	**1 día**	**mié 20/12/2**	**mié 20/12/2**
41	2.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	100%	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23

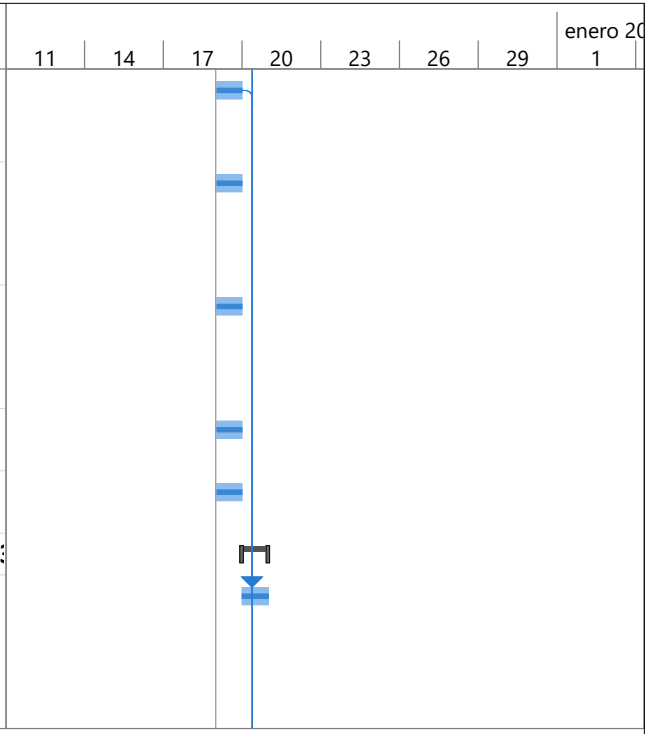

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
42	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EN ACERO CORRUGADO DE DIÁMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.	100%	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
43	2.3	CONSTRUCCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	100%	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
44	**3**	**MAMPOSTERIA**	**100%**	**1 día**	**mar 19/12/2**	**mar 19/12/2**
45	3.1	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS.	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
46	**4**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**100%**	**2 días**	**mar 19/12/2**	**mié 20/12/2**
47	4.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
48	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	100%	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23

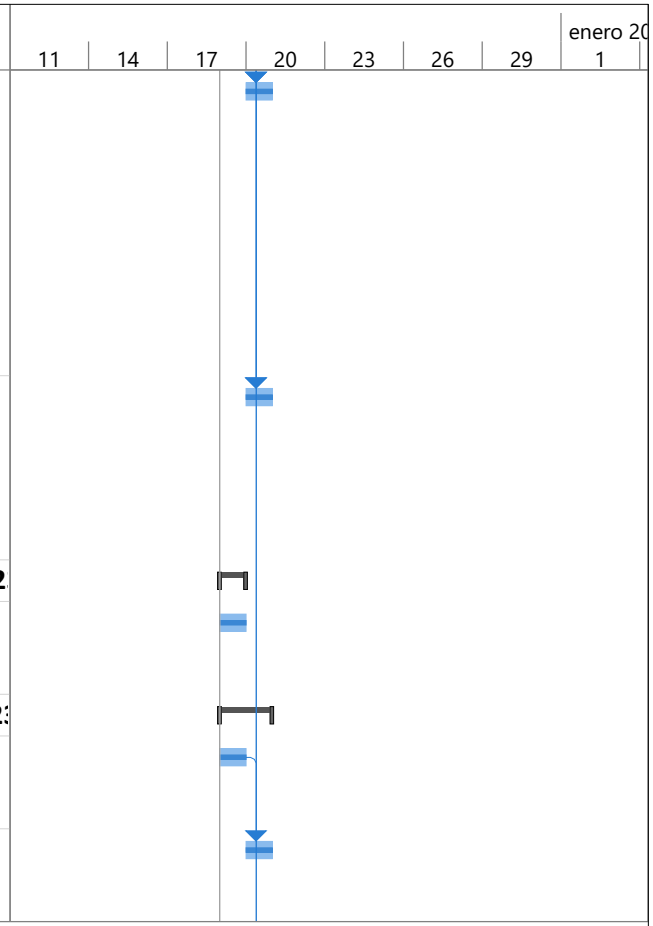

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
49	4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	100%	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
50	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
51	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**100%**	**3 días**	**mar 19/12/2**	**jue 21/12/23**
52	5.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDA	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
53	5.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	100%	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23

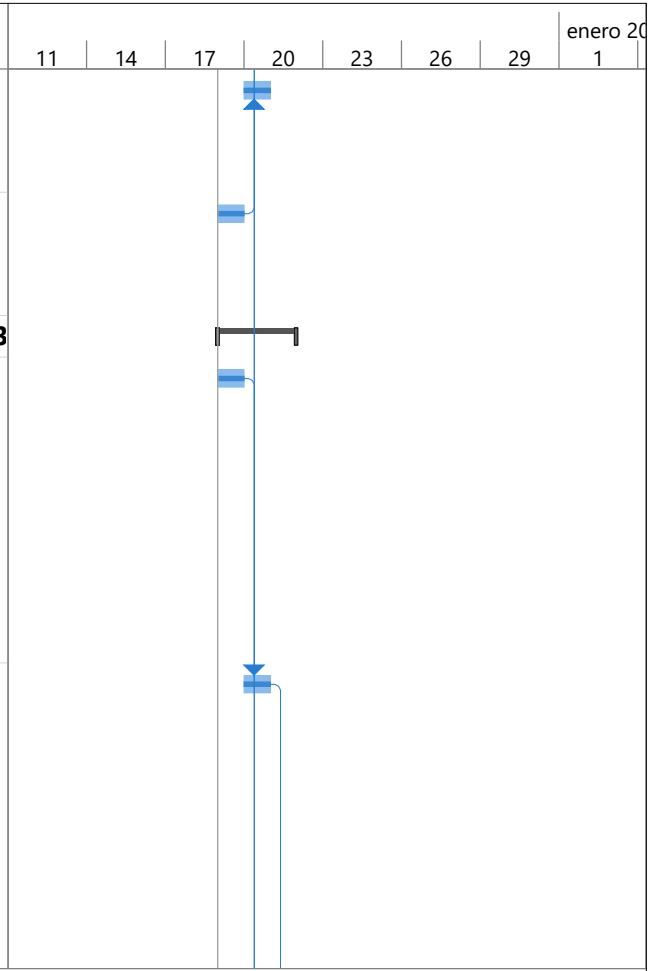

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
54	5.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	100%	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
55	**6**	**PAÑETES**	**100%**	**1 día**	**mar 19/12/2**	**mar 19/12/2**
56	6.1	PAÑETE 1:4 FILOS Y DILATACIONES	100%	1 día	mar 19/12/2:	mar 19/12/2:
57	**7**	**CIELO RASO**	**100%**	**5 días**	**mié 20/12/2:**	**mar 26/12/2**
58	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	100%	5 días	mié 20/12/23	mar 26/12/23
59	**8**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**100%**	**6 días**	**mar 19/12/23**	**mar 26/12/23**
60	8.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23

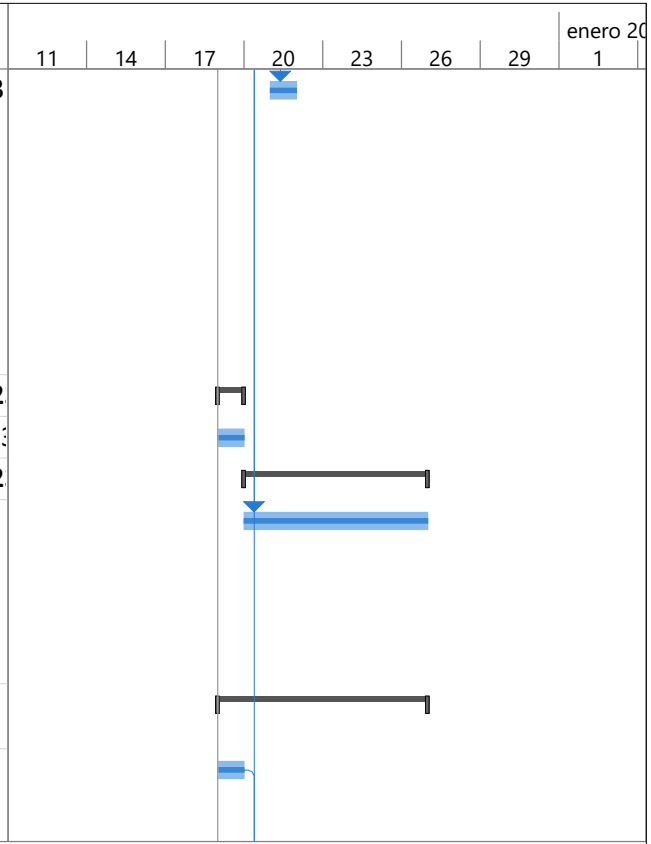

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
61	8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.	100%	2 días	lun 25/12/23	mar 26/12/23
62	8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)	100%	3 días	mié 20/12/23	vie 22/12/23
63	**9**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**100%**	**2 días**	**mar 19/12/23**	**mié 20/12/23**
64	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	100%	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23
65	9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	100%	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23
66	**10**	**CARPINTERIA METALICA**	**100%**	**5 días**	**mar 19/12/2**	**lun 25/12/23**

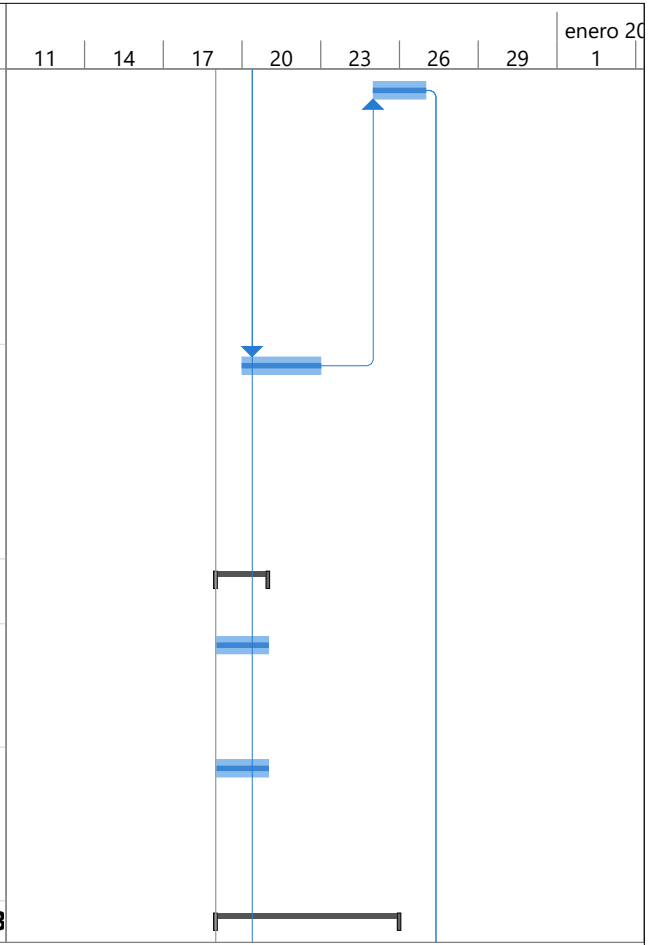

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
67	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	100%	5 días	mar 19/12/23	lun 25/12/23
68	**11**	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**	**0%**	**5 días**	**mar 19/12/2**	**lun 25/12/23**
69	11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL, ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.	0%	5 días	mar 19/12/23	lun 25/12/23
70	**12**	**CUBIERTAS**	**100%**	**2 días**	**mié 20/12/2**	**jue 21/12/23**
71	12.1	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA	100%	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23
72	**13**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**56%**	**30 días**	**mié 27/12/23**	**mar 6/02/24**

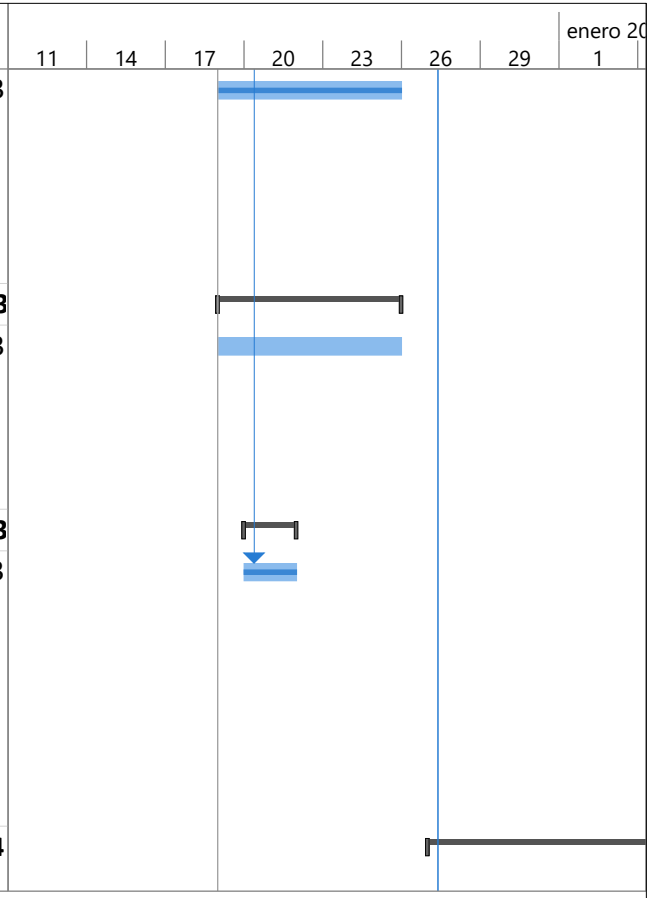

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
73	13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	0%	2 días	mar 16/01/24	mié 17/01/24
74	13.2	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL, ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	100%	3 días	mié 27/12/23	vie 29/12/23
75	13.3	LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	0%	2 días	lun 5/02/24	mar 6/02/24
76	13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	100%	2 días	mié 27/12/23	jue 28/12/23
77	**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0%**	**1 día**	**jue 1/02/24**	**jue 1/02/24**

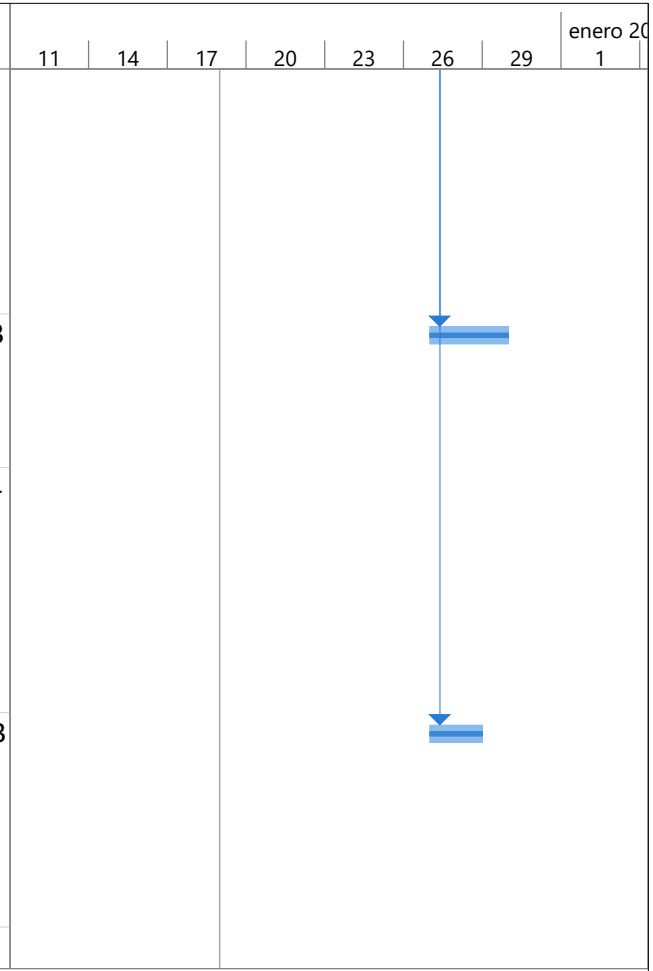

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
78	14.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	0%	1 día	jue 1/02/24	jue 1/02/24
79	**15**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**50%**	**35 días**	**mar 19/12/2**	**lun 5/02/24**
80	15.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	0%	1 día	lun 5/02/24	lun 5/02/24
81	15.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	100%	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
82		**MANTENIMIENTO KIOSCO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4**	**40%**	**35 días**	**mar 26/12/23**	**lun 12/02/24**
83	**1**	**PRELIMINARES**	**100%**	**2 días**	**mar 26/12/2**	**mié 27/12/2**
84	1.1	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	100%	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
85	1.2	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	100%	2 días	mar 26/12/23	mié 27/12/23
86	**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**25%**	**4 días**	**lun 8/01/24**	**jue 11/01/24**
87	2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE	25%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24
88	**3**	**ESTRUCTURA**	**33%**	**3 días**	**lun 8/01/24**	**mié 10/01/2**
89	3.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	33%	3 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24
90	**4**	**MAMPOSTERIA**	**52%**	**9 días**	**vie 26/01/24**	**mié 7/02/24**

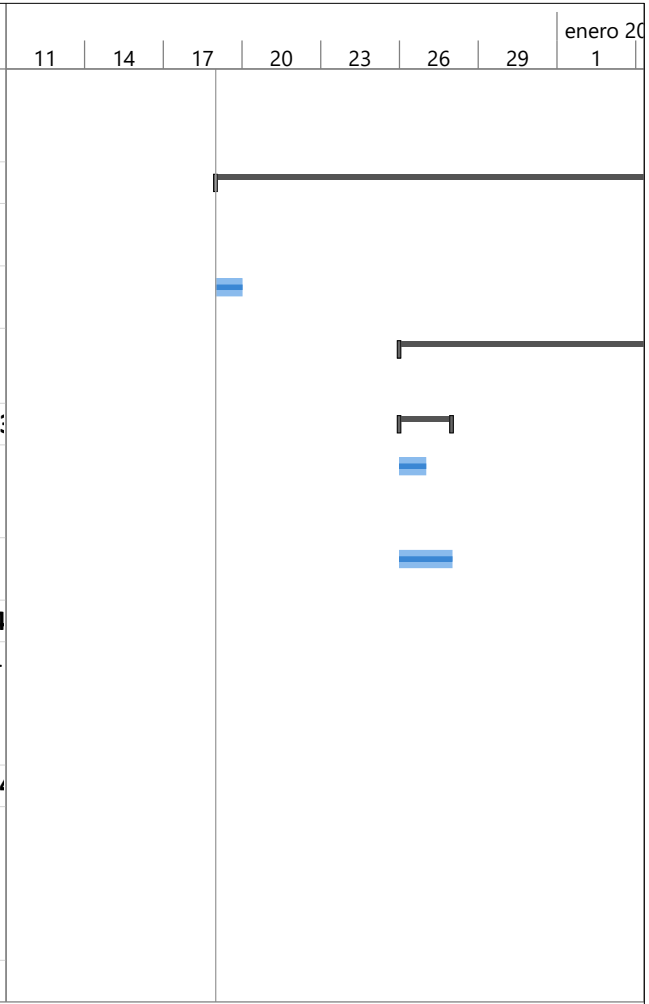

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
91	4.1	CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO	100%	2 días	lun 29/01/24	mar 30/01/24
92	4.2	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.	65%	5 días	vie 26/01/24	jue 1/02/24
93	4.3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI	33%	3 días	mié 31/01/24	vie 2/02/24
94	4.4	CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)	0%	2 días	mar 6/02/24	mié 7/02/24
95	**5**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**100%**	**3 días**	**vie 12/01/24**	**mar 16/01/2**
96	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	100%	2 días	vie 12/01/24	lun 15/01/24
97	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	100%	3 días	vie 12/01/24	mar 16/01/24




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
98	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	100%	2 días	vie 12/01/24	lun 15/01/24
99	5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	100%	3 días	vie 12/01/24	mar 16/01/24
100	**6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0%**	**2 días**	**mié 7/02/24**	**jue 8/02/24**
101	6.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	0%	2 días	mié 7/02/24	jue 8/02/24
102	6.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDA	0%	2 días	mié 7/02/24	jue 8/02/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24




Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
103	6.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	0%	1 día	mié 7/02/24	mié 7/02/24
104	**7**	**PAÑETES**	**0%**	**1 día**	**mar 6/02/24**	**mar 6/02/24**
105	7.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	0%	1 día	mar 6/02/24	mar 6/02/24
106	**8**	**CIELO RASO**	**0%**	**3 días**	**lun 5/02/24**	**mié 7/02/24**
107	8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	0%	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24
108	**9**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0%**	**2 días**	**vie 12/01/24**	**lun 15/01/24**
109	9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR	0%	1 día	lun 15/01/24	lun 15/01/24




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
110	9.2	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	0%	1 día	vie 12/01/24	vie 12/01/24
111	**10**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**0%**	**1 día**	**mié 7/02/24**	**mié 7/02/24**
112	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST.	0%	1 día	mié 7/02/24	mié 7/02/24
113	10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	0%	1 día	mié 7/02/24	mié 7/02/24
114	10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	0%	1 día	mié 7/02/24	mié 7/02/24
115	**11**	**CARPINTERIA METALICA**	**0%**	**3 días**	**jue 8/02/24**	**lun 12/02/24**
116	11.1	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CON MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM	0%	3 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24
117	11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	0%	3 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24
118	**12**	**CUBIERTAS**	**38%**	**2 días**	**vie 2/02/24**	**lun 5/02/24**



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24




Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
119	12.1	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA	0%	1 día	lun 5/02/24	lun 5/02/24
120	12.2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y	75%	1 día	vie 2/02/24	vie 2/02/24
121	**13**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**15%**	**31 días**	**mar 26/12/2**	**mar 6/02/24**
122	13.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	0%	1 día	mar 6/02/24	mar 6/02/24
123	13.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	30%	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
124		**MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4**	**35%**	**32 días**	**vie 12/01/24**	**lun 26/02/24**
125	**1**	**PRELIMINARES**	**70%**	**20 días**	**vie 12/01/24**	**jue 8/02/24**

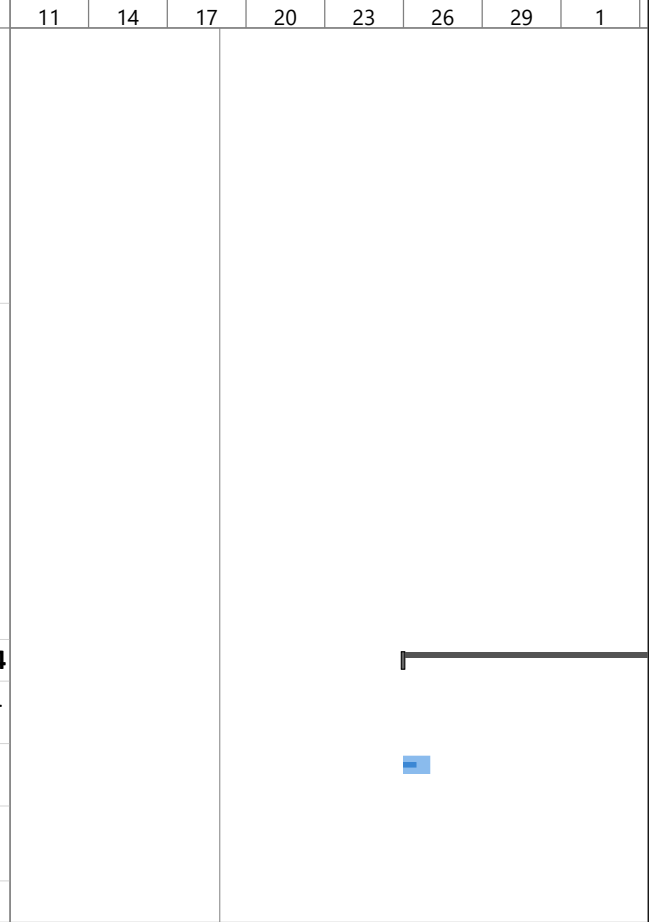

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
126	1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	100%	3 días	vie 12/01/24	mar 16/01/24
127	1.2	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	100%	2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24
128	1.3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	100%	1 día	mar 16/01/24	mar 16/01/24
129	1.4	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	0%	4 días	lun 5/02/24	jue 8/02/24
130	1.5	RETIRO DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	0%	3 días	mar 6/02/24	jue 8/02/24
131	1.6	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA , INCLUYE ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	100%	8 días	mar 23/01/24	jue 1/02/24
132	1.7	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	100%	2 días	mar 23/01/24	mié 24/01/24
133	**2**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**29%**	**7 días**	**mié 17/01/24**	**jue 25/01/24**
134	2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	0%	2 días	mié 17/01/24	jue 18/01/24
135	2.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	100%	2 días	vie 19/01/24	lun 22/01/24
136	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	0%	3 días	mar 23/01/24	jue 25/01/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
137	**3**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**100%**	**8 días**	**vie 9/02/24**	**mar 20/02/2**
138	3.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	100%	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24
139	3.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	100%	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
140	3.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A	100%	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24
141	3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDA	100%	1 día	vie 9/02/24	vie 9/02/24
142	3.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	100%	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24



Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
143	**4**	**PAÑETES**	**0%**	**2 días**	**vie 9/02/24**	**lun 12/02/24**
144	4.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	0%	2 días	vie 9/02/24	lun 12/02/24
145	4.2	PAÑETE 1:4 FILOS Y DILATACIONES	0%	2 días	vie 9/02/24	lun 12/02/24
146	**5**	**CIELO RASO**	**75%**	**10 días**	**jue 25/01/24**	**mié 7/02/24**
147	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	75%	10 días	jue 25/01/24	mié 7/02/24
148	**6**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0%**	**16 días**	**lun 5/02/24**	**lun 26/02/24**
149	6.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	0%	5 días	lun 5/02/24	vie 9/02/24
150	6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	0%	6 días	lun 12/02/24	lun 19/02/24




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
151	6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON	0%	5 días	mar 20/02/24	lun 26/02/24
152	6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA	0%	2 días	mar 20/02/24	mié 21/02/24
153	**7**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**0%**	**10 días**	**vie 9/02/24**	**jue 22/02/24**
154	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	0%	10 días	vie 9/02/24	jue 22/02/24
155	7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST.	0%	8 días	vie 9/02/24	mar 20/02/24
156	**8**	**CUBIERTAS**	**38%**	**8 días**	**mié 17/01/24**	**vie 26/01/24**
157	8.1	LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 20 PARA TRAMPA DE GRASAS. INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA, MARCO METALICO DE SOPORTE, ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	0%	8 días	mié 17/01/24	vie 26/01/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24




Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
158	8.2	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA	100%	5 días	jue 18/01/24	mié 24/01/24
159	**9**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**0%**	**5 días**	**mar 30/01/2**	**lun 5/02/24**
160	9.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	0%	5 días	mar 30/01/24	lun 5/02/24
161	9.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	0%	5 días	mar 30/01/24	lun 5/02/24
162		**MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES**	**13%**	**33 días**	**mar 23/01/24**	**jue 7/03/24**
163	**1**	**PRELIMINARES**	**38%**	**15 días**	**mar 23/01/2**	**lun 12/02/24**
164	1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	100%	3 días	mar 23/01/24	jue 25/01/24
165	1.2	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	50%	3 días	mar 23/01/24	jue 25/01/24
166	1.3	DESMONTE DE BARANDAS METÁLICAS, INCLUYE RETIRO	0%	3 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24
167	1.4	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	0%	3 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24
168	**2**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0%**	**3 días**	**lun 12/02/24**	**mié 14/02/2**

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
169	2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	0%	3 días	lun 12/02/24	mié 14/02/24
170	2.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A	0%	3 días	lun 12/02/24	mié 14/02/24
171	2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	0%	2 días	lun 12/02/24	mar 13/02/24

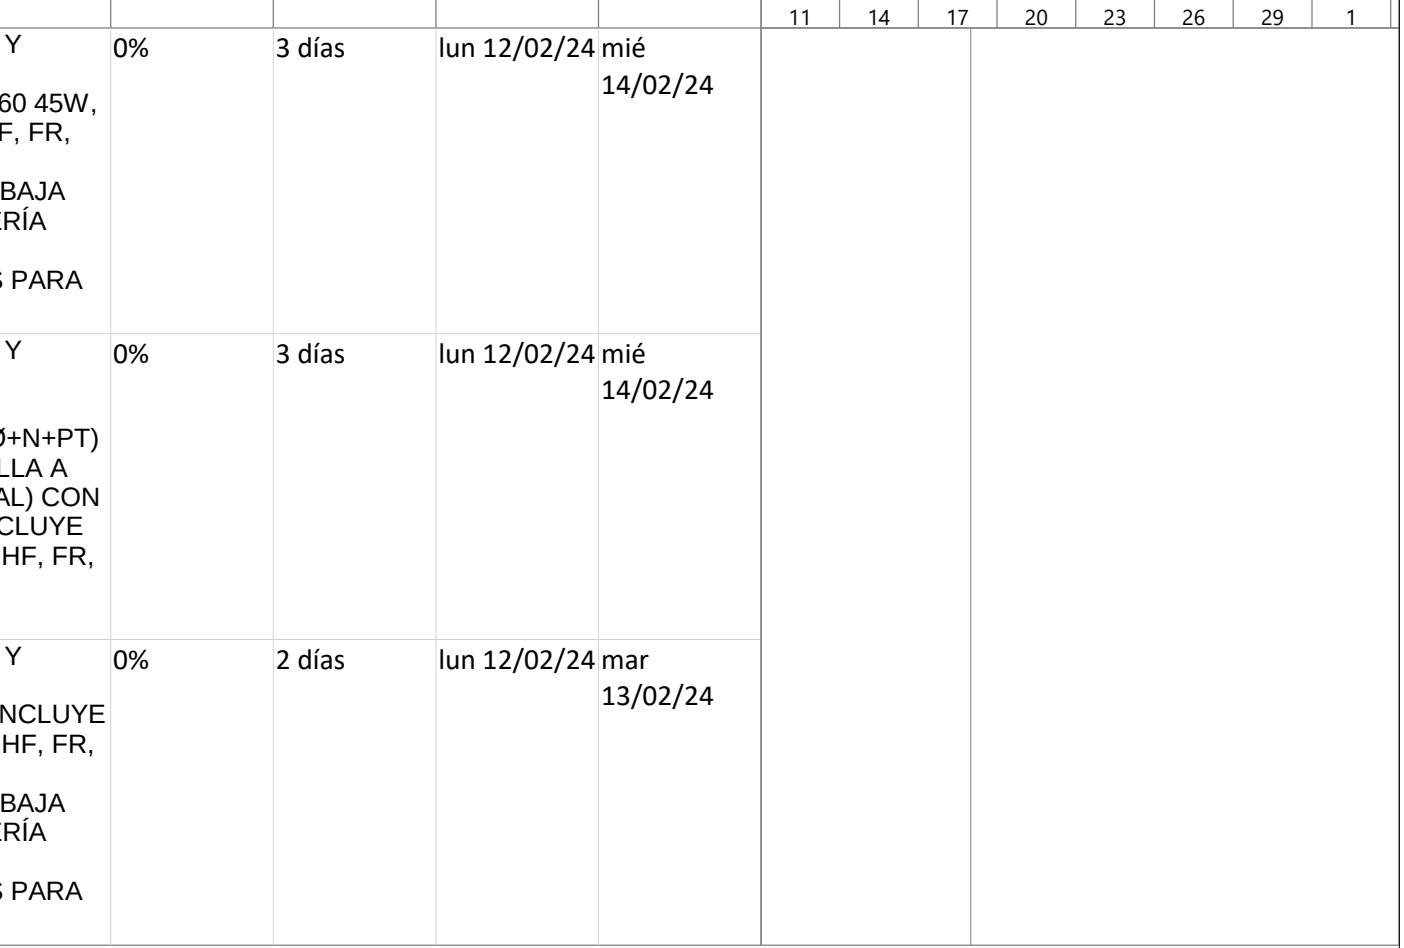


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
172	**3**	**PAÑETES**	**8%**	**30 días**	**vie 26/01/24**	**jue 7/03/24**
173	3.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	0%	1 día	mié 14/02/24	mié 14/02/24
174	**4**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**18%**	**30 días**	**vie 26/01/24**	**jue 7/03/24**
175	4.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	100%	3 días	vie 26/01/24	mar 30/01/24
176	4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	0%	6 días	mié 7/02/24	mié 14/02/24
177	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	5%	6 días	jue 29/02/24	jue 7/03/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24



Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
178	4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO	0%	3 días	mar 13/02/24	jue 15/02/24
179	**5**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**0%**	**4 días**	**mar 13/02/24**	**vie 16/02/24**
180	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	0%	2 días	mar 13/02/24	mié 14/02/24
181	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO,	0%	2 días	mar 13/02/24	mié 14/02/24
182	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	0%	2 días	jue 15/02/24	vie 16/02/24
183	**6**	**CARPINTERIA METALICA**	**0%**	**3 días**	**jue 15/02/24**	**lun 19/02/24**

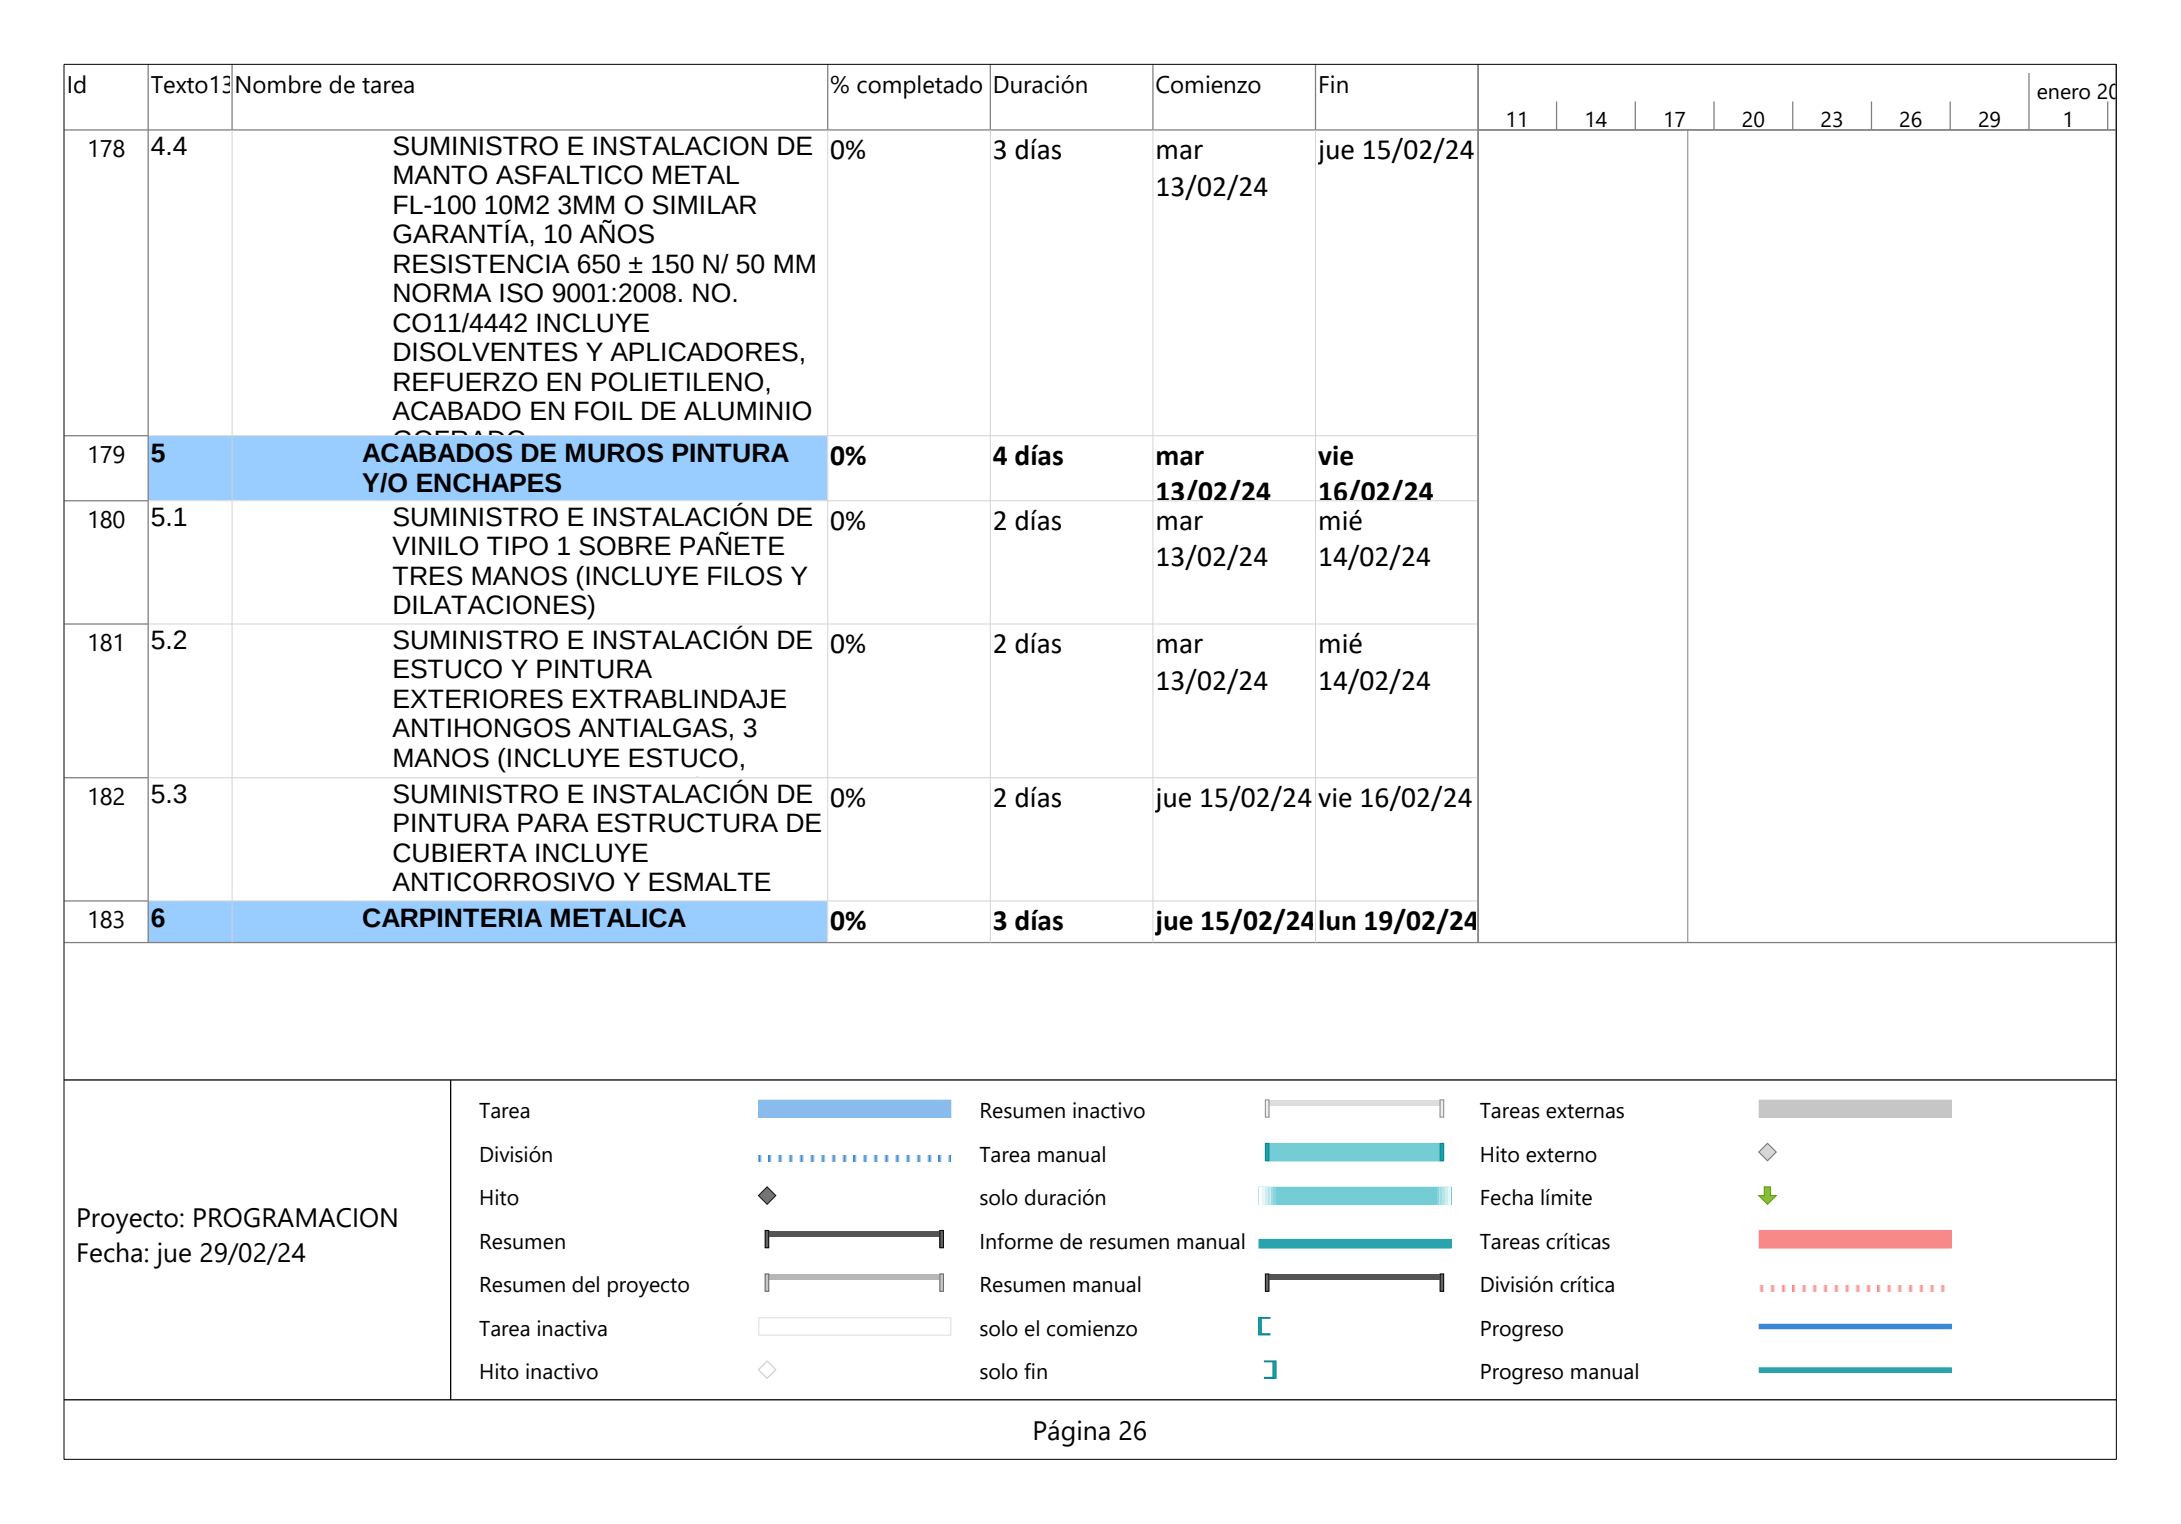


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
184	6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	0%	3 días	jue 15/02/24	lun 19/02/24
185	**7**	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**0%**	**1 día**	**mar 13/02/24**	**mar 13/02/24**
186	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	0%	1 día	mar 13/02/24	mar 13/02/24
187	**8**	**CUBIERTAS**	**0%**	**8 días**	**mar 6/02/24**	**jue 15/02/24**
188	8.1	MANTENIMIENTO A CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS DE SUJECCION DE TEJA EN LAMINA ONDULADA EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE TRAXX 3 CON ARANDELA DE GOMA, ALINEACION DE TEJAS CORRIDAS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y APLI	0%	8 días	mar 6/02/24	jue 15/02/24
189	**9**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**0%**	**2 días**	**jue 15/02/24**	**vie 16/02/24**
190	9.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	0%	2 días	jue 15/02/24	vie 16/02/24
191	9.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	0%	2 días	jue 15/02/24	vie 16/02/24




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24




Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
192		**MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA**	**0%**	**24 días**	**mié 14/02/24**	**sáb 16/03/24**
193	**1**	**PRELIMINARES**	**0%**	**7 días**	**mié 14/02/24**	**jue 22/02/24**
194	1.1	CAMPAMENTO DE 18 M2	0%	3 días	mié 14/02/24	vie 16/02/24
195	1.2	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	0%	2 días	mié 14/02/24	jue 15/02/24
196	1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	0%	2 días	jue 15/02/24	vie 16/02/24
197	1.4	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	0%	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24
198	1.5	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	0%	2 días	mié 21/02/24	jue 22/02/24
199	**2**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0%**	**17 días**	**vie 16/02/24**	**lun 11/03/24**
200	2.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	0%	9 días	vie 16/02/24	mié 28/02/24
201	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	0%	3 días	jue 29/02/24	lun 4/03/24



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24



Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
202	2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA	0%	5 días	mar 5/03/24	lun 11/03/24
203	2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A	0%	4 días	vie 16/02/24	mié 21/02/24
204	2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON	0%	3 días	vie 16/02/24	mar 20/02/24
205	**3**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**0%**	**3 días**	**lun 19/02/24**	**mié 21/02/24**
206	3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	0%	3 días	lun 19/02/24	mié 21/02/24
207	**4**	**CARPINTERIA METALICA**	**0%**	**5 días**	**mié 21/02/2**	**mar 27/02/2**
208	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	0%	5 días	mié 21/02/24	mar 27/02/24




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Texto13	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
209	**5**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**0%**	**4 días**	**vie 23/02/24**	**mié 28/02/24**
210	5.1	VENTANA EN ALUMINIO CRUDO Y VIDRIO AZUL LAKE DE 6MM DE CORREDERA	0%	4 días	vie 23/02/24	mié 28/02/24
211	**6**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**0%**	**5 días**	**mar 12/03/2**	**sáb 16/03/24**
212	6.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	0%	4 días	mié 13/03/24	sáb 16/03/24
213	6.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	0%	5 días	mar 12/03/24	sáb 16/03/24




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24






Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

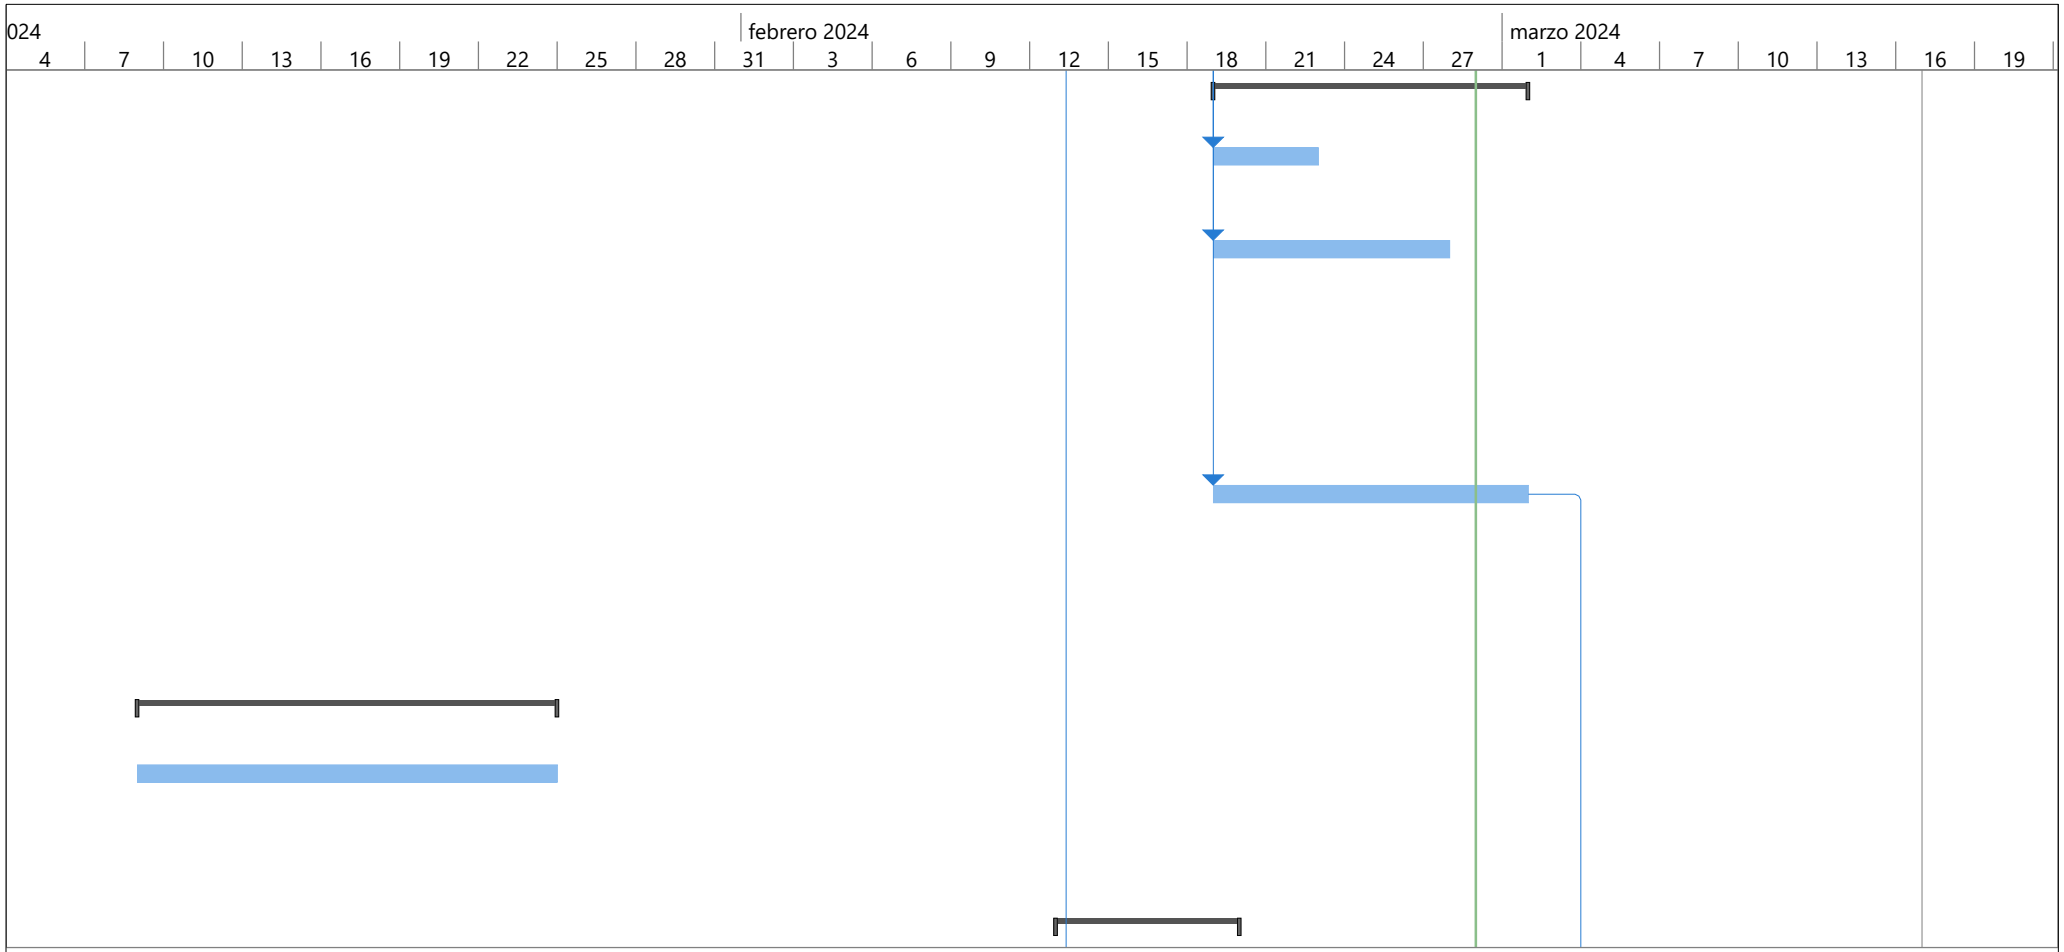

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

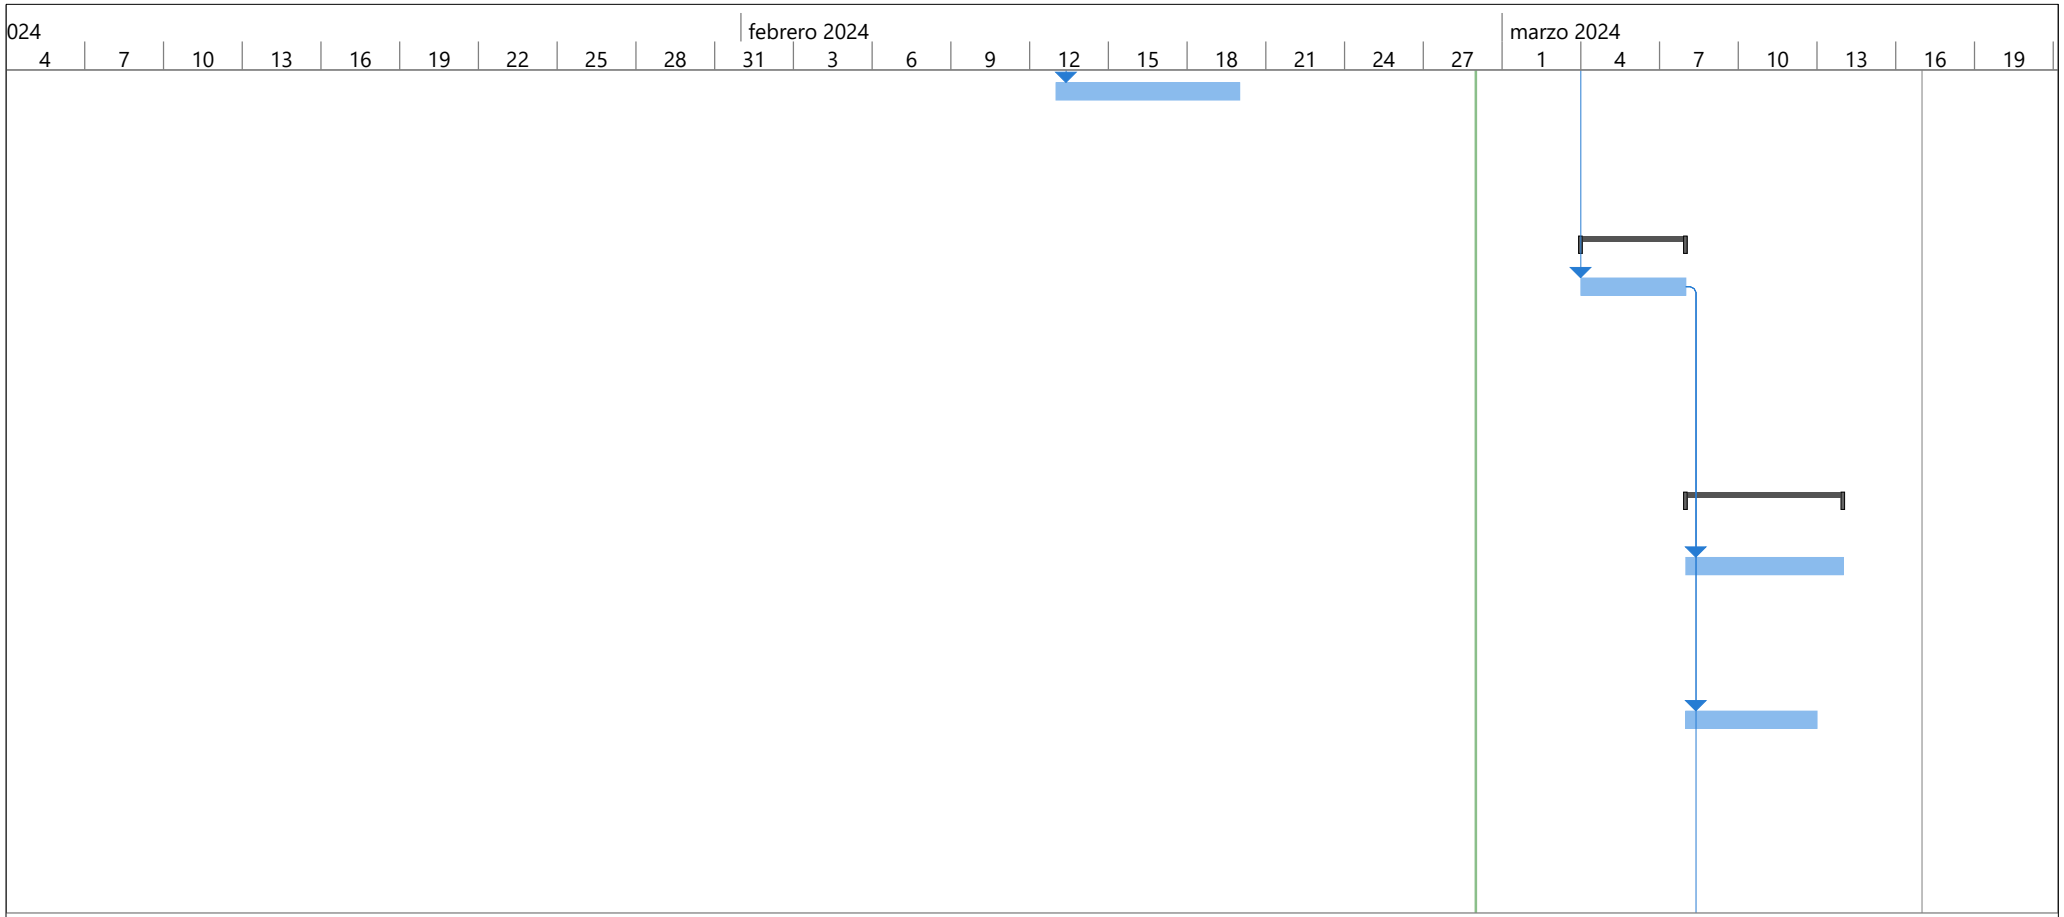


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

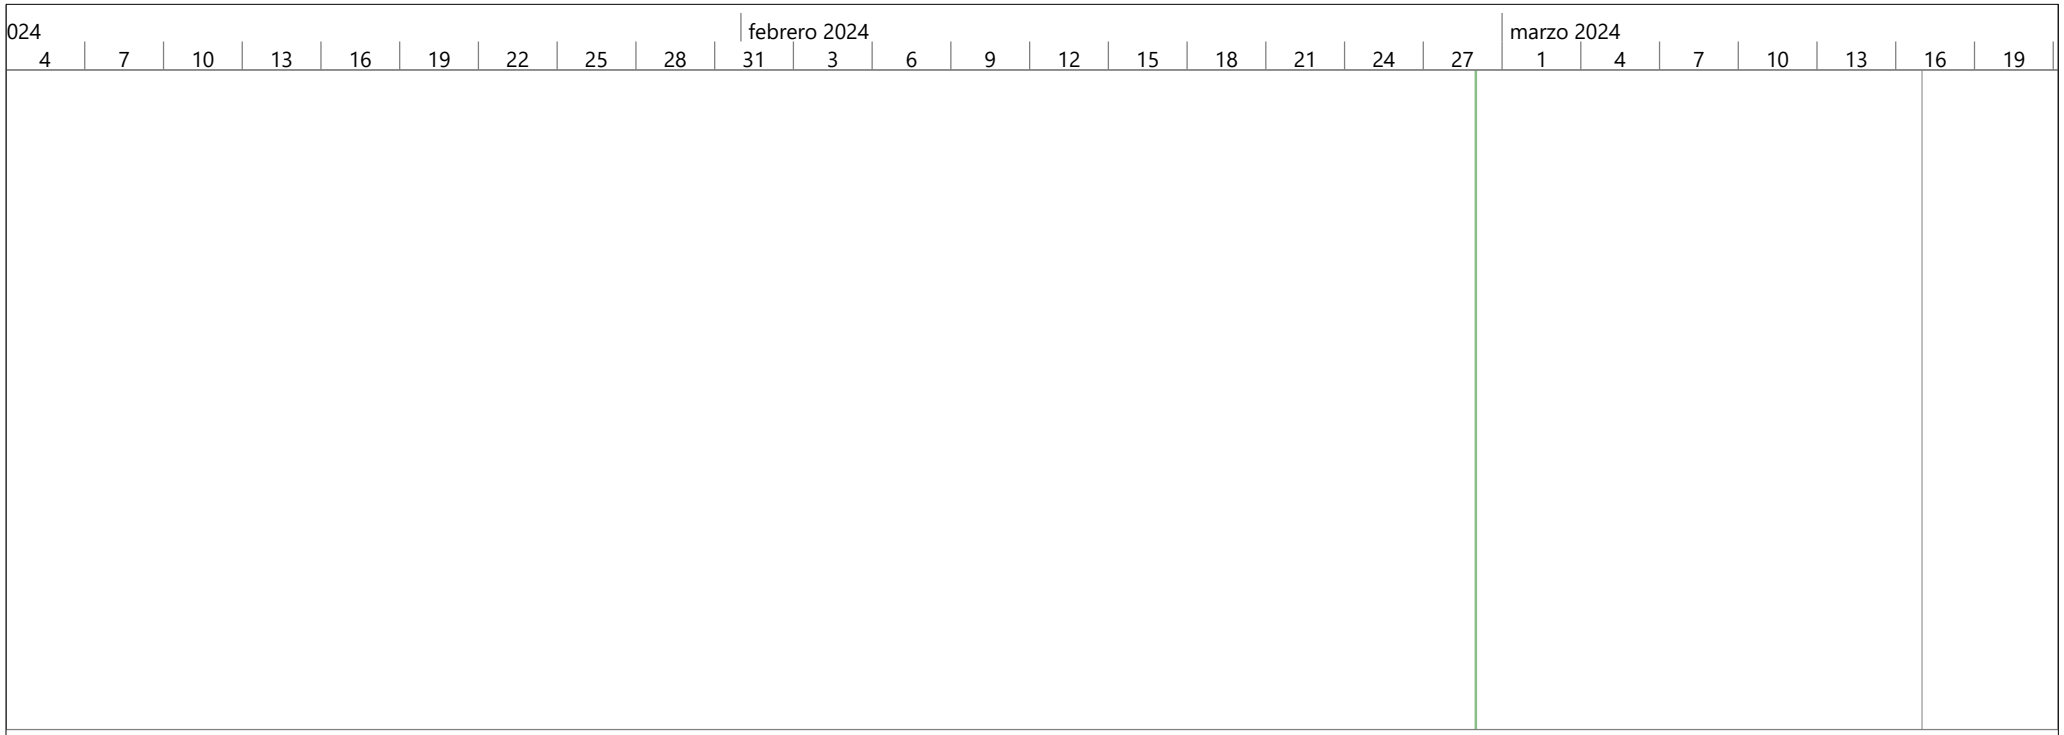

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

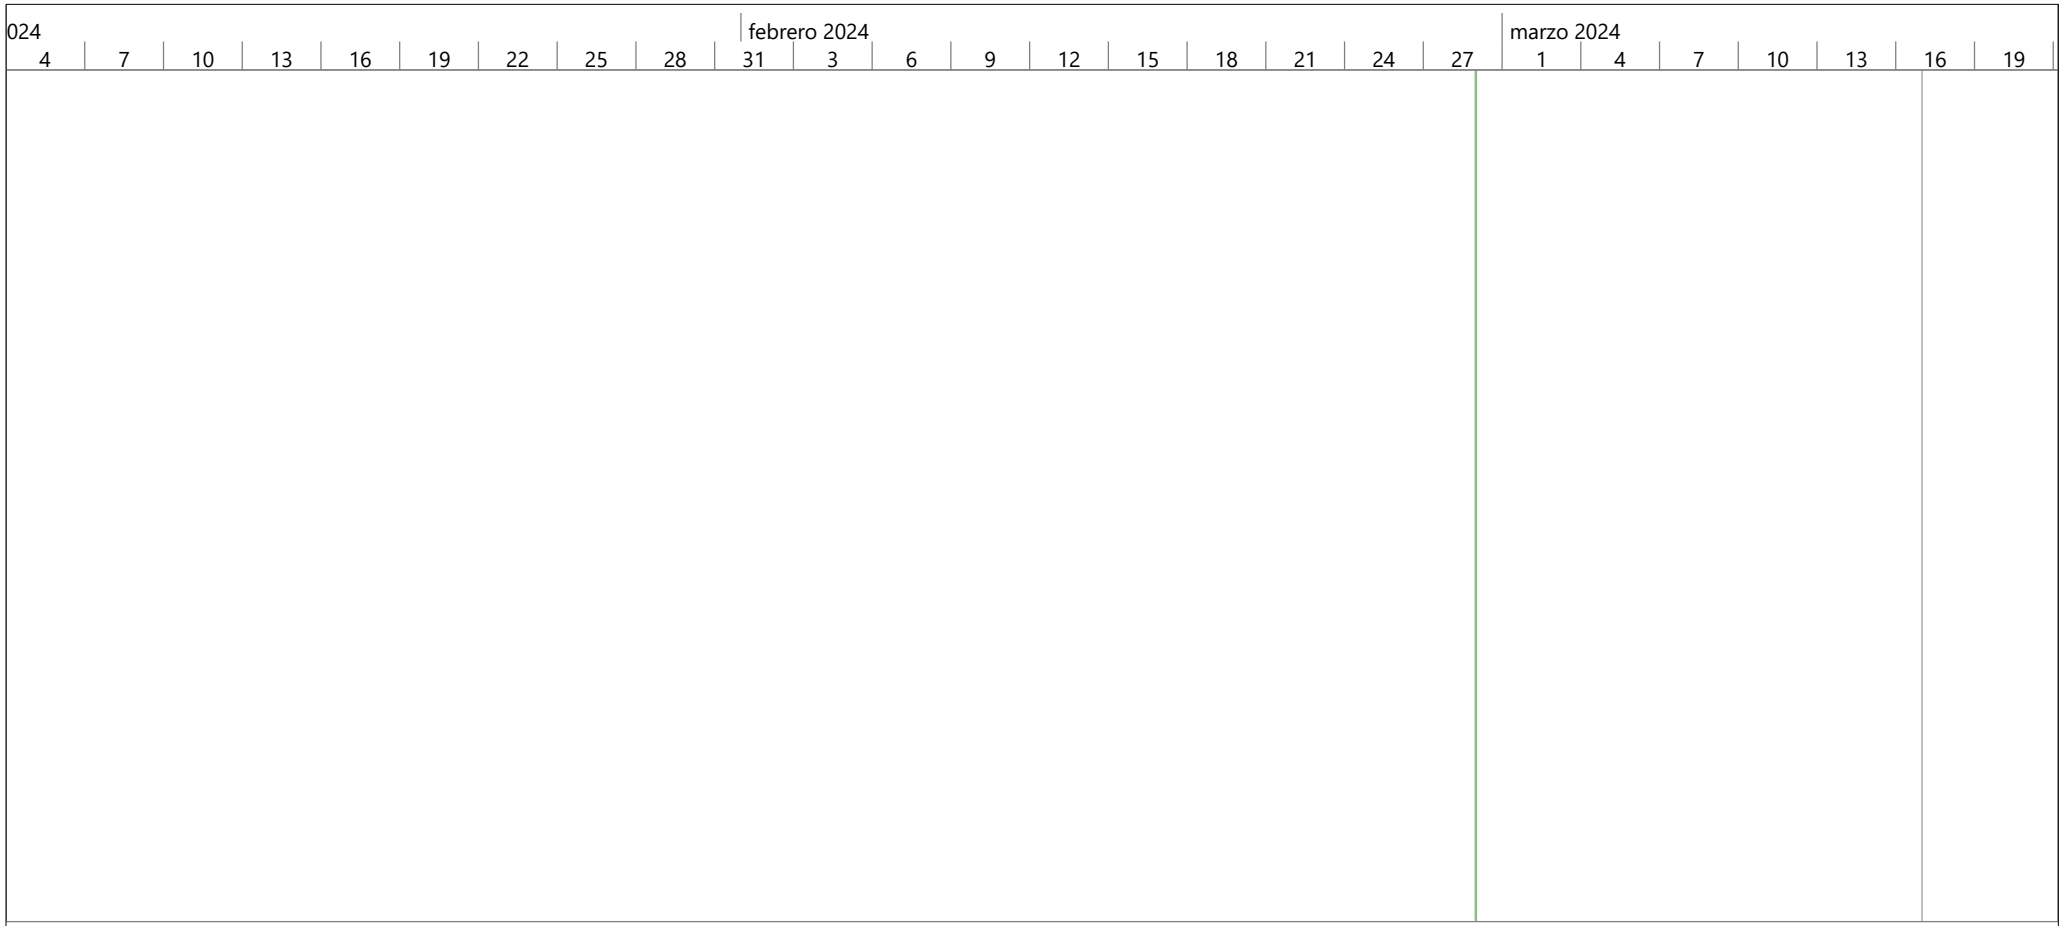

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

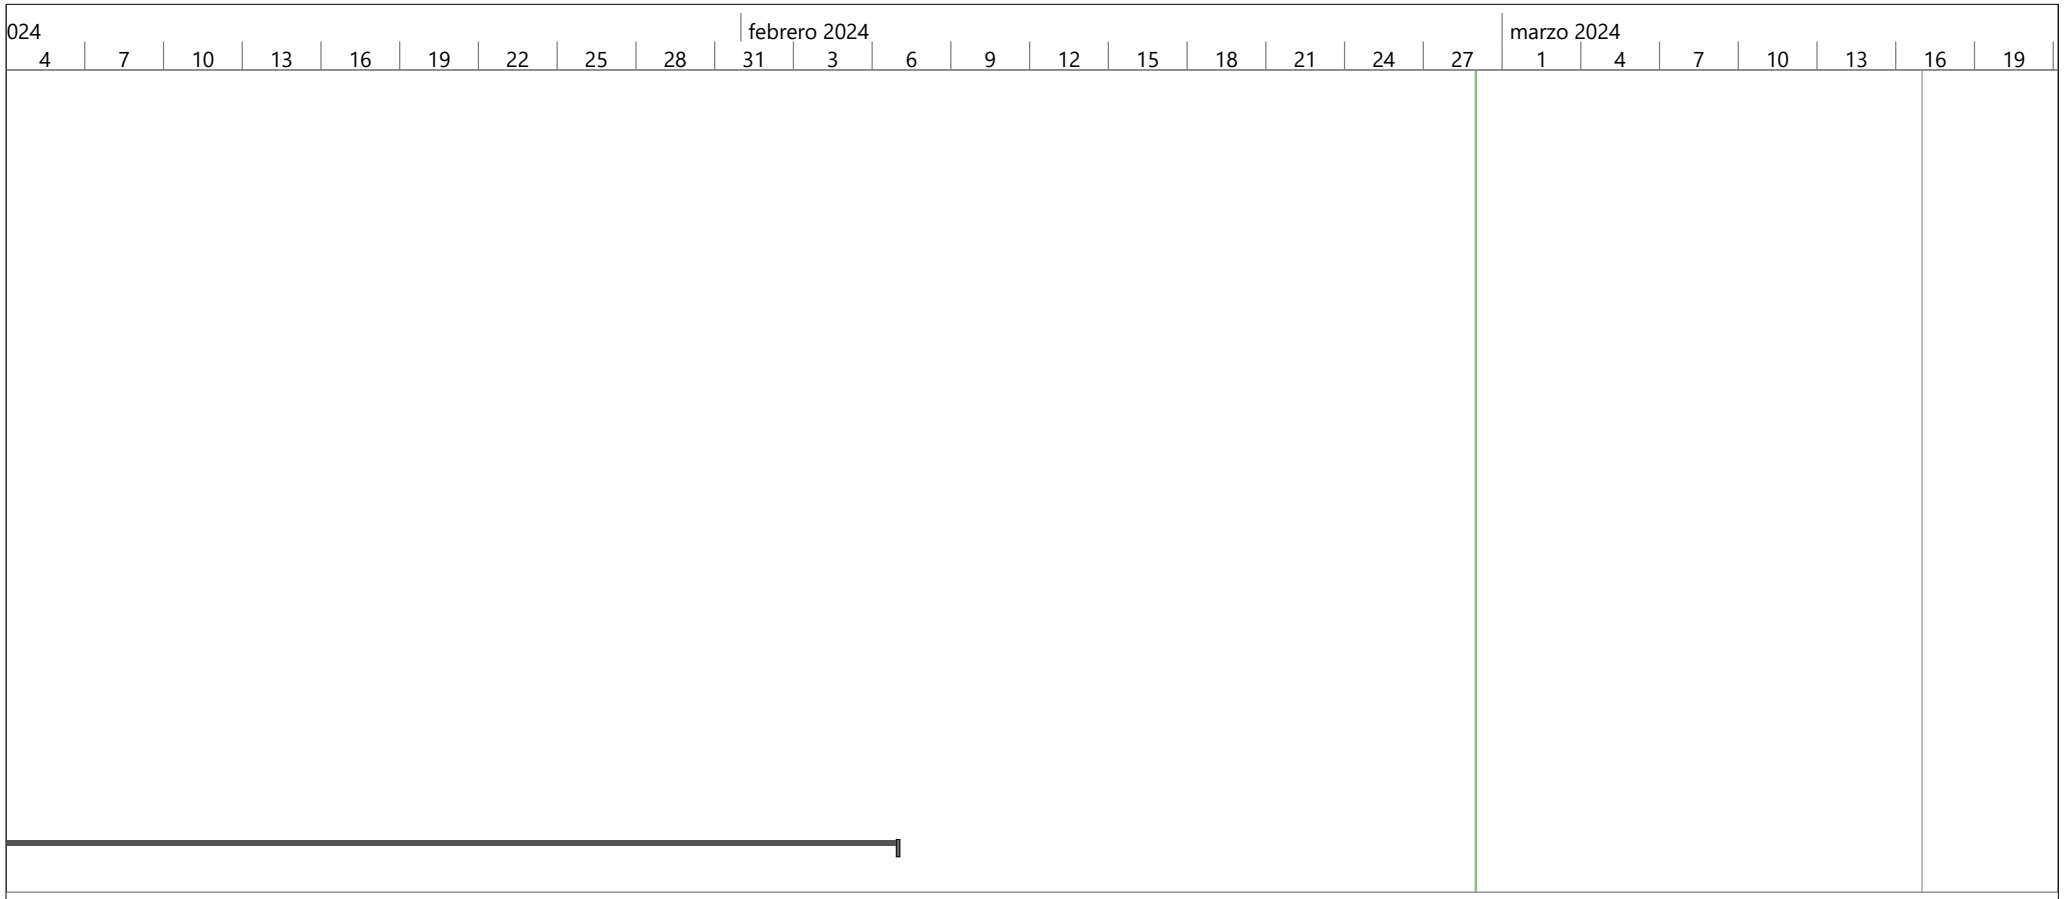


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

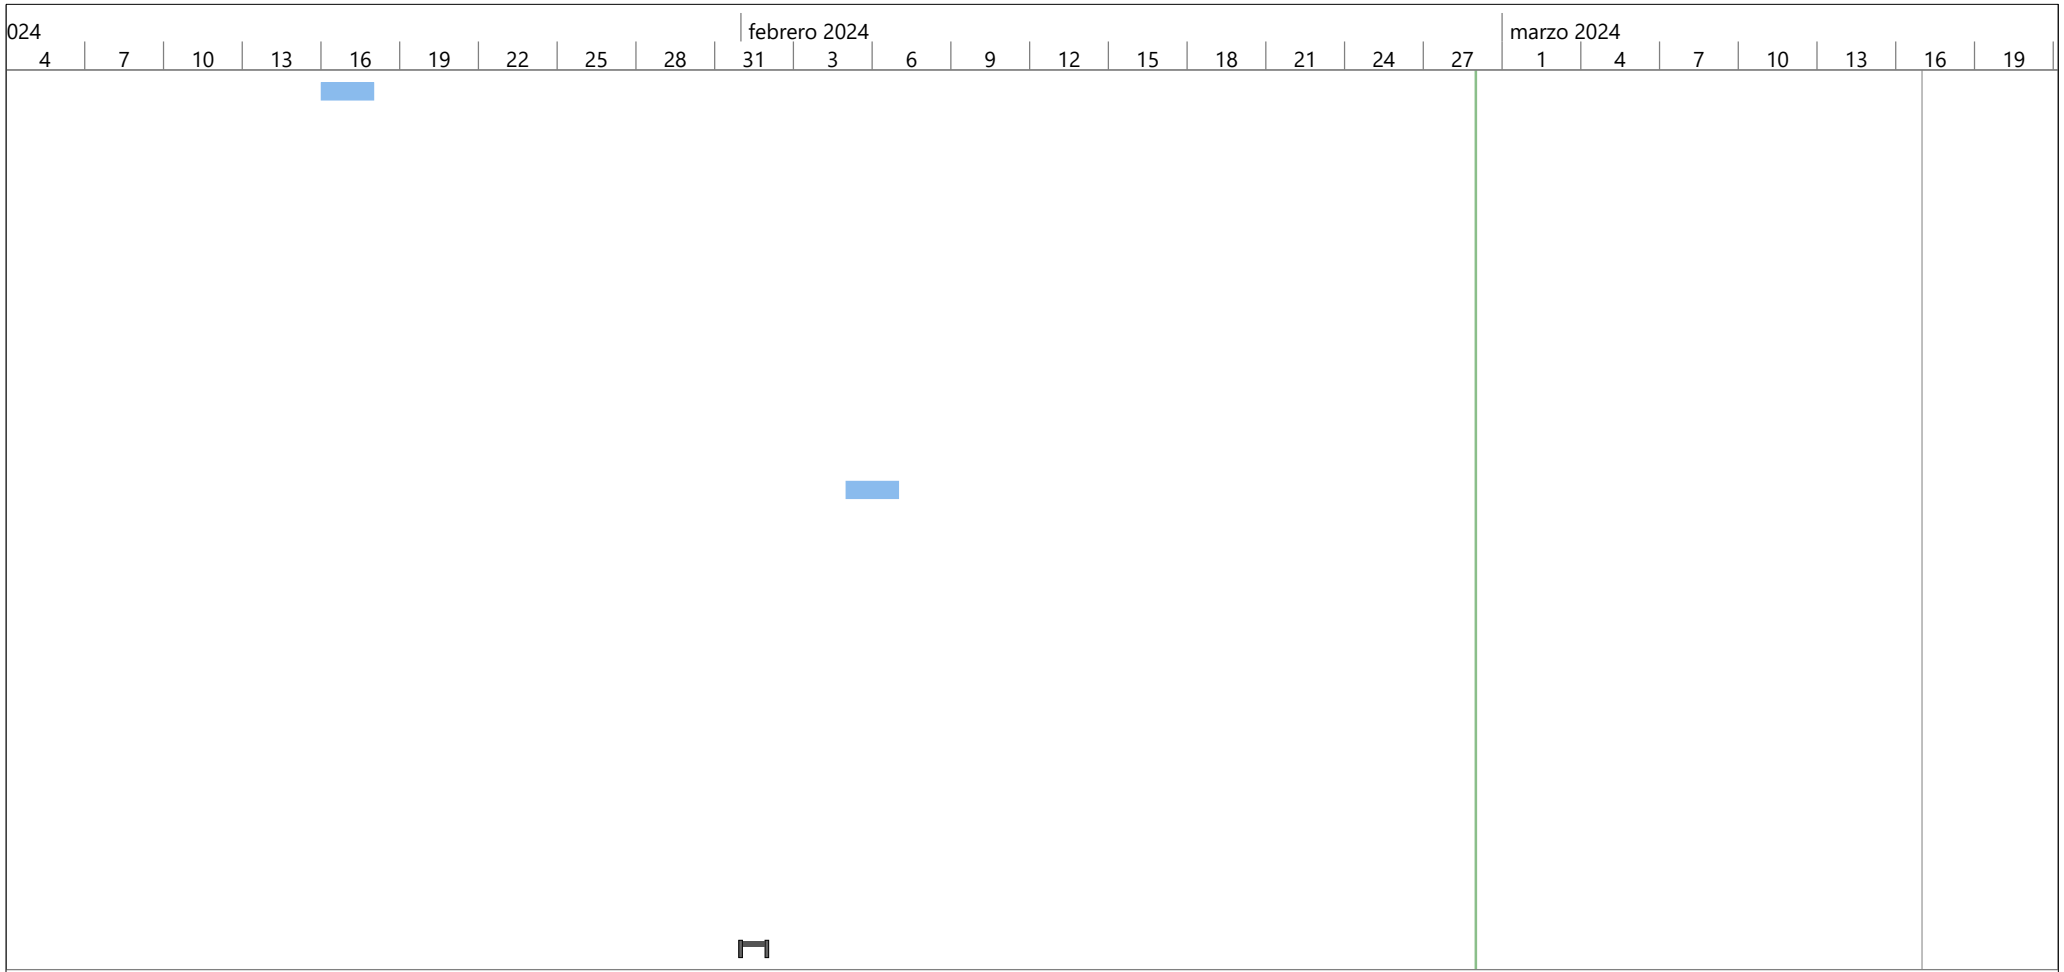


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

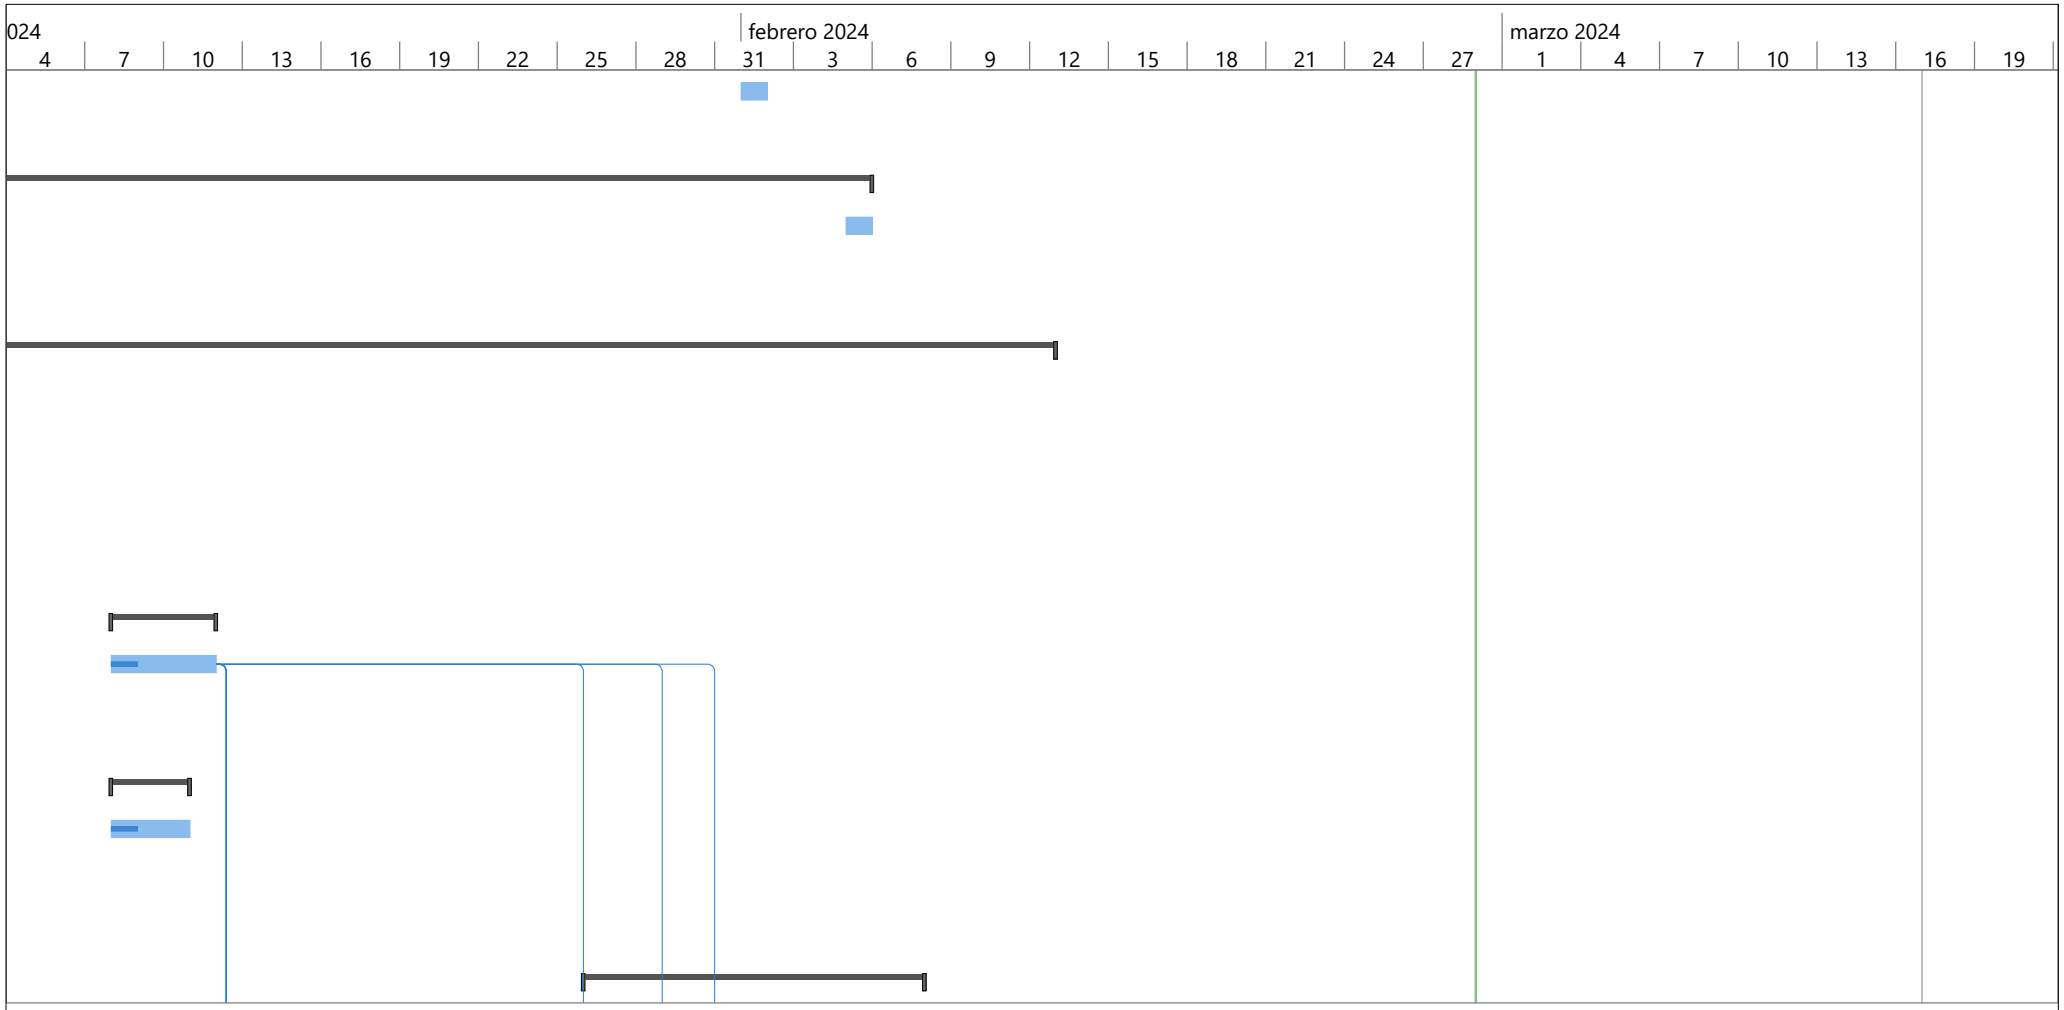


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

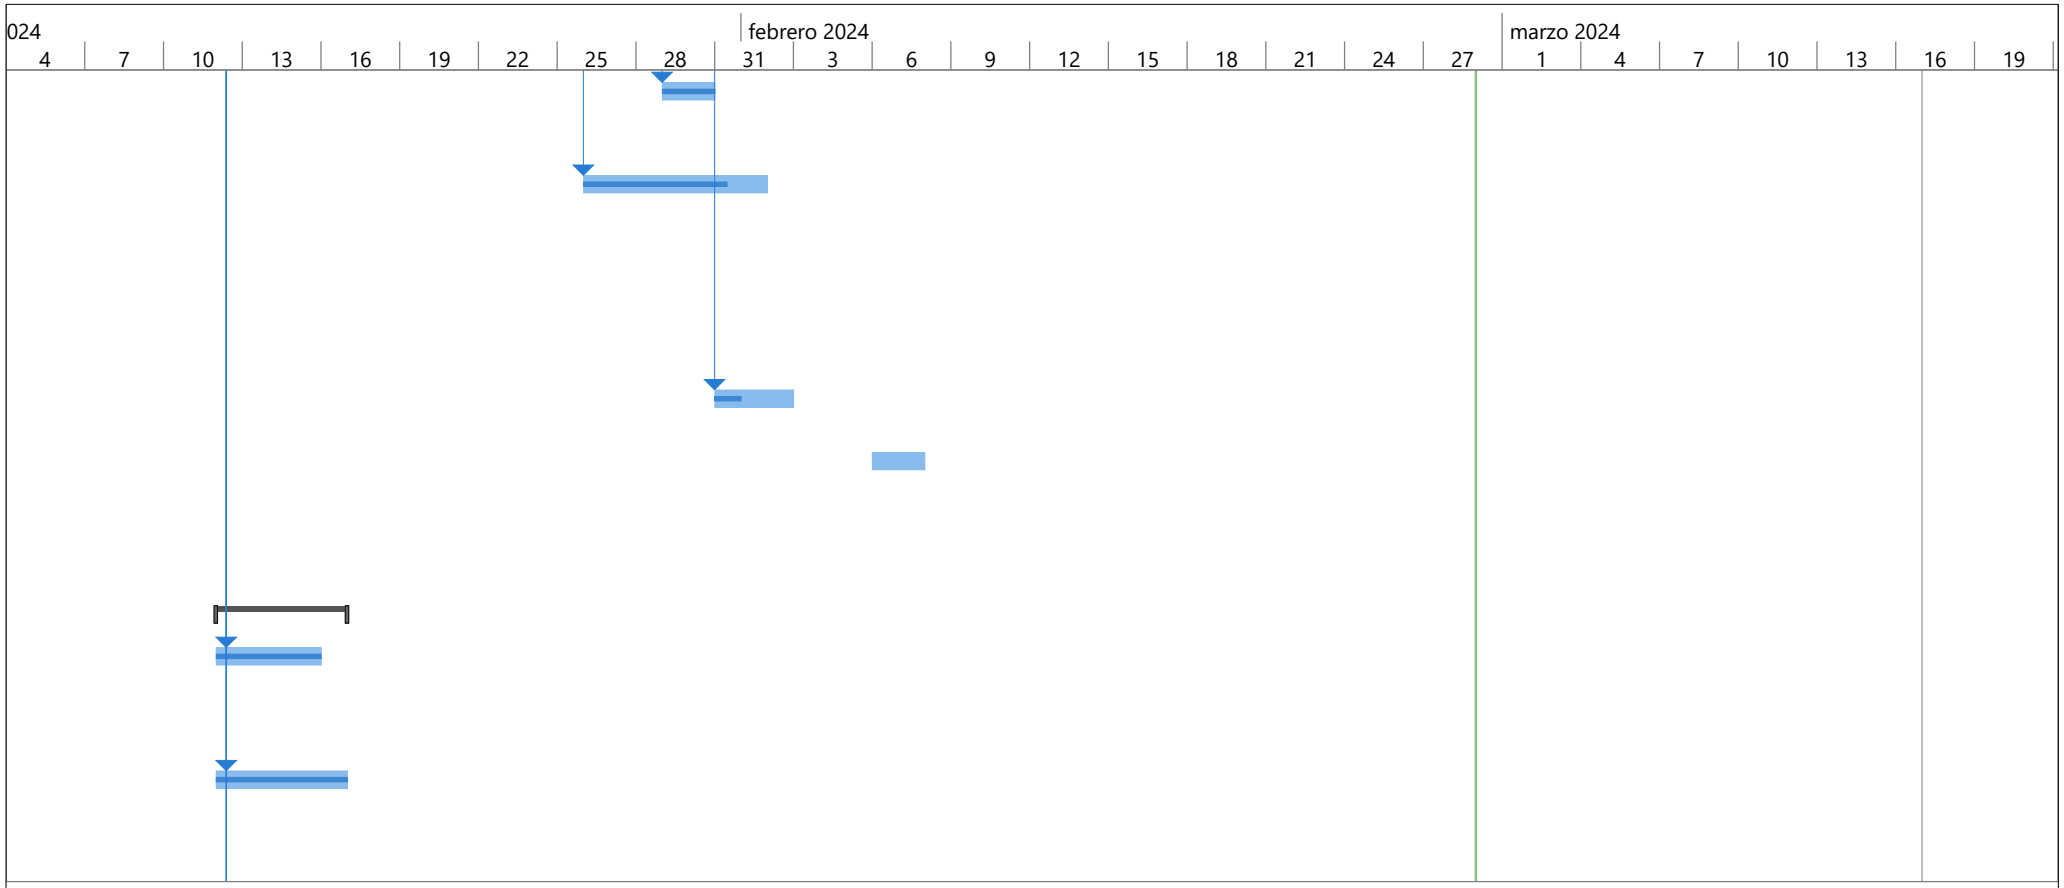


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

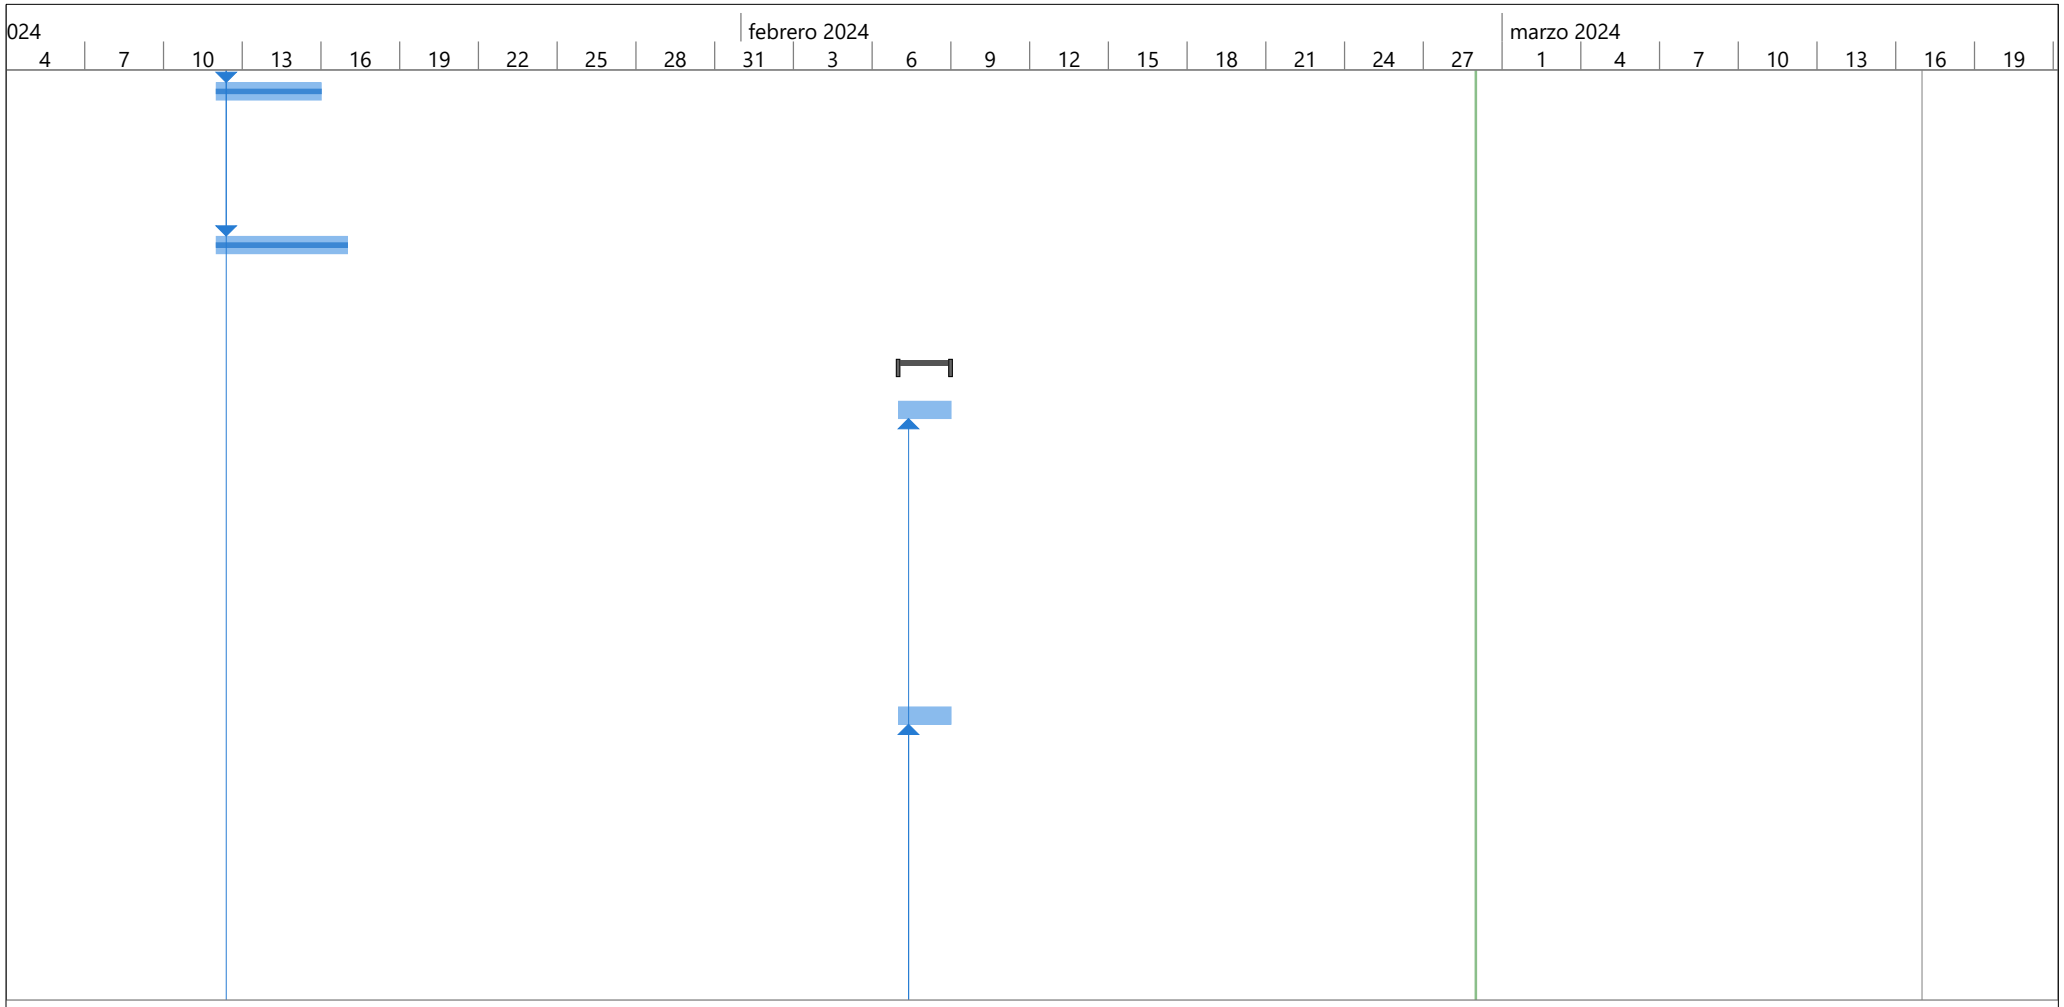


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

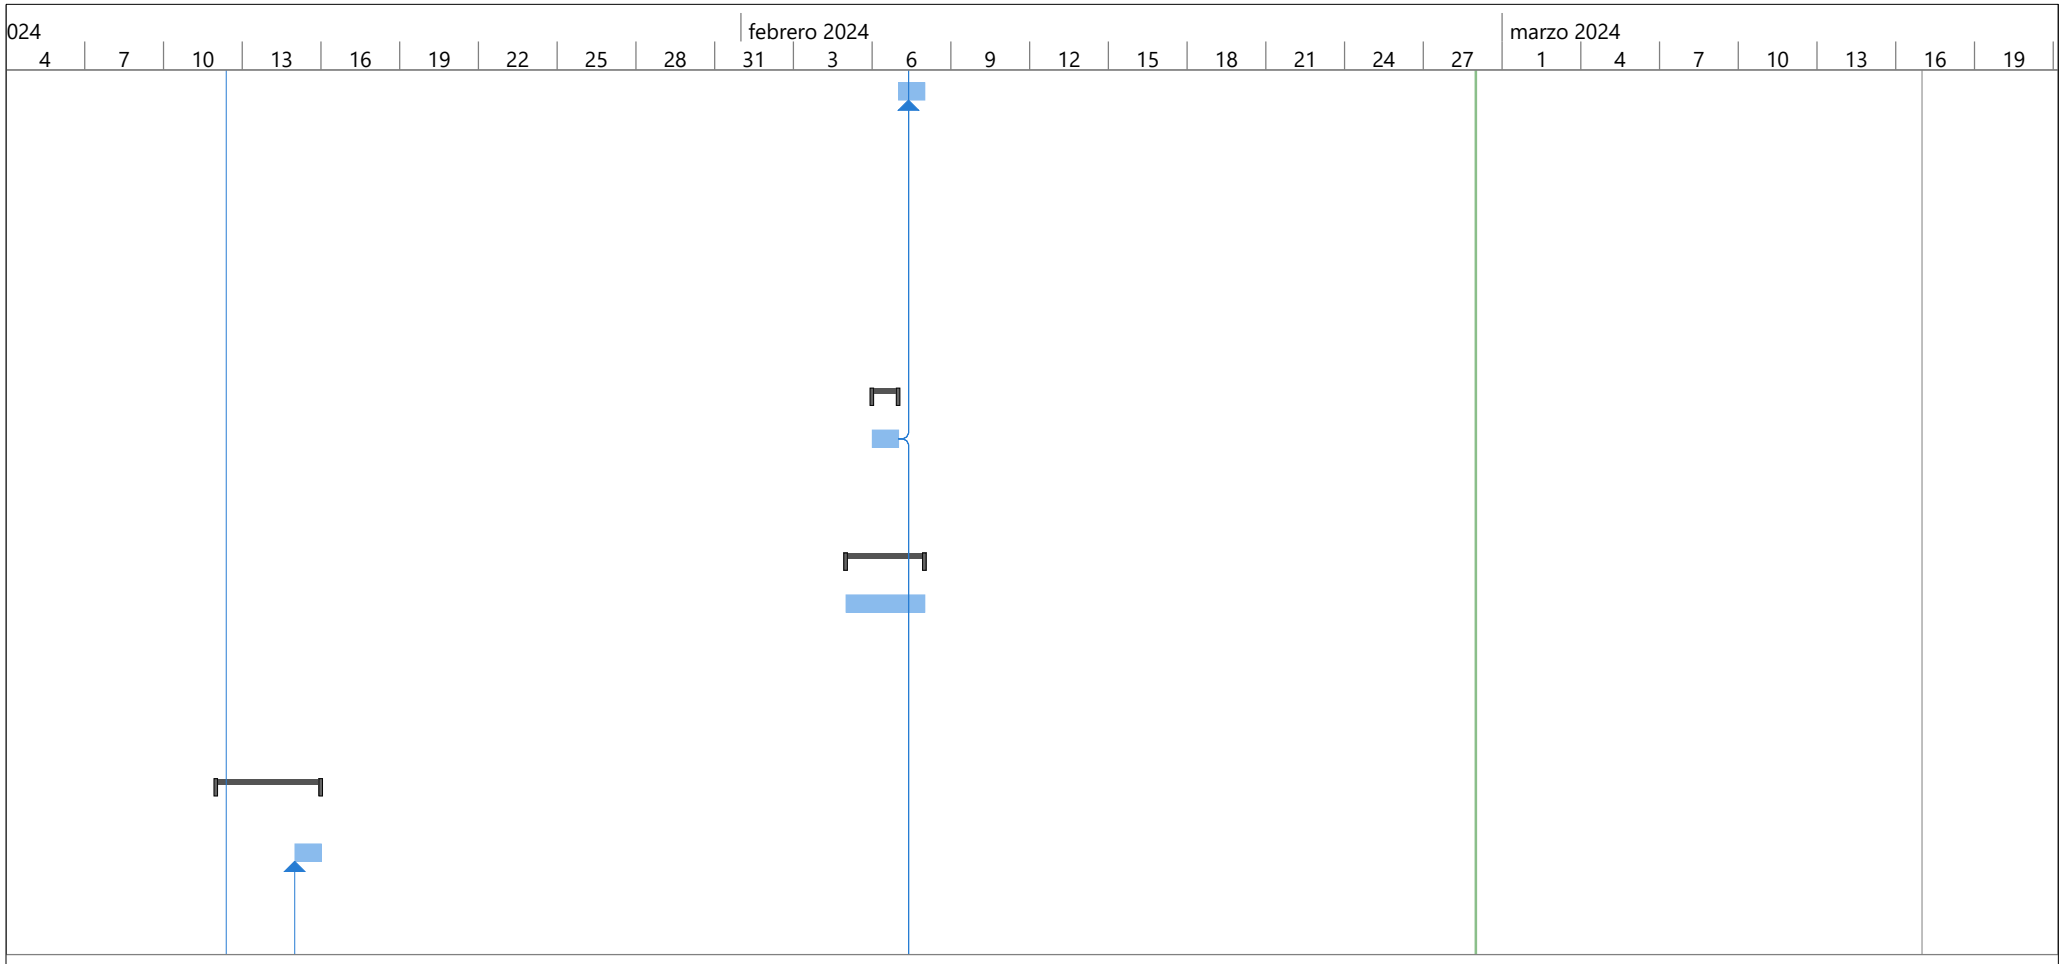


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

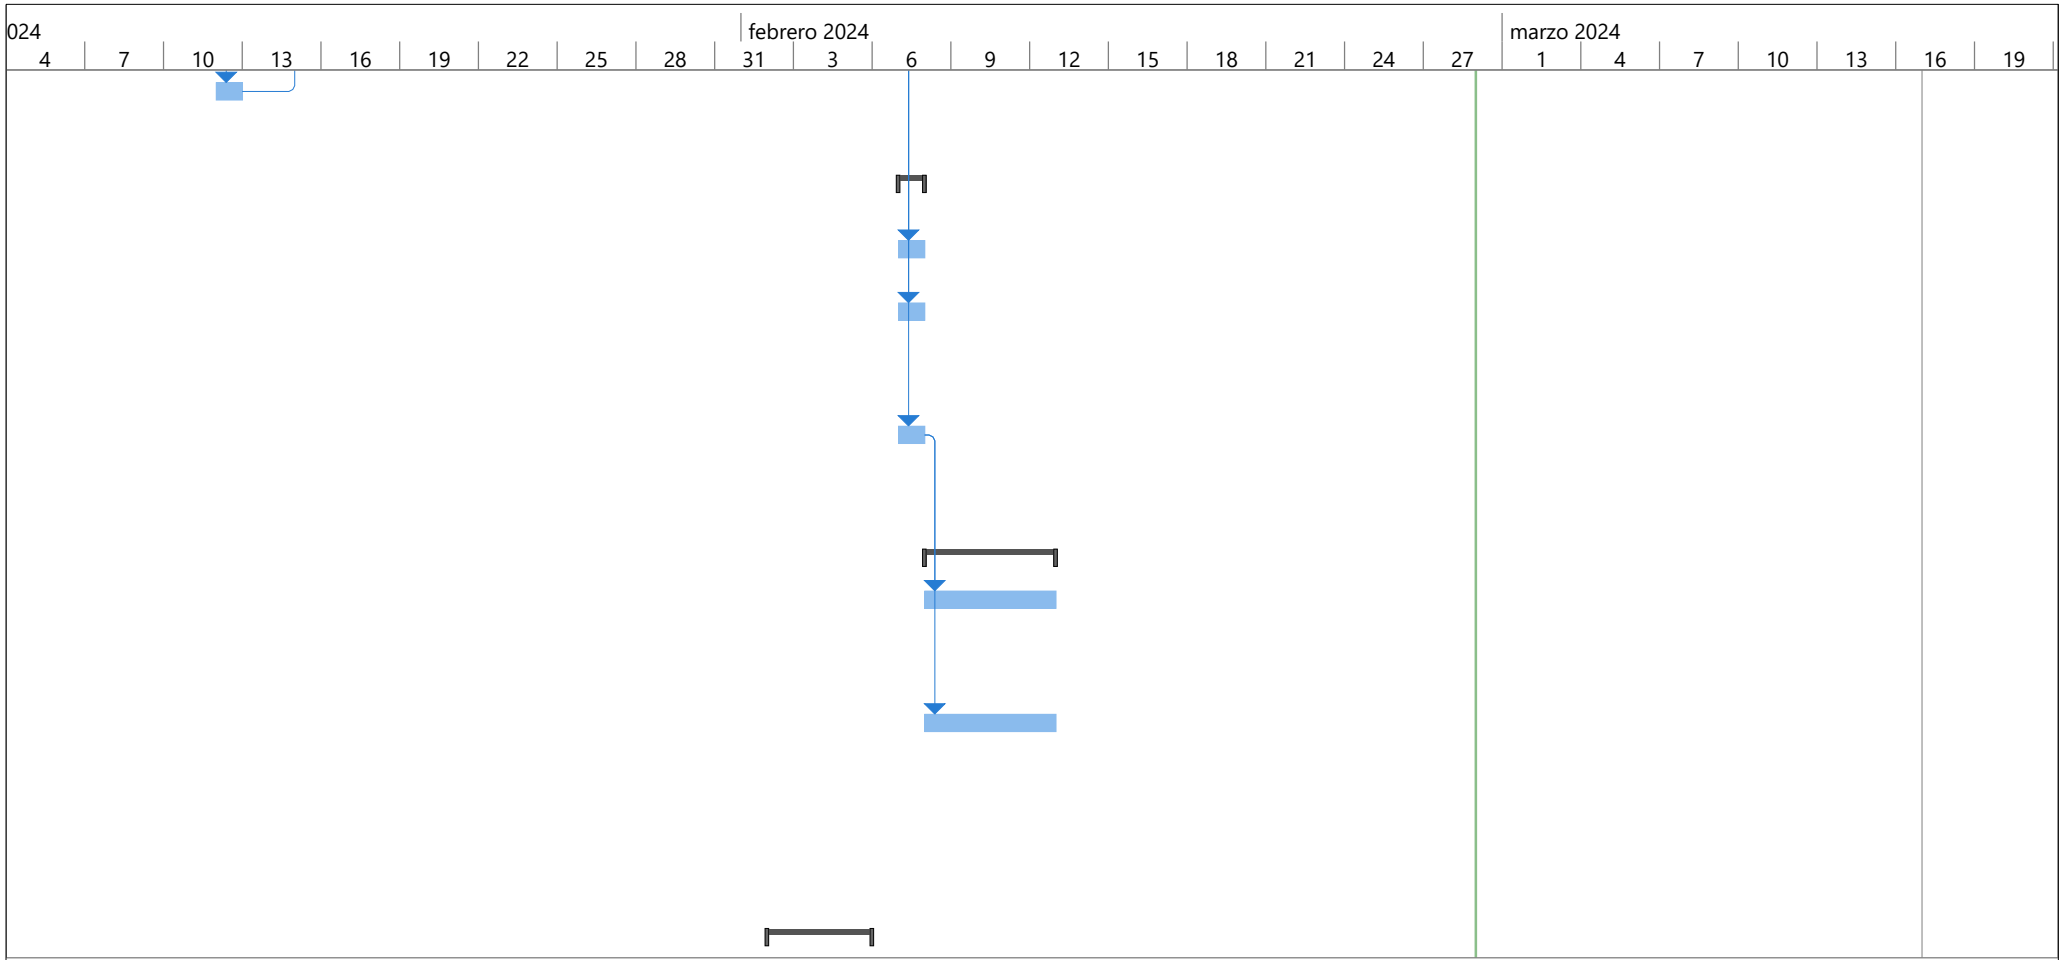


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

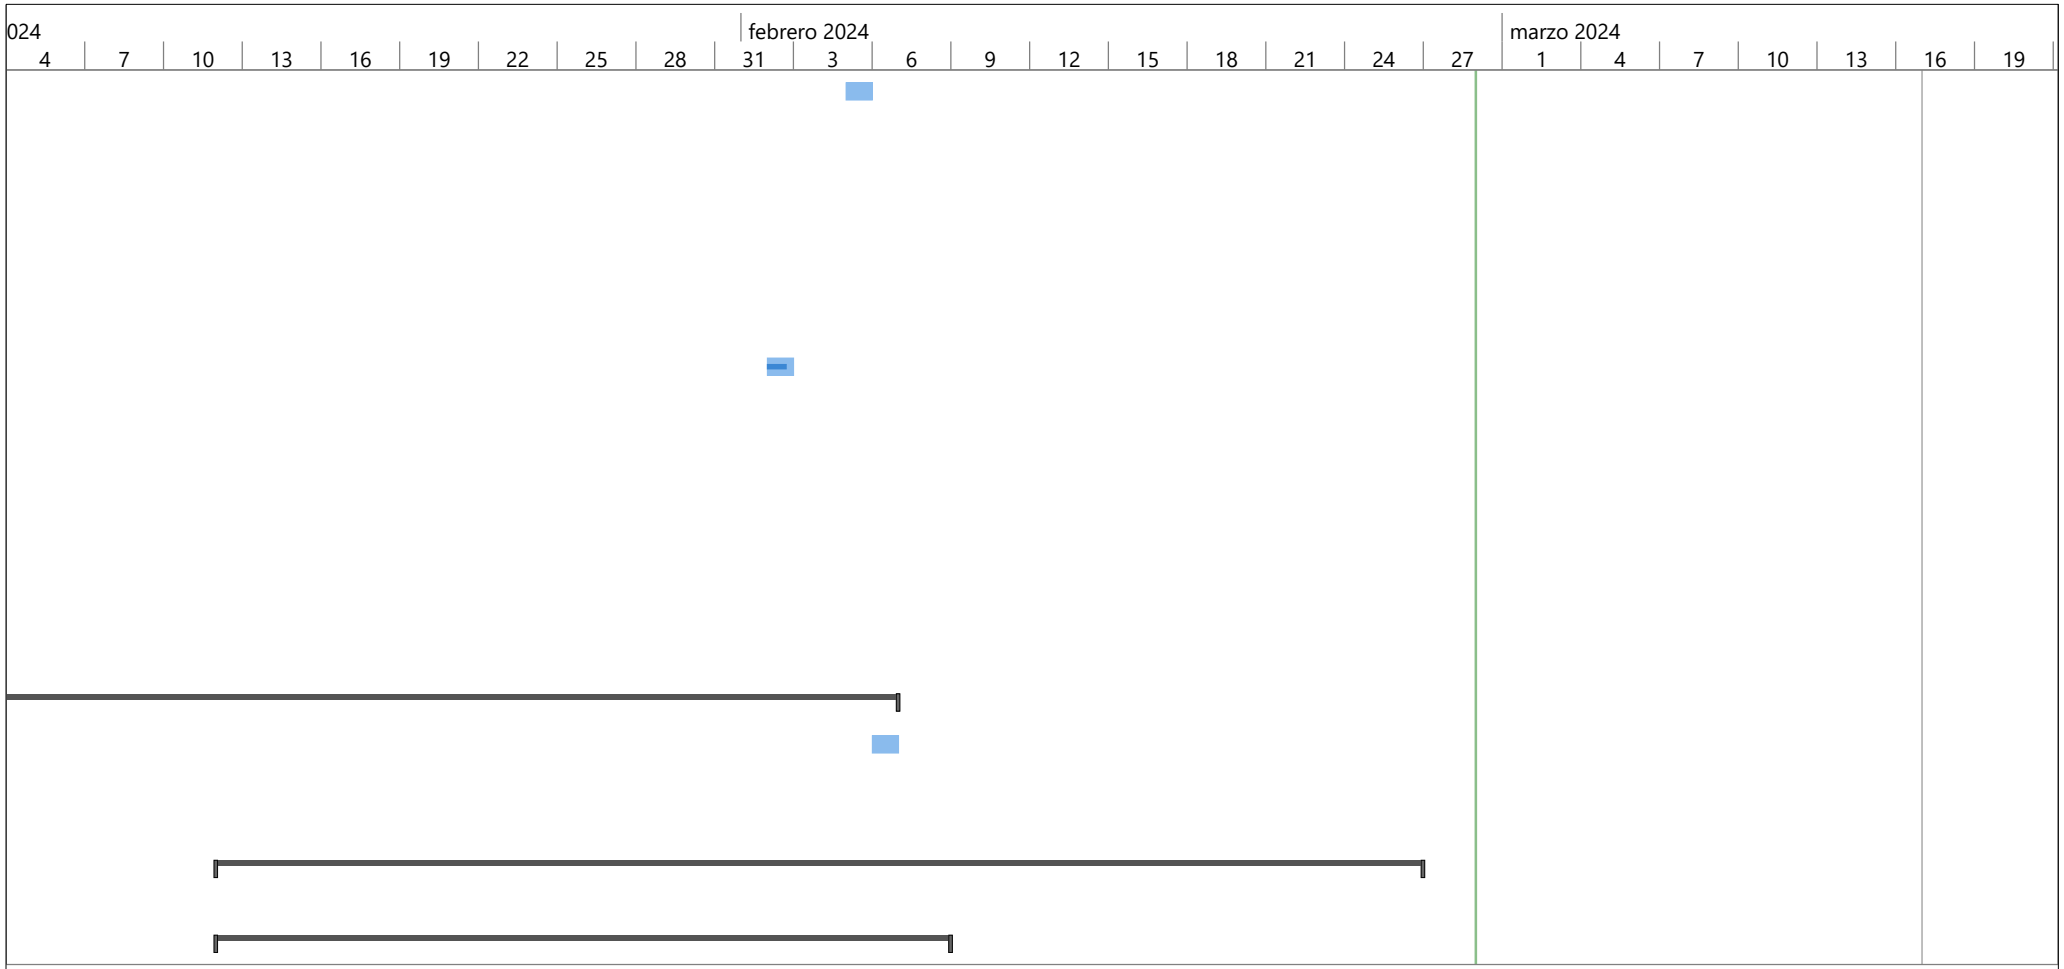


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

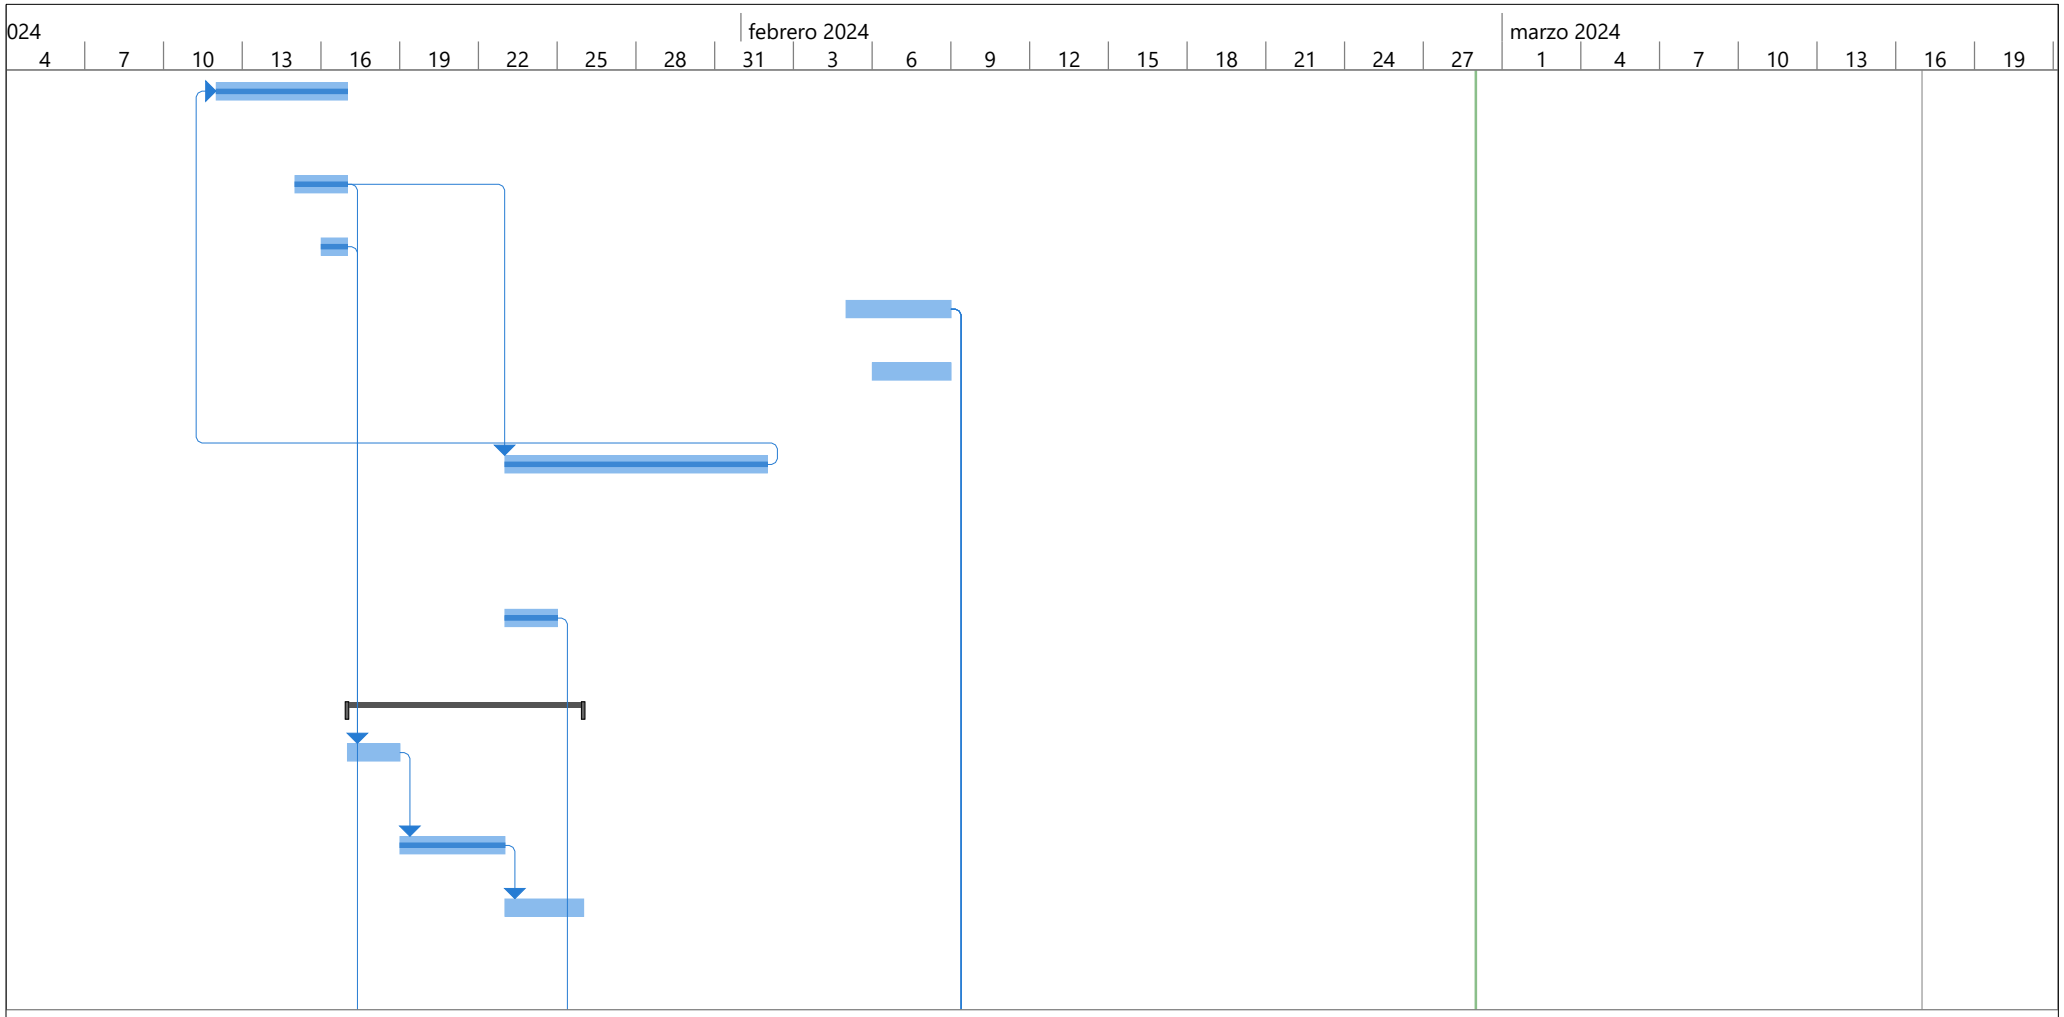


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

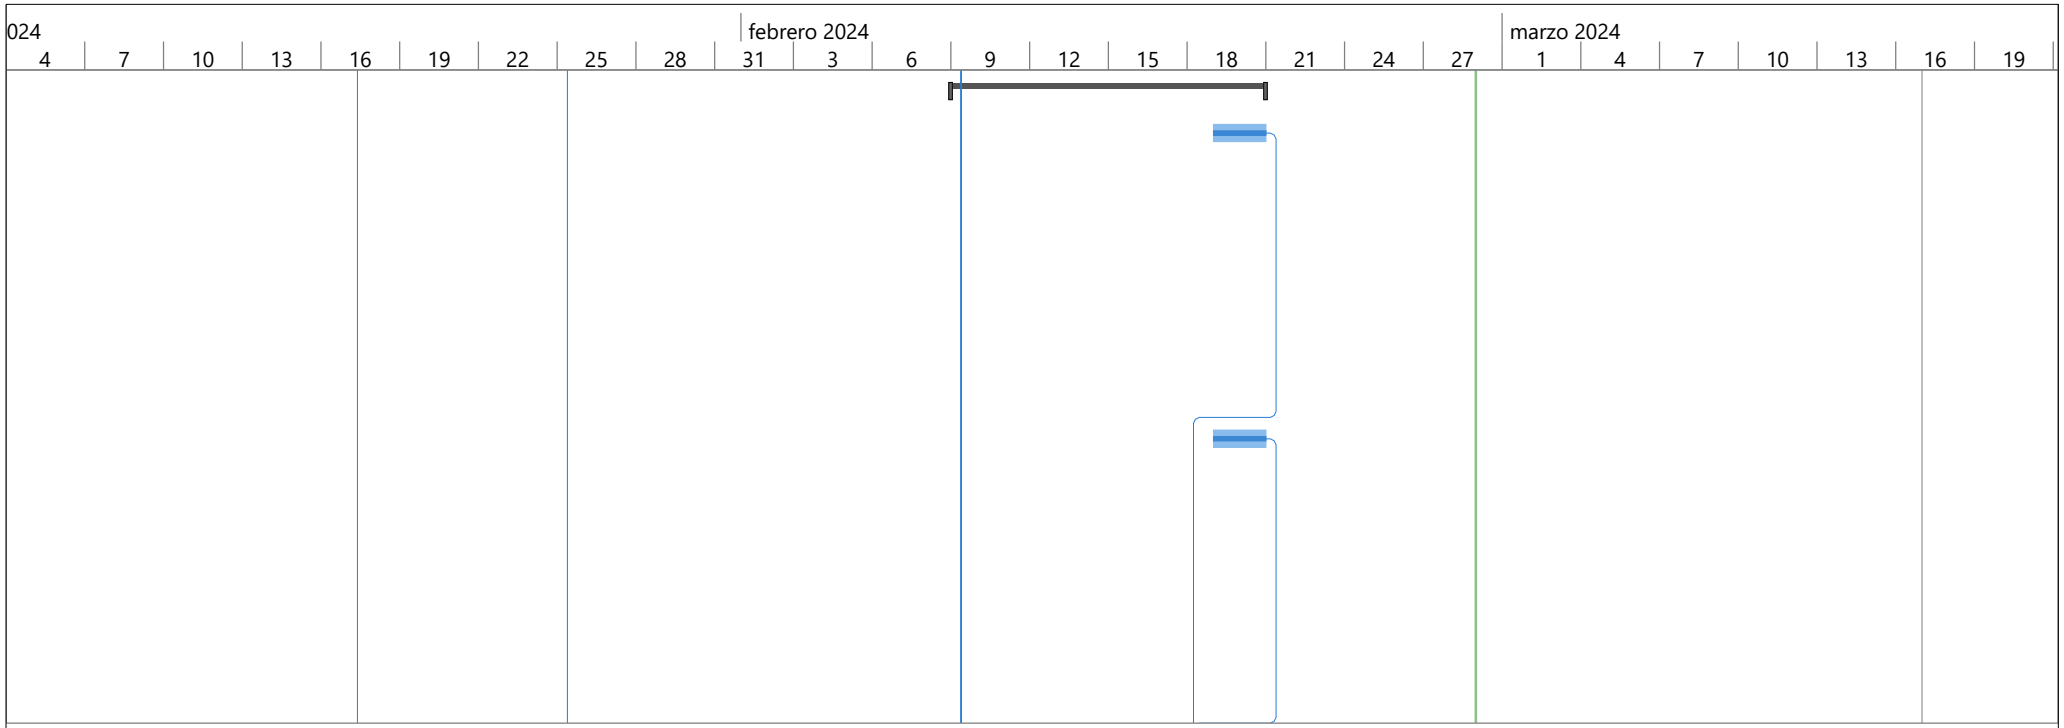


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

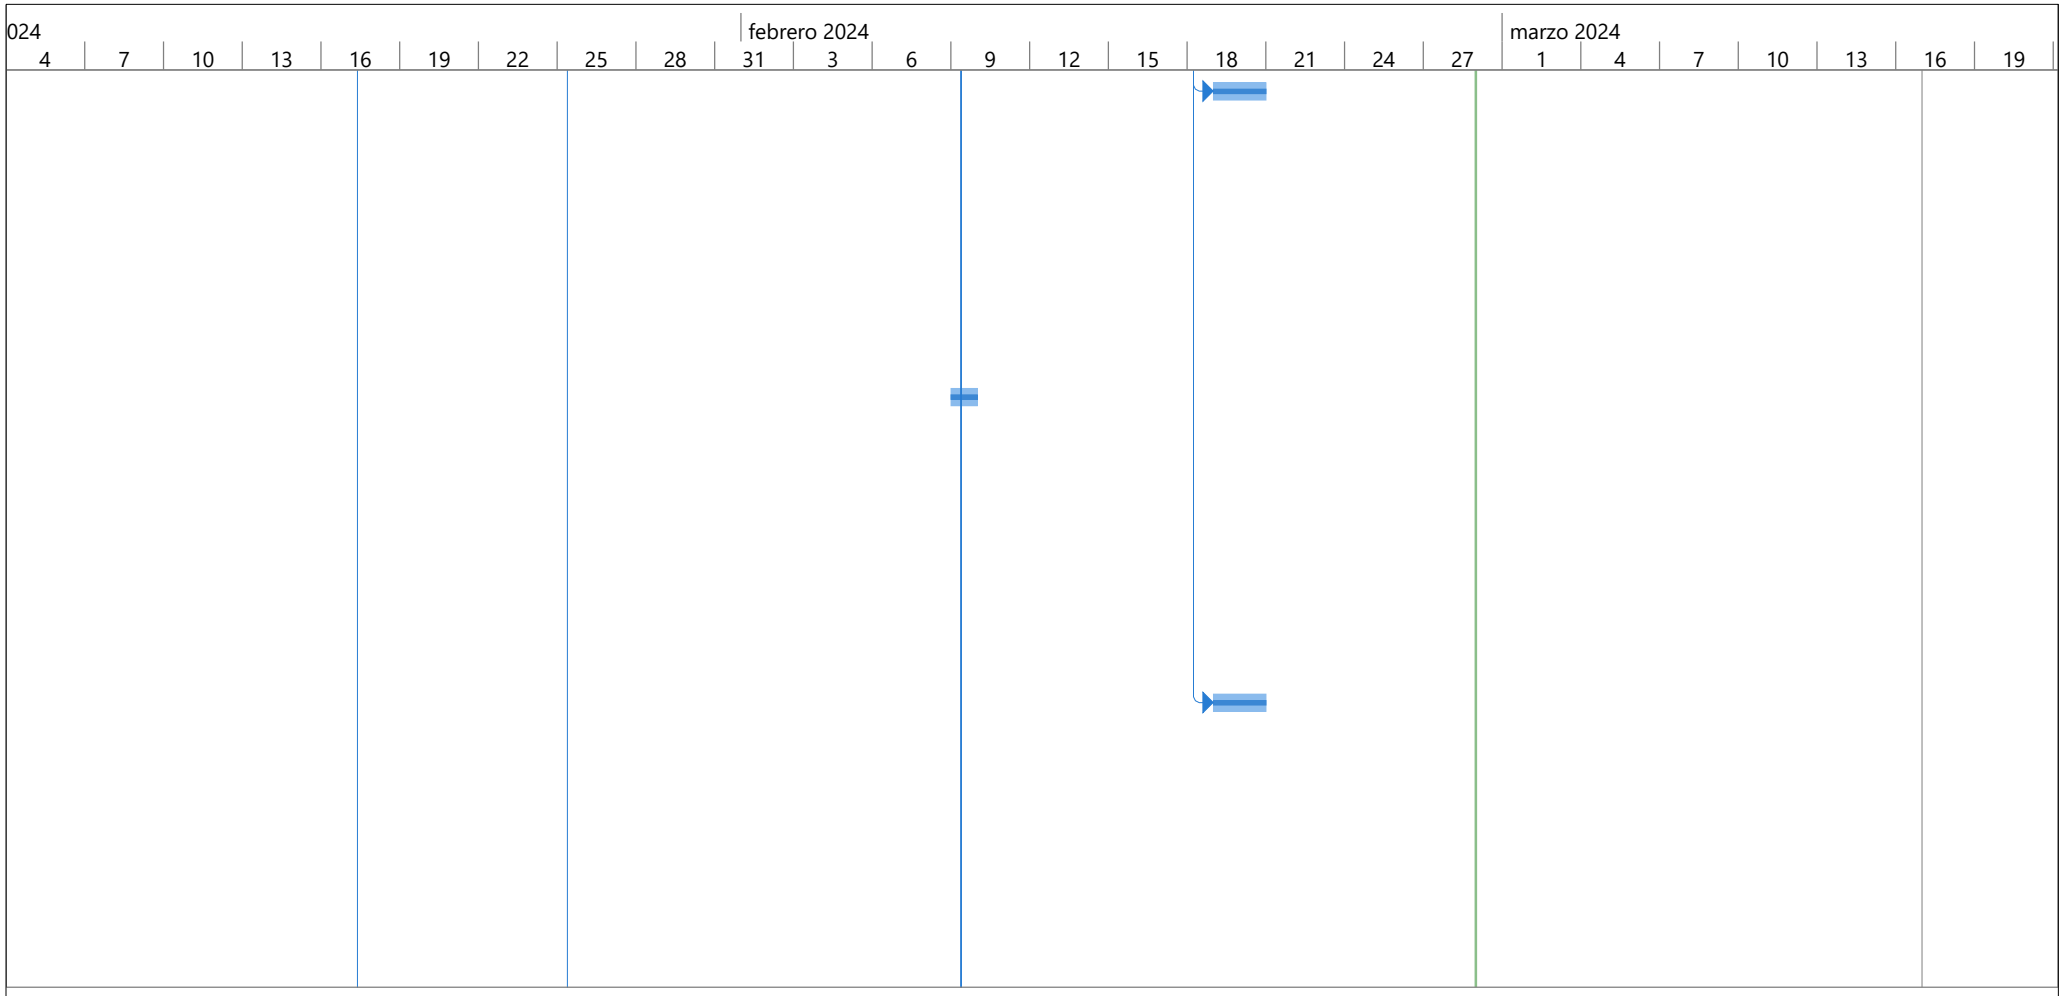


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

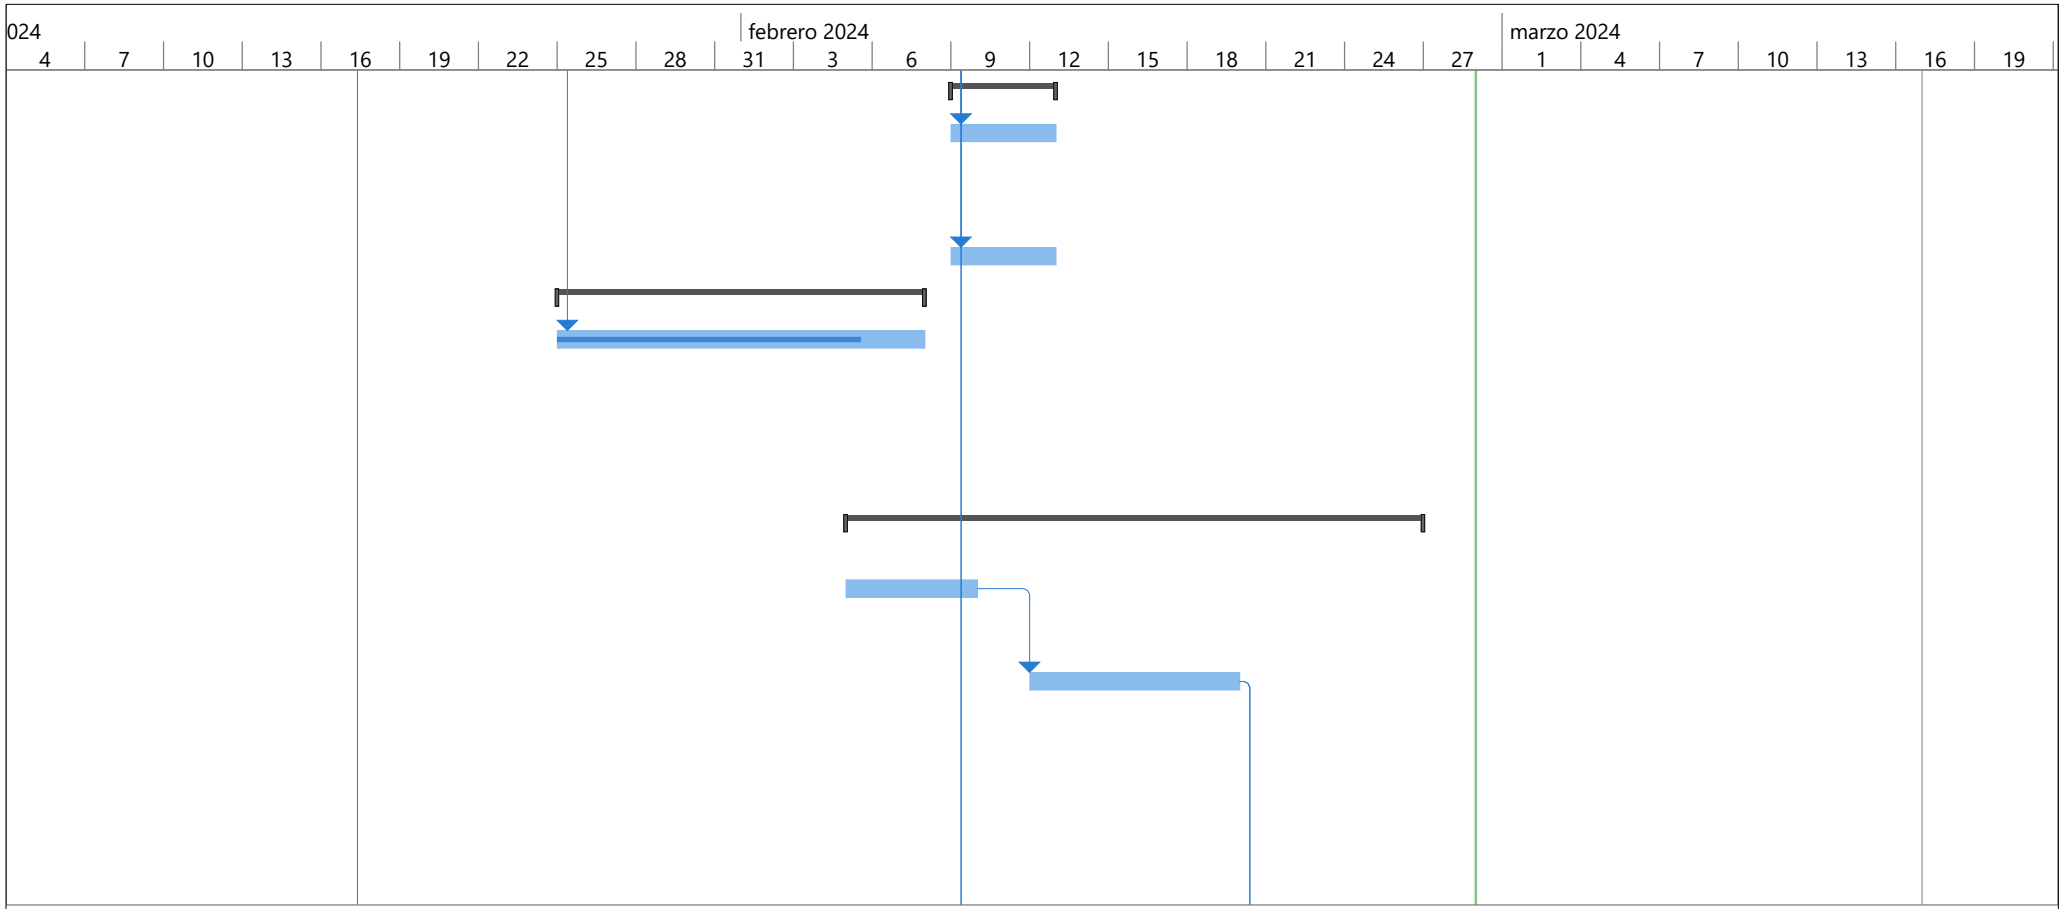


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

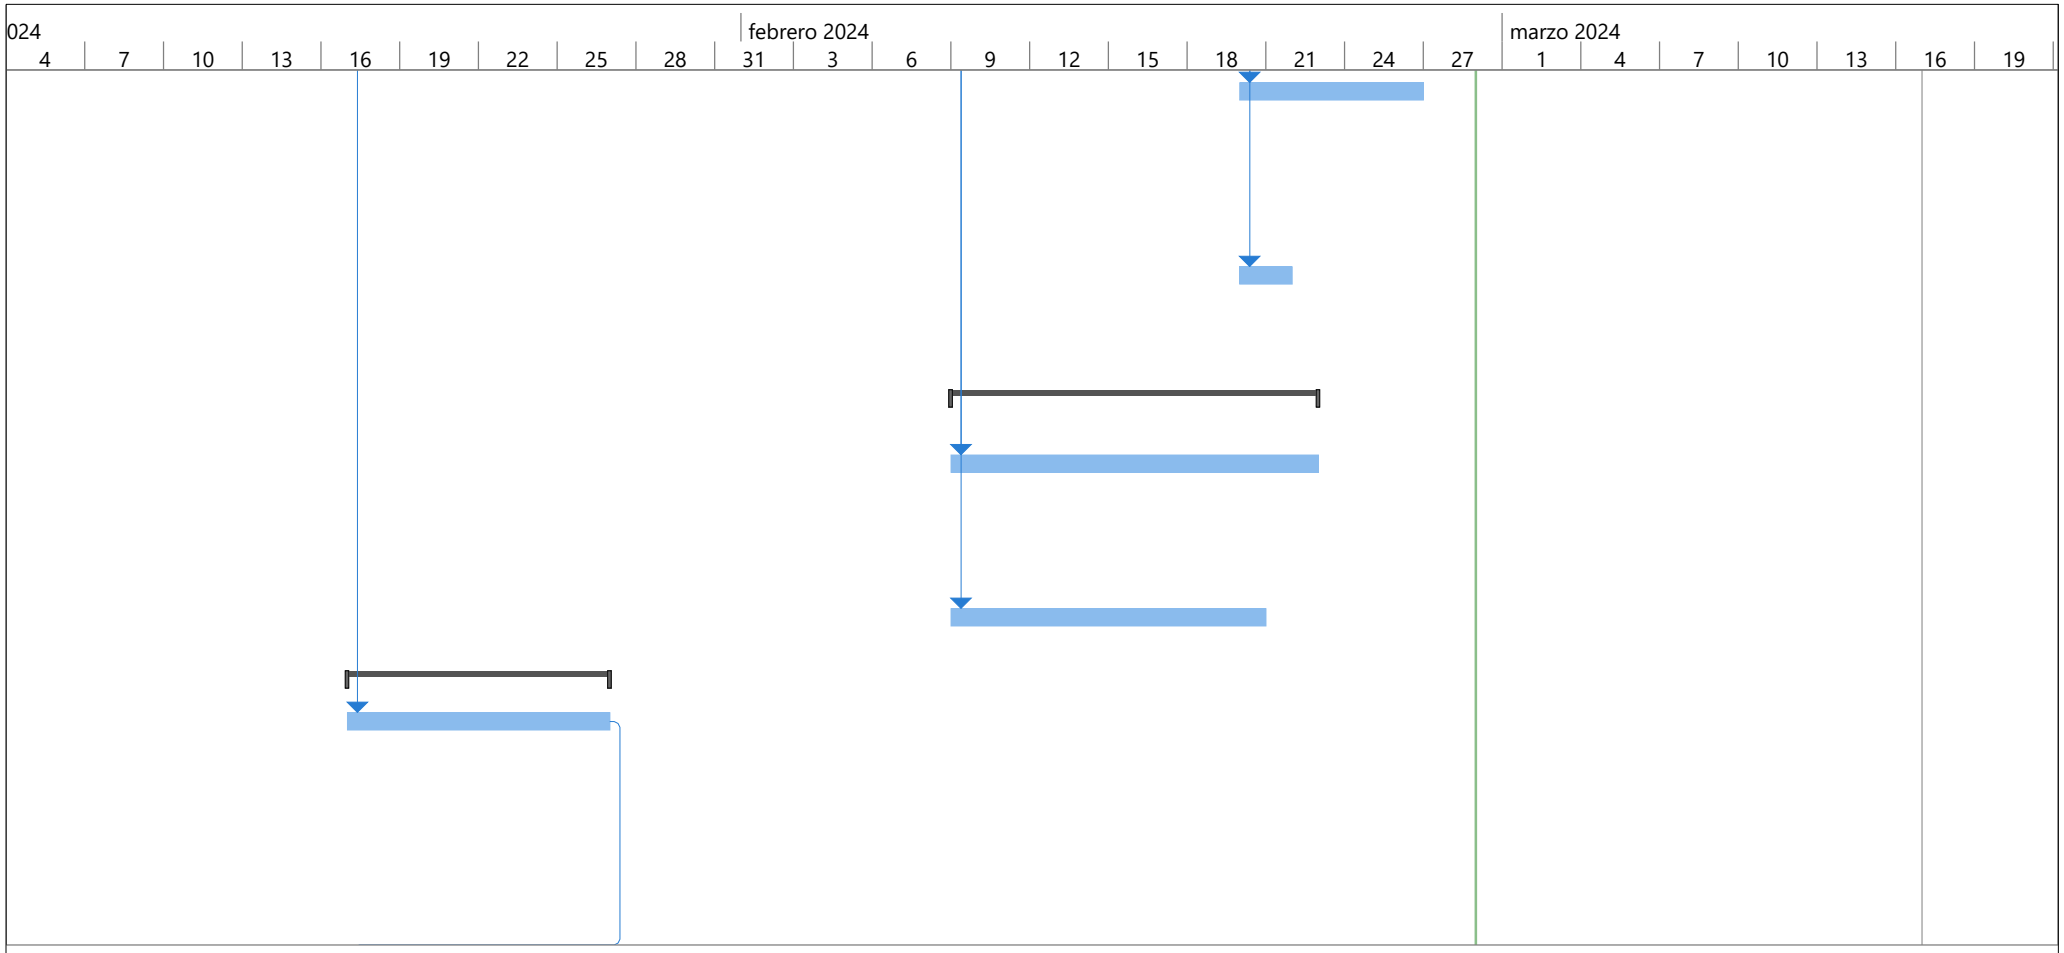


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

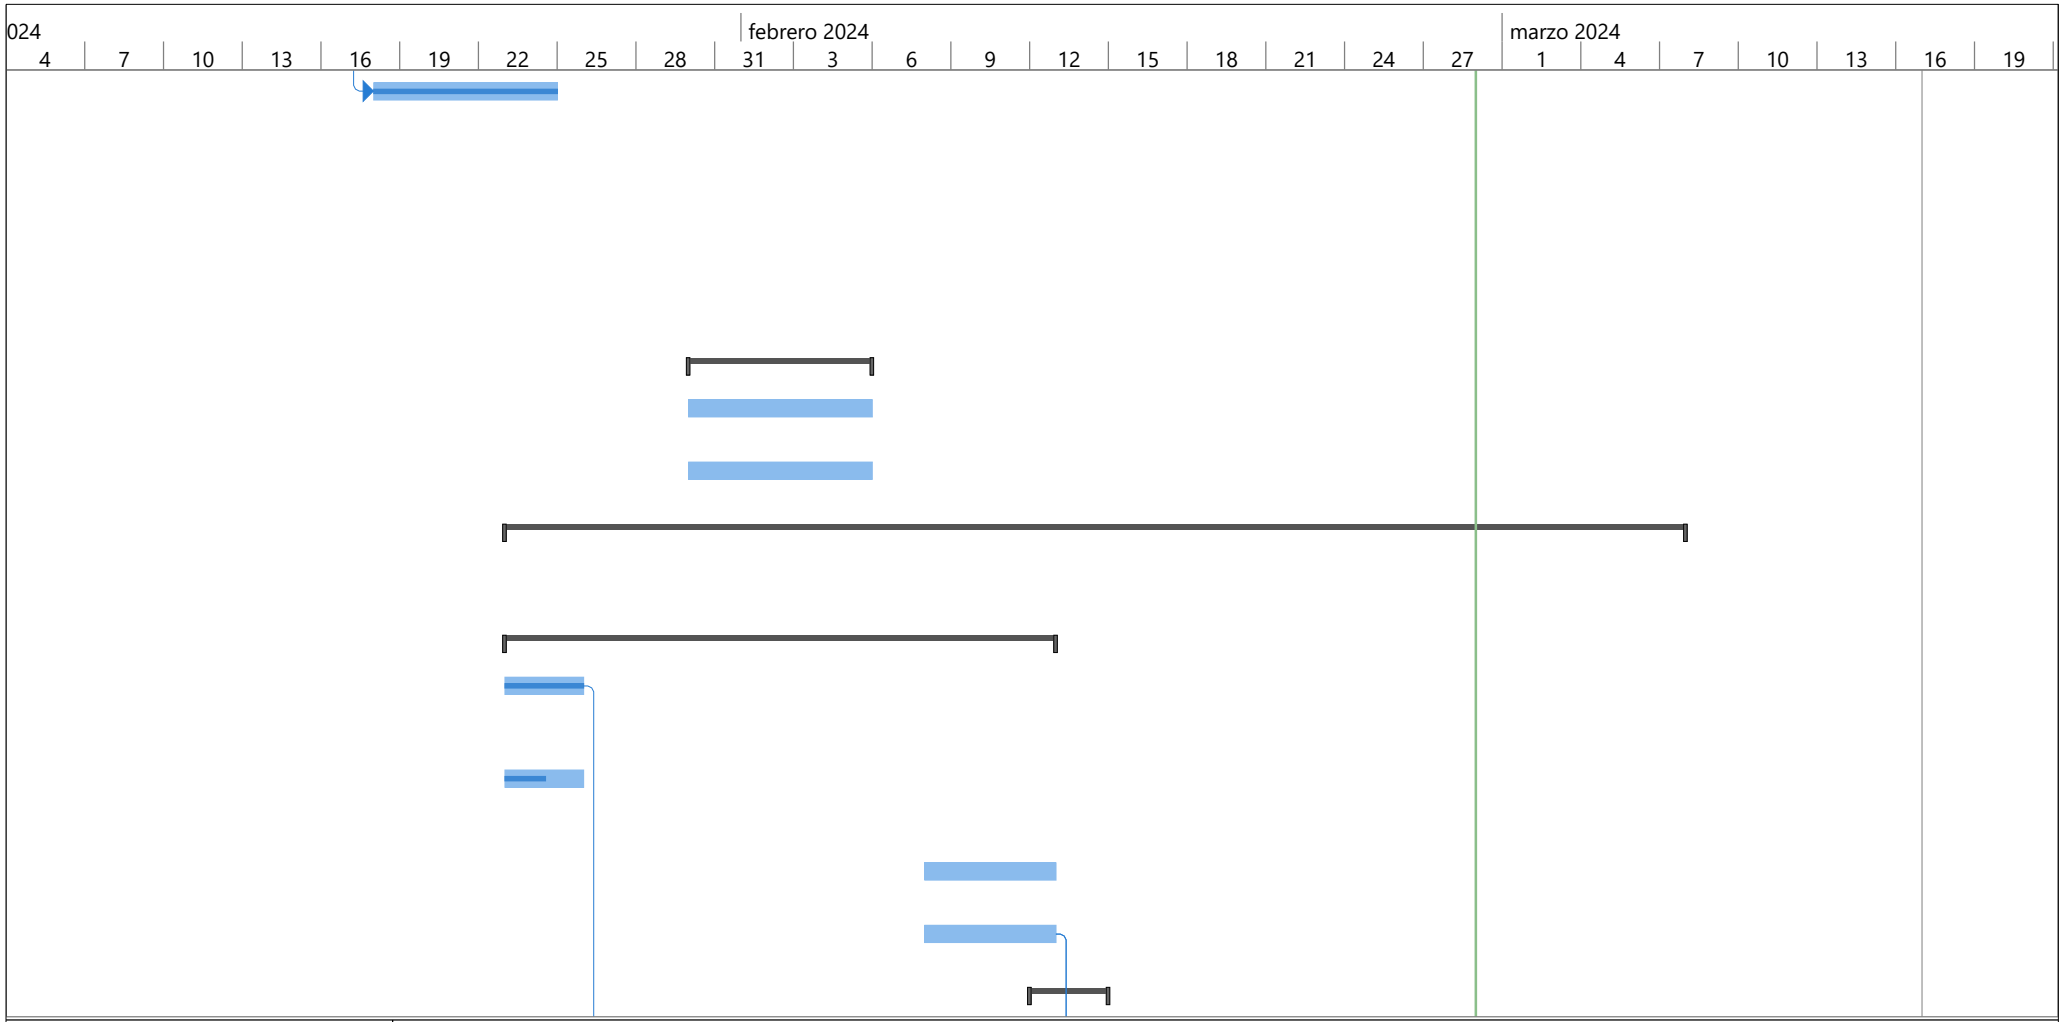


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

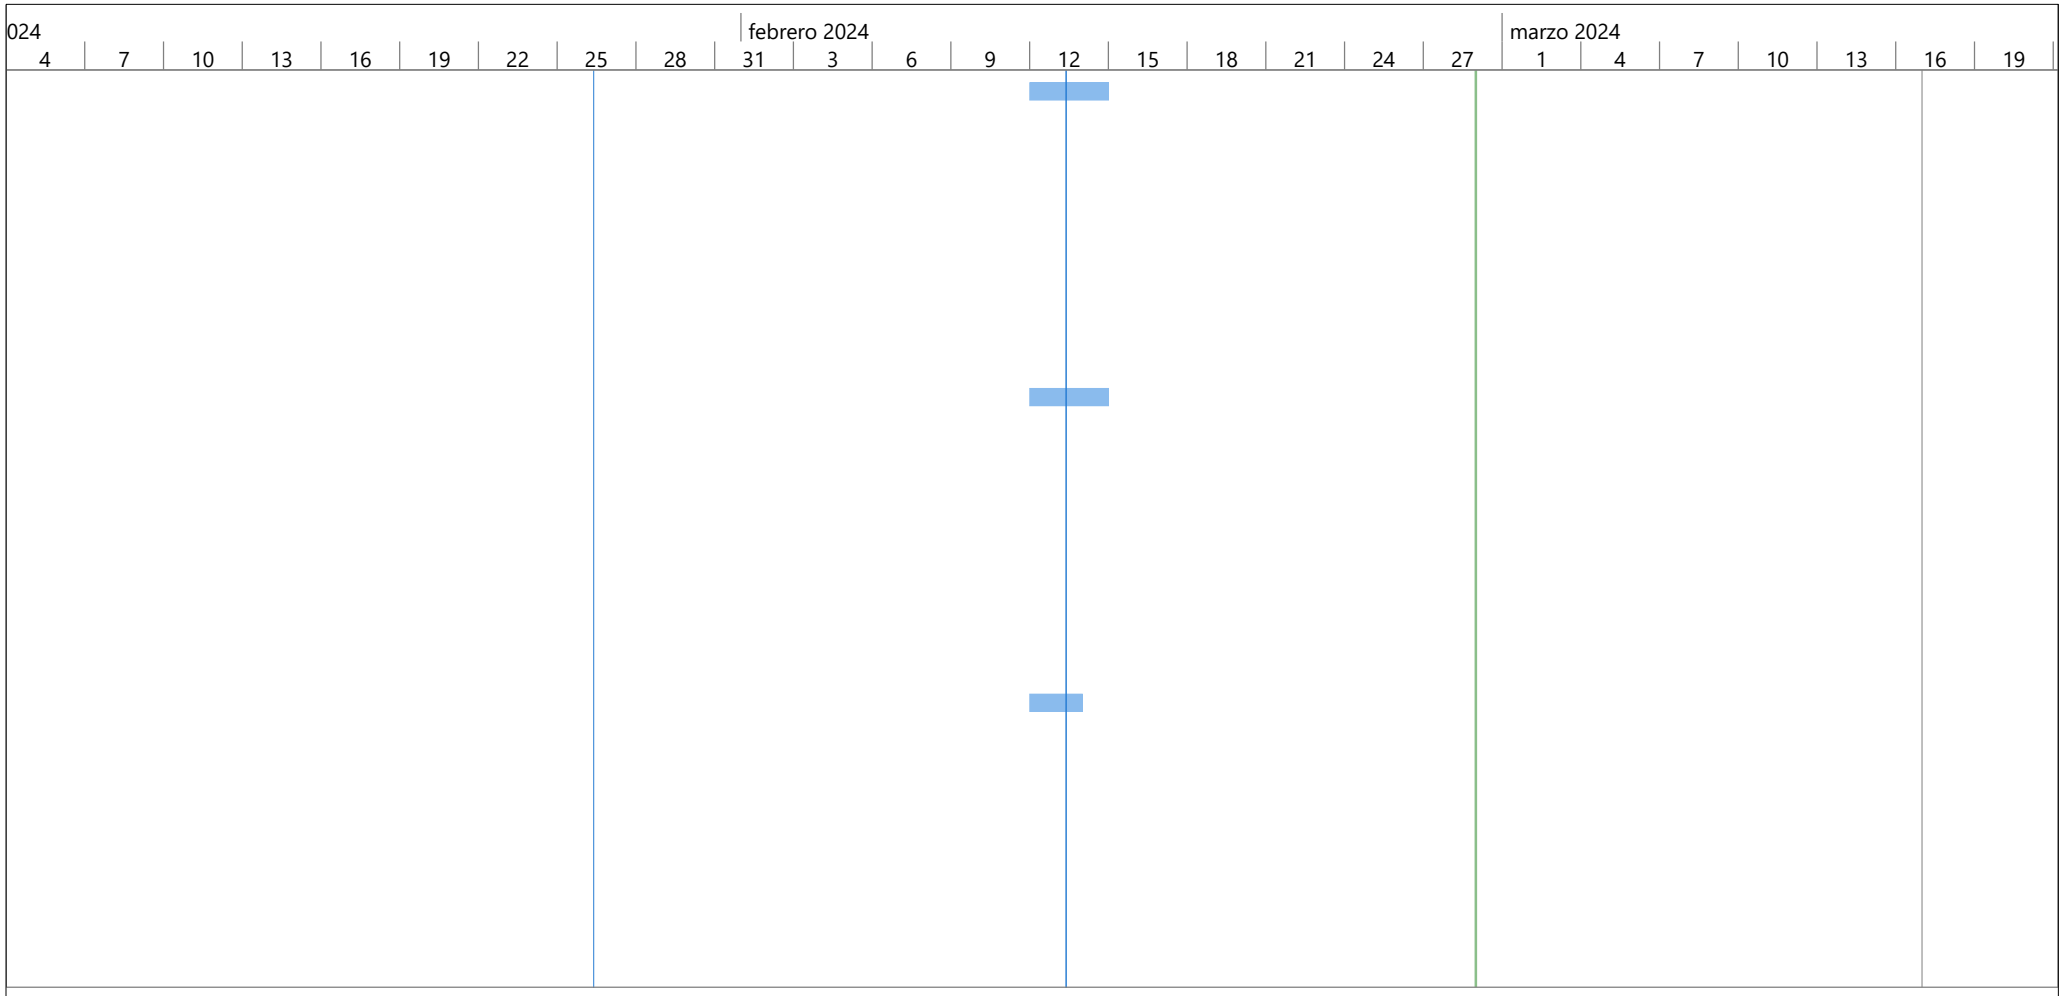


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

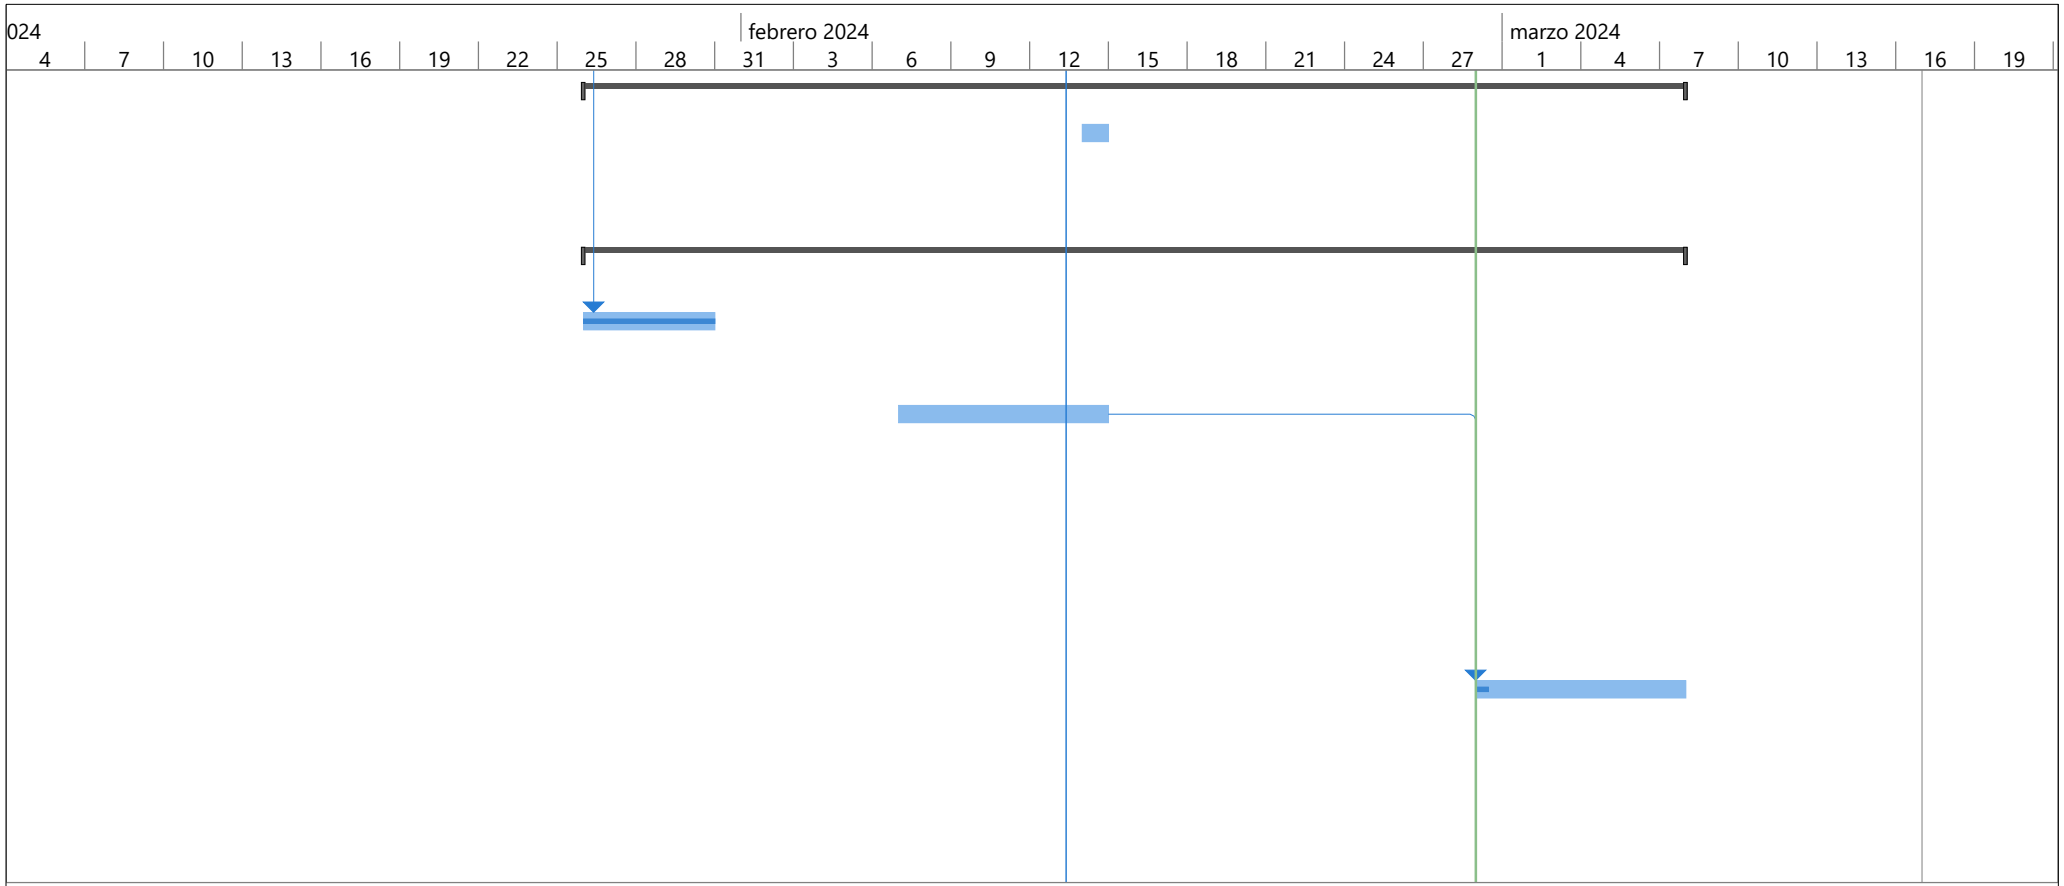


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

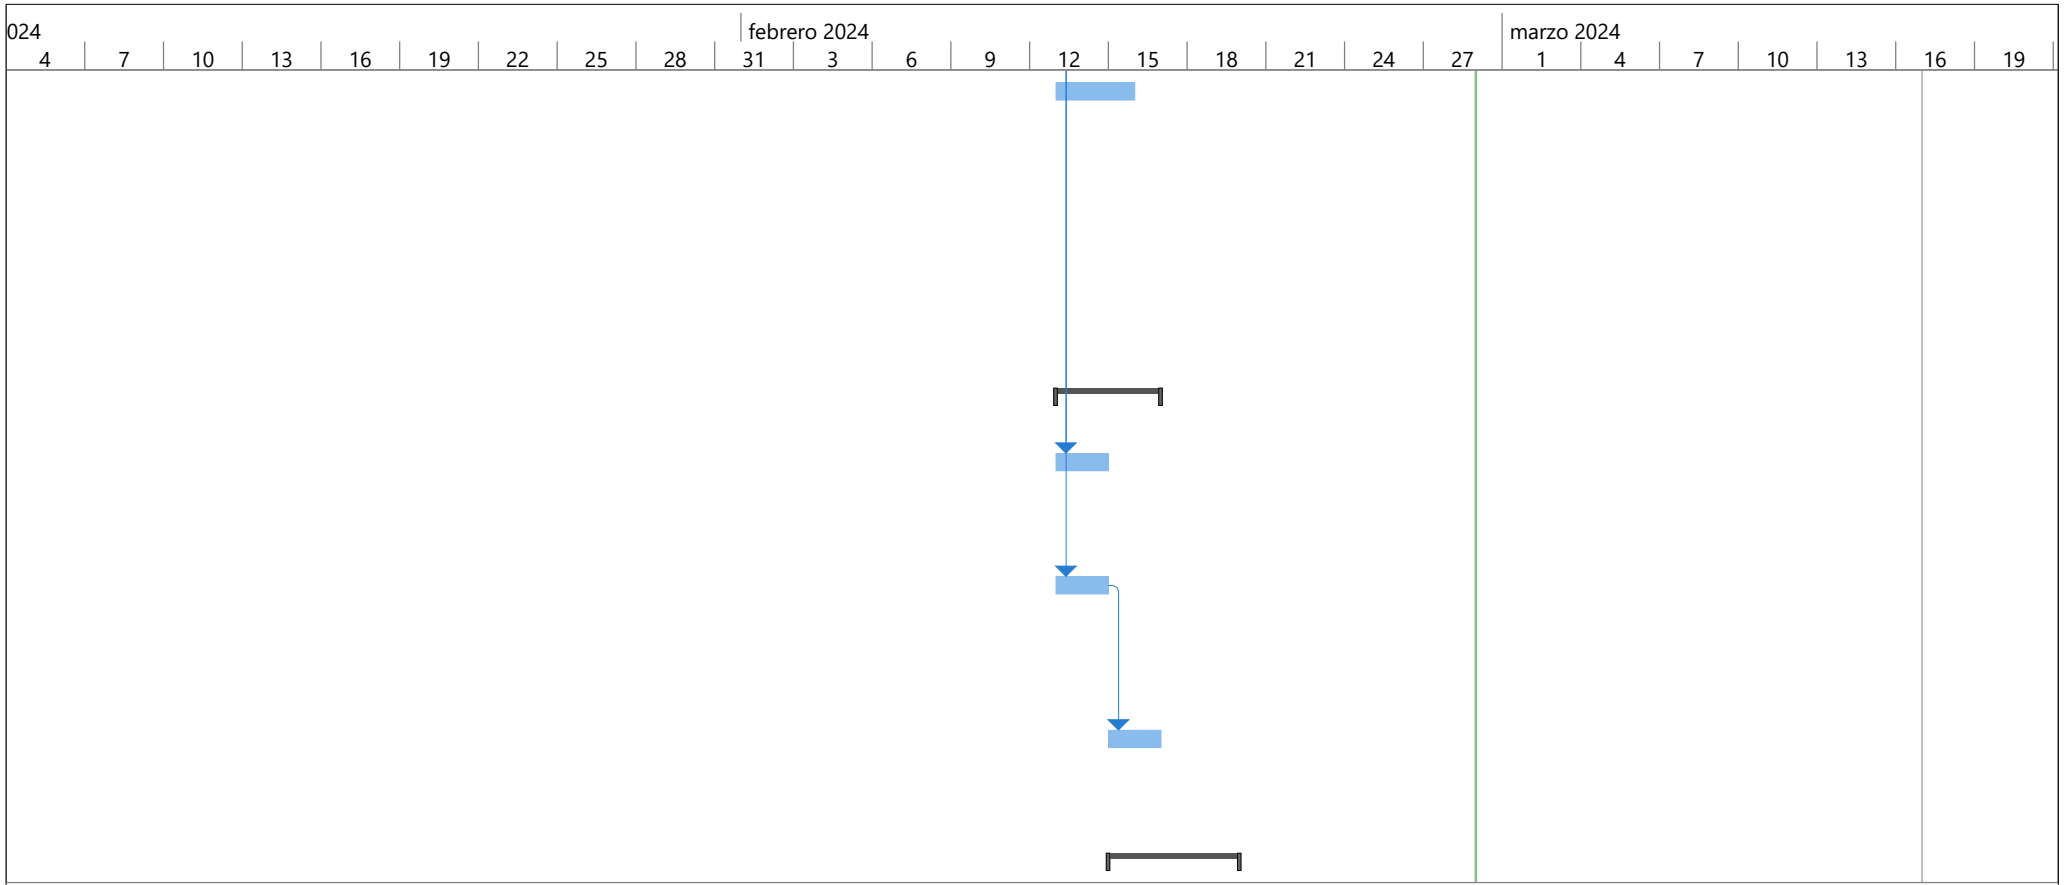


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

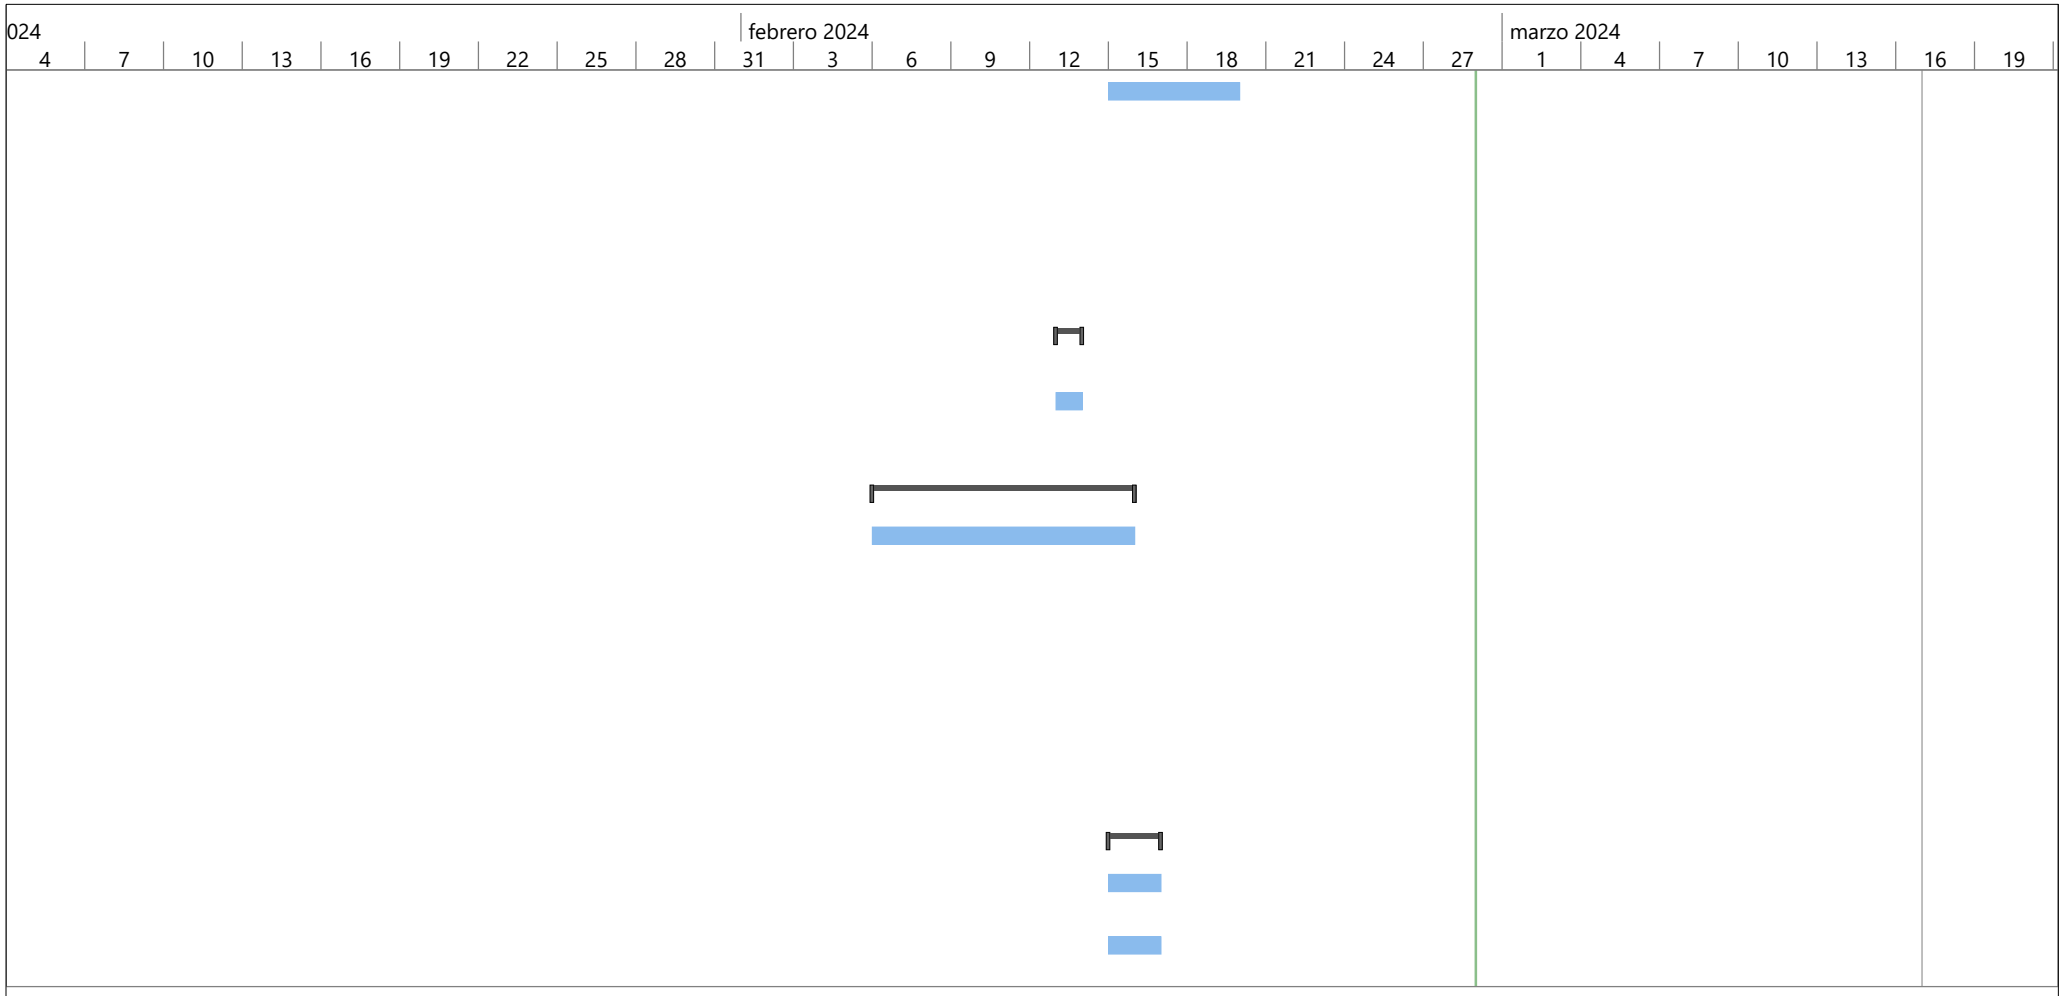


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

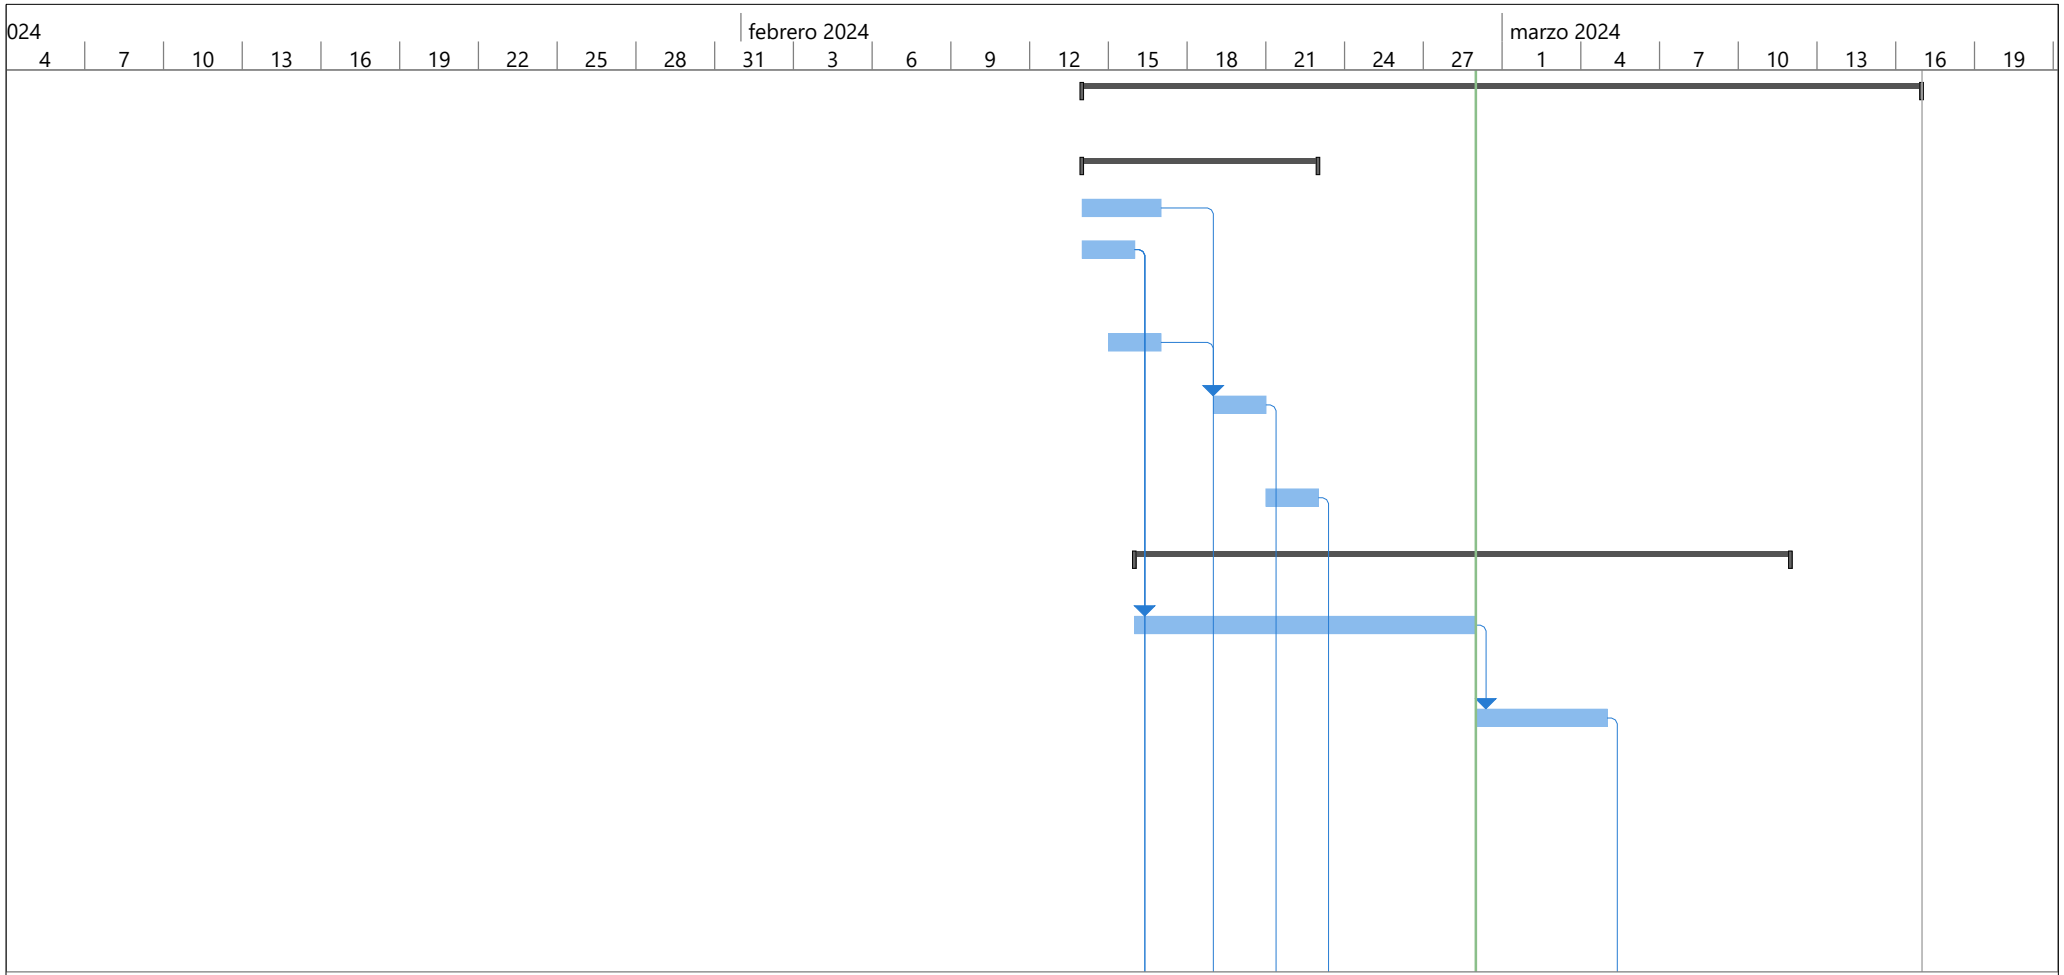


Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

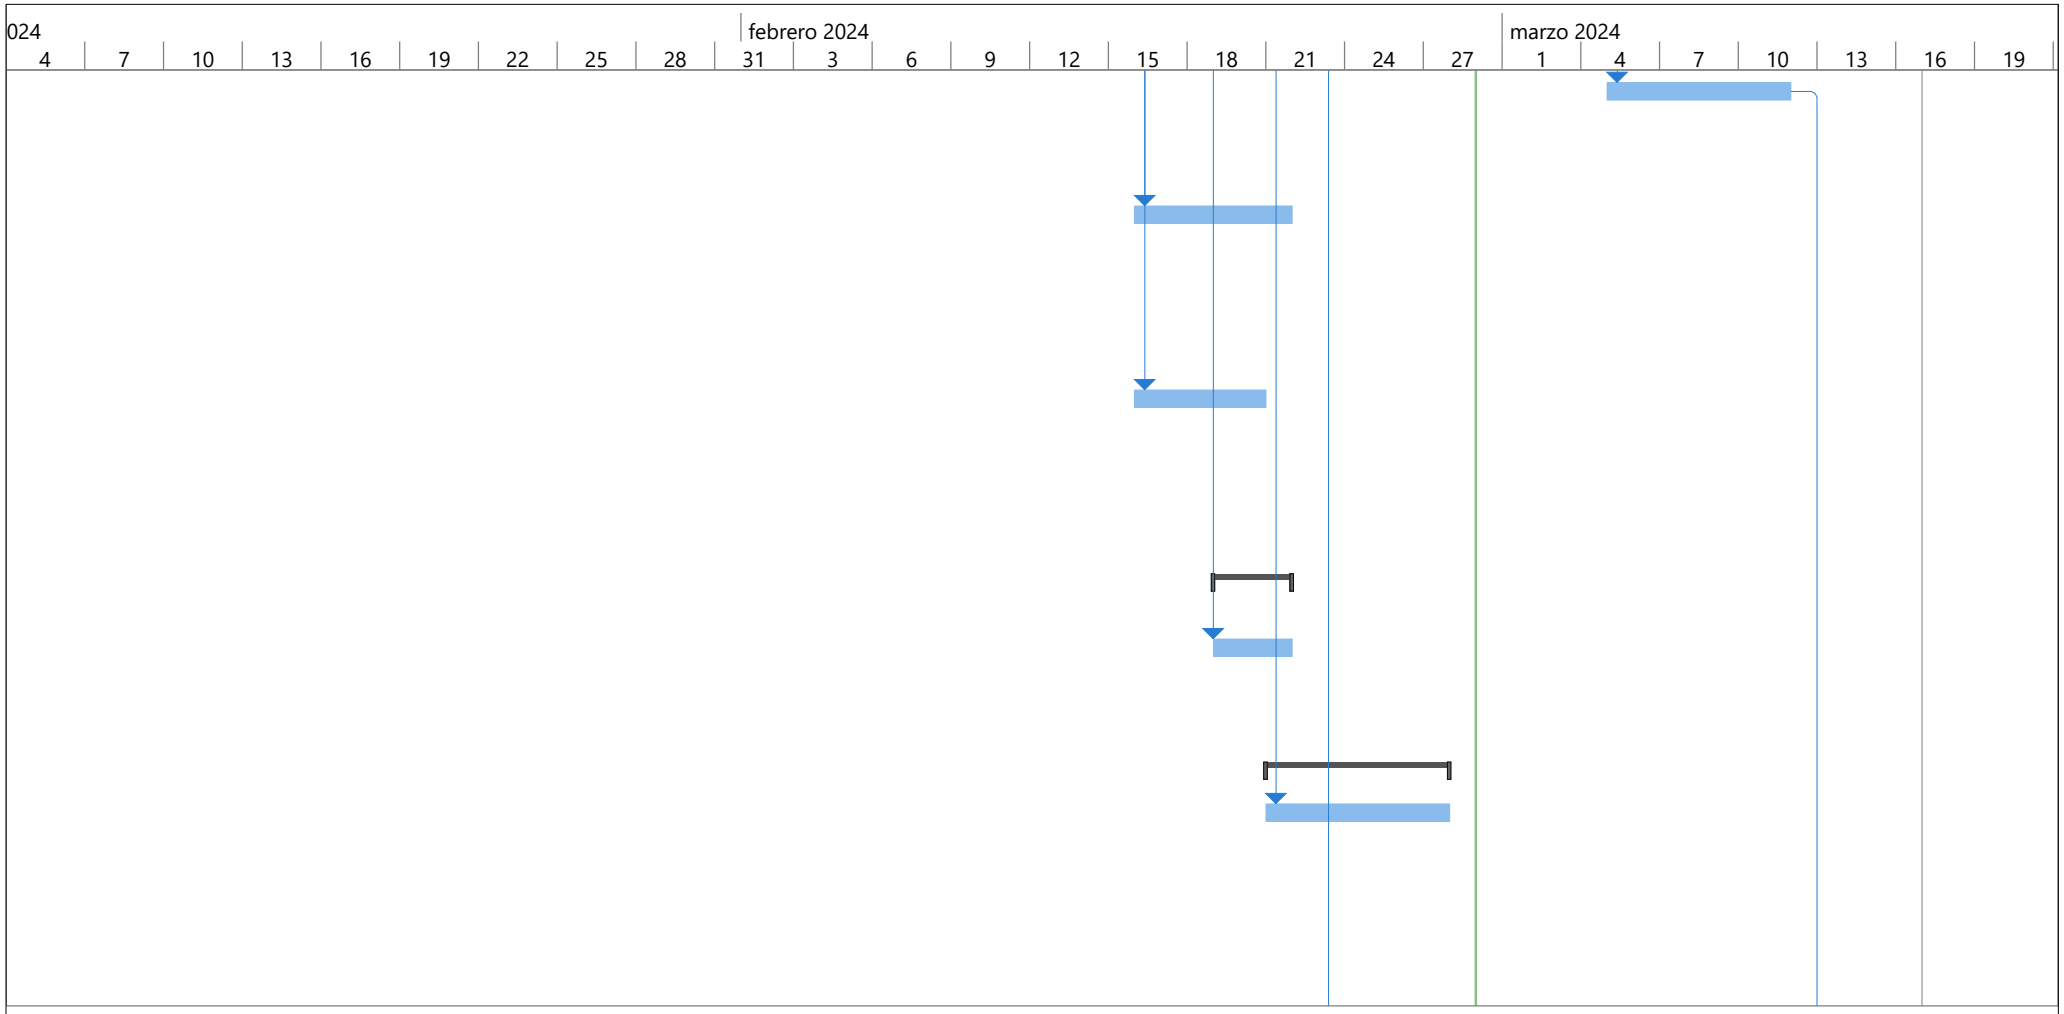

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

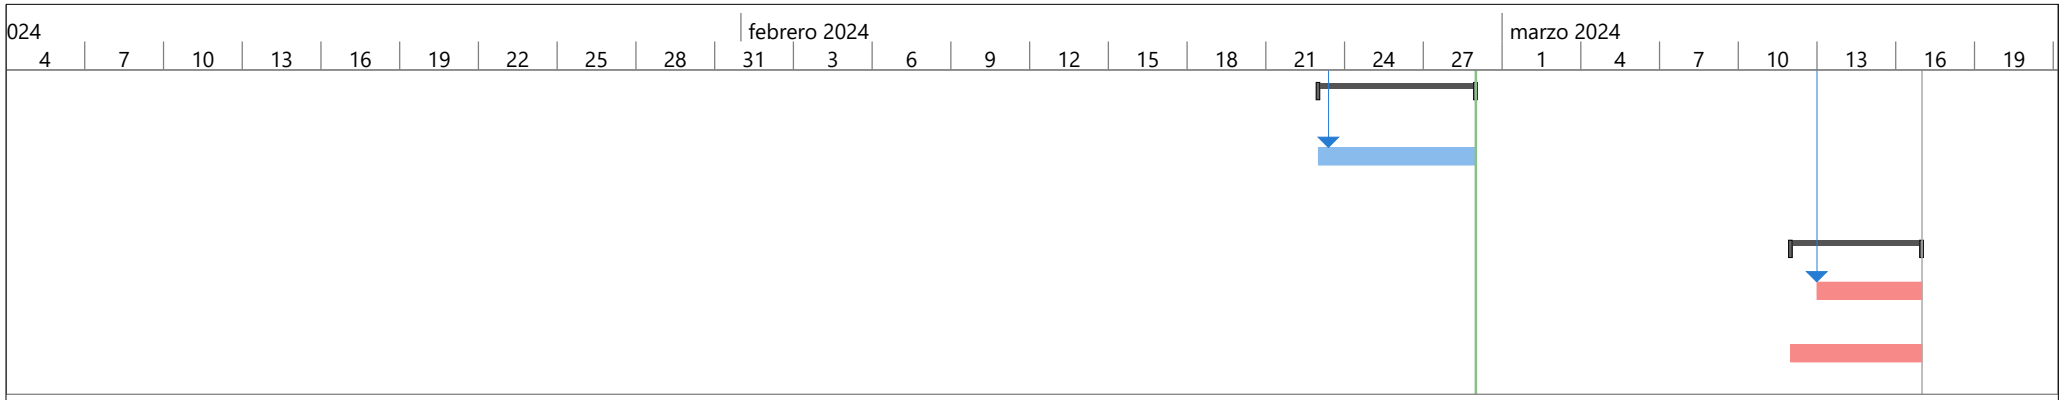

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: jue 29/02/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

	INFORME SEMANAL	FR-SGSST-40 Versión: 02 19/05/2023

CONTRATO No	068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4
ACTA DE INICIO	martes, 19 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACION:	miércoles, 15 de febrero de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE	T4. PEREZ LOPEZ DANIELA
CONTRATISTA	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
R/L CONTRATISTA	CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 510.000.000,00
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
INFORME SEMANAL No	**7**
FECHA DEL CORTE	DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 6 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVIDADES

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No. 3, KIOSKO Y RANCHO DE TROPA CACOM 4

ACTIVIDADES DIARIAS	
1/02/2024	**BARRACAS 3**
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Se realizan los cortes en el cielo raso a escuadra para la instalacion de los marcos y asi mismo incrustar las luminarias de 60 x60 en el alojamiento
SUBSANACION DE ACTIVIDADES	Se procede con una cuadrilla a revisar detalles en los baños del alojamiento para comenzar a subsanar y realizar las entrega de esta barraca a conformidad por la supervision
RANCHO DE TROPA	
SUBSANACION DE ACTIVIDADES	Se realizan arreglos de tuberias que presentaban fugas en la parte de la cocina
FLANDES	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continuan con los cortes y trazados simetricos para la instalacion,utilizando todos los materiales acorde a las especificaciones tecnicas del contrato
2/02/2024	

	INFORME SEMANAL	FR-SGSST-40 Versión: 02 19/05/2023

BARRACAS 3	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	se continuan con los detalles de pintura en el alojamiento,tanto de pintura externa como interna
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	se realiza jornada de aseo en este frente de trabajo, al igual que en los demas puntos de trabajo, y se procede a hacer el retiro del material sobrante y de escombros fuera de la unidad militar
FLANDES	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continuan con la instalacion de la media caña en el rancho de tropa, aplicando el granito pulido
5/02/2024	
FLANDES	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continuan con la instalacion de la media caña en el rancho de tropa, aplicando el granito pulido
BARRACAS 3	
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Se continua con el suministro e instalacion de de las luminarias, dejando todos los circuitos conectados
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	se realiza jornada de aseo en este frente de trabajo, al igual que en los demas puntos de trabajo.
RANCHO DE TROPA	
ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	Se termina de fundir el piso donde se encontraban ubicadas las marmitas
6/02/2024	
BARRACAS 3	
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Se termina la actividad de la instalacion de las luminarias en el alojamiento

	INFORME SEMANAL	FR-SGSST-40 Versión: 02 19/05/2023

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	se continua con jornada de aseo en el alojamiento y los baños
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Se continuan arreglando detalles de pintura y detalles en los baños para poder entregar a conformidad con la supervision
INSPECCION CON SUPERVISION Y COMISION DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA	Se realiza inspeccion al alojamiento con la supervisora del contaro la St Laura Perez y se dejan por sentado los siguientes compromisos o actividades a realizar: *Detalles de pintura *Arreglo de estuco *Llijado y pintura de marcos de puertas *Arreglo de llave en lavamanos *Arreglo de filos *Se da inicio a traslado del centro de acopio de la barraca 3 para comenzar con la entrega de esta
KIOSKO	
CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI	Se desenconfran los mesones para darles acabdo final
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	Instalacion de perfileria para techo de la cubierta que se instalara en la caseta del kiosko
ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	Se dio inicio a esta actividad con una cuadrilla de 2 personas dejando Limpia la superficie de piso, se verifican los niveles se continua con la humectación del área a intervenir, se procede a realiza las maestras horizontales a una distancia considerable para que las reglas queden apoyadas en sus extremos, y a continuación se Llenan entre los niveles de las maestras con mortero 1:4 a 4 cm
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Arreglo de pvc en la cocina, no se logro terminar de instalar debido a que enviaron nuevamente las laminas de pvc del color que no corresponde
INSPECCION DE OBRA	Se realiza inventario de toda la herramienta en la obra para verificar el stado y buen funcionamiento de la misma

POLIZAS

ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	605-47-994000104893		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	6/12/2023	6/08/2024	204.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	6/12/2023	26/12/2026	51.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/12/2023	26/12/2028	25.500.000,00
ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No POLIZA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	605 -74 - 994000023279		

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**


NOVEDADES E IMPREVISTOS

1. Durante la ejecución de este trabajo hubo siempre comunicación con el supervisor y los encargados de las áreas con el fin de lograr intervenir de manera oportuna y sin contratiempos

2. El aseo es una constante dentro de la ejecución de los trabajos siempre se recalca que aunque ya se termino dedemoler siempre va haber partículas que van descargando, y por eso es el polvo que se evidencia a días posteriores a la jornada de limpieza

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W BARRACAS 3

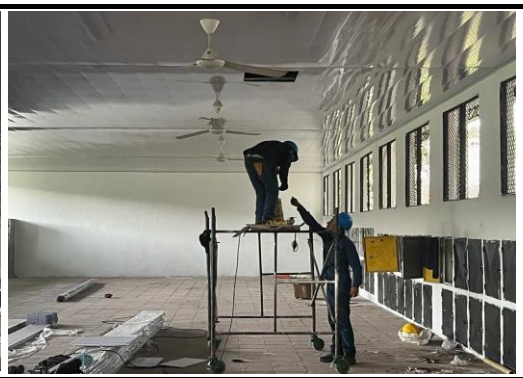
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO **(FLANDES)**




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1




MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20





CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI






SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA





	INFORME SEMANAL	FR-SGSST-40 Versión: 02 19/05/2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO

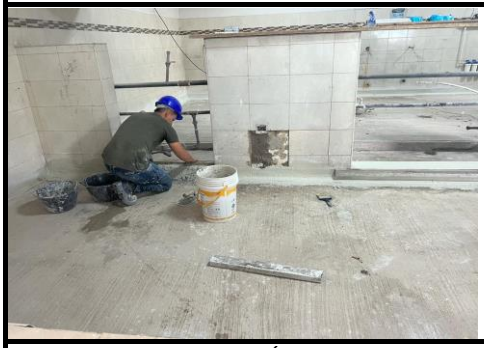

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM RANCHO DE TROPA





AVANCE FINANCIERO

EJECUCION DE OBRA		SEMANA 7
Valor según Programacion de obra	$ 46.767.000,00	9,17%
Valor ejecutado semanal	$ 10.149.000,00	1,99%
Valor ejecutado acumulado	$ 358.381.563,99	70,27%

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	DIRCETOR DE OBRA	SUPERVISOR
ARQ DANIELA ARBELAEZ	ING. FELIPE COLINA	ST. LAURA PEREZ BENJUMEA

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

CONTRATO No	068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4
ACTA DE INICIO	martes, 19 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACION:	miércoles, 15 de febrero de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE	T4. PEREZ LOPEZ DANIELA
CONTRATISTA	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
R/L CONTRATISTA	CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 510.000.000,00
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
INFORME SEMANAL No	**8**
FECHA DEL CORTE	DEL 7 DE FEBRERO DE 2024 AL 13 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVIDADES

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No. 3, KIOSKO Y RANCHO DE TROPA CACOM 4

ACTIVIDADES DIARIAS

7/02/2024	
BASE MELGAR	
INSPECCION DE OBRA POR COMISION DE LA FUERZA AEREA	Se realiza inspeccion de obra, haciendo recorrido de las actividades que se ejecutaron en el mes de diciembre de 2023 *Se revisa nuevamente con la arquitecta supervisora de contraro la barraca #3, se hacen unas sugerencias en los acabados por lo que se delegan 2 personas para realizar limpieza de los dormitorios y un oficial entra a detallar los baños.
KIOSKO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	Se continua con la fabricacion de las ventanas y la puerta que van ubicadas en la caseta del kiosko
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR	Se realiza la instalacion del piso, unicamente quedando pendiente dos baldosas (para la instalacion de esta baldosa ceramica, se solito primero la aprobacion de la balsoa en tamaño de 60 x 60, esto debido a que la de 45 x 45 se encuentran descontinuadas)
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continua con la instalacion de la media caña con granito en la cocina
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Llega nuevamente el pvc que se cambio por el tono que no era el mismo que se estaba instalando y se termina de instalar las laminas que se habian desmontado en el comedor,dejando todo el cielo raso terminado.
8/02/2024	

	INFORME SEMANAL	FR-SGSST-40 Versión: 02 19/05/2023
INSPECCION DE OBRA POR COMISION DE LA FUERZA AEREA	Se continua con la inspeccion de obra por parte de la comision de militares de la fuerza aerea	
FLANDES		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM	Impermeabilizacion de la viga, limpieza de teja y se comienza a atornillar las tejas que se soltaron.	
INSPECCION DE OBRA POR COMISION DE LA FUERZA AEREA	Se continua con la inspeccion de obra por parte de la comision de militares de la fuerza aerea	
BARRACAS 3		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	se continua con los arreglos a los detalles del estuco y pintura en el interior del baño	
KIOSKO		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR	se termina de enchapar y emboquillar el piso de la caseta nueva	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	se continua con la construccion de las ventas y pueras de la caseta del kiosko	
RANCHO DE TROPA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA	Se continuan con la instalacion de la media caña en el rancho de tropa, aplicando el granito pulido	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se comienza a estructurar el ala del rancho que da contra la cancha	
9/02/2024		
BARRACAS 3		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	2 oficiales realizan detalles de filos y resanes de los filos donde se encuenran ubicados los casilleros, adicional a esto se debe reconstruir la pared de acceso a los baños	
TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	se debe volver a instalar la cubierta pequeña que queda en la parte exterior de los baños, debido a un arreglo en la estructura de la misma.	
KIOSKO		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	se continua con la construccion de las ventas y pueras de la caseta del kiosko	

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	se realiza jornada de aseo en este frente de trabajo, al igual que en los demas puntos de trabajo.
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continuan con la instalacion de la media caña en el rancho de tropa, aplicando el granito pulido
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se termina de estructurar el alero que qieda contra la cancha y queda listo para insalacion del pvc en la cocina.
FLANDES	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM	Se termina de instalar la emulsion asfaltica a la canal, se termina de atornillar la teja y se instala la cinta asfaltica por 15 cm de ancho por todas las uniones de la teja donde se presentaron luces.
10/02/2024	
BARRACAS 3	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Detalles de filos y resanes de filos y paredes donde se encuentran ubicados los casilleros, asi mismo en las carteras de las ventanas.
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Instalacion de pvc en el alero que queda contra la cancha.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continua con la instalacion de la media caña con granito en la cocina y se dejan sondeados los sifones que iran ubicadas en las marmitas
KIOSKO	
TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Se instala la cubierta en la caseta ubicada en el kiosko
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	se continua con la construccion de las ventas y puertas de la caseta del kiosko, dejadolas listas para comenzar a pulir y a pintar
FLANDES	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM	Se termina de instalar la cinta vituminosa, para unir las tejas y lograr sellar donde se encontraban las goteras. El día de hoy no hubo luz en toda la unidad, lo cual atraso un poco el proceso de pulir la media caña
12/02/2024	
BARRACAS 3	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Se continua con resane de filos donde se encuentran los casilleros,aplicación de pintura y resane de las paredes internas del alojamiento
CUBIERTA	Se da inicio a la apliacion de la pintura en la cubierta del color solicitado por la supervision, que debe llevar la unidad militar de la FAC y se continua jornada de aseo en los baños del alojamiento
KIOSKO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	Se continua con la construccion de puertas ye ventanas, ya dando acabados, como pulir y pintar para la isntalacion
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Instalacion de pvc en el alero que queda contra la cancha.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continua puliendo la media caña con granito en la cocina
13/02/2024	
BARRCAS 3	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Pintura y resane de las paredes internas del alojamiento
CUBIERTA	Se continua con la apliacion de la pintura en la cubierta del color solicitado por la supervision.
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Se continua jornada de aseo en los baños del alojamiento

POLIZAS

ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	605-47-994000104893		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	6/12/2023	6/08/2024	204.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	6/12/2023	26/12/2026	51.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/12/2023	26/12/2028	25.500.000,00
ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No POLIZA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	605 -74 - 994000023279		

NOVEDADES E IMPREVISTOS

1. Durante la ejecución de este trabajo hubo siempre comunicación con el supervisor y los encargados de las áreas con el fin de lograr intervenir de manera oportuna y sin contratiempos

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

REGISTRO FOTOGRAFICO


SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20




SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS



SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO

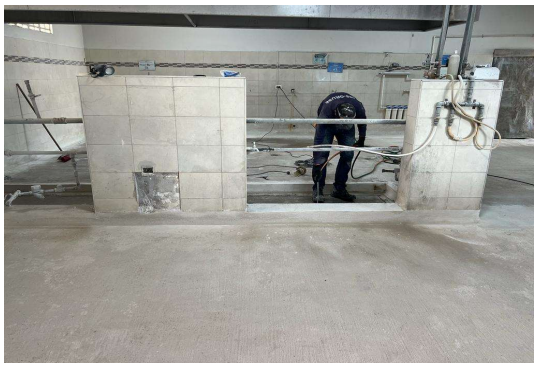



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM




MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA






SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)





TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO

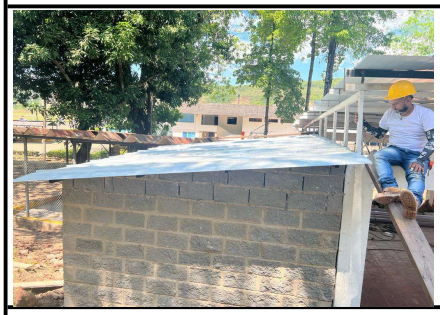



AVANCE FINANCIERO

EJECUCION DE OBRA		**SEMANA 8**
Valor según Programacion de obra	$ 29.921.106,88	5,87%
Valor ejecutado semanal	$ 12.903.000,00	2,53%
Valor ejecutado acumulado	$ 371.280.000,00	72,80%

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	**DIRCETOR DE OBRA**	**SUPERVISOR**
ARQ DANIELA ARBELAEZ	**ING. FELIPE COLINA**	**ST. LAURA PEREZ BENJUMEA**

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

CONTRATO No	068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4
ACTA DE INICIO	martes, 19 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACION:	miércoles, 15 de marzo de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE	T4. PEREZ LOPEZ DANIELA
CONTRATISTA	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
R/L CONTRATISTA	CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 510.000.000,00
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
INFORME SEMANAL No	**9**
FECHA DEL CORTE	DEL 14 DE FEBRERO DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVIDADES

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No. 3, KIOSKO Y RANCHO DE TROPA CACOM 4

ACTIVIDADES DIARIAS

14/02/2024	
KIOSKO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	Se empiezan a detallar las puertas de la caseta y a pintar donde se tuvo que macillar despues de instaladas. *Se arreglan detalles en la construccion de la caseta
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se continua con la instlacion del cielo raso de la fachada posterior del comedor
Imprevistos	se instalan sifones metalicos y se dejan puestas unas pruebas de humedad en el piso de la cocina para verificar si ya es viable realizar la instlación del poliuretano.
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Se termina de hacer toda la parte electrica de la cocina y se comienza la instlacion de las luminarias, dejandolas instaladas y en funcionamiento, tanto en el comedor como en la cocina

BARRACAS 3	
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Se continua con jornada de aseo y adicional, se realizan unos arreglos, como resanes y estuco solicitado por la supervision. *se continua con la palicacion de la pintura Gris ral en la cubierta del alojamiento
15/02/2024	
BARRACAS 3	
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Se continua con jornada de aseo en donde queda el dormitorio de los soldados
SUBSANACIONES	se da continuidad arreglando detalles de pintura y estuco en el alojamiento *Se realiza visita con la St. Laura Perez y el coronel Rozo,y se dejan establecidos los siguientes compromisos para recibir a satifaciion el alojamiento: 1. restirara los rieles que se encuentran en las entradas de los baños y dejara resanado y estucado esos puntos que se encuentran anclados. 2. Revisar toda la boquilla de los baños y arreglar algunos puntos que quedaron sin emboquillar. 3. Terminar d epintar las cerchas que estan ubicadas en la fachada principal del alojamiento. 4. resanar,estucar y pintar muro donde descansa la cubierta en la fachada principal del alojamiento. 5.Cortar angulos donde se encontraba ubiacada la canal que se retiro.
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se continua con la instalacion de pvc en los aleros del rancho .
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	*Se comienza con la instalacion de piso poliuretano en la cocina del rancho
IMPREVISTOS	Se arregla, solda, y pinta viga canal que va ubicada en el alero de la fachada principal del rancho de tropa
BARRACAS 1	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	Se da incio al montaje de las puertas, para la instalacion en los baños del alojamiento
KIOSKO	

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Se comienza con la conexión de los circuitos para la isntalcion de las luminarias toma corrientes e interruptores
16/02/2024	
BARRACAS 3	
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Se continua con jornada de aseo en donde queda el dormitorio de los soldados y se comienza con los arreglos para dejar subsanado y poder entregar a satisfaccion de la supervision
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se continua con la instalcion de pvc en los aleros tanto fachada principal como posterior del rancho
KIOSKO	
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Se comienza con la conexión de los circuitos para la isntalcion de las luminarias toma corrientes e interruptores
BARRACAS 1	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	Se conyinua con el montaje de las puerta spara los baños del alojamiento
19/02/2024	
BARRACAS 3	
ENTREGA FINAL	Se realiza la entrega total del alojamiento a supervision, quedando recibida a satisfaccion por la St. Laura Perez Bemjumea y el Mayor Rangel, asi mismo se realiza la entrega de una malla con los sunchos para su respectiva instalacion y dos galones de pintura gris brillante, para pintar los lockers de dicho alojamiento, quedando todo a satisfaccion,, se realiz ala entrega de Barraca 1, para comenzar su intervencion el dia de mañana 20-02-2024
KIOSKO	

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Se terminan las conexiones de los circuitos para las instalaciones de las luminarias, los tomas y el interruptor
Se programa visita al cerro la maria, para establecer cantidades finales con supervision y asi mismo llevara materiales para la ejecucion de las actibidades de ese rancho de tropa	
20/02/2024	
BARRACA 1	
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	Se da inicio a la demolicion de los pisos,ubicados en el baño del alojamiento
RETIROS	Se realiza el desmonte de sanitarios
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se continua con la instalcion de pvc en la parte de la oficina y el baño al lado de la cocina
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA	Se contunia puliendo la media caña de la cocina y se comienza a preprara el piso para aplicar la resina que es el ultimo paso del poliuretano establecido
CANALES	Se continua con la instalcion de canales que exisitan en este punto,se entrgean pintadas,soldadas y con arreglos en los puntos donde se encontraba rota o totalmene corroida
KIOSKO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se instala cielo raso de la caseta ubicada en este punto

POLIZAS

ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	605-47-994000104893		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	6/12/2023	6/08/2024	204.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	6/12/2023	26/12/2026	51.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/12/2023	26/12/2028	25.500.000,00
ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No POLIZA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	605 -74 - 994000023279		

NOVEDADES E IMPREVISTOS

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

1. Durante la ejecución de este trabajo hubo siempre comunicación con el supervisor y los encargados de las áreas con el fin de lograr intervenir de manera oportuna y sin contratiempos

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM




SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W




ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA BARRACA 3




SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**



SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA





CANALES RANCHO DE TROPA





AVANCE FINANCIERO

EJECUCION DE OBRA		**SEMANA 9**
Valor según Programacion de obra	$ 867.000,00	0,17%
Valor ejecutado semanal	$ 12.903.000,00	2,53%
Valor ejecutado acumulado	$ 384.183.000,00	75,33%

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	**DIRCETOR DE OBRA**	**SUPERVISOR**
ARQ DANIELA ARBELAEZ	**ING. FELIPE COLINA**	**ST. LAURA PEREZ BENJUMEA**

	INFORME SEMANAL	FR-SGSST-40 Versión: 02 19/05/2023

CONTRATO No	068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4
ACTA DE INICIO	martes, 19 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACION:	miércoles, 15 de marzo de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE	T4. PEREZ LOPEZ DANIELA
CONTRATISTA	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
R/L CONTRATISTA	CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 510.000.000,00
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
INFORME SEMANAL No	**10**
FECHA DEL CORTE	DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVIDADES

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No. 3, KIOSKO Y RANCHO DE TROPA CACOM 4

ACTIVIDADES DIARIAS

21/02/2024	
BARRACAS 1	
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	Se continua con la demolicion de pisos en el baño del alojamiento *Se terminan de desmontar los sanitarios *Se desmontan los orinales
ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	Se da inicio a la actividad de alistado de piso en mortero 1:5 E:0,04 mts
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continua puliendo la media media caña y SE REALIZA LA INSTLACION DE LA OTRA CANAL EN LA FACHADA POSTERIOR
KIOSKO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	Se comenzo a pintar la estructura de la cubierta del kiosko
22/02/2024	
BARRACAS 1	

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	Se termina de fundir el sobre piso en los baños
REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	construccion de regata de 3" en el muro de los baños, incluyendo mortero para retiro de sobrantes
RANCHO DE TROPA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	Se continua puliendo la media caña y piso para realizar la aplicación de resina epoxica en el piso de poliuererano en la cocina del rancho
KIOSKO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	Se cpntinua pintando la estructura de la cubierta con pintura blanca anticorrosivo *Se comienza a construir muro en ladrillo comun para tapar el hueco solicitado por supervision
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Se comienza pañetando y estucando las columnas y vigas para aplicar pinturA
23/02/2024	
RANCHO DE TROPA	
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Se terminan las actividades presvitas para este punto y se inicia jornada de aseo para realizar la entrega a satisfaccion por parte de supervision
BARRACAS 1	
REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	S e termina la construccion de regatas de 3" en los muros de las duchas y se aplica mortero para luego enchapar
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.	Se da inicio a la instalacion de la ceramica en psio en la zona de los sanitarios
ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	Se empieza a escarificar las paredes del alojamiento, pero en este proceso se evidencia que estas paredes se encuentran en mal estado, por lo que hay varios puntos que se deben resanar para poder estucar y pintar,para lo que queda concertado hacerlo y es aprobado por la supervision

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	Se continua con el montaje de las puertas para los baños del alojamiento
KIOSKO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	e comienza a pintar la estructura del kiosko(viga y columnas) asi mismo se empieza el aseo para realiza la entrega a satisfaccion por supervision
24/02/2024	
RANCHO DE TROPA	
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Se realiza aseo en la cocina, aresa del baño y oficina, dejando todo limpio,se detecta una fuga de agua de una parte que no se intervino, sin embargo se debe corregir, se enchapan baldosas de pared que se dañaron buscando las fugas que habian
BARRACAS 1	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.	Se continua con el enchape de piso en los sanitarios y orinales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	Resane exterior despiues de pañetar y se comienza el estuco exterior
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	se realiza regata para cambio de tuberia de agua y se obserav que 4 duchas estan en acero, por lo que se va a preguntar como proceder
25/02/2024	
BARRACAS 1	
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	Instalacion de 6 registros en la ducha y se comienza con el enchape en la pared

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.	Se termina de enchapar el area de los sanitarios y oronales, se deja un poco mas de la mitad del lavamanos
KIOSKO	
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Se realiza aseo perimetral

POLIZAS

ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	605-47-994000104893		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	6/12/2023	6/08/2024	204.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	6/12/2023	26/12/2026	51.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/12/2023	26/12/2028	25.500.000,00
ASEGURADORA	ASEGURADORA DE COLOMBIA		
No POLIZA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	605 -74 - 994000023279		

NOVEDADES E IMPREVISTOS

1. Se observa una fuga en la pared por un tubo roto, es tuberia metalica, no hace parte del contrato pero es necesario realizar dicho arreglo

REGISTRO FOTOGRAFICO

REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO BARRACAS 1






MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) BARRACAS 1




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE

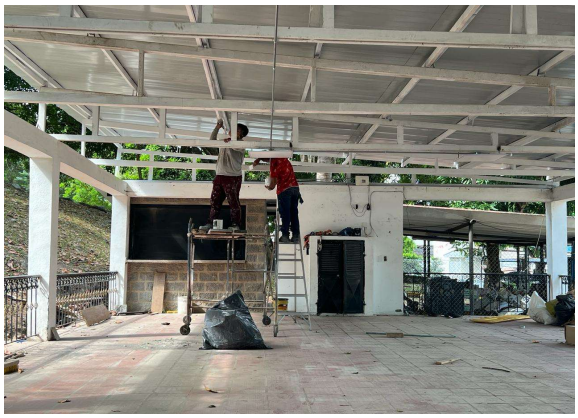



REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES






MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

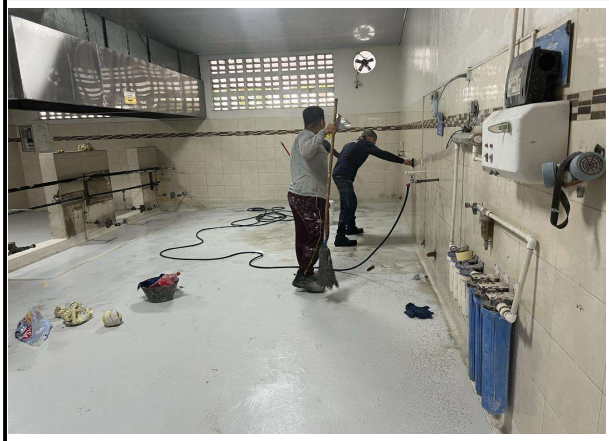

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA

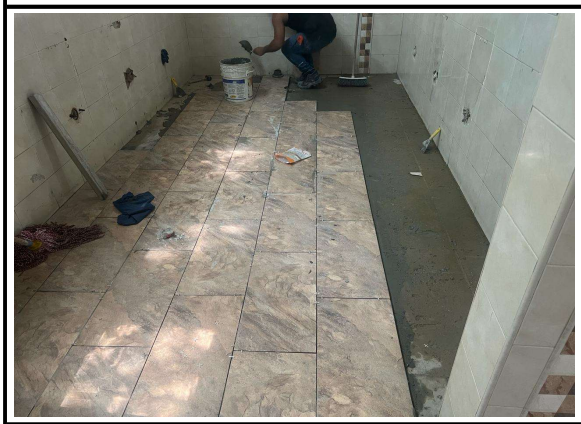

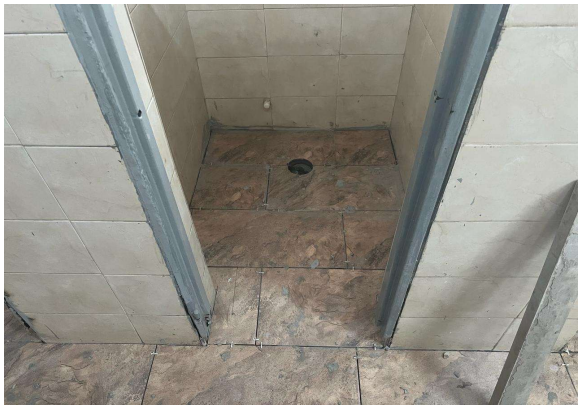

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES





REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)

MARRERO	**INFORME SEMANAL**	**FR-SGSST-40** **Versión: 02** **19/05/2023**





AVANCE FINANCIERO

EJECUCION DE OBRA		**SEMANA 7**
Valor según Programacion de obra	$ 28.509.000,00	5,59%
Valor ejecutado semanal	$ 38.505.000,00	7,55%
Valor ejecutado acumulado	$ 422.688.000,00	82,88%

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA		**SUPERVISOR**
ARQ DANIELA ARBELAEZ		**ST. LAURA PEREZ BENJUMEA**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-006742-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-006742-CE del 29 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor
CARLOS MARRERO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Contraseña:7eJPVtnX8g

Asunto: Llamado a cumplir las obligaciones del CTO 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023

En atención al CONTRATO No. 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DELGRUSE 45 DEL CACOM 4", me permito solicitar al señor representante legal de la empresa MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S cumpla con las obligaciones del contrato, las cuales están estipuladas en el EDP y en el anexo *"CONDICIONES GENERALES"*, toda vez que se han presentado las siguientes novedades:

1.Hasta la fecha NO se ha dado cumplimiento a uno de los aspectos de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, el cual es la conformación del equipo técnico básico, toda vez que hasta la fecha no se ha evidenciado participación del equipo solicitado, como es el caso del ingeniero civil especialista en estructuras, el ingeniero hidrosanitario y el ingeniero electricista, los cuales tienen la siguiente participación dentro del contrato:

01	Ing. Civil / Arquitecto. Residente de obra	5 años. Adicionalmente deberá contar con experiencia según se indica más adelante.	Residente de Obra	100%
01	Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en estructuras	2 años Adicionalmente deberá contar con experiencia según se indica más adelante.	Profesional asesor	30%
01	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	3 años	Residente SISO	100%
01	Ingeniero hidrosanitario	3 años	Profesional asesor	25%
01	Ingeniero electricista	2 años Adicionalmente deberá contar con experiencia según se indica más adelante.	Residente electricista	20%

Se recuerda que el plazo del contrato según el último modificatorio es el 16 de marzo de 2024 y para evitar posibles incumplimientos del contrato, se solicita que este personal cumpla con la dedicación requerida en obra, se anexen los conceptos técnicos y la planimetría firmada por cada profesional, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda de obra.

2.Se presentan demoras para la entregar la información correspondiente a los informes semanales y mesuales que debe ser enviados a la supervisión el último día del mes, donde se consigna el trabajo ejecutado hasta la fecha, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo programado, debe contar con el registro fotográfico y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, lo anterior según lo solicitado en las especificaciones técnicas. Por lo anterior, se solicita anexar al informe del mes de febrero un certificado de calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los items ejecutados en el presente mes.

Se recuerda que mensualmente se debe anexar el informe de Seguridad y Salud en el trabajo donde se mencionen las actividades realizadas por el profesional SST, como capacitaciones, inducciones, medidas de control para mejorar las condiciones de trabajo, adicionalmente se deberá anexar las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales.

3.Se debe llevar un control minucioso de los imprevistos del contrato, toda vez que se deberá entregar con el informe final, el desgloce de los mismos, los cuales serán verificados por parte de la supervisión.

4.Se solicita implementar un plan de contingencia, toda vez que se encuentran actividades retrasadas, según la programación aprobada en el último modificatorio del contrato, las cuales corresponden a:

- Suministro e instalación de piso poliuretano SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO en el rancho de tropa de Flandes

- En el frente de obra de la María no se han iniciado actividades, se debe tener en cuenta que la Unidad va a apoyar subiendo los materiales al sitio, pero a pesar de las solicitudes de la supervisión de ir adelantando tal actividad, solo hasta el día 23 de febrero por parte del director de obra se envió la solicitud de carga, por lo que ésta semana se ha complicado subir tales insumos, debido a diferentes requerimientos operacionales.

- Se encuentran atrasadas las actividades de la barraca No.3 de soldados, toda vez que según programación de obra éste frente de obra debió entregarse el 06 de febrero de 2024.

Se solicita tener en cuenta lo anteriormente mencionado, con el fin de evitar debidos incumplimientos del contrato.

Cordialmente,

Subteniente LAURA PEREZ BENJUMEA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

SIC ITUR AD ASTRA

CR. ROZO / SECOM. MY. BEJARANO / DECOP. TC. NÚÑEZ / GRUAL. MY. GRIJALBA / SEPSE

Elaboró: ST. PEREZ / MANIN Revisó: Aprobó:ST. PEREZ / MANIN

SIC ITUR AD ASTRA

FAC-S-2024-007079-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-007079-CE del 4 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor
CARLOS MARRERO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Contraseña:UlcBn4iYwd

Asunto: Inconformidad acabado de piso

En atención al CONTRATO No. 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4", me permito informar al señor representante legal de la empresa MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S, de acuerdo a la revista realizada, existe una inconformidad con el acabado de piso en poliuretano, se evidencian poros y grietas, no cuenta con un color ni textura uniforme, como se evidencia a continuación:



FAC-S-2024-007079-CE

De acuerdo a las especificaciones técnicas el piso en poliuretano SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 debe contar con esmalte Uretano brillante con particulas antideslizantes, de acuerdo a la hoja de dato del producto marca SIKA, este producto debe ser aplicado por profesionales con experiencia, se recomienda seguir las instrucciones de SIKA para la aplicación del mismo.

Por lo anterior, me permito informar que la presente supervisión no recibe a satisfacción el acabado de piso SIKA aplicado en el Rancho de Tropa del CACOM-4, se recomienda verificar con el fabricante las posibles soluciones, que en tal caso es de vitat importancia seguir al pie de la letra la hoja de dato del producto SIKAFLOOR - 210 PURCEM.

Cordialmente,

Subteniente LAURA PEREZ BENJUMEA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

CR. ROZO / SECOM; MY. GRIJALBA / SEPSE; MY. BEJARANO / DECOP

Elaboró: ST. PEREZ / MANIN Revisó: Aprobó:ST. PEREZ / MANIN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-016553-AG	Lugar y Fecha	CACOM-4,06-03-2024

Asunto	Reunión de seguimiento CTO 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023		
Oficina Productora	DECOP - GRUAL		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	15:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Se convoca reunión con el fin de revisar los posibles incumplimientos relacionados en el oficio No. FAC-S-2024-006742-CE del 29 de febrero de 2024, en relación al contrato No.068-00-G -CACOM-4-GRUAL-2023.
2. Se expresan consideraciones importantes para ser teniendas en cuenta por la ordenación del gasto, con el objetivo de prorrogar y modificar el contrato.
3. Se establecen compromisos de ambas partes para el llevar a feliz termino el contrato en mención.

Desarrollo:

De acuerdo al oficio No. FAC-S-2024-006742-CE del 29 de febrero de 2024, se convoca reunión por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana asiste el Señor CR. YERIM ANDRES ROZO como ordenador de gasto, MY. JAZMIN BEJARANO como Jefe DECOP, la ST. HERNANDEZ TATIANA asesora juridica y la ST. PEREZ LAURA como supervisora principal del contrato, asiste por parte de la empresa MARRERO ASESORIA Y SERVICIOS SAS el señor CARLOS MARRERO representante legal y la arquitecta DANIELA ARBELAEZ residente del contrato, con el fin de revisar los posibles incumplimientos relacionados en el mencionado oficio en relación al contrato No. 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 con objeto contractual "MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4".

1. Por parte de la supervisora del contrato se inicia recordando el cumplimiento de las obligaciones del contrato estipuladas en el EDP y en el anexo "CONDICIONES GENERALES", toda vez que hasta la fecha NO se ha dado cumplimiento a uno de los aspectos de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, el cual es la conformación del equipo tecnico basico, toda vez que hasta la fecha no se ha evidenciado participación del equipo solicitado, como es el caso del ingeniero civil especialista en estructuras, el ingeniero hidrosanitario y el ingeniero electricista, por lo que se le solicita al contratista traer el personal de profesionales a la obra, con el fin de que emitan los conceptos requeridos de acuerdo a sus especialidad. El señor representante legal quedó con el compromiso de hacer llegar este personal técnico a la obra para cumplir con el porcentaje de participación.
2. Se menciona que se encuentran demoras en la entrega de la información correspondiente a los informes semanales y mensuales que debe ser enviados a la supervisión el último día del mes, se recalca que tal compromiso ya fue cumplido por parte del contratista el día 01 de marzo de 2024.
3. Por parte de la supervisión se recalca la importancia de llevar un control minucioso de los imprevistos del contrato, toda vez que se deberá entregar con el informe final. La residente de obra menciona que una vez terminada la obra se entregará informe técnico desglosando el pago de estos imprevistos.

FAC-S-2024-016553-AG

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

4. De acuerdo al atraso que se tiene en la obra y de acuerdo a la solicitud realizada por la supervisora de implementar un plan de contingencia, el representante legal de la empresa solicita se tome en consideración prorrogar el contrato hasta el 01 de abril de 2024, con el objetivo de cumplir a cabalidad con las obligaciones del contrato y las especificaciones técnicas estipuladas en el mismo, toda vez que se tienen las siguientes consideraciones:

- Mediante oficio No. FAC-S-2024-007079-CE del 04 de marzo de 2024, la supervisora del contrato emite concepto de acuerdo a la revista realizada, en la cual existe una inconformidad con el acabado de piso en poliuretano, se evidencian poros y grietas, no cuenta con un color ni textura uniforme por lo que no se recibe a satisfacción el acabado de piso, por ende, mediante coordinaciones entre la supervisión y el contratista se busca un personal idóneo para la corrección del acabado de piso, el cual tiene previsto ingresar el día 09 de marzo de 2024 e iniciar con el mantenimiento del piso en poliuretano SIKAFLOOR PURCEMGLOSSY 210, se tiene previsto acabar ésta actividad el día 14 de marzo y de allí proceder al frente de obra de la María y Flandes.
- Se evidencia de acuerdo a condiciones meteorológicas en el frente de obra barraca No.1, se han adelantado actividades de estuco, pero de acuerdo al mal estado en el que se encuentra la canal existente, el trabajo se ha perdido, por lo que han tenido que iniciar nuevamente con la aplicación, la residente de obra menciona que será difícil garantizar la garantía del estuco y pintura con esta problemática, por parte del ordenador del gasto se analizará una posible solución para tal novedad.
- En relación a la barraca No.1, una vez desmontados los orinales se evidencia fugas internas, por lo que el personal contratista tuvo que romper baldosa y muros, con el fin de subsanar la novedad y proceder de tal modo a instalar los nuevos orinales, lo cual ha retrasado el rendimiento de la actividad.

Según los anteriormente expuesto se adquieren los siguientes compromisos de ambas partes, como se relaciona a continuación:

COMPROMISOS CONTRATISTA:

- Asistencia del personal técnico (profesionales) a la obra para que emitan los debidos conceptos y planimetría según su especialidad.
- Subsanar la novedad presentada con el acabado de piso instalado en el rancho de tropa del CACOM-4, de acuerdo a que no cumple con lo solicitado.

COMPROMISOS FAC:

- Apoyar al personal contratista con el traslado de personal en ruta MELGAR- LA MARÍA, con el fin de que inicien con las actividades de obra el día 09 de marzo de 2024, lo anterior se realizará de acuerdo a disponibilidad de aeronave.

SOLICITUDES CONTRATISTA:

- Se solicita prorrogar del contrato de 16 días calendario, es decir, hasta el 01 de abril de 2024 con el objetivo de para cumplir a cabalidad con las obligaciones del contrato y las especificaciones técnicas estipuladas en el mismo. Para tal solicitud por parte de la entidad se le solicita se emita

FAC-S-2024-016553-AG

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

oficio de solicitud de modificación del contrato con las siguientes justificaciones expuestas: Condiciones meteorológicas, calidad del acabado de piso, fugas de agua en la barraca No.1.

- Se solicita modificar la forma de pago del contrato, con el fin de establecer un corte adicional para el día 09 de marzo de 2024 y establecer el tercer y ultimo pago para el día 01 de abril de 2024.

De acuerdo a las solicitudes realizadas por el contratista, el ordenador del gasto, la jefe de DECOP, la especialista jurídica y la supervisora consideran suficientes las justificaciones para modificar el contrato, se espera la solicitud del contratista para continuar con el procedimiento establecido.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Asistencia del personal técnico	CONTRATISTA	01-04-2024
Subsanar la novedad presentada con el acabado de piso instalado	CONTRATISTA	01-04-2024
Oficio de solicitud de modificatorio	CONTRATISTA	06-03-2024
Apoyar al personal contratista con el traslado de personal en ruta MELGAR- LA MARÍA	SUPERVISION	09-03-2024

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Subteniente LAURA PEREZ BENJUMEA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

FAC-S-2024-016553-AG

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Elaboró: ST. PEREZ / MANIN Revisó: Aprobó:ST. PEREZ / MANIN

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	3
	Vigencia:	18/08/2023

TEMA REUNIÓN: Verificación presunto incumplimiento CTO 068-00-6-CACOM-4-2023.

OFICINA PRODUCTORA: DECOP - GRUAL.

LUGAR Y FECHA: CACOM_4 06-03-2024

HORA: 14:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CR.	Yenm Andies Rozo Cepeda	SECOM	CACOM-4	3187352723	yenm.rozo@fac.mil.co	
2	MY	Bejarano Beltrán Jazmín	DECOP	GSMAY	3129725127	jazmin.bejarano@fac.mil.co	
3	ST.	Perea Benjumea Laura	GRUAL	GRUAL	3136818214	laura.perea@fac.mil.co	PB
4		Daniela Arbeláez Niño	Arq Residente obra		3145172236	marrerosasesoriasas@gmail.com	DANIELA ARBELÁEZ
5		Carlos Albion Marrero Vargas	R/L Marrerosas AAS		3144436949	marrerosas20@gmail.com	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-078
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4
CONTRATISTA	MARRERO ASESORÍAS Y SERVICIOS S.A.S
SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA

HOJA DE VIDA	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA DILIGENCIAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	NÚMERO Y CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	No. DE FOLIOS ANEXOS Y OBSERVACIONES
	SI	NO						
INGENIERO ELECTRICISTA	X		21/02/2024	PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA	CN 205-57029	15 años, 11 meses	3203991061 - pedroahll@gmail.com	9 folios

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se requiré el concepto técnico del profesional, y teniendo en cuenta que no se aprobó la hoja de vida al firmar el acta de inicio, se revisa al profesional en mención el cual cumple con la experiencia solicitada de 02 años.

ELABORÓ:	APROBO:
SUPERVISORA COMANDANTE ESCUADRILLA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES CACOM-4	SUPERVISORA COMANDANTE ESCUADRILLA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES CACOM-4

CARTA DE INTENCION

Yopal, 07 de diciembre de 2023

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
MELGAR TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023

REFERENCIA: "MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4"

Estimados señores

El suscrito **PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA**, identificado con la cedula de ciudadanía No 80.179.867 de Bogota DC, Ingeniero electrico de profesión, por la presente declaro me comprometo a desempeñar el cargo de **RESIDENTE ELECTRICISTA** a la empresa **MARRERO ASESORÍAS Y SERVICIOS S.A.S** y para la ejecución del objeto en referencia.

FIRMA:



NOMBRE: **PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA**
C.C. No. 80.179.867 de Bogota DC

CONTRATO No 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
"MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4

ANEXO No. 4 - HOJA DE VIDA PROFESIONAL

OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4"		
NOMBRE Y APELLIDOS:	PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA		
TIULO OBTENIDO Y FECHA:	INGENIERO ELECTRICO MAYO DE 2005	**MATRICULA PROFESIONAL:**	CN205-57029
TITULO DE ESPECIALISTA:	N/A	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	RESIDENTE ELECTRICISTA

No. DE ORDEN	CONTRATANTE	OBJETO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	No. FOLIO SOPORTE	FECHA DE INICIO (dd-mm-aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aaaa)	TIEMPO (años)	DEDICACIÓN (Total)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (años)
1	ASECOINT GT SAS	INGENIERO ELECTRICISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN PENSAMIENTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE	INGENIERO ELECTRICISTA		1/06/2016	30/12/2019	3.63	100%	3.63
2	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 5INCO S&S SAS.	INGENIERO ELECTRICISTA		13/01/2020	3/09/2020	0.65	100%	0.65
							4.28		**4.28**

CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS
R/L MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA
CN205-57029
RESIDENTE ELECTRICISTA

PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA
C.C. 80.179.867
Matricula Profesional: CN205-57029
CALLE 4 # 36-55 Bogotá D. C.
CELULAR: 0057.1. 320 399 1061
E-MAIL: pedroahll@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería Eléctrica. Formado con conocimientos técnicos, administrativos y humanísticos, con habilidades para el levantamiento de información en campo, diseño de instalaciones eléctricas industriales y domiciliarias, análisis de sistemas de potencia y máquinas eléctricas, diseño de líneas de transmisión y subestaciones, conocimiento en sistemas dinámicos y de control e instrumentación. Con capacidad crítica para analizar problemas. Habilidad para el manejo de relaciones interpersonales, trabajo en equipo y adaptable a cambios con capacidad de análisis y tomas de decisiones.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.179.867**

HURTADO LLOREDA

APELLIDOS

PEDRO ANGEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1981**

QUIBDO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00169950-M-0080179867-20090815 **0015**003915A 1 1130107551

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines



Titular PEDRO ÁÑGEL HURTADO LLOREDA

D.I. 80.179.867

Ingeniero ELECTRICISTA

Matricula CN205-57029 Resol. C.P.N. 15/2008

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
"JULIO GARAVITO"

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de Grado No. 6214

El Consejo Directivo de la ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, en su sesión del día 4 de marzo de 2008, mediante el Acta General de Grado Profesional No. 35,

Considerando

Que la ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, con Personería Jurídica del Ministerio de Justicia, Resolución No. 086 del 19 de enero de 1973 y certificada por el Ministerio de Educación Nacional, está facultada por el Gobierno Nacional para expedir el título profesional en Ingeniería Electricista.

Que el señor **Pedro Ángel Hurtado Lloreda** con C. C. No. 80.179.867 de Santafé de Bogotá D.C., ha presentado su solicitud de grado profesional acompañada de todos los documentos exigidos para el efecto, que el solicitante ha cursado y aprobado todas las asignaturas que componen el plan de estudios, y que ha cumplido los demás requisitos legales y reglamentarios según certifican el Rector y el Secretario General de la ESCUELA,

Resuelve

Primero: Otorgar el título de **Ingeniero Electricista** al señor

Pedro Ángel Hurtado Lloreda

Segundo: Disponer que en testimonio del presente grado se haga entrega del diploma correspondiente, previo el juramento de rigor, en ceremonia especial.

Para constancia, expide y certifica el Secretario General de la ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, en Bogotá D. C., el 4 de marzo de 2008.

Ing. RICARDO A. LÓPEZ CUALLA
Secretario General

No. de Registro 05396 **Libro de diplomas No. 1** **Folio 2698**

República de Colombia

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

con Personería jurídica concedida por el Ministerio de Justicia según resolución No 086 del 19 de enero de 1973

otorgó a

Pedro Ángel Hurtado Lloreda

c.c. 80.179.867 Santafé de Bogotá D.C.

el día 4 de marzo de 2008

El título de

Ingeniero Electricista

En testimonio de ello se expide el presente Diploma

Presidente del Consejo Directivo

Rector

Secretario General

Acta de Grado No. 6214 *Registro No. 05396* *Libro de Diploma No. 1* *Folio No. 2698*

Bogotá, D. C. 4 de marzo de 2008

NIT: 900463585

El suscrito **GERMAN ANDRES TORRES DELGADO** Identificado con cedula de ciudadania No 1.118.530.984 expedida en Yopal Casanare actuando en calidad de representante legal de la empresa **ASECOINT GT SAS**, identificada tributariamente con Numero 900.463.585-8

CERTIFICA:

Que **el ing. PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA** identificado con cedula de ciudadanía 80.179.867 de BOGOTA DC, Presto los servicios como **INGENIERO ELECTRICO** en la ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura institucional de las instalaciones de la empresa construcciones y servicios de la Orinoquia e infraestructura institucional dela fundación pensamiento social en el municipio de Yopal Casanare.

1 de junio de 2016 al 30 de diciembre de 2019.

La presente se expide a solicitud del interesado.



GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
GERENTE

(098) 633 2940
Calle 30 N 21a - 33 Piso 2 / Yopal / Cas
contacto@asecointgt.com.co

LUZ ELIANA MESA SANCHEZ identificada con cedula de ciudadanía numero 1.057.574.660 representante legal de la empresa **5INCO SERVICIOS & SUMINISTROS SAS NIT 901253593**

CERTIFICA

Que el ingeniero **PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA** identificado con cedula de ciudadanía 80.179.867 de BOGOTA DC de profesión INGENIERO ELECTRICO, presto los servicios profesionales en el siguiente proyecto con una dedicación del 100%:

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 5INCO S&S SAS.

FECHA DE INICIO: 13 de enero de 2020.
FECHA DE TERMINACION: 03 de septiembre de 2020.
AREA INTERVENIDA: 250 M2

La presente se expide a solicitud del interesado

LUZ ELIANA MESA SANCHEZ

INFORME PARA CORTE DE GESTION DEL RIESGO-SG-SST
MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S
PERIODO DESDE EL 26-01-2024 al 29-02-2024
MELGAR TOLIMA 2023

CONTRATO DE OBRA No. 068-00-E-CACOM-4-GRUAL-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 NIT. 800.141.632-1 Y MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S CON NIT. 901.337.149-4.

INFORME FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PERIODO: DEADE EL 26-01-2024 al 29-02-2024

INTRODUCCION

Este informe detalla las actividades realizadas en relación con el contrato **068-00-E-CACOM-4-GRUAL-2023** para dar cumplimiento al programa de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, además de la gestión social que se presenten durante el periodo del 26-01-2024 al 29-02-2024, para prevenir, mitigar y controlar cualquier peligro o riesgo que se presente durante el desarrollo de la obra.

Para llevar a cabo las actividades se contó con un grupo de personal operativo, administrativo y contratistas, por tal motivo se establecieron estrategias que permitieron velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, implementando un plan de trabajo de SST a través de evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de requisitos legales, el diagnostico de condiciones de salud, la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles, en pro de mantener un ambiente de trabajo seguro y prevenir accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus actividades, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, la mejora continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales.

OBJETIVOS INTEGRADOS

1. Realizar nuestras labores con calidad y excelente servicio.
2. Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable a nuestra actividad laboral.
3. Cuidar la seguridad y salud de nuestros colaboradores mediante la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, así como ejecución de campañas de promoción y prevención.
4. Cuidar el medio ambiente, capacitando a nuestro personal para evitar impactos ambientales.
5. Optimizar los recursos.

ACCIONES REALIZADAS

A continuación, se detallan las actividades preventivas realizadas por el personal de obra y personal administrativo para el cumplimiento del SG-SST:

- Se realizaron charlas de seguridad, bioseguridad y ambientales como medidas anticipadas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, fomentando también el autocuidado.

- Se hizo señalización en las zonas de trabajo para prevenir ingresos o el paso del personal externo de la obra. (registro fotográfico)

- Se realizaron pausas activas y se le suministro hidratación al personal, para mejor el desempeño laboral, contribuir al fortalecimiento del trabajo en equipo y tener un ambiente saludable durante las jornadas. (registro fotográfico)

- Se realiza entrega de elementos de protección personal, para el auto cuidado y la mitigación de accidentes e incidentes.

- Se diligencias los formatos correspondientes a cada actividad:
  - (ATS) análisis trabajo seguro de cada una de las actividades desarrolladas.
  - Permisos de trabajos en alturas para los trabajos realizados en las cubiertas y tejados de casas y barracas.
  - Inspecciones de herramientas manuales y eléctricas, equipos para trabajo seguro en alturas y maquinaria necesaria para las actividades.
  - Se hace separación de residuos y disposición final.

GESTIÓN SOCIAL:

La gestión social en obras es un instrumento mediante el cual se pretende dar el manejo adecuado a los impactos sociales generados por la realización de obras de mantenimiento en la infraestructura en las diferentes áreas del CACOM 4 en Melgar Tolima.

Se busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, como cambios abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del sector o nuevos intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. De igual manera, impactar positivamente en las comunidades que deben reconocer el cambio en su calidad de vida por la demanda de bienes y servicios, así como brindarles capacitación a los trabajadores para que cumplan las normas y control que rige la unidad.
Finalmente, la gestión social es una herramienta para la evaluación y el mejoramiento del desarrollo durante las etapas de construcción y operación de las obras realizadas.

Por lo anterior MARREROS está en busca de dar mejoras a las arias intervenidas para ofrecer un mejor ambiente a las personas que residen en el CACOM 4, estando atentos a cualquier solicitud por parte de la unidad y de su personal. También se compromete a dar cumplimiento con las normas que se establecen para la seguridad de todos.

PERSONAL EN OBRA DESDE EL 27-01-2024 al 24-02-2024

Ítem	Cedula	Apellido y Nombre Completo	Cargo
1	118568116	JHON MARIO SAGANOME CAMACHO	AYUDANTE
2	1005855239	JUAN CAMILO RODRIGUEZ LOPES	AYUDANTE
3	1118548472	ROOBERTH JORDANIAN PEREZ HERNANDEZ	MAESTRO
4	74814899	NELSON GABRIEL ABRIL PEREZ	OFICIAL
5	9847104	SIGIFREDO OSORIO MORALES	OFICIAL
6	91446378	IOHAN ALFONSO JIMENEZ CRUZ	AYUDANTE
7	1118576392	ANDRES FELIPE RINCON RODRIGUEZ	SOLDADOR
8	1098628386	DUVAN ARMANDO SANABRIA DIAZ	OFICIAL
9	14249806	SABAS GODOY REYES	OFICIAL
10	79324910	WILLIAM ALONSO BELTRAN MURILLO	OFICIAL
11	1193287861	JERSSON CAMILO PEÑA ROJAS	AYUDANTE
12	1105672681	JULIAN DAVID PEÑA ROJAS	AYUDANTE
13	1106892337	WILLINTON GOMEZ RAYO	AYUDANTE
14	1006029758	SERGIO CAMILO GUTIERREZ VARON	AYUDANTE
15	1059813850	OSMAN LONDOÑO RESTREPO	MAESTRO
16	94441516	JOHN JAIRO OROBIO QUIÑONES	SOLDADOR
17	80179867	PEDRO ANGEL HURTADO LLOREDA	ELECTRICO

Personal en rojo son retirados

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ítem	Cedula	Apellido y Nombre Completo	Cargo
1	1057590448	DANIELA ARBELAEZ NIÑO	RES. ARQUITECTA
2	1077868994	GLORIA ISABEL RAMOS OLIVEROS	RES. SST
3	74814250	FELIPE ANDRES COLINA APONTE	DIRECTOR DE OBRA
4	17343101	CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS	REPRESENTANTE LEG.

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DOCUMENTO	DC-SGSST-01
		Versión: 01
		30/11/2022
		Hoja 1 de 1


















MARRERO	**DOCUMENTO**	**DC-SGSST-01** **Versión: 01** **30/11/2022** **Hoja 1 de 1**




















MARRERO	**DOCUMENTO**	**DC-SGSST-01** **Versión: 01** **30/11/2022** **Hoja 1 de 1**














GLORIA RAMOS OLIVEROS

COORDINADORA PROYECTO SST

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS	Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74722732	$4.916.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.400	0		0		0	1	100	0	40.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.900	0		0		0	1	200	0	146.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.500	0		0		0	1	200	0	114.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	236.700	0		0		0	1	300	0	237.000	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	50.300	0		0		0	1	100	0	50.400	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	4.000	0		0		0	1	100	0	4.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	263.500	0	0	0	0	1	300	0	263.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.109.000	0	0	0	0	1	1.900	0	2.110.900	17
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.000	0	0	0	0	1	100	0	7.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.036.300				1.036.300	1	1.000	1.037.300			10.363	1.037.300	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	643.800	1	600	644.400	21

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS		Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74722732	$4.916.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	643.800	644.900
Pensión	4	2.587.500	2.590.000
Riesgos Laborales	1	1.036.300	1.037.300
CCF	1	643.800	644.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.911.400	4.916.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS		Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74722732	$4.916.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005855239	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006029758	GUTIERREZ VARON SERGIO CAMILO	1	0			S	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS037	476.667	19.100	14-23	476.667	5	33.200	CCF69	476.667	19.100	0	0	0	0	0
3	CC	1057590448	ARBELAEZ NIÑO DANIELA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF69	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1077868994	RAMOS OLIVEROS GLORIA ISABEL	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF69	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1098628386	SANABRIA DIAZ DUVAN ARMANDO	1	0			S	X																230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	39.900	14-23	996.667	5	69.400	CCF69	996.667	39.900	0	0	0	0	0
6	CC	1105672681	PEÑA ROJAS JULIAN DAVID	1	0			S	X																230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS017	910.000	36.400	14-23	910.000	5	63.400	CCF69	910.000	36.400	0	0	0	0	0
7	CC	14249806	GODOY REYES SABAS	1	0			S	X	X															230301	53.334	8.600	0	0	0	0	EPS002	53.334	2.200	14-23	53.334	5	3.800	CCF69	53.334	2.200	0	0	0	0	0
8	CC	17343101	MARRERO VARGAS CARLOS ALBIAR	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	74814250	COLINA APONTE FELIPE ANDRES	1	0			S	X	X															230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS005	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF69	346.667	13.900	0	0	0	0	0
10	CC	9847104	OSORIO MORALES SIGIFREDO	1	0			S																	230301	1.353.334	216.600	0	0	0	0	EPS037	1.353.334	54.200	14-23	1.353.334	5	94.200	CCF69	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0
11	CC	9847104	OSORIO MORALES SIGIFREDO	1	0			S									X								230301	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS037	46.667	0	14-23	46.667	5	0	CCF69	46.667	0	0	0	0	0	0
12	CC	1118576392	RINCON RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1	0			S	X	X															230301	53.334	8.600	0	0	0	0	EPSC25	53.334	2.200	14-23	53.334	5	3.800	CCF69	53.334	2.200	0	0	0	0	0
13	CC	12132193	MEDINA PERDOMO LUIS ALBERTO	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC25	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF69	43.334	1.800	0	0	0	0	0
14	CC	1118548472	PEREZ HERNANDEZ ROOBERTH JORDANIAN	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF69	43.334	1.800	0	0	0	0	0
15	CC	1118568116	SAGANOME CAMACHO JHON MARIO	1	0			S																	230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS041	1.256.667	50.300	14-23	1.256.667	5	87.500	CCF69	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
16	CC	1118568116	SAGANOME CAMACHO JHON MARIO	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF69	43.334	0	0	0	0	0	0
17	CC	1193287861	PEÑA ROJAS JERSSON CAMILO	1	0			S	X																230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	36.400	14-23	910.000	5	63.400	CCF69	910.000	36.400	0	0	0	0	0
18	CC	74814899	ABRIL PEREZ NELSON GABRIEL	1	0			S	X																230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	39.900	14-23	996.667	5	69.400	CCF69	996.667	39.900	0	0	0	0	0
19	CC	1005855368	GUTIERREZ LOPEZ JONATHAN JULIAN	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF69	43.334	1.800	0	0	0	0	0
20	CC	1106892337	GOMEZ RAYO WILLINTON	1	0			S	X																230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS017	606.667	24.300	14-23	606.667	5	42.300	CCF69	606.667	24.300	0	0	0	0	0
21	CC	79324910	BELTRAN MURILLO WILLIAN ALONSO	1	0			S	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF69	43.334	1.800	0	0	0	0	0
22	CC	79498736	ROZO VELASQUEZ CARLOS HERNANDO	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF69	43.334	1.800	0	0	0	0	0
23	CC	91446378	JIMENEZ CRUZ IOHAN ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS	Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	16/01/2024	74020083	$12.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.600	0		0		0	4	100	0	1.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	6.200	0	0	0	0	4	100	0	6.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.700				2.700	4	100	2.800			27	2.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.600	4	100	1.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.600	1.700
Pensión	1	6.200	6.300
Riesgos Laborales	1	2.700	2.800
CCF	1	1.600	1.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	12.100	12.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS		Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	16/01/2024	74020083	$12.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80179867	HURTADO LLOREDA PEDRO ANGEL	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS	Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73972717	$2.330.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	21.700	0		0		0	3	100	0	21.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.500	0		0		0	3	400	0	113.900	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.900	0		0		0	3	100	0	2.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	14.000	0		0		0	3	100	0	14.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	101.700	0		0		0	3	300	0	102.000	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	34.200	0		0		0	3	100	0	34.300	3
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	1.600	0		0		0	3	100	0	1.700	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	21.700	0		0		0	3	100	0	21.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	81.800	0	0	0	0	3	300	0	82.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	958.300	0	0	0	0	3	2.600	0	960.900	14
231001	Colfondos	800227940-6	191.800	0	0	0	0	3	600	0	192.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.200	0	0	0	0	3	100	0	6.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	464.300				464.300	3	1.300	465.600			4.643	465.600	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	310.300	3	900	311.200	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS		Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73972717	$2.330.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	310.300	311.600
Pensión	4	1.238.100	1.241.700
Riesgos Laborales	1	464.300	465.600
CCF	1	310.300	311.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	2.323.000	2.330.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901337149-4	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS		Carrera 8 Numero 46B - 27	3144436949	marrerosas20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73972717	$2.330.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005855239	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CAMILO	1	0			S	X																230201	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS017	348.000	14.000	14-23	348.000	5	24.300	CCF69	348.000	14.000	0	0	0	0	0
2	CC	1053327359	ZAMORA ROBLES OLMAN ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
3	CC	1057574660	MESA SANCHEZ LUZ ELIANA	1	0			S	X	X															231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
4	CC	1057590448	ARBELAEZ NIÑO DANIELA	1	0			S	X																230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF69	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061624362	OSORIO MORALES JUAN DIEGO	1	0			S	X	X															230201	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS010	46.667	1.900	14-23	46.667	5	3.300	CCF69	46.667	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1069479925	MIRANDA PAEZ ARBEIS UNAR	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
7	CC	1118548472	PEREZ HERNANDEZ ROOBERTH JORDANIAN	1	0			S	X																230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS037	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.900	CCF69	773.334	31.000	0	0	0	0	0
8	CC	1118568116	SAGANOME CAMACHO JHON MARIO	1	0			S	X																230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS041	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.900	CCF69	773.334	31.000	0	0	0	0	0
9	CC	79381678	OBESO TORRES HECTOR	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
10	CC	79498736	ROZO VELASQUEZ CARLOS HERNANDO	1	0			S	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS002	541.334	21.700	14-23	541.334	5	37.700	CCF69	541.334	21.700	0	0	0	0	0
11	CC	1077868994	RAMOS OLIVEROS GLORIA ISABEL	1	0			S	X																230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS037	800.000	32.000	14-23	800.000	5	55.700	CCF69	800.000	32.000	0	0	0	0	0
12	CC	1106897414	COVALEDA RODRIGUEZ JOSE MANUEL	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
13	CC	1118530962	ANTOLINEZ TORRES BRAYAN OSWALDO	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSC25	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
14	CC	1118530984	TORRES DELGADO GERMAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
15	CC	91446378	JIMENEZ CRUZ IOHAN ALFONSO	1	0			S	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPSC34	541.334	21.700	14-23	541.334	5	37.700	CCF69	541.334	21.700	0	0	0	0	0
16	CC	9847104	OSORIO MORALES SIGIFREDO	1	0			S	X																230301	886.667	141.900	0	0	0	0	EPS037	886.667	35.500	14-23	886.667	5	61.800	CCF69	886.667	35.500	0	0	0	0	0
17	CC	1118575293	GUTIERREZ LEON CESAR IVAN	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
18	CC	17343101	MARRERO VARGAS CARLOS ALBIAR	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF69	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	74188301	RIVAS TOCA JOSE ALBEIRO	1	0			S	X	X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF69	38.667	1.600	0	0	0	0	0
20	CC	74814250	COLINA APONTE FELIPE ANDRES	1	0			S	X	X															230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS005	116.000	4.700	14-23	116.000	5	8.100	CCF69	116.000	4.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
