No: 20-2-2023-004169
22/12/2023 16:37:10

Doctor
JAIME JOSE BAUTE DANGON
Subdirector (E)
CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
SENA – REGIONAL CESAR
KM 7 VIA LA PAZ
Valledupar

Asunto: Informe de supervisión Parcial de
contrato CO1.PCCNTR.5553686
diciembre 2023

Cordial saludo;

Con el fin de surtir el trámite de pago parcial respectivo, me permito allegar el informe de supervisión del contrato CO1.PCCNTR.5553686 por parte del contratista SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos para continuar con el proceso:

- Acta de supervisión parcial
- Informe contratista
- Factura electrónica
- Soporte seguridad social
- Certificación bancaria
- Rut expedido por la DIAN
- Garantias

Atentamente;

MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN
Instructora G17
Supervisora de contrato

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Valledupar, Cesar, 22 de diciembre 2023

CO1.PCCNTR.5553686 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.5553686 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023**, celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **JAIME JOSE BAUTE DANGON**, Subdirector(E) del Centro y **P&R GRUPO EMPRESARIAL SAS**, representada legalmente por **LIZETH BELTRAN ORTIZ**, cuyo objeto es: "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de almacenamiento de residuos Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar.", me permito presentar informe final de supervisión del mismo, de acuerdo con lo siguiente

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE – CBC**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.5553686 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023**
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de almacenamiento de residuos Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar
CONTRATISTA	**SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**LIZETH BELTRAN ORTIZ**
NIT.	**900950957-3**

VALOR INICIAL	**CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 41.700.753 COP COP) MCTE**
FORMA DE PAGO **PAGO 1: 50%** **PAGO 2: 25%** **PAGO 3: 25%** **TOTAL: 100%**	A. POR PARTE DEL CONTRATISTA: presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN (En caso de estar obligado). Acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado. Estos documentos deben soportarse en el secop II cumpliendo el procedimiento es por los lineamientos trámite de pago Contratistas del SENA que se encuentre vigente para ello. B. POR PARTE DEL SENA: El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato del recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales (art. 50 Ley789 de 2002 y art. 23 Ley 1150 de 2007), de acuerdo al derecho de turno. Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto, queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
PLAZO INICIAL	Cuarenta (40) días, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**6623 de fecha 2023-09-06**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP 236223 de 2023-11-27**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**28 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA DE INICIO	**30 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**30 DE DICIEMBRE DE 2021**
VALOR TOTAL PAGADO	**CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 41.700.753 COP COP) MCTE**

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍAS CONTRACTUALES:
1. Cumplimiento del contrato.
2. Pago de salarios.
3. Calidad del servicio.
4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO					
NOMBRE DE ASEGURADORA	**No POLIZA**	**GARANTIAS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187142	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2023	30/06/2024	$ 4.426.077,70
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	16/11/2023	30/12/2026	$ 2.213.038,85
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	16/11/2023	30/06/2024	$ 8.852.155,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2023	30/06/2024	$ 8.852.155,40
	25-40-101049681	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16/11/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00
GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO					

NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	GARANTIAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187142	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2023	12/07/2024	$ 4.426.077,70
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	28/11/2023	11/01/2027	$ 2.213.038,85
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	28/11/2023	12/07/2024	$ 8.852.155,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/2023	12/07/2024	$ 8.852.155,40
	25-40-101049681	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/11/2023	11/01/2024	$ 232.000.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN, durante la ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.5553686 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023,** no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día de diciembre de 2023,El Representante Legal **LIZETH BELTRAN ORTIZ**, certifica que **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S. 900950957-3** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, según planilla No. 9460391678 de diciembre de 2023, las cuales, se encuentran pagadas, dando cumplimiento a lo consignado en la forma de pago.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Que el Supervisor del Contrato No. **CO1.PCCNTR.5553686 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023**, MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN, Instructor G17 certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, como también certifica que se encuentra a paz y salvo en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales del mes de diciembre de 2023, como consta en el certificado expedido por el representante legal de la firma **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S. 900950957-3**.

En la ejecución del objeto contractual del Contrato No. **CO1.PCCNTR.5553686 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023**, no se presentó incumplimiento que dieran lugar a procesos de imposición de multas.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN en el mes de noviembre del 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

1. BALANCE DEL CONTRATO:

I. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 41.700.753	20/12/2023	DICIEMBRE	20.889.914,01	50,09%
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	$ 41.700.753.				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	.				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 20.889.914,01 .				
Vr. SALDO A LA FECHA	$ 20.889.914,01				

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)		$	20.889.914,01

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
21/12/2023	E43	$ 20.889.915	$ 20.889.915		50,09%		

I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	50,09%
Financiera	50,09%

Para el periodo informado se realizaron avances en las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	ADECUACION BODEGAS RESIDUOS CBC - VALLEDUPAR		
1	**PRELIMINARES**		
1,03	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	**12,00**
1,04	DESMONTE CUBIERTAS TEJAS ONDULADAS	M2	**12,00**
1,05	PODA DE ARBOL, INC RETIRO	UND	**1,00**
1,06	RETIRO DE SOBRANTES EN OBRA	M3	**12,00**
2	**EXCAVACIONES**		
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL ESP. DE 0,10 A 0,30m (RED A.N. A POZO)	ML	**6,00**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
4	**CUBIERTAS**		
4,01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-TEJA MASTER 1000 (CUBIERTA LATERAL)	M2	**34,10**
4,02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO TEJA ASBETO CEMENTO DETERIORADA EXISTENTE POR TEJA MASTER 1000	M2	**16,00**
6	**ACABADOS Y PINTURA**		
6,02	PINTURA KORAZA EXTERIORES	M2	**50,80**
6,03	LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVO PERFIL METALICO EN C (CORREAS CUBIERTA)	ML	**4,00**
7	**CARPINTERIA METALICA**		
7,01	MANTENIMIENTO PORTON DE ACCESO CORREDIZO MALLA ESLABONADA (CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE)	UND	**1,00**
7,02	MANTENIMIENTO PUERTA ACCESO A BODEGA DOS HOJAS (CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE)	UND	**1,00**
7,03	REJA MALLA ESLABONADA GALV CAL 10 OJO 2", INC. TUBO GALV. 1 1/2"	M2	**37,00**
7,06	REJILLA METALICA A=0,30, PARA CARCAMO, VARILLA 1/2" CON MARCO EN ANGULO	ML	**3,00**
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
9,01	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	**6,00**
9,02	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**6,00**
9,03	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	**1,00**
9,04	POZO SEPTICO 1000 LTS	UND	**1,00**
9,05	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" RDE 21.	ML	**50,00**
9,06	PUNTO HIDRÁULICO A.F. 1/2"	UND	**2,00**
9,07	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-LLAVES DE CONTROL DE Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UND	**1,00**
9,08	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 30X30CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI	ML	**3,00**
10	**APARATOS SANITARIOS**		
10,01	LAVAMANOS TIPO ACUACER BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE	UND	**1,00**
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
11,01	REVISION GENERAL RED ELECTRICA	UND	**1,00**
11,04	LUMINARIA LED HERMETICA 36W 4000 K FL 4500 O SIMILAR	UND	**3,00**
11,06	SALIDA TOMACORRIENTE GMFI 110V CON CABLE LIBRE DE HALOGENO	UND	**1,00**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe atendiendo que la ejecución del contrato para el cual fui designado como supervisor, queda como soporte de ejecución del proceso contractual, igual para el trámite de la cuenta y archivo en el expediente contractual.

El presente informe de ejecución se recibe a satisfacción recibo del mismo de manera parcial según factura E43

a los 20 días del mes de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.
Elaboró: MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN-Instructora grado 17

Elaboró: MARIA FERNANDA ESCALANTE Instructor G17
Revisó: MARIA FERNANDA ESCALANTE Instructor G17

Anexos:

a. Copia del acta de supervisión
b. Informe contratista
c. Comprobante de pago de salud y pensión
d. Acta de recibo a satisfacción
e. Rut
f. Factura electrónica
g. Cuenta bancaria

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5553686
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 9:15:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5553686
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de almacenamiento de residuos Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	41 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/06/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900950957

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	65600012547

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Lizeth Beltran Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 1:02:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *jaime jose baute dangon* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 3:57:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5553686_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 11 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 3:57:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12975399	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	38.691.261,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5553686
Proveedor SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S
Creado por MARY CARMEN ROSADO ANDRADE
Agregado en 20 horas de tiempo transcurrido *(27/11/2023 7:16:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario link del proceso origen https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28132968&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO TECNICO.pdf	ANEXO TECNICO.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DE RIESGO.pdf	ANALISIS DE RIESGO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 7 VIA LA PAZ CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1 CO1.PCCNTR.5553686

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						44.260.777,21	41.700.753,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101517	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de almacenamiento de residuos Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar	1,00	UN	44.260.777,21	41.700.753,00	44.260.777,21	41.700.753,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 1:02:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo_a la Aceptación_de_Oferta.pdf	Anexo_a la Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	jaime jose baute dangor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77168849	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA FERNANDA ESC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	56054500	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	jaime jose baute dangor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77168849	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	jaime jose baute dangon	28/11/2023 4:12:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN
Supervisor	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN	5 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 3:32:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	jaime jose baute dangon
Ordenador del pago	jaime jose baute dangon	12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:57:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	jaime jose baute dangon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	41.700.753
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	41.700.753

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-020-952010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6623	CDP	Generado	44.263.353 COP		36-02-00-020-911410	Editar

Saldo de CDP: 44.263.353 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 31/10/2023 1:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	236223	Presupuestal (CDP)	27/11/2023 12:00 AM	Generado	41.700.753 COP	41.700.753 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 41.700.753 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 41.700.753 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 27/11/2023 7:16 PM

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	**IBAGUE**	**25**	**25-44-101187142**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	**12**	**2023**	**28**	**11**	**2023**	**00:00**	**11**	**01**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S	**NIT: 900.950.957-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	VALLEDUPAR, CESAR	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR, CESAR	5703366

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5553686 FECHADO 16/11/2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**28/11/2023**	**12/07/2024**	**$4,426,077.70**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**28/11/2023**	**11/01/2027**	**$2,213,038.85**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**28/11/2023**	**12/07/2024**	**$8,852,155.40**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**28/11/2023**	**12/07/2024**	**$8,852,155.40**	

ACLARACIONES

REFERENTE ACTA DE INICIO CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5553686 SE ACLARA LAS VIGENCIAS INICIALES A PARTIR DEL DIA 28/11/2023 EN LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******62,279.00	$ *******8,000.00	$ ******13,353.00	$ ***********83,633.00	$ *******24,343,427.35	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY LUZ CABEZAS MORENO	999236	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101187142

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101187142	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2023	28	11	2023	00:00	11	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S		**NIT: 900.950.957-3**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	5703366

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101187142

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	**IBAGUE**	**25**	**25-40-101049681**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	**12**	**2023**	**28**	**11**	**2023**	**00:00**	**11**	**01**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S		**NIT: 900.950.957-3**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO:	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	5703366
BENEFICIARIO: 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SURGEN DE LAS ACTUACIONES HECHOS U OMISIONES EN EL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5553686 FECHADO 16/11/2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**28/11/2023**	**11/01/2024**	**$232,000,000.00**	

ACLARACIONES

REFERENTE ACTA DE INICIO CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5553686 SE ACLARA LA VIGENCIA INICIAL A PARTIR DEL DIA 28/11/2023 EN EL AMPARO ARRIBA CITADO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******69,917.00	$ *******3,000.00	$ ******13,854.00	$ **********86,772.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
FRANCY LUZ CABEZAS MORENO	999236	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

25-40-101049681

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-40-101049681	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2023	28	11	2023	00:00	11	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S		**NIT: 900.950.957-3**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	5703366

BENEFICIARIO: 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

25-40-101049681

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

Valledupar, 22 de diciembre de 2023

Arquitecta:
MARÍA FERNANDA ESCALANTE DURAN
SUPERVISORA

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN PARA ACTA DE COBRO PARCIAL

Respetuosamente presento el informe de gestión de cobro parcial del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5553686 cuyo objeto es ***"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de almacenamiento de residuos Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar."*** con corte a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del 2023.

Atentamente,

LIZETH BELTRAN ORTIZ
C.C No.1.098.759.710 de Bucaramanga
Rep. Legal de SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.”

CONTRATO DE OBRA N°. CO1.PCCNTR.5553686

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

INFORME DE COBRO PARCIAL 01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR
2023

INTRODUCCIÓN

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S en calidad de contratista tiene el propósito del cumplimiento de las obligaciones establecidas de acuerdo con el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5553686.

Con el objeto de dar a conocer a la entidad contratante el avance y ejecución del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5553686. cuyo objeto es: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR." el contratista, en cumplimiento integral de sus funciones, presenta el actual informe con ejecución y corte en el periodo comprendido entre el veintiocho (28) de noviembre de 2023 y el dieciocho (18) de diciembre de 2023.

El presente informe tiene como objetivo documentar y presentar de manera detallada todas las actividades, avances y resultados relacionados con el proyecto llevado a cabo por el contratista SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S. Este proyecto, está siendo desarrollado bajo la supervisión de la arquitecta MARÍA FERNANDA ESCALANTE DURAN, en el recorrido de este informe, se proporcionarán detalles de las tareas realizadas y los logros alcanzados durante la ejecución de la obra, asimismo información legal y financiera del contrato.

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR
SUPERVISIÓN:	MARÍA FERNANDA ESCALANTE DURAN - INSTRUCTORA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
TIPOLOGÍA DE CONTRATACIÓN	OBRA
No. DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.5553686
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT	900.950.957-3
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH BELTRAN ORTIZ
IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL	1.098.759.710 DE BUCARAMANGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($41.700.753)
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO (30%)	N.A.
VALOR ADICIONAL	N.A.
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y UN (41) DÍAS
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE CORTE DEL INFORME	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2023

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

GARANTÍAS

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO					
NOMBRE DE ASEGURADORA	**No POLIZA**	**GARANTIAS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187142	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2023	30/06/2024	$ 4.426.077,70
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	16/11/2023	30/12/2026	$ 2.213.038,85
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	16/11/2023	30/06/2024	$ 8.852.155,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2023	30/06/2024	$ 8.852.155,40
	25-40-101049681	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16/11/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO					
NOMBRE DE ASEGURADORA	**No POLIZA**	**GARANTIAS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187142	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2023	12/07/2024	$ 4.426.077,70
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	28/11/2023	11/01/2027	$ 2.213.038,85
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	28/11/2023	12/07/2024	$ 8.852.155,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/2023	12/07/2024	$ 8.852.155,40
	25-40-101049681	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/11/2023	11/01/2024	$ 232.000.000,00

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

El centro de acopio de residuos es el lugar de concentración de los residuos aprovechables, como papel, cartón, vidrio, plástico, metal, especiales, como el aceite usado de cocina y peligrosos, entre otros. En el cual se realiza la separación de los residuos anteriormente mencionados y entregados a la empresa gestora externa legalmente constituidas, aleladas por las CAR y superintendencia de servicios públicos domiciliarios para cumplir el ciclo de vida del producto de manera legal y sostenible.

Las obras de saneamiento son fundamentales en la infraestructura de cualquier edificio, ya que son necesarias para el buen funcionamiento del mismo; Teniendo en cuenta los objetivos planteados para esta propuesta dentro del Centro de Formación, y las normas de desarrollo sostenible fijados por la ONU, garantizar el agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" con metas hasta 2030.

Por lo general se entiende por residuos peligrosos - RESPEL aquellos residuos que, debido a sus peligros intrínsecos, por ejemplo, ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente. Los RESPEL se pueden encontrar en estado sólido o semisólido o ser líquidos o gases contenidos en recipientes (por ejemplo, en cilindros de gas), Los residuos aprovechables son cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. En referencia a los residuos especiales - Aceite Usado de Cocina - ACU generados en el centro de formación producto de la cocción alimentaria para los aprendices del centro de convivencia y suministro a punto de venta

Una vez producido los residuos integrales en las instalaciones del centro de formación, se realiza la ruta interna para la disposición temporal en el centro de acopio de residuos (peligrosos especiales y aprovechables); la cual, actualmente por presentar condiciones de infraestructura ineficiente, afecta el almacenamiento de los residuos que ingresan al centro de acopio así como también las actividades asociadas a la desinfección, limpieza, rotulo, pesaje, embalaje debido a que presenta problemas locativos tales como: Mal estado puerta de acceso, desnivel de pisos, paredes con pintura desgastada, filtración de agua lluvias por tejado, sin iluminación con lavamanos defectuoso, ventanales en madera degastado afecta el servicio ambiental integral de residuos para la disposición final (entrega a gestora especializada autorizada legalmente) acorde al Plan de Gestión Integral - PGIRS CF.

Todo lo anterior ocasiona una inadecuada e ineficiente gestión ambiental lo cual dificulta la Gestión ambiental y genera escenarios deficientes para el desarrollo del saneamiento básico en la formación profesional integral, situación que puede incurrir a posibles sanciones legales a la entidad mediante los entes de control; por lo cual surge la necesidad del mejoramiento y mantenimiento del centro de acopio de residuos Biotecnológico del Caribe sede principal encaminada al cumplimiento de la perspectiva ciclo de vida de bienes y/o elementos que promulguen la gestión legal, prevención, reutilización, aprovechamiento y/o recuperación de materiales relevantes para la continuidad de una economía circular Sena.

El proyecto en cuestión consiste en: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR, las actividades de mejoramiento y mantenimiento del centro de acopio de residuos estuvieron orientadas a la restauración del piso de esta zona, reforzamiento de la estructura de cubierta y reemplazo de cubierta, reemplazo de portones, rejas y puertas, mantenimiento de cerramiento, puertas y ventanas, además de las instalaciones y aparatos hidrosanitarios y eléctricos, todas ella encaminadas al

restablecimiento de las actividades saneamiento, y correcta disposición y tratamiento de los residuos allí almacenados.

El proyecto en cuestión tiene el propósito de anticiparse a las afectaciones por contaminación ambiental, impactos en la economía circular verde o alteraciones en los ambientes sanos además de reducir la contaminación paisajística y restablecer el control ambiental de forma tal que se garantice la seguridad y bienestar de la comunidad circundante.

LOCALIZACIÓN

CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR, VALLEDUPAR CESAR

El proyecto se desarrollará en El Centro Biotecnológico del Caribe ubicado a las afueras del municipio de Valledupar en el kilómetro 7 vía a La paz, Valledupar es la capital del departamento del Cesar, Colombia. Está ubicada al nororiente de la Costa Caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá.

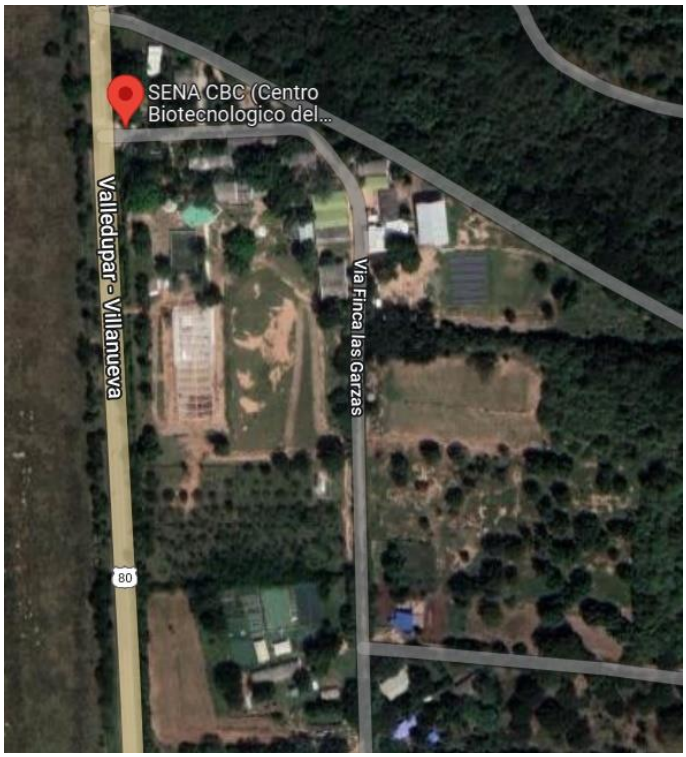


Imagen 1. *Localización Centro Biotecnológico del Caribe - SENA*

Valledupar está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los ríos Cesar y Guatapurí, en la Costa Caribe colombiana.
Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. La ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, siendo la altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m.



Imagen 2. *Localización general municipio de Valledupar (Cesar)*

Tiene una extensión total de 4.493 Km2 aproximadamente y la extensión en el área urbana: El casco urbano tiene una longitud norte-sur de 8.3 km y este-oeste de 6.2 km.
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): la ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m. al norte y 150 m. a sur, siendo la altitud media de 168 m.
Temperatura media: la temperatura Media Anual es de 28,4 ºC, con máximas y mínimas de 22ºC y 34ºC respectivamente, la temperatura máxima histórica registrada es de 41.5ºC y la mínima de 16ºC.

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

ALCANCE

El servicio nacional de aprendizaje – SENA, REGIONAL CESAR, formuló el proyecto denominado: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR." Con el fin de realizar mejoramiento y mantenimiento del centro de acopio de residuos Biotecnológico del Caribe sede principal.

Este proyecto contempla la ejecución de las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	ADECUACION BODEGAS RESIDUOS CBC - VALLEDUPAR		
1	**PRELIMINARES**		
1,01	DEMOLICION PLANTILLA PISO ESPESOR HASTA 0,10M	M2	**13,00**
1,02	DEMOLICION MANUAL PISO CONCRETO ANCHO DE 0,10m HASTA 0,35m (RED A.N. A POZO)	ML	**5,50**
1,03	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	**12,00**
1,04	DESMONTE CUBIERTAS TEJAS ONDULADAS	M2	**12,00**
1,05	PODA DE ARBOL, INC RETIRO	UND	**1,00**
1,06	RETIRO DE SOBRANTES EN OBRA	M3	**12,00**
2	**EXCAVACIONES**		
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL ESP. DE 0,10 A 0,30m (RED A.N. A POZO)	ML	**6,00**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
3,01	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI 3,40 X 1,00, ESP 0,10	M2	**3,40**
4	**CUBIERTAS**		
4,01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-TEJA MASTER 1000 (CUBIERTA LATERAL)	M2	**34,10**
4,02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO TEJA ASBETO CEMENTO DETERIORADA EXISTENTE POR TEJA MASTER 1000	M2	**16,00**
5	**ACEROS DE REFUERZOS**		
5,01	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	**30,00**
6	**ACABADOS Y PINTURA**		
6,01	PINTURA EPOXICA BLANCA INTERIOR (MUROS Y PISO)	M2	**65,00**
6,02	PINTURA KORAZA EXTERIORES	M2	**50,80**
6,03	LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVO PERFIL METALICO EN C (CORREAS CUBIERTA)	ML	**4,00**
7	**CARPINTERIA METALICA**		
7,01	MANTENIMIENTO PORTON DE ACCESO CORREDIZO MALLA ESLABONADA (CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE)	UND	**1,00**
7,02	MANTENIMIENTO PUERTA ACCESO A BODEGA DOS HOJAS (CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE)	UND	**1,00**
7,03	REJA MALLA ESLABONADA GALV CAL 10 OJO 2", INC. TUBO GALV. 1 1/2"	M2	**37,00**
7,04	PERSIANAS EN ALUMINIO TIPO Z	M2	**2,68**
7,05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRES PELOS ALAMBRE DE PUAS CONTORNO CERRAMIENTO	ML	**35,00**
7,06	REJILLA METALICA A=0,30, PARA CARCAMO, VARILLA 1/2" CON MARCO EN ANGULO	ML	**3,00**
7,07	ESRUCTURA METALICA EN PERFIL METALICO EN C PARA SOPORTE TEJA MASTER 1000 EN CUBIERTAS LATERALES (PARALES Y CERCHAS) ACABADO EN PINTURA ESMALTE	M2	**32,00**
8	**PISOS**		
8,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	**13,00**
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
9,01	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	**6,00**
9,02	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**6,00**
9,03	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	**1,00**
9,04	POZO SEPTICO 1000 LTS	UND	**1,00**

9,05	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" RDE 21.	ML	**50,00**
9,06	PUNTO HIDRÁULICO A.F. 1/2"	UND	**2,00**
9,07	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-LLAVES DE CONTROL DE Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UND	**1,00**
9,08	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 30X30CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI	ML	**3,00**
10	**APARATOS SANITARIOS**		
10,01	LAVAMANOS TIPO ACUACER BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE	UND	**1,00**
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
11,01	REVISION GENERAL RED ELECTRICA	UND	**1,00**
11,02	REFLECTORES TIPO LED 400W CELDA FOTOVOLTAICA	UND	**2,00**
11,04	LUMINARIA LED HERMETICA 36W 4000 K FL 4500 O SIMILAR	UND	**3,00**
11,06	SALIDA TOMACORRIENTE GMFI 110V CON CABLE LIBRE DE HALOGENO	UND	**1,00**

ACTIVIDADES DEL PERIODO

El proyecto “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.”, se desarrolla en el marco del contrato CO1.PCCNTR.5553686 desde el pasado veintiocho (28) de noviembre del año 2023, fecha en la que se suscribe acta de inicio, con un plazo de ejecución de cuarenta y un (41) días.

Los trabajos se iniciaron realizando inspección de verificación de las condiciones en las que se encontraba el área donde se realizará la intervención de dicho contrato y posterior a ello se iniciaron las actividades hasta corte del dieciocho (18) de diciembre de 2023, evidenciando un porcentaje de avance en la ejecución correspondiente al 50,09%

Para el periodo informado se realizaron avances en las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	ADECUACION BODEGAS RESIDUOS CBC - VALLEDUPAR		**AVANCE PARCIAL 01**
1	**PRELIMINARES**		
1,02	DEMOLICION MANUAL PISO CONCRETO ANCHO DE 0,10m HASTA 0,35m (RED A.N. A POZO)	ML	**6,00**
1,03	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	**12,00**
1,04	DESMONTE CUBIERTAS TEJAS ONDULADAS	M2	**1,00**
2	**EXCAVACIONES**		
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL ESP. DE 0,10 A 0,30m (RED A.N. A POZO)	ML	**6,00**
4	**CUBIERTAS**		
4,02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO TEJA ASBETO CEMENTO DETERIORADA EXISTENTE POR TEJA MASTER 1000	M2	**16,00**
6	**ACABADOS Y PINTURA**		
6,02	PINTURA KORAZA EXTERIORES	M2	**50,80**
6,03	LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVO PERFIL METALICO EN C (CORREAS CUBIERTA)	ML	**4,00**
7	**CARPINTERIA METALICA**		
7,01	MANTENIMIENTO PORTON DE ACCESO CORREDIZO MALLA ESLABONADA (CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE)	UND	**1,00**
7,03	REJA MALLA ESLABONADA GALV CAL 10 OJO 2", INC. TUBO GALV. 1 1/2"	M2	**37,00**
7,06	REJILLA METALICA A=0,30, PARA CARCAMO, VARILLA 1/2" CON MARCO EN ANGULO	ML	**3,00**
7,07	ESRUCTURA METALICA EN PERFIL METALICO EN C PARA SOPORTE TEJA MASTER 1000 EN CUBIERTAS LATERALES (PARALES Y CERCHAS) ACABADO EN PINTURA ESMALTE	M2	**11,00**
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
9,01	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	**6,00**

9,03	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	**1,00**
9,04	POZO SEPTICO 1000 LTS	UND	**1,00**
9,05	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" RDE 21.	ML	**50,00**
9,06	PUNTO HIDRÁULICO A.F. 1/2"	UND	**1,00**
9,07	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-LLAVES DE CONTROL DE Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UND	**1,00**
9,08	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 30X30CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI	ML	**3,00**
10	**APARATOS SANITARIOS**		
10,01	LAVAMANOS TIPO ACUACER BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE	UND	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo del proyecto se recolectaron las evidencias fotográficas que exponen el avance en la ejecución de las actividades contractuales con fecha de corte de dieciocho (18) de diciembre del 2023.





SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S







Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S










Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S







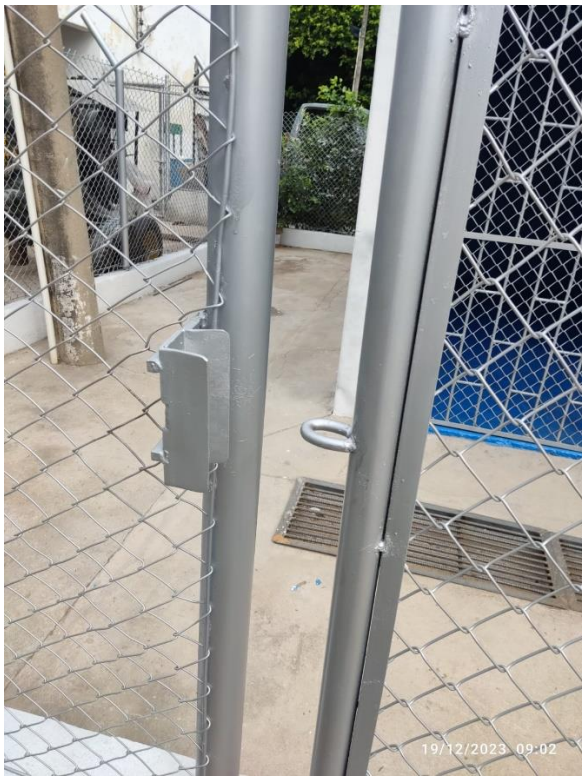

Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S









Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

CONCLUSIONES

La ejecución del proyecto de mejoramiento y mantenimiento del centro de acopio de residuos ubicado en El Centro Biotecnológico del Caribe ubicado a las afueras del municipio de Valledupar ha sido intervenido rigurosa, y exhaustivamente, con actividades que prevengan y mitiguen impactos ambientales, afectaciones en la economía circular verde o alteraciones en los ambientes sanos de forma tal que se garantice la seguridad y bienestar de la comunidad circundante, en consecuencia, de la ineficiente calidad del servicio en las instalaciones de funcionamiento del centro de acopio.

Una vez desarrolladas las actividades de mejoramiento se logró entregar una zona con las condiciones propicias para el correcto almacenamiento, entrega y disposición de los residuos que allí se encuentren, así como las labores de desinfección, limpieza, rotulo, pesaje y embalaje para la disposición final.

Desde la suscripción del contrato, se ha mantenido un compromiso firme con la excelencia en la ejecución de la obra. La ejecución y remodelación de esta zona, la gestión de obra técnica y especializada, garantizan un alcance integral que influye significativamente a la seguridad y bienestar de la comunidad circundante.

LIZETH BELTRAN ORTIZ
C.C No.1.098.759.710 de Bucaramanga
Rep. Legal de SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S
