INFORME No. 7

CONVENIO No. 2339 - 2023

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES MEDIANTE SUBSIDIO DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS MUNICIPIOS; OICATA, SANTA ROSA DE VITERBO, TOPAGA, MONGUI, MONGUA, FIRAVITOBA, CUCAITA, SAMACA, CALDAS, TUNJA.





PANORAMICA MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ENERO 13 DE 2024

GENERALIDADES

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUÍ, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO".

Decreto 0389 de 27 de marzo del 2023.
"Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caldas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Mongui y Mongua del Departamento de Boyacá" mediante Decreto No. 0176 de 23 de febrero de 2023, emitido por el Gobernador de Boyacá se priorizó, aprobó y se designó a la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones intemas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caldas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Mongui y Mongua del Departamento de Boyacá" identificado con código BPIN 2022000050029, el cual será financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

FASE

El proyecto se encuentra en fase I.

PLAZO DE EJECUCIÓN
Plazo de ejecución: NUEVE (09) MESES

ENTIDAD EJECUTORA
Departamento de Boyacá

ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN
Departamento de Boyacá – secretaria de Minas y Energía

AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO OICATA

La red de distribución avanza en un 57%, las inscripciones 73% y construcción de instalaciones internas en un 51%, Puesta en servicio el 31% para un total de 185 usuarios.

MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO

La red de distribución avanza en un 43%, las inscripciones 76% y construcción de instalaciones internas en un 36%, Puesta en servicio 24% para un total de 110 usuarios.

MUNICIPIO MONGUI

La red de distribución avanza en un 25%, las inscripciones 73% y construcción de instalaciones internas en un 20%. Puesta en servicio el 17% para un total de 127 usuarios.

MUNICIPIO MONGUA

La red de distribución avanza en un 60%, las inscripciones 89% y construcción de instalaciones internas en un 50%. Puesta en servicio el 4% para un total de 23 usuarios.

MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS

La red de distribución avanza en un 63%, las inscripciones 94% y construcción de instalaciones internas en un 87%. Puesta en servicio 36% para un total de 83 usuarios.

MUNICIPIO SAMACA

La red de distribución avanza en un 72%, las inscripciones 128% y construcción de instalaciones internas en un 123%. Puesta en servicio 58% para un total de 233 usuarios.

MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO

La red de distribución avanza en un 25%, las inscripciones 68% y construcción de instalaciones internas en un 54%, puesta en servicio 0%.

MUNICIPIO TUNJA


La red de distribución avanza en un 30%, las inscripciones 30% y construcción de instalaciones internas en un 26%. Puesta en servicio el 22% para un total de 168 usuarios.

AVANCE DE EJECUCION

Tabla No. 1. Descripción de las conexiones.

INFORME ENERO 13 DE 2024									
MUNICIPIO	ASIGNADOS	INSCRITOS	% AVANCE DE INSCRIPCIÒN	INSTALACIONES CONSTRUIDAS	% AVANCE CONSTRUCCION INSTALACIONES	INSTALACIONES EN SERVICIO	% DE INSTALACIONES EN SERVICIO INFORME 7	VALOR SUBSIDIO	VALOR A COBRAR
OICATA	600	440	73%	303	51%	185	31%	$ 1,330,148	$ 246,077,380
STA ROSA DE VIRTERBO	500	299	60%	35	7%	0	0%	$ 1,330,148	$ 0
TOPAGA	450	340	76%	160	36%	110	24%	$ 1,330,148	$ 146,316,280
MONGUI	750	550	73%	150	20%	127	17%	$ 1,330,148	$ 168,928,796
MONGUA	560	500	89%	280	50%	23	4%	$ 1,330,148	$ 30,593,404
FIRAVITOBA	400	50	13%	0	0%	0	0%	$ 1,330,148	$ 0
CUCAITA	230	217	94%	200	87%	83	36%	$ 1,330,148	$ 110,402,284
SAMACA	400	510	128%	490	123%	233	58%	$ 1,330,148	$ 309,924,484
CALDAS	220	150	68%	118	54%	0	0%	$ 1,330,148	$ 0
TUNJA	760	230	30%	195	26%	168	22%	$ 1,330,148	$ 223,464,864
TOTAL	4870	3286	0.674743326	1931	0.39650924	929	0.190759754	1330148	$ 1,235,707,492
TOTAL SUBSIDIOS CONVENIO									4870
VALOR TOTAL EJECUTADO									$ 1,235,707,492
VALOR POR EJECUTAR									$ 5,242,113,268
VALOR COBRADO INFORMES ANTERIORES									0
VALOR A COBRAR INFORME Nº 7									$ 1,235,707,492

Imagen 1. Informe de inspección de instalaciones- puesta en Servicio.

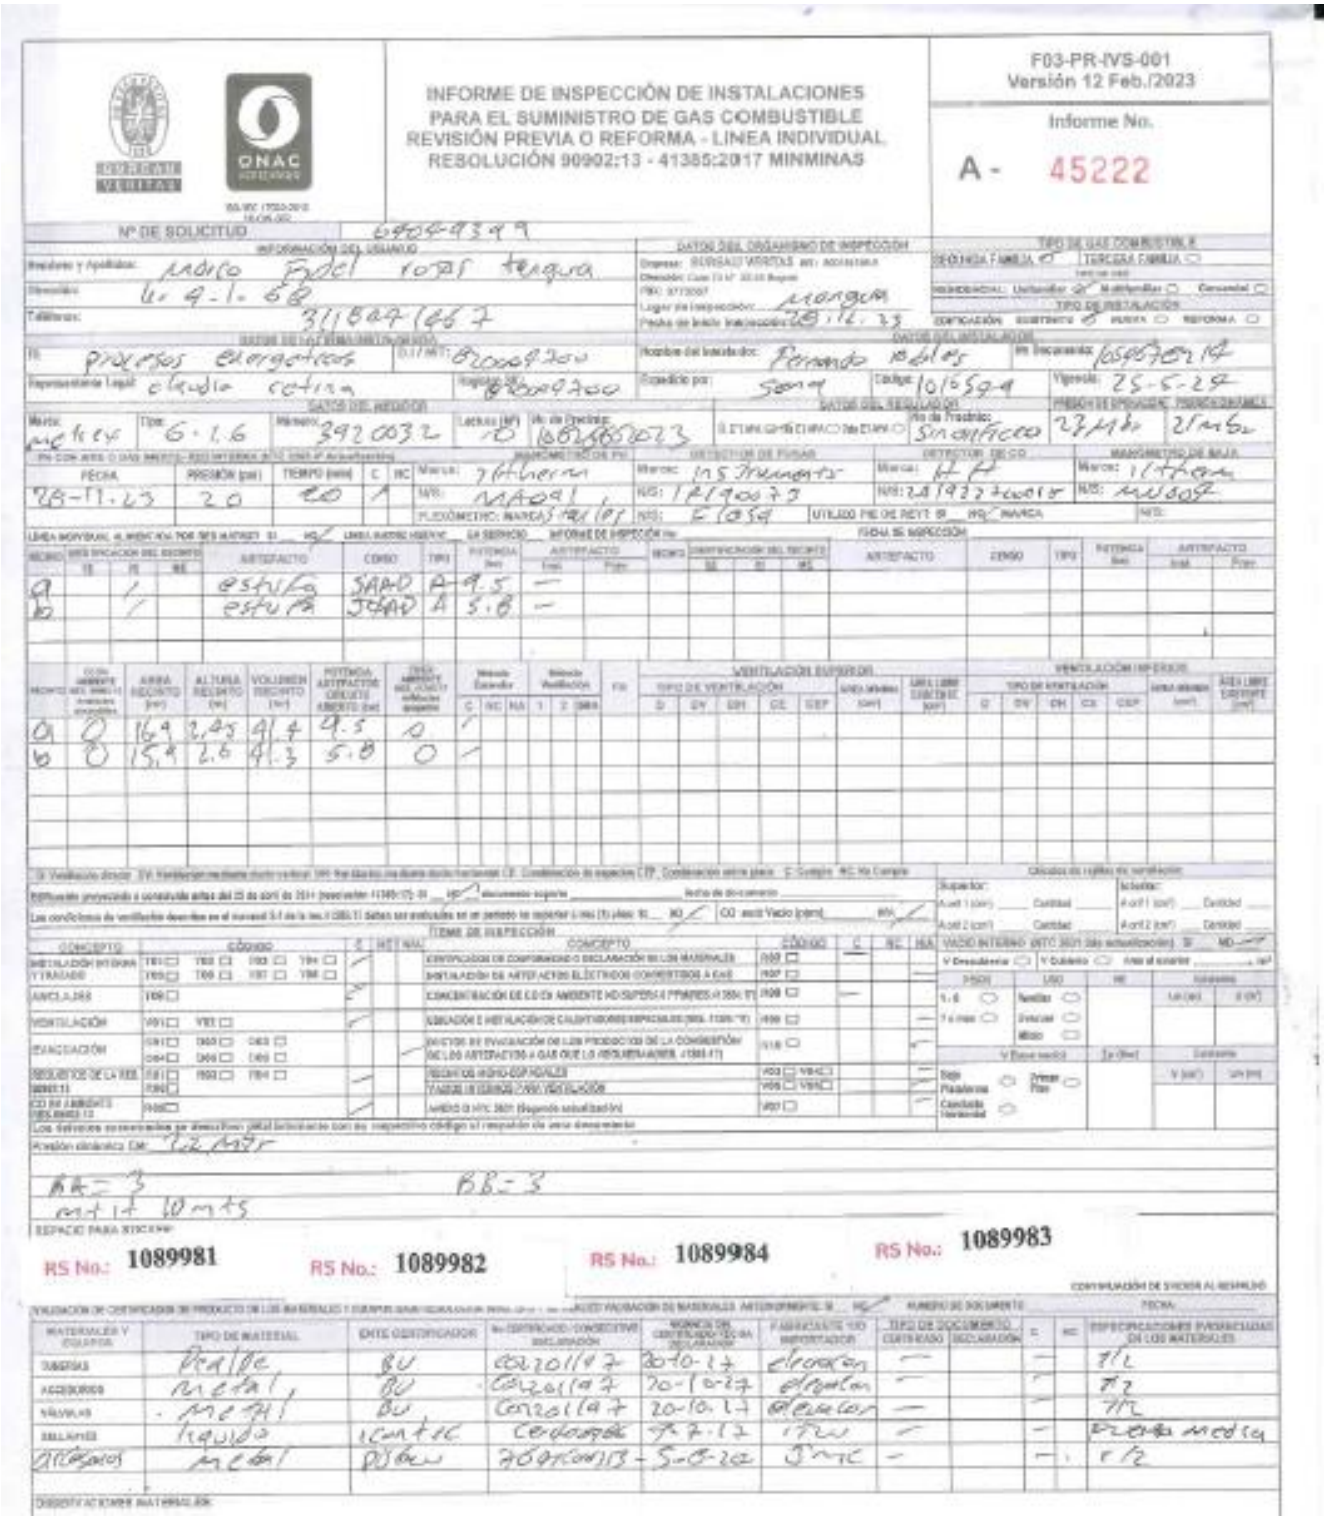

INFORME DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES
PARA EL SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE
REVISIÓN PREVIA O REFORMA - LINEA INDIVIDUAL
RESOLUCIÓN 90902:13 - 41385:2017 MINMINAS

F03-PR-IVS-001
Versión 12 Feb./2023

Informe No.
A - 45222

RS No.: 1089981 RS No.: 1089982 RS No.: 1089984 RS No.: 1089983

Imagen 2. Evento de inauguración gasificación proyecto municipio Mongua






vanti



Cordialmente,



Gloria Marcela Muñoz Rojas
CC.36.479.006

NOTA: Se anexa: Listado Excel instalaciones puestas en servicio
