NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS. POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO DE OBRA No. GGC-149-2: **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023 **RADICACION No.** **FECHA RADICACION:**

CONTRATISTA : GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. **OBJETO:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE

DIRECCION : CRA 32 No. 25 B 45 BOGOTÁ D.C.

C.C. ó NIT : 830.128.894-1 **SEDE:** **PLAZO INICIAL :** HASTA EL 29 DE DICIEMBRE

TELEFONO : 6012441734 **LOCALIZACION:** **FECHA INICIACION :** 21/11/2023

INTERVENTOR : GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S **VR. INICIAL:** $ 0 **FECHA TERMINAC :** 29/12/2023

DIRECCION : Calle 32#8-41 Floridablanca-Santander **ANTICIPO:** $ 0 **FECHA SUSPENCI :**

C.C. ó NIT : 830.509.427-9 **VR. ADICIONAL:** $ 0 **FECHA REINICIO :**

TELEFONO : 317 6446297 **VR. FINAL:** $ 0 **PLAZO TOTAL :**

FECHA FINAL ENT : 29/12/2023

A PAGAR **$ 345.094.135,80**

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº		ICA	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nº		CODIGO	

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BOGOTA SUCURSAL PARQUE NACIONAL CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORR CTA. Nº 032343105

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES — **OBRA ORIGINAL EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	REPARACION Y MANTENIMIENTO AUDITORIO											
1	**PRELIMINARES**											0,0%
1,01	CAMPAMENTO 18m2, Base granular norma invias con bisagra gato OMEGA	UN	1,00	$ 1.863.955,00	$ 1.863.955,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,02	Cerramiento provisional en polisombra de 2 metros de altura.	m	110,00	$ 29.449,00	$ 3.239.390,00	110,00	$ 3.239.390,00		$ -	110,00	$ 3.239.390,00	100,0%
1,03	Red Provisional de Agua en Tuberia pvc 1/2"	m	30,00	$ 13.991,00	$ 419.730,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,04	Localización y replanteo de los Cimientos	m2	677,00	$ 3.045,00	$ 2.061.465,00	27,21	$ 82.854,80		$ -	27,21	$ 82.854,80	4,0%
1,05	Demolición manual de piso de cerámica tableta tipo granito pulido	m2	83,00	$ 5.564,00	$ 461.812,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,06	Demolición manual de placa (sin Reforzamiento estructural) , en concreto.	m2	447,00	$ 28.729,00	$ 12.841.863,00	22,05	$ 633.474,00		$ -	22,05	$ 633.474,45	4,9%
1,07	Excavación manual terreno natural, profundidad 0-2m	m3	1148,00	$ 30.867,00	$ 35.435.316,00	22,46	$ 693.273,00		$ -	22,46	$ 693.272,82	2,0%
1,08	Desmonte y REINSTALACIÓN de unidad de aire acondicionado sin afectar	UN	7,00	$ 585.901,00	$ 4.101.307,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,09	Desmontaje Y REINSTALACIÓN de tanque, con medios manuales, sin	UN	5,00	$ 168.049,00	$ 840.245,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,10	Desmonte y translado de equipos de laboratorio,sin afectar la debida	GL	1,00	$ 7.957.210,00	$ 7.957.210,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,11	Cargue manual y retiro de escombros en volqueta con capacidad de 7m3 a	m3	970,43	$ 48.019,00	$ 46.598.838,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,12	Corte con disco de muro 0.25m ambos lados para Encamisado en las	m	500,00	$ 1.957,00	$ 978.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,13	Excavación terreno natural volumen vigas de amarre cimentación.	m3	57,00	$ 30.867,00	$ 1.759.419,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,14	Demolicion de placa de concreto sin refuerzo parte Superior (en cubierta)	m2	70,00	$ 28.729,00	$ 2.011.030,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,15	Desmonte de puerta en Madera en área actualmente desocupada junto a	un	2,00	$ 10.474,00	$ 20.948,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,16	Demolición de base de concreto reforzado ubicado en cubierta, la cual	m2	27,00	$ 8.554,00	$ 230.958,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,17	Adecuación y mantenimiento de ventaneria; Marcos y Rejas, con el fin de	Un	50,00	$ 459.528,00	$ 22.976.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,18	Corte mesónes a medida, en los laboratorios que intervengan en el Re-	m	52,00	$ 9.761,00	$ 507.572,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,19	Demolición mediacaña en cerámica.	m	70,00	$ 10.081,00	$ 705.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,20	Desmonte de escritorios y sillas dentro del área de LNDF, OGM Y	un	38,00	$ 13.176,00	$ 500.688,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,21	Desmonte de puertas y marco en aluminio en zonas de laboratorios, sin	m2	35,00	$ 11.770,00	$ 411.950,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,22	Desmonte de afiches, pancartas, películas en muros y ventanas.	un	45,00	$ 4.572,00	$ 205.740,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,23	Revisión y mantenimiento de redes eléctricas existentes, basandose en las	Dia	15,00	$ 245.652,00	$ 3.684.780,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,24	Revisión y mantenimiento de redes Hidrosanitarias existentes, basandose en	Dia	15,00	$ 147.948,00	$ 2.219.220,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,25	Desmonte de mesones Existentes, generando espacio de trabajo optimo	m	91,00	$ 15.210,00	$ 1.384.110,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
1,26	Demolición manual de muro e= 0.20-0.25 m presentes en el terreno natural y	m2	498,10	$ 11.649,00	$ 5.802.367,00	1,40	$ 16.309,00		$ -	1,40	$ 16.308,60	0,3%
2	**CIMENTACIÓN**											
2,01	Concreto Clase F, 2000 PSI Para Solados (respecto al diseño Estructural del	m3	68,00	$ 402.924,00	$ 27.398.832,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
2,02	Concreto ciclópeo, realizado con concreto f'c=170 kg/cm² (17 MPa), clase de	m3	705,00	$ 440.515,00	$ 310.563.075,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
2,03	Concreto para armar en zapatas de cimentación, (20.7 MPa), tamaño	m3	170,00	$ 593.520,00	$ 100.898.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
2,04	VIGA DE AMARRE CIMENTACION EN CONCRETO 3500 PSI	m3	54,00	$ 883.452,00	$ 47.706.408,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
2,05	ACERO FIGURADO 60000 PSI (Cantidad de acero con respecto a los	Kg	4860,00	$ 6.263,00	$ 30.438.180,00	3851,50	$ 24.121.945,00		$ -	3.851,50	$ 24.121.944,50	79,2%
2,06	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO TIPO SIKA	m2	70,00	$ 11.312,00	$ 791.840,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
3	**PISOS**											
3,01	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido	m	80,00	$ 44.042,00	$ 3.523.360,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
3,02	Suministro, transporte e instalación de piso en granito pulido, garantía 30	m2	447,00	$ 138.410,00	$ 61.869.270,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
4	**PUERTAS**											
4,01	Instalación de puerta en aluminio para los laboratorios.Incluye todos los	UN	35,00	$ 38.418,00	$ 1.344.630,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
4,02	Instalación de puerta lisa en madera ubicado al lado de referencia. Incluye	UN	2,00	$ 36.920,00	$ 73.840,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
5	**ESTRUCTURA**											
5,01	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	47,00	$ 883.452,00	$ 41.522.244,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
5,02	ACERO FIGURADO 60000 PSI (Cantidad de acero con respecto a los	Kg	12541,00	$ 6.263,00	$ 78.544.283,00	12541,00	$ 78.544.283,00		$ -	12.541,00	$ 78.544.283,00	100,0%
5,03	ESCARIFICACION SUPERFICIE	m2	95,00	$ 8.517,00	$ 809.115,00	4,44	$ 37.815,00		$ -	4,44	$ 37.815,48	4,7%
5,04	ANCLAJES	UN	174,00	$ 18.865,00	$ 3.282.510,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
5,05	PUENTE ADHERENCIA	m2	95,00	$ 15.404,00	$ 1.463.380,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
5,06	COLUMNAS EN CONCRETO 3500 PSI, PARA REALIZAR EL	m3	10,00	$ 960.366,00	$ 9.603.660,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
5,07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	Kg	17870,00	$ 15.263,00	$ 272.749.810,00	7137,83	$ 108.944.738,00		$ -	7.137,83	$ 108.944.737,65	39,9%
5,08	Placa en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m, (reparación placa demolida por	m2	134,00	$ 72.075,00	$ 9.658.050,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
6	**CUBIERTA**											
6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA (Teja	m2	1523,00	$ 71.160,00	$ 108.376.680,00	1016,00	$ 72.298.560,00		$ -	1.016,00	$ 72.298.560,00	66,7%
6,02	Canal PVC Amazona de 3m cada pieza con las respectivas uniones, tapas	m	260,00	$ 80.882,00	$ 21.029.320,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
6,03	Suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica (Incluye	m	128,00	$ 87.168,00	$ 11.157.504,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
6,04	Suministro e Instalación Bajante PVC Amazona de 3m con las respectivas	m	42,00	$ 58.834,00	$ 2.471.028,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
7	**PAÑETE Y PINTURA**											
7,01	Suministro y Aplicación de pañete liso muro 1:4 sobre muro y espesor	m2	300,00	$ 28.777,00	$ 8.633.100,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
7,02	Suministro y aplicación de pintura biocida blanca a tres manos Muros y techo	m2	2250,86	$ 18.377,00	$ 41.364.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
8	**MOBILIARIO Y MESONES**											
8,01	Suministro e instalación de mesones en granato PLUSS (Incluye 4	m	29,00	$ 1.638.384,00	$ 47.513.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
8,02	Divisiones en eterboard para cuarto "toma de muestra" al lado de salida de	m2	35,00	$ 141.482,00	$ 4.951.870,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
8,03	Silla alta en poliuretano para laboratorio, modelo sugerido: Techsit-L-Tech, o	Un	18,00	$ 767.452,00	$ 13.814.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
9	**ASEO GENERAL**											
9,01	Aseo general de los tres bloques tanto de la parte interna como externa y	m2	1540,00	$ 4.421,00	$ 6.808.340,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
10	**DOS (2) ESTRUCTURAS TANQUES ELEVADOS**											
10,01	Concreto para armar en zapatas de cimentación, (20.7 MPa), tamaño	m3	0,90	$ 593.520,00	$ 534.168,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
10,02	COLUMNAS EN CONCRETO 20.7 Mpa, tamaño máximo del agregado 12,5	m3	0,70	$ 883.452,00	$ 618.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
10,03	Losa Maciza de soporte en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	m2	6,00	$ 72.075,00	$ 432.450,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
10,04	ACERO FIGURADO 60000 PSI (Cantidad de acero con respecto a los	Kg	308,00	$ 6.263,00	$ 1.929.004,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,0%
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 1.431.094.534,00**		**$ 288.612.641,80**					

ACTIVIDADES NO PREVISTAS — **OBRA NO PREVISTA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
					$ -		$ -		$ 0		$ -	
					$ -		$ -		$ 0		$ -	
					$ -		$ -		$ 0		$ -	
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				$ -		$ -		$ 0		$ -	0,0%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:			**$ 1.431.094.534,00**	**$ 288.612.641,80**		**$ 288.612.641,80**
	A %	16%	**$ 228.975.125,00**	**$ 46.178.022,69**	**$ 0**	**$ 46.178.022,69**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**I %**	1%	**$ 14.310.945,00**	**$ -**	**$ 0**	**$ -**
	U %	3%	**$ 42.932.836,00**	**$ 8.658.379,25**	**$ 0**	**$ 8.658.379,25**

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:		**$ 286.218.906,00**	**$ 54.836.401,94**	**$ 0**	**$ 54.836.401,94**
I.V.A. (19% DE U)	19%	**$ 8.157.239,00**	**$ 1.645.092,06**	**$ 0**	**$ 1.645.092,06**
VALOR TOTAL:		**$ 1.725.470.679,00**	**$ 345.094.135,80**	**$ 0**	**$ 345.094.135,80**
AMORTIZACION AL ANTICIPO:		**$ -**	**$ -**	**$ 0**	**$ -**
VALOR A PAGAR EN ACTA:			**$ 345.094.135,80**	**$ 0**	**$ 345.094.135,80**
SALDO DEL CONTRATO		**$ 1.380.376.543,20**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**



FIRMA DEL CONTRATISTA
ARQ. JORGE HUMBERTO PINZON
DIRECTOR DE OBRA



APROBACION INTERVENTOR
ARQ. CARLOS AUGUSTO GIRALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FORMA-4-983

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	ENTIDAD	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	CONTRATO N°	GGC-149-23
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	FECHA INICIO	21/11/2023
CAPITULO	1 PRELIMINARES	DIRECCIÓN	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA	FECHA FINAL	29/12/2023

ITEM	1,02	Cerramiento provisional en polisombra de 2 metros de altura.		UBICACIÓN	UNIDADES			m	
					DIMENSIONES			CANT	MEDIDA TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
			1,00	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN POLISOMBRA	110,00			1,00	110,00





TOTAL EJECUTADO EN OBRA	110,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO	**110,00**
TOTAL POR EJECUTAR	**0,00**

ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	ENTIDAD	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	CONTRATO N°	GGC-149-23
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	FECHA INICIO	21/11/2023
CAPITULO	1 PRELIMINARES	DIRECCIÓN	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA	FECHA FINAL	29/12/2023

ITEM	1,04	Localización y replanteo de los Cimientos	EJE	UBICACIÓN	UNIDADES			m2	
					DIMENSIONES			CANT	MEDIDA TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
			(1-K)	EXTERIOR	1,70	0,90		1,00	1,53
					1,91	0,90		1,00	1,72
			(1-J)	EXTERIOR	1,80	0,90		1,00	1,62
			(1-I)	EXTERIOR	1,70	1,20		1,00	2,04
			(1-H)	EXTERIOR	1,70	1,20		1,00	2,04
			(1-G)	EXTERIOR	0,80	1,80		1,00	1,44
			(1-F)	EXTERIOR	0,80	1,80		1,00	1,44
			(3-J)	EXTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(1-F)	EXTERIOR	0,70	1,60		1,00	1,12
			(1-J)	INTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(2-I)	INTERIOR	0,90	1,80		1,00	1,62
			(3-I)	INTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(19-F)	EXTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(19-G)	EXTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(19-H)	EXTERIOR	0,70	1,60		1,00	1,12
			(3-K)	EXTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(3-F)	EXTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(3-H)	EXTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28
			(8-K)	EXTERIOR	0,80	1,60		1,00	1,28









TOTAL EJECUTADO EN OBRA	27,21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO	**27,21**
TOTAL POR EJECUTAR	**649,79**

ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD** INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	**CONTRATO Nº** GGC-149-23
		INTERVENTORIA GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FECHA INICIO** 21/11/2023
CAPITULO	**1 PRELIMINARES**	**DIRECCIÓN** KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA	**FECHA FINAL** 29/12/2023

ITEM	1,06	Demolición manual de placa (sin Reforzamiento estructural) , en concreto.







EJE	**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			m2	
		DIMENSIONES			**CANT**	**MEDIDA TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
(1-K)	**EXTERIOR**	1,70	0,90		1,00	1,53
		1,90	0,60		1,00	1,14
(1-J)	**EXTERIOR**	1,80	0,60		1,00	1,08
(1-I)	**EXTERIOR**	1,70	0,60		1,00	1,02
(1-H)	**EXTERIOR**	1,70	0,60		1,00	1,02
(1-G)	**EXTERIOR**	0,60	1,80		1,00	1,08
(1-F)	**EXTERIOR**	0,60	1,80		1,00	1,08
(3-J)	**EXTERIOR**	0,60	1,60		1,00	0,96
(1-F)	**EXTERIOR**	0,60	1,60		1,00	0,96
(1-J)	**INTERIOR**	0,80	1,60		1,00	1,28
(2-I)	**INTERIOR**	0,90	1,80		1,00	1,62
(3-I)	**INTERIOR**	0,80	1,60		1,00	1,28
(19-F)	**EXTERIOR**	0,60	1,60		1,00	0,96
(19-G)	**EXTERIOR**	0,60	1,60		1,00	0,96
(19-H)	**EXTERIOR**	0,60	1,60		1,00	0,96
(3-K)	**EXTERIOR**	0,80	1,60		1,00	1,28
(3-F)	**EXTERIOR**	0,80	1,60		1,00	1,28
(3-H)	**EXTERIOR**	0,80	1,60		1,00	1,28
(8-K)	**EXTERIOR**	0,80	1,60		1,00	1,28
	TOTAL EJECUTADO EN OBRA					22,05
	TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO					**22,05**
	TOTAL POR EJECUTAR					**424,95**

ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD**	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
CAPITULO	**1 PRELIMINARES**	**DIRECCIÓN**	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA

ITEM	1,07	Excavación manual terreno natural, profundidad 0-2m	**EJE**	**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			m3	
					DIMENSIONES			**CANT**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
			(1-K)	**EXTERIOR**	1,70	0,90	0,70	1,00	1,07
					1,90	0,90	0,70	1,00	1,20
			(1-J)	**EXTERIOR**	1,80	0,90	1,30	1,00	2,11
			(1-I)	**EXTERIOR**	1,70	1,20	1,30	1,00	2,65
			(1-H)	**EXTERIOR**	1,70	1,20	1,30	1,00	2,65
			(1-G)	**EXTERIOR**	0,80	1,80	0,70	1,00	1,01
			(1-F)	**EXTERIOR**	0,80	1,80	0,70	1,00	1,01
			(3-J)	**EXTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(1-F)	**EXTERIOR**	0,70	1,60	0,70	1,00	0,78
			(1-J)	**INTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(2-I)	**INTERIOR**	0,90	1,80	0,70	1,00	1,13
			(3-I)	**INTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(19-F)	**EXTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(19-G)	**EXTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(19-H)	**EXTERIOR**	0,70	1,60	0,70	1,00	0,78
			(3-K)	**EXTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(3-F)	**EXTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(3-H)	**EXTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
			(8-K)	**EXTERIOR**	0,80	1,60	0,70	1,00	0,90
				TOTAL EJECUTADO EN OBRA					22,46
				TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO					**22,46**
				TOTAL POR EJECUTAR					**1125,54**







ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD**	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
CAPITULO	**1 PRELIMINARES**	**DIRECCIÓN**	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA

ITEM	1,26	Demolición manual de muro e= 0.20-0.25 m presentes en el terreno natural y la placa.	**EJE**	**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			m2	
					DIMENSIONES			**CANT**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
			(2 I)	Demolición murete bajo placa	0,80		0,50	1,00	0,40
			(3 G)	Demolición murete bajo placa	1,00		1,00	1,00	1,00
				TOTAL EJECUTADO EN OBRA					1,40
				TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO					**1,40**
				TOTAL POR EJECUTAR					**496,70**






ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD**	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	**CONTRATO N°**	GGC-149-23
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FECHA INICIO**	21/11/2023
CAPITULO	**1 PRELIMINARES**	**DIRECCIÓN**	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA	**FECHA FINAL**	29/12/2023

ITEM	2,05	ACERO FIGURADO 60000 PSI (Cantidad de acero con respecto a los diseños presentados)	**EJE**	**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			Kg	
					DIMENSIONES			**CANT (KG)**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		

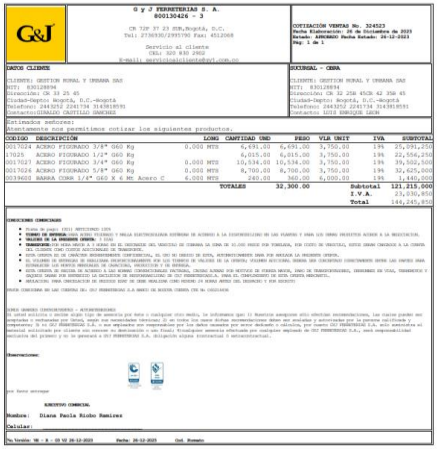

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

COTIZACIÓN VENTAS No. 324523
Fecha Elaboración: 26 de Diciembre de 2023
Estado: APROBADO Fecha Estado: 26-12-2023
Hoy: 1 de 1

DATOS CLIENTE

CLIENTE: GESTION RURAL Y URBANA SAS
NIT: 83012894
Dirección: CR 33 25 45
Ciudad-Depto: Bogotá, D.C.-Bogotá
Teléfono: 2441252 2241734 3143918591
Contacto:GIRALDO CASTILLO JHAIRO

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: GESTION RURAL Y URBANA SAS
NIT: 83012894
Dirección: CR 32 25A 45CN 42 25D 45
Ciudad-Depto: Bogotá, D.C.-Bogotá
Teléfono: 2441252 2241734 3143918591
Contacto: NOTA PEDIDO: 1806

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.


CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
0017024	ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg	0.000 MTS	6,691.00	6,691.00	3,750.00	19%	25,091,250
17025	ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg		6,015.00	6,015.00	3,750.00	19%	22,556,250
0017027	ACERO FIGURADO 3/4" G60 Kg	0.000 MTS	10,534.00	10,534.00	3,750.00	19%	39,502,500
0017026	ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg	0.000 MTS	8,700.00	8,700.00	3,750.00	19%	32,625,000
0039600	BARRA CORR 1/4" G60 X 6 Mt. Acero C	6.000 MTS	240.00	360.00	6,000.00	19%	1,440,000
		TOTALES	32,300.00			Subtotal	121,215,000
						I.V.A.	23,030,850
						Total	144,245,850

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: CRÉDITO 30DIAS
- TIEMPO DE ENTREGA: [illegible]
- VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: 5 DIAS
- TRANSPORTE: [illegible]

Observaciones:

ASESOR(A) COMERCIAL
Nombre: Diana Paola Ricbo Ramirez
Celular:



Fecha actual: 2023/12/26 | Hora: 17:54 | IP: 200.119.47.98

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: GESTION RURAL Y URBANA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: GILDARDO CASTILLO
No. Identificación: 8301288941

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17542427	Fecha de Emisión	2023/12/26
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3105	No. Producto	*****3105
Fecha Pago	2023/12/26		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	800130426
Beneficiario	G Y J FERRETERIAS SA
Valor a Pagar	$144,245,850.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	092216496
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ANT COT324523 MOSQUERA
Información Adicional	MATERIALES OBRA
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

1,00	ACERO FIGURADO PARA CIMENTACIÓN				3851,50	3851,50


TOTAL EJECUTADO EN OBRA	3851,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO	**3851,50**
TOTAL POR EJECUTAR	**1008,50**

ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD**	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	**CONTRATO N°**	GGC-149-23
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FECHA INICIO**	21/11/2023
CAPITULO	**1** **PRELIMINARES**	**DIRECCIÓN**	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA	**FECHA FINAL**	29/12/2023

ITEM	5,02	ACERO FIGURADO 60000 PSI (Cantidad de acero con respecto a los diseños presentados)	**EJE**	**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			Kg	
					DIMENSIONES			**CANT (KG)**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
			1,00	ACERO FIGURADO PARA ESTRUCTURA				######	12541,00

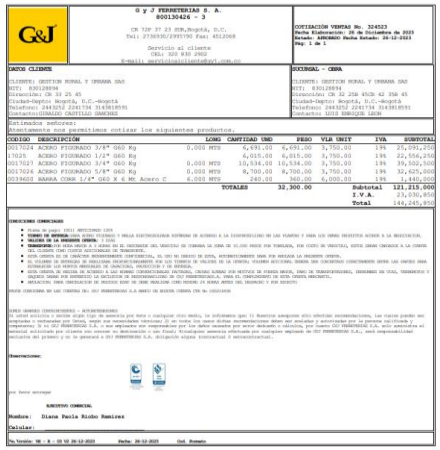

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3
CR 72F 37 23 SUR,Bogotá, D.C.
Tel: 2736330/2993790 Fax: 4512068
Servicio al cliente
CEL: 320 830 2962
E-mail: serviciogjlinternet@hotmail.com.co

COTIZACIÓN VENTAS No. 324523
Fecha Elaboración: 29 de Diciembre de 2023
Estado: APROBADO Fecha Estado: 29-12-2023
Pag: 1 de 1

DATOS CLIENTE
CLIENTE: GESTION RURAL Y URBANA SAS
NIT: 830128894
Dirección: CR 32 25A 45CN 42 35B 45
Ciudad-Depto: Bogotá, D.C.-Bogotá
Telefono: 2443252 2241734 3143818531
Contacto:ORLANDO CASTILLO 3082828


DESPACHAR - OBRA
CLIENTE: GESTION RURAL Y URBANA SAS
NIT: 830128894
Dirección: CR 32 25A 45CN 42 35B 45
Ciudad-Depto: Bogotá, D.C.-Bogotá
Telefono: 2443252 2241734 3143818531
Contacto: LUIS 3082828 LUIS

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD	UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
3017024	ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg	0.000	MTS		6,691.00	6,691.00	3,750.00	19% 25,091,250
17025	ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg				6,015.00	6,015.00	3,750.00	19% 22,556,250
3017027	ACERO FIGURADO 3/4" G60 Kg	0.000	MTS		10,534.00	10,534.00	3,750.00	19% 39,502,500
3017024	ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg	0.000	MTS		8,760.00	8,760.00	3,750.00	19% 32,625,000
3039402	BARRA CORR 1/4" G60 X 6 Mt Acero C	6.000	MTS		240.00	360.00	6,000.00	19% 1,440,000
			TOTALES		32,300.00		Subtotal	121,215,000
							I.V.A.	23,030,850
							Total	144,245,850

CONDICIONES COMERCIALES
- Forma de pago: CRED. EFECTIVO: 100%
- TIEMPO DE ENTREGA: [illegible] ELECTRONICAMENTE DISPONIBLE DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS ITEMS PRESENTES ACUERDO A LA NEGOCIACION.
- VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: 7 DIAS
- TRANSPORTE: [illegible]

Nombre: Diana Paola Rico Ramirez
Celular:



Fecha actual: 2023/12/26 | Hora: 17:54 | IP: 200.119.47.98

Banco de Bogotá
WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Tipo Identificación:	NIT Persona Jurídica
No. Identificación:	8301288941
Generado por:	GILDARDO CASTILLO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorizacion	17542427	Fecha de Emisión	2023/12/26
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3105	No. Producto	*****3105
Fecha Pago	2023/12/26		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8001304263		
Beneficiario	G Y J FERRETERIAS SA		
Valor a Pagar	$144,245,850.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	060216496		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	ANT COT324523 MOSQUERA		
Información Adicional	MATERIALES OBRA		
Estado	En Proceso		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

TOTAL EJECUTADO EN OBRA	12541,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO	**12541,00**
TOTAL POR EJECUTAR	**0,00**

ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD**	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
CAPITULO		**DIRECCIÓN**	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA

ITEM	5,03	ESCARIFICACION SUPERFICIE		**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			m2	
					DIMENSIONES			**CANT**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
			(1 J)	**ESCARIFICACIÓN DE COLUMNA**		0,25	3,50	1,00	0,88
			(1 I)	**ESCARIFICACIÓN DE ZAPATA**		1,40	0,40	1,00	0,56
			(2 G)	**ESCARIFICACIÓN DE COLUMNA**		0,25	3,00	2,00	1,50
			(2 H)	**ESCARIFICACIÓN DE COLUMNA**		0,25	3,00	1,00	0,75
			(2 I)	**ESCARIFICACIÓN DE COLUMNA**		0,25	3,00	1,00	0,75
				TOTAL EJECUTADO EN OBRA					4,44
				TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO					**4,44**
				TOTAL POR EJECUTAR					**90,57**









ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD**	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
		INTERVENTORIA	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
CAPITULO	**1 PRELIMINARES**	**DIRECCIÓN**	KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA

ITEM	5,07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA TUBO A500 Grado B , (incluye correas para la estructura de la cubierta cada 1.10m) (Dimensiones con respecto a Diseño en planos)	**EJE**	**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			kg	
								CANT	**MEDIDA TOTAL**
					KG/ CERCHA				
			1,00	ACERO PARA CERCHA METALICA DE CUBIERTA MODULO 1 EJES B, F, G, H, I, J, K	405,00			7,00	2835,00
			2,00	ACERO PARA CERCHA METALICA DE CUBIERTA MODULO 2 EJES K	405,00			1,00	405,00
			3,00	ACERO PARA CERCHA METALICA DE CUBIERTA MODULO 2 EJES F, G, H, I, J	3897,83			1,00	3897,83









TOTAL EJECUTADO EN OBRA		7137,83
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO		**7137,83**
TOTAL POR EJECUTAR		**10732,17**

ALVARO PEREZ GUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1**	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."	**ENTIDAD** INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	**CONTRATO N°** GGC-149-23
		INTERVENTORIA GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FECHA INICIO** 21/11/2023
CAPITULO		**DIRECCIÓN** KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA	**FECHA FINAL** 29/12/2023

ITEM	6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA (Teja Termoacustica Ecoroof 21 UPVC 1.5mm Blanco 0.89 x 5.90 Mts)(Incluye accesorios para su debida instalación)		**UBICACIÓN**	**UNIDADES**			m2	
					DIMENSIONES			**CANT**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
			1,00	TEJA TERMOACUSTICA PARA CUBIERTA MODULO 1	49,60	6,50		2,00	644,80
			2,00	TEJA TERMOACUSTICA PARA CUBIERTA MODULO 2	28,55	6,50		2,00	371,15
				TOTAL EJECUTADO EN OBRA					1016,00
				TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO					**1016,00**
				TOTAL POR EJECUTAR					**507,00**

PANELCO S.A.
DIR: CRA 27 N° 15-24 BOGOTA D.C. PBX: (601) 3602815 - 3152563126 - 3015403528
NIT: 830.140.354-3
USUARIO: MORALES BARRERA RAUL
PEDIDOS CLIENTES - P-202735

CLIENTE:	GESTION RURAL Y URBANA SAS	**NIT:**	830128894
DIRECCIÓN:	CR 32 25 B 45	**CODIGO:**	830128894
TELÉFONO:	3108505758	**FECHA:**	12/27/2023
CIUDAD:	BOGOTÁ	**FECHA ENTREGA:**	1/12/2024
VENDEDOR:	MORALES BARRERA RAUL	**DOC. ALTERNO:**	
CENTRO CTO:	2 - PALOQUEMAO	**COND. PAGO:**	transferencia bogota

Referencia	Descripción	Unidad de Medida	Peso	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
P37.2	TEJA UPVC T26 CRESTA BAJA 1.13 MTS ANCHO X 2.0 MM X ML	ML	6,928.74	1638	$21,975.00	$42,834,110.00
P37.89	CABALLETE UPVC CRESTA BAJA T26 BL/BL	UND	459.90	126	$30,000.00	$4,498,200.00
L10.84	KIT CAPELOTE PARA CRESTA BAJA	UNIDAD	4,100.00	4100	$1,350.00	$6,586,650.00

TOTAL UNIDADES: 5864 **TOTAL PESO:** 11488.64

SUBTOTAL:	45,310,050.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL IVA:	8,608,910.00
TOTAL:	53,918,960.00

SON: cincuenta y tres millones novecientos dieciocho mil novecientos sesenta peso colombianos

OBSERVACIONES: FAVOR PROGRAMAR PROGRAMAR ENTREGA A VARIANTE MOSQUERA CLIENTE CONFIRMA DIRECION Y DESPACHO SON MODULO 1(96)DE 6.50 MODULO 2 (60) DE 6.50 MODULE 3 (96) 6.50 PARA UN TOTAL DE 252 UNIDADES 6.50 PARA UN TOTAL EN METROS 1638 MTL EN TEJAS DE 11.80 MIL GRACIAS

REVISADO

RECIBIDO CLIENTE

ELABORADO POR: MORALES BARRERA RAUL

ALVARO PEREZ CUEVARA
ING. RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
