Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MC 20 DE 2023
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC1 1.102.851.781
Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA DE OBRAS:	**ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO**	**FECHA INICIO:**	**23 DE NOVIEMBRE DE 2023**
CONTRATISTA INTERVENTOR:	**ING. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**FECHA DE ACTA:**	**13 DE ENERO DE 2024**
SUPERVISION DE OBRAS:	**ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**	**TIPO DE ACTA:**	**ACTA FINAL DE OBRAS**

CONDICIONES INICIALES						ACTA DE MODIFICACION Nro. 2		PRESENTE ACTA					
								CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD FINAL**	**VALOR FINAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**
1	**MANTENIMIENTO DE PUERTA**												
1,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA DE MADERA ENTANORADA SIN CAMBIO DE CERRADURRA INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	29,00	$ 45.000,00	$ 1.305.000,00	35,00	$ 1.575.000,00	0,00	35,00	35,00	$ -	$ 1.575.000,00	$ 1.575.000,00
1,2	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA	UND	24,00	$ 36.000,00	$ 864.000,00	24,00	$ 864.000,00	0,00	24,00	24,00	$ -	$ 864.000,00	$ 864.000,00
2													
2,1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.	M2	8,00	$ 55.000,00	$ 440.000,00	13,20	$ 726.000,00	0,00	13,20	13,20	$ -	$ 726.000,00	$ 726.000,00
3	**MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ACABADOS**												
3,1	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO. INCLUYE RASPADA, RESANE, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANADAMIO Y TODOS LOS ELEMENOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	2235,00	$ 9.000,00	$ 20.115.000,00	2454,81	$ 22.093.276,00	0,00	2454,81	2454,81	$ -	$ 22.093.276,00	$ 22.093.276,00
3,2	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1687,00	$ 8.000,00	$ 13.496.000,00	1552,00	$ 12.416.000,00	0,00	1552,00	1552,00	$ -	$ 12.416.000,00	$ 12.416.000,00
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATO**												
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO CON TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE A 120V CON SALIDA ELECTRICA EN CABLE # 12 Y CONDUCIDO POR CANALETA PLASTICA 100 X 45 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	45,50	$ 77.000,00	$ 3.503.500,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 x 45 PARA ADECUACION DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (DESCUBIERTO) EN LAS DISITINTAS DEPENDENCIAS INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	27,00	$ 27.000,00	$ 729.000,00	54,00	$ 1.458.000,00	0,00	54,00	54,00	$ -	$ 1.458.000,00	$ 1.458.000,00

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MC 20 DE 2023** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**		RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA DE OBRAS:	**ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO**	**FECHA INICIO:**	**23 DE NOVIEMBRE DE 2023**
CONTRATISTA INTERVENTOR:	**ING. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**FECHA DE ACTA:**	**13 DE ENERO DE 2024**
SUPERVISION DE OBRAS:	**ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**	**TIPO DE ACTA:**	**ACTA FINAL DE OBRAS**

CONDICIONES INICIALES						**ACTA DE MODIFICACION Nro. 2**		**PRESENTE ACTA**					
								CANTIDADES EJECUTADAS			**VALORES EJECUTADOS**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD FINAL**	**VALOR FINAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE A 125V EN BAÑO INCLUYE DESMONTE DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	UND	16,00	$ 60.000,00	$ 960.000,00	7,00	$ 420.000,00	0,00	7,00	7,00	$ -	$ 420.000,00	$ 420.000,00
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CON CABLE UTP Y CONDUCIDO POR CANALETA PLASTICA A 20X12 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	7,00	$ 20.000,00	$ 140.000,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -
5	**REMPLAZO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED**												
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 6" INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL DEPOSITO QUE AUTORIZE LA SUPERVISION	UND	10,00	$ 24.000,00	$ 240.000,00	10,00	$ 240.000,00	0,00	10,00	10,00	$ -	$ 240.000,00	$ 240.000,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 30X120 INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL DEPOSITO QUE AUTORIZE LA SUPERVISION.	UND	50,00	$ 116.000,00	$ 5.800.000,00	59,00	$ 6.844.000,00	0,00	59,00	59,00	$ -	$ 6.844.000,00	$ 6.844.000,00
6	**ITEMS NO PREVISTOS**												
NP1	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO. INCLUYE RASPADA, RESANE, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANADAMIO Y TODOS LOS ELEMENOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. VALIDO PARA ANCHOS MENORES A 40 CM	ML	0,00	$ 4.055,00	-	1112,00	$ 4.509.160,00	0,00	1112,00	1112,00	$ -	$ 4.509.160,00	$ 4.509.160,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA METALICA CON ACCESO A DEPENDENCIAS (INCLUYE JUEGO DE LLAVES, RETIRO DE LAS EXISTENTES Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION)	UND	0,00	$ 266.665,00	-	14,00	$ 3.733.310,00	0,00	14,00	14,00	$ -	$ 3.733.310,00	$ 3.733.310,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PORCELANA CON PEDESTAL INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	0,00	$ 275.070,00	-	5,00	$ 1.375.350,00	0,00	5,00	5,00	$ -	$ 1.375.350,00	$ 1.375.350,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AHORRADOR DE DOBLE DESCARGA INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	0,00	$ 302.164,00	-	5,00	$ 1.510.820,00	0,00	5,00	5,00	$ -	$ 1.510.820,00	$ 1.510.820,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE JARDINERIA (MATERA CILINDRICA-TRONCO DE LA FELICIDAD-SOPORTE DE MADERA)	UND	0,00	$ 183.676,00	-	7,00	$ 1.285.732,00	0,00	7,00	7,00	$ -	$ 1.285.732,00	$ 1.285.732,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINERA EN CEMENTO	UND	0,00	$ 157.276,00	-	12,00	$ 1.887.312,00	0,00	12,00	12,00	$ -	$ 1.887.312,00	$ 1.887.312,00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE JARDIN DE USO INTERNO INCLUYE ABONO ORGANICO	UND	0,00	$ 74.164,00	-	25,00	$ 1.854.100,00	0,00	25,00	25,00	$ -	$ 1.854.100,00	$ 1.854.100,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MC 20 DE 2023
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC1 1.102.851.781
Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA DE OBRAS:	**ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO**	**FECHA INICIO:**	**23 DE NOVIEMBRE DE 2023**
CONTRATISTA INTERVENTOR:	**ING. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**FECHA DE ACTA:**	**13 DE ENERO DE 2024**
SUPERVISION DE OBRAS:	**ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**	**TIPO DE ACTA:**	**ACTA FINAL DE OBRAS**

CONDICIONES INICIALES						ACTA DE MODIFICACION Nro. 2		PRESENTE ACTA					
								CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD FINAL**	**VALOR FINAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA TIPO PANEL CON CORREDERA HORIZONTAL INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y HERRAJES DE 4,00 M X 2,4 M APROX	UND	0,00	$ 1.882.530,00	-	1,00	$ 1.882.530,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 1.882.530,00	$ 1.882.530,00
NP9	MATENIMIENTO DE MUEBLES EN MADERA (2 ESCRITORIOS, 1 ARMARIO, 1 MUEBLE BAJO, 3 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS) INCLUYE PINTURA TOTAL, BISAGRAS, HERRAJES Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	GLB	0,00	$ 2.975.060,00	-	1,00	$ 2.975.060,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.975.060,00	$ 2.975.060,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO CON TOMA CORRIENTE AMERICANA DOBLE A 120V CON SALIDA ELECTRICA EN CABLE # 12 Y CONDUCIDO POR CANALETA PLASTICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	0,00	$ 74.782,00	-	50,00	$ 3.739.100,00	0,00	50,00	50,00	$ -	$ 3.739.100,00	$ 3.739.100,00
COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 47.592.500,00**		**$ 71.388.750,00**				**$ -**	**$ 71.388.750,00**	**$ 71.388.750,00**
ADMINISTRACION				**17,00%**	**$ 8.090.725,00**		**$ 12.136.087,50**				**$ -**	**$ 12.136.087,50**	**$ 12.136.087,50**
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 475.925,00**		**$ 713.887,50**				**$ -**	**$ 713.887,50**	**$ 713.887,50**
UTILIDAD				**5,00%**	**$ 2.379.625,00**		**$ 3.569.437,50**				**$ -**	**$ 3.569.437,50**	**$ 3.569.437,50**
IVA				**19,00%**	**$ 452.128,75**		**$ 678.193,13**				**$ -**	**$ 678.193,13**	**$ 678.193,13**
TOTAL OBRA					**$ 58.990.903,75**		**$ 88.486.355,63**				**$ -**	**$ 88.486.355,63**	**$ 88.486.355,63**

CONTRATISTA	
NOMBRE	**GEORGY PAOLO RUSSI LADINO**
FIRMA	

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**
FIRMA	
Vo.Bo	

INTERVENTOR	
NOMBRE	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	
REVISIÓN	


Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTA**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA DE MADERA ENTANORADA SIN CAMBIO DE CERRADURRA INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1,1	 	**PISO 2**					
		OFICINA MG. TULIA JARAVA				2,00	2,00
		OFICINA MG. VIVIANA LOPEZ				2,00	2,00
		OFICINA 1				2,00	2,00
		OFICINA MG. CESAR GOMEZ				2,00	2,00
		OFICINA MG. RUFO CARVAJAL				1,00	1,00
		OFICINA 2				2,00	2,00
		PISO 3					
		OFICINA MG. LUCY BEJARAJO				2,00	2,00
		OFICINA MG. MARTHA OTALORA				3,00	3,00
		OFICNA SECRETARIA ADJUNTA				1,00	1,00
		OFICINA MG. CLAUDIA PIZARRO				2,00	2,00
		OFICINA MG. MARIA RODELO				0,00	0,00
		OFICINA MG. ELVIA ACEVEDO				2,00	2,00
		PISO 4					
		OFICINA MG. ESLAVA MOJICA				2,00	2,00
		OFICINA MG, JHONY FORTICH				2,00	2,00
		OFICINA MG. ROSANA ABELLO				0,00	0,00
		OFICINA MG. FABIAN PATERNINA				2,00	2,00
		OFICINA MG. MAURICIO CORONEL				3,00	3,00
		OFICNA 1				1,00	1,00
		CUARTOS DE ASEO PISO 1,2,3 Y 4				4,00	4,00
						TOTAL ÍTEM	**35,00**

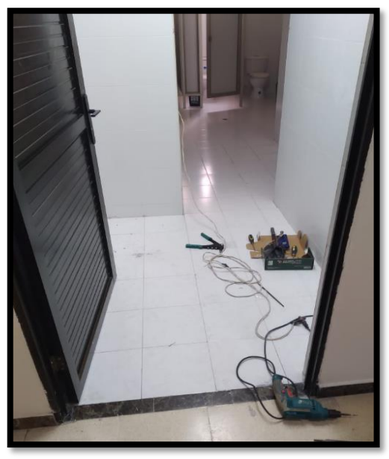

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTA**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1,2	 	**PISO 1**					
		SEC. DE LA COMISION DISCIPLINARIA				1,00	1,00
		OFICINA SECRETARIA SALA CIVIL				1,00	1,00
		PISO 2					
		OFICINA MG. TULIA JARAVA				1,00	1,00
		OFICINA MG. VIVIANA LOPEZ				1,00	1,00
		OFICINA 1				1,00	1,00
		OFICINA MG. CESAR GOMEZ				1,00	1,00
		OFICINA MG. RUFO CARVAJAL				1,00	1,00
		SALDA DE ACUERDOS				1,00	1,00
		BAÑO MUJERES				1,00	1,00
		BAÑO HOMBRS				1,00	1,00
		SALA DE AUDIENCIAS				1,00	1,00
		OFICINA 2				1,00	1,00
		PISO 3					
		OFICINA MG. LUCY BEJARAJO				1,00	1,00
		OFICINA MG. MARTHA OTALORA				1,00	1,00
		OFICNA SECRETARIA ADJUNTA				1,00	1,00
		OFICINA MG. CLAUDIA PIZARRO				1,00	1,00
		OFICINA MG. ELVIA ACEVEDO				1,00	1,00
		BAÑO DAMAS				1,00	1,00
		SALA DE ACUERDOS				1,00	1,00
		SALDA DE AUDIENCIAS				1,00	1,00
		PISO 4					
		OFICINA MG. ESLAVA MOJICA				1,00	1,00
		OFICINA MG, JHONY FORTICH				1,00	1,00
		OFICINA MG. ROSANA ABELLO				1,00	1,00
		OFICINA MG. FABIAN PATERNINA				1,00	1,00
		OFICINA MG. MAURICIO CORONEL				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**24,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	RAMON LOPEZ CAMARGO
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**0**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
2,1		**PISO 1**					
		COCINA	4,00	2,00		1,00	8,00
		OFICINA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	2,30	2,26		1,00	5,20
						TOTAL ÍTEM	**13,20**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO. INCLUYE RASPADA, RESANE, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANADAMIO Y TODOS LOS ELEMENOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		





# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		PISO 1					
		HALL					
		MURO	1,35		2,40	1,00	3,24
		MURO	1,40		2,40	1,00	3,36
		MURO	3,50		2,40	1,00	8,40
		MURO	1,40		2,40	1,00	3,36
		MURO	5,77		2,40	1,00	13,85
		MURO	1,70		2,40	1,00	4,08
		MURO	12,30		2,40	1,00	29,52
		MURO	2,75		2,40	1,00	6,60
		MURO	3,20		2,40	1,00	7,68
		MURO	2,90		2,40	1,00	6,96
		MURO	4,70		2,40	1,00	11,28
		MURO	5,00		2,40	1,00	12,00
		MURO	3,50		2,40	1,00	8,40
		MURO	2,45		2,40	1,00	5,88
		MURO	14,60		2,40	1,00	35,04
		SEC. DE LA COMISION DISCIPLINARIA					
		MURO	3,00		2,40	1,00	7,20
		MURO	1,50		2,40	1,00	3,60
		MURO	5,20		2,40	1,00	12,48
		MURO	4,15		2,40	1,00	9,96
		MURO	8,20		2,40	1,00	19,68
		MURO	5,65		2,40	1,00	13,56
		MESON	2,14		0,90	2,00	3,85
		MURO	4,00		2,40	1,00	9,60
		MURO	0,60		2,40	1,00	1,44
		MURO	0,70		2,40	1,00	1,68
		MURO	2,00		2,40	1,00	4,80
		MURO	1,40		2,40	1,00	3,36
		OFICINA MAYOR					
		MURO	8,50		2,40	1,00	20,40
		MURO	3,45		2,40	2,00	16,56
		MURO	3,90		2,40	1,00	9,36
		MESON	1,50		0,90	2,00	2,70
		MURO	4,20		2,40	1,00	10,08
		MURO	2,60		2,40	1,00	6,24
		MURO	2,23		2,40	2,00	10,70
		MURO	2,50		2,40	2,00	12,00
		OFICINA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO					
		MURO	6,00		2,40	2,00	28,80
		MURO	2,80		2,40	2,00	13,44
		MURO	3,80		2,40	1,00	9,12
		MURO	4,36		2,40	1,00	10,46
		MURO	2,54		2,40	1,00	6,10
		MURO	2,40		2,40	2,00	11,52
		MURO	3,35		2,40	2,00	16,08
		MURO	8,73		2,40	1,00	20,95
		MURO	4,40		2,40	1,00	10,56
		MURO	4,40		2,40	1,00	10,56
		MURO	1,52		2,40	1,00	3,65
		MURO	2,00		2,40	2,00	9,60
		MURO	2,40		2,40	2,00	11,52
		MURO	1,73		2,40	1,00	4,15
		MURO	3,18		2,40	1,00	7,63
		MURO	2,40		2,40	1,00	5,76
		MURO	0,80		2,40	1,00	1,92
		MURO	1,00		2,40	1,00	2,40
		MURO	3,20		2,40	1,00	7,68
		MURO	6,80		2,40	1,00	16,32
		MURO	3,20		2,40	1,00	7,68
		OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS					

MURO	2,30		2,40	1,00	5,52
MURO	2,50		2,40	1,00	6,00
MURO	4,10		2,40	1,00	9,84
MURO	1,60		2,40	1,00	3,84
MURO	3,50		2,40	1,00	8,40
MURO	3,36		2,40	1,00	8,06
MURO	5,00		2,40	1,00	12,00
MURO	1,30		2,40	1,00	3,12
MURO	6,20		2,40	1,00	14,88
MURO	5,62		2,40	1,00	13,49
MURO	0,80		2,40	1,00	1,92
MURO	0,90		2,40	1,00	2,16
MURO	0,60		2,40	1,00	1,44
MURO	1,60		2,40	1,00	3,84
MURO	5,00		2,40	1,00	12,00
MURO	3,50		2,40	1,00	8,40
MURO	0,80		2,40	1,00	1,92
MURO	0,90		2,40	1,00	2,16
MURO	0,80		2,40	1,00	1,92
MURO	0,90		2,40	1,00	2,16
MURO	4,00		2,40	1,00	9,60
OFICINA SECRETARIA SALA CIVIL					
MURO	1,30		2,40	1,00	3,12
MURO	2,20		2,40	1,00	5,28
MURO	1,40		2,40	1,00	3,36
MURO	1,10		2,40	1,00	2,64
SEC. GRAL TRIBUNAL DE FAMILIA					
MURO	3,10		2,45	1,00	7,60
MURO	0,97		0,80	1,00	0,78
MURO	2,14		2,45	1,00	5,24
MURO	2,90		1,00	1,00	2,90
MURO	6,15		2,45	1,00	15,07
MURO	3,75		2,45	1,00	9,19
MURO	1,90		2,45	1,00	4,66
MURO	4,47		2,45	1,00	10,95
MURO	0,60		2,45	1,00	1,47
MURO	3,00		0,80	1,00	2,40
MURO	3,00		2,45	1,00	7,35
MURO	1,15		2,45	1,00	2,82
MURO	2,77		2,45	1,00	6,79
PISO 2					
HALL					
MURO	27,50		2,40	1,00	66,00
MURO	2,20		2,40	1,00	5,28
MURO	18,70		2,40	1,00	44,88
MURO	2,20		2,40	1,00	5,28
MURO	5,17		2,40	1,00	12,41
MURO	3,19		2,40	1,00	7,66
MURO	1,32		2,40	0,70	2,22
OFICINA MG. TULIA JARAVA					
MURO	4,07		2,40	2,00	19,54
MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
MURO	4,07		2,40	1,00	9,77
MURO	3,30		2,40	2,00	15,84
MURO	4,40		2,40	1,00	10,56
MURO	0,66		2,40	1,00	1,58
MURO	1,65		2,40	1,00	3,96
MURO	0,66		2,40	1,00	1,58
MURO	3,30		2,40	1,00	7,92
MURO	2,64		2,40	1,00	6,34
MURO	1,54		2,40	2,00	7,39
MURO	1,65		2,40	2,00	7,92
OFICINA 1					
MURO	4,07		2,40	2,00	19,54
MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
MURO	1,27		2,40	2,00	6,07
MURO	2,42		2,40	2,00	11,62
MURO	6,60		2,40	2,00	31,68
MURO	3,30		2,40	2,00	15,84
OFICINA MG. CESAR GOMEZ					
MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
MURO	3,96		2,40	2,00	19,01
MURO	2,42		2,40	2,00	11,62
MURO	1,43		2,40	2,00	6,86

			OFICINA MG. RUFO CARVAJAL					
			MURO	4,18		2,40	2,00	20,06
			MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
			MURO	1,43		2,40	2,00	6,86
			MURO	2,42		2,40	2,00	11,62
			MURO	6,71		2,40	2,00	32,21
			MURO	3,30		2,40	2,00	15,84
			OFICINA 2					
			MURO	4,18		2,40	2,00	20,06
			MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
			MURO	1,87		2,40	2,00	8,98
			MURO	2,42		2,40	2,00	11,62
			MURO	3,30		2,40	2,00	15,84
			MURO	6,71		2,40	2,00	32,21
			BAÑO HOMBRE					
			MURO	3,55		2,40	1,00	8,53
			MURO	2,34		2,40	1,00	5,61
			MURO	1,59		2,40	1,00	3,81
			MURO	2,06		2,40	1,00	4,94
			MURO	2,81		2,40	1,00	6,73
			MURO	5,70		2,40	1,00	13,69
			BAÑO DAMAS					
			MURO	3,55		2,40	1,00	8,53
			MURO	2,34		2,40	1,00	5,61
			MURO	1,59		2,40	1,00	3,81
			MURO	2,06		2,40	1,00	4,94
			MURO	2,81		2,40	1,00	6,73
			MURO	5,70		2,40	1,00	13,69
			OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS					
			MURO	2,31		2,40	1,00	5,54
			MURO	9,68		2,40	1,00	23,23
			MURO	6,16		2,40	1,00	14,78
			MURO	5,06		2,40	1,00	12,14
			MURO	0,77		2,40	1,00	1,85
			MURO	1,76		2,40	1,00	4,22
			MURO	1,87		2,40	1,00	4,49
			PISO 3					
			HALL					
			MURO	27,50		2,40	1,00	66,00
			MURO	2,20		2,40	1,00	5,28
			MURO	18,70		2,40	1,00	44,88
			MURO	2,20		2,40	1,00	5,28
			MURO	5,17		2,40	1,00	12,41
			MURO	3,19		2,40	1,00	7,66
			MURO	0,94		2,40	1,00	2,24
			OFICNA SECRETARIA ADJUNTA					
			MURO	4,07		2,40	2,00	19,54
			MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
			MURO	1,27		2,40	2,00	6,07
			MURO	2,42		2,40	2,00	11,62
			MURO	6,60		2,40	2,00	31,68
			MURO	3,30		2,40	2,00	15,84
			OFICINA MG. CLAUDIA PIZARRO					
			MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
			MURO	3,96		2,40	2,00	19,01
			MURO	2,42		2,40	2,00	11,62
			MURO	1,43		2,40	2,00	6,86
			OFICINA MG. ELVIA ACEVEDO					
			MURO	4,18		2,40	2,00	20,06
			MURO	2,75		2,40	2,00	13,20
			MURO	1,87		2,40	2,00	8,98
			MURO	2,42		2,40	2,00	11,62
			MURO	3,30		2,40	2,00	15,84
			MURO	6,71		2,40	2,00	32,21
			OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS					
			MURO	2,31		2,40	1,00	5,54
			MURO	9,68		2,40	1,00	23,23
			MURO	6,16		2,40	1,00	14,78
			MURO	5,06		2,40	1,00	12,14
			MURO	0,77		2,40	1,00	1,85
		3,1						


MURO	1,76		2,40	1,00	4,22
MURO	1,87		2,40	1,00	4,49
OFICINA SALA DE ACUERDOS					
MURO	3,08		2,40	1,00	7,39
MURO	7,70		2,40	1,00	18,48
MURO	2,09		2,40	1,00	5,02
MURO	4,13		2,40	1,00	9,90
MURO	1,01		2,40	1,00	2,43
MURO	3,69		2,40	1,00	8,84
ESCALERAS	4,75		2,40	2,00	22,81
BAÑO DAMAS					
MURO	3,08		2,40	1,00	7,39
MURO	7,70		2,40	1,00	18,48
MURO	2,09		2,40	1,00	5,02
MURO	4,13		2,40	1,00	9,90
MURO	1,01		2,40	1,00	2,43
MURO	3,69		2,40	1,00	8,84
PISO 4					
HALL					
MURO	25,00		2,40	1,00	60,00
MURO	2,00		2,40	1,00	4,80
MURO	17,00		2,40	1,00	40,80
MURO	2,00		2,40	1,00	4,80
MURO	4,70		2,40	1,00	11,28
MURO	2,90		2,40	1,00	6,96
MURO	0,85		2,40	1,00	2,04

OFICINA MG. ESLAVA MOJICA					
MURO	3,70		2,40	2,00	17,76
MURO	2,50		2,40	2,00	12,00
MURO	3,70		2,40	1,00	8,88
MURO	3,00		2,40	2,00	14,40
MURO	4,00		2,40	1,00	9,60
MURO	0,60		2,40	1,00	1,44
MURO	1,50		2,40	1,00	3,60
MURO	0,60		2,40	1,00	1,44
MURO	3,00		2,40	1,00	7,20
MURO	2,40		2,40	1,00	5,76
MURO	1,40		2,40	2,00	6,72
MURO	1,50		2,40	2,00	7,20
OFICINA MG, JHONY FORTICH					
MURO	4,18		2,40	1,00	10,03
MURO	2,71		2,40	1,00	6,49
MURO	4,18		2,40	1,00	10,03
MURO	2,71		2,40	1,00	6,49
MURO	1,24		2,40	1,00	2,98
MURO	1,54		2,40	1,00	3,70
MURO	0,94		2,40	1,00	2,24
MURO	4,18		2,40	1,00	10,03
MURO	3,30		2,40	1,00	7,92
MURO	3,52		2,40	1,00	8,45
MURO	1,49		2,40	1,00	3,56
MURO	0,66		2,40	1,00	1,58
MURO	0,66		2,40	1,00	1,58
MURO	0,66		2,40	1,00	1,58
MURO	0,77		2,40	1,00	1,85
MURO	3,96		2,40	1,00	9,50
MURO	1,76		2,40	1,00	4,22
OFICINA SALA DE ACUERDOS					
MURO	3,70		2,40	2,00	17,76
MURO	2,50		2,40	2,00	12,00
MURO	1,15		2,40	2,00	5,52
MURO	2,20		2,40	2,00	10,56
MURO	6,00		2,40	2,00	28,80
MURO	3,00		2,40	2,00	14,40
OFICINA MG. ROSANA ABELLO					
MURO	2,50		2,40	2,00	12,00
MURO	3,60		2,40	2,00	17,28
MURO	2,20		2,40	2,00	10,56
MURO	1,30		2,40	2,00	6,24
OFICINA MG. FABIAN PATERNINA					
MURO	3,80		2,40	2,00	18,24
MURO	2,50		2,40	2,00	12,00
MURO	1,30		2,40	2,00	6,24
MURO	2,20		2,40	2,00	10,56
MURO	6,10		2,40	2,00	29,28
MURO	3,00		2,40	2,00	14,40
BAÑO DAMAS					
MURO	2,80		2,40	1,00	6,72
MURO	7,00		2,40	1,00	16,80
MURO	1,90		2,40	1,00	4,56
MURO	3,75		2,40	1,00	9,00
MURO	0,92		2,40	1,00	2,21
MURO	3,35		2,40	1,00	8,04

BAÑO HOMBRE					
MURO	2,80		2,40	1,00	6,72
MURO	7,00		2,40	1,00	16,80
MURO	1,90		2,40	1,00	4,56
MURO	3,75		2,40	1,00	9,00
MURO	0,92		2,40	1,00	2,21
MURO	3,35		2,40	1,00	8,04
OFICINA MG. MAURICIO CORONEL					
MURO	3,80		2,40	2,00	18,24
MURO	2,50		2,40	2,00	12,00
MURO	1,70		2,40	2,00	8,16
MURO	2,20		2,40	2,00	10,56
MURO	3,00		2,40	2,00	14,40
MURO	6,10		2,40	2,00	29,28
OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS					
MURO	2,10		2,40	1,00	5,04
MURO	8,80		2,40	1,00	21,12
MURO	5,60		2,40	1,00	13,44
MURO	4,60		2,40	1,00	11,04
MURO	2,18		2,40	1,00	5,23
MURO	1,60		2,40	1,00	3,84
MURO	2,17		2,40	1,00	5,22
VANOS					
Cafeteria	2,34	1,95	1,00	-3,00	-13,69
vantana	2,34	1,00	1,00	-3,00	-7,02
vantana	1,42	1,47	1,00	-3,00	-6,26
vantana	1,42	4,28	1,00	-3,00	-18,23
vantana	0,60	1,00	1,00	-3,00	-1,80
vantana	1,00	0,95	2,34	-3,00	-6,67
puerta	1,00	1,00	2,34	-3,00	-7,02
puerta	1,00	0,80	2,34	-3,00	-5,62
HALL	1,00	2,00	1,42	-18,00	-51,12
vantana	1,00	1,00	2,34	-24,00	-56,16
puerta	1,00	0,95	2,34	-3,00	-6,67
MG Eslava Mojica	1,00	3,60	1,42	-3,00	-15,34
vantana	1,00	3,60	0,66	-3,00	-7,13
mueble	1,00	3,04	1,42	-3,00	-12,95
ventana	1,00	3,04	0,66	-3,00	-6,02
mueble	1,00	0,70	2,34	-3,00	-4,91
puerta	1,00	1,00	2,34	-3,00	-7,02
puerta	1,00	0,80	2,34	-3,00	-5,62
MG Johnny Fortich	1,00	3,56	1,42	-3,00	-15,17
ventana	1,00	3,05	1,42	-3,00	-12,99
ventana	1,00	0,98	2,34	-3,00	-6,88
puerta	1,00	0,70	2,34	-3,00	-4,91
puerta	1,00	0,80	2,34	-6,00	-11,23
Sala de acuerdos	1,00	3,26	1,42	-3,00	-13,89
ventana	1,00	3,26	0,67	-3,00	-6,55
mueble	1,00	0,70	2,34	-3,00	-4,91
puerta	1,00	0,80	2,34	-3,00	-5,62

		puerta	1,00	1,00	2,34	-6,00	-14,04
		MG Rozana Abello	1,00	3,32	1,42	-3,00	-14,14
		ventana	1,00	3,32	0,66	-3,00	-6,57
		ventana	1,00	0,70	2,34	-3,00	-4,91
		puerta	1,00	1,00	2,34	-3,00	-7,02
		puerta	1,00	0,80	2,34	-6,00	-11,23
		MG Fabian Paternina	1,00	3,10	1,42	-3,00	-13,21
		ventana	1,00	3,10	0,66	-3,00	-6,14
		ventana	1,00	0,70	2,34	-3,00	-4,91
		puerta	1,00	1,00	2,34	-3,00	-7,02
		puerta	1,00	0,80	2,34	-6,00	-11,23
		MG Mauricio Coronel	1,00	3,13	1,42	-3,00	-13,33
		ventana	1,00	3,13	0,66	-3,00	-6,20
		ventana	1,00	1,00	2,34	-3,00	-7,02
		puerta	1,00	1,26	2,34	-3,00	-8,83
						TOTAL ÍTEM	**2454,81**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		






# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		PISO 1					
		HALL					
		TECHO	5,64	3,14		1,00	17,71
		TECHO	3,84	5,64		1,00	21,66
		TECHO	12,94	3,64		1,00	47,10
		TECHO	3,09	4,14		1,00	12,79
		TECHO	6,41	5,64		1,00	36,15
		SEC. DE LA COMISION DISCIPLINARIA					
		TECHO	3,00	1,50		1,00	4,50
		TECHO	5,65	8,20		1,00	46,33
		TECHO	4,00	1,70		1,00	6,80
		OFICINA MAYOR					
		TECHO	8,50	3,45		1,00	29,33
		TECHO	2,60	2,00		1,00	5,20
		TECHO	2,50	2,23		1,00	5,58
		OFICINA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO					
		TECHO	4,44	8,62		1,00	38,27
		TECHO	3,04	2,64		1,00	8,03
		TECHO	9,37	5,04		1,00	47,22
		TECHO	6,64	3,44		1,00	22,84
		TECHO	7,44	4,14		1,00	30,80
		OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS					
		TECHO	2,94		2,40	1,00	7,06
		TECHO	2,24		2,40	1,00	5,38
		TECHO	5,06		2,40	1,00	12,14
		TECHO	6,84		2,40	1,00	16,42
		OFICINA SECRETARIA SALA CIVIL					
		TECHO	5,00	5,00		1,00	25,00
		PISO 2					
		HALL					
		TECHO	2,64	25,64		1,00	67,69
		TECHO	2,64	6,39		1,00	16,87
		OFICINA MG. TULIA JARAVA					
		TECHO	3,14	4,34		1,00	13,63
		TECHO	3,64	6,64		1,00	24,17
		TECHO	2,04	2,14		1,00	4,37
		TECHO	2,14	3,04		1,00	6,51
		OFICINA 1					
		TECHO	4,34	3,14		1,00	13,63
		TECHO	1,79	2,84		1,00	5,08
		TECHO	3,64	6,64		1,00	24,17
		TECHO	1,84	2,04		1,00	3,75
		OFICINA MG. CESAR GOMEZ					
		TECHO	3,14	4,24		1,00	13,31
		TECHO	2,84	1,94		1,00	5,51
		TECHO	2,04	1,74		1,00	3,55
		OFICINA MG. RUFO CARVAJAL					
		TECHO	4,44	3,14		1,00	13,94
		TECHO	1,94	2,04		1,00	3,96
		TECHO	2,04	1,74		1,00	3,55
		OFICINA 2					
		TECHO	3,14	4,40		1,00	13,82
		TECHO	2,34	2,84		1,00	6,65
		TECHO	1,84	2,14		1,00	3,94
		BAÑO HOMBRE					
		TECHO	7,44	2,04		1,00	15,18
		TECHO	2,04	3,94		1,00	8,04
		BAÑO DAMAS					
		TECHO	7,44	2,34		1,00	17,41
		TECHO	1,64	4,01		1,00	6,58
		OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS					


TECHO	8,80	3,85		1,00	33,88
MG VIVIANA LOPEZ					
TECHO	4,44	3,10		1,00	13,76
TECHO	1,77	2,04		1,00	3,61
TECHO	2,24	1,78		1,00	3,99
PISO 3					
HALL					
TECHO	2,64	25,64		1,00	67,69
TECHO	2,64	6,39		1,00	16,87
OFICNA SECRETARIA ADJUNTA					
TECHO	4,34	3,14		1,00	13,63
TECHO	1,79	2,84		1,00	5,08
TECHO	1,84	2,04		1,00	3,75
OFICINA MG. CLAUDIA PIZARRO					
TECHO	3,14	4,24		1,00	13,31
TECHO	2,84	1,94		1,00	5,51
TECHO	2,04	1,74		1,00	3,55
TECHO	4,24	4,50		1,00	19,08
OFICINA MG. ELVIA ACEVEDO					
TECHO	3,14	4,40		1,00	13,82
TECHO	2,34	2,84		1,00	6,65
TECHO	3,64	6,74		1,00	24,53
TECHO	1,84	2,14		1,00	3,94
OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS					
TECHO	9,44	4,49		1,00	42,39
OFICINA SALA DE ACUERDOS					
TECHO	7,64	2,54		1,00	19,41
TECHO	3,99	1,56		1,00	6,22
BAÑO DAMAS					
TECHO	7,44	2,34		1,00	17,41
TECHO	1,64	4,01		1,00	6,58
PISO 4					
HALL					
TECHO	2,90	25,64		1,00	74,46
TECHO	2,90	6,39		1,00	18,56

3,2

OFICINA MG. ESLAVA MOJICA					
TECHO	3,45	4,34		1,00	14,99
TECHO	4,00	6,64		1,00	26,59
TECHO	2,24	2,14		1,00	4,80
TECHO					
OFICINA MG, JHONY FORTICH					
TECHO	4,88	3,10		1,00	15,14
TECHO	1,95	2,04		1,00	3,97
TECHO	7,30	3,64		1,00	26,59
TECHO	2,46	1,78		1,00	4,39
OFICINA SALA DE ACUERDOS					
TECHO	4,77	3,14		1,00	14,99
TECHO	1,97	2,84		1,00	5,59
TECHO	4,00	6,64		1,00	26,59
TECHO	2,02	2,04		1,00	4,13
OFICINA MG. ROSANA ABELLO					
TECHO	3,45	4,24		1,00	14,64
TECHO	3,12	1,94		1,00	6,06
TECHO	2,24	1,74		1,00	3,90
TECHO	4,66	6,64		1,00	30,97
OFICINA MG. FABIAN PATERNINA					
TECHO	4,88	3,14		1,00	15,34
TECHO	2,13	2,04		1,00	4,35
TECHO	4,00	6,74		1,00	26,99
TECHO	2,24	1,74		1,00	3,90
BAÑO DAMAS					
TECHO	8,18	2,34		1,00	19,15
TECHO	1,80	4,01		1,00	7,23

		BAÑO HOMBRE				
		TECHO	8,18	2,04		1,00	16,70
		TECHO	2,24	3,94		1,00	8,84
		OFICINA MG. MAURICIO CORONEL				
		TECHO	3,45	4,40		1,00	15,20
		TECHO	2,57	2,84		1,00	7,31
		TECHO	3,80	5,74		1,00	21,81
		TECHO					
		OFICINA SALA DE AUDICIENCIAS				
		TECHO	7,50	3,01		1,00	22,58
						TOTAL ÍTEM	**1552,00**

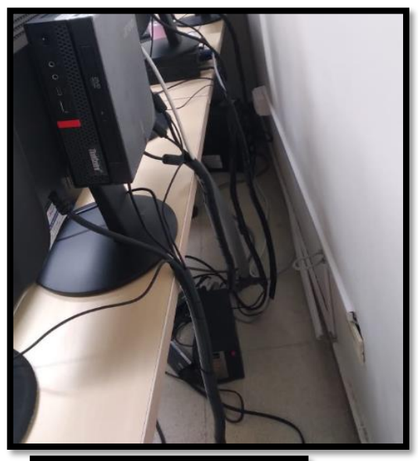
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	


Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATO**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 x 45 PARA ADECUACION DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (DESCUBIERTO) EN LAS DISITINTAS DEPENDENCIAS INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4,2	 	**PISO 1**					
		OFICINAS				54,00	54,00
						TOTAL ÍTEM	**54,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATO**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE A 125V EN BAÑO INCLUYE DESMONTE DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4,3	 	**PISO 1**					
		BAÑOS CABALLEROS				1,00	1,00
		PISO 2					
		BAÑOS CABALLEROS				1,00	1,00
		BAÑOS DAMAS				1,00	1,00
		PISO 3					
		BAÑOS DAMAS				2,00	2,00
		PISO 4					
		BAÑOS CABALLEROS				1,00	1,00
		BAÑOS DAMAS				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**7,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	


Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	#¡REF!
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**REMPLAZO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 6" INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL DEPOSITO QUE AUTORIZE LA SUPERVISION**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5,1		HALL PISO 1				1,00	1,00
		HALL PISO 4				4,00	4,00
		OFICINAS				5,00	5,00
						TOTAL ÍTEM	**10,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	#¡REF!
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**REMPLAZO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 30X120 INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL DEPOSITO QUE AUTORIZE LA SUPERVISION.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5,2	 	**PISO 1**					
		SEC. TRIBULAN ADMINISTRATIVA				16,00	16,00
		SALA PENAL				5,00	5,00
		SEC. SALA CIVIL FAMILIA				8,00	8,00
		BAÑOS HOMBRES				3,00	3,00
		BAÑOS DAMAS				3,00	3,00
		PISO 2					
		OFICINA MG. RUFO CARVAJAL				2,00	2,00
		BAÑOS HOMBRES				3,00	3,00
		BAÑOS DAMAS				3,00	3,00
		PISO 3					
		BAÑOS DAMAS				3,00	3,00
		OFICINA MG. MARTHA OTALORA				1,00	1,00
		OFICINA MG. SANDRA				3,00	3,00
		SALA DE ACUERDOS				3,00	3,00
		PISO 4					
		BAÑOS HOMBRES				3,00	3,00
		BAÑOS DAMAS				3,00	3,00
						TOTAL ÍTEM	**59,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO. INCLUYE RASPADA, RESANE, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANADAMIO Y TODOS LOS ELEMENOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. VALIDO PARA ANCHOS MENORES A 40 CM**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP2	  	**PISO 1**					
		HALL					13,60
		SEC. DE LA COMISION DISCIPLINARIA					21,39
		OFICINA MAYOR					35,58
		OFICINA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO					81,86
		SEC. GRAL TRIBUNAL DE FAMILIA					17,41
		OFICINA SECRETARIA SALA CIVIL					22,17
		PISO 2					
		HALL					14,72
		OFICINA MG. TULIA JARAVA					37,03
		OFICINA MG. VIVIANA LOPEZ					44,30
		OFICINA 1					34,78
		OFICINA MG. CESAR GOMEZ					45,77
		OFICINA MG. RUFO CARVAJAL					47,45
		OFICINA 2					106,54
		PISO 3					
		HALL					14,72
		OFICINA MG. LUCY BEJARAJO					37,03
		OFICINA MG. MARTHA OTALORA					44,30
		OFICNA SECRETARIA ADJUNTA					34,78
		OFICINA MG. CLAUDIA PIZARRO					45,77
		OFICINA MG. MARIA RODELO					47,45
		OFICINA MG. ELVIA ACEVEDO					106,54
		PISO 4					
		HALL					14,72
		OFICINA MG. ESLAVA MOJICA					37,03
		OFICINA MG, JHONY FORTICH					44,30
		OFICINA MG. ROSANA ABELLO					34,78
		OFICINA MG. FABIAN PATERNINA					45,77
		OFICINA MG. MAURICIO CORONEL					47,45
		OFICINA 1					34,78
						TOTAL ÍTEM	**1112,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	


Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA METALICA CON ACCESO A DEPENDENCIAS (INCLUYE JUEGO DE LLAVES, RETIRO DE LAS EXISTENTES Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP2	 	**PISO 1**					
		SALA DE AUDIENCIAS					1,00
		PISO 2					
		BAÑO MUJERES					1,00
		OFICINA MG. TULIA JARAVA					1,00
		SALA DE ACUERDOS					1,00
		PISO 3					
		SALA DE AUDIENCIAS					1,00
		BAÑO MUJERES					1,00
		OFICINA MG. CLAUDIA PIZARRO					1,00
		OFICINA MG. MARIA RODELO					1,00
		PISO 4					
		BAÑO HOMBRES					1,00
		OFICINA MG. ESLAVA MOJICA					1,00
		OFICINA MG, JHONY FORTICH					1,00
		OFICINA MG. ROSANA ABELLO					1,00
		SALA DE AUDIENCIAS					1,00
		OFICINA 1					1,00
						TOTAL ÍTEM	**14,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PORCELANA CON PEDESTAL INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP3		**TORRE C**					
		MAG FABIAN ELIAS				1,0	1,00
		MAG MAURICION ANDRES				1,0	1,00
		MAG ROZANA ABELLO				1,0	1,00
		MAG EMIRO ESLAVA				1,0	1,00
		MAG JOHNNY FORTICH				1,0	1,00
						TOTAL ÍTEM	**5,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	


Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AHORRADOR DE DOBLE DESCARGA INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	**ESQUEMA**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (LONG/AREA/VOL)**
		LUGAR	**Largo**	**Ancho**	**Alto**		
NP4		**TORRE C**					
		MAG FABIAN ELIAS				1,0	1,00
		MAG MAURICION ANDRES				1,0	1,00
		MAG ROZANA ABELLO				1,0	1,00
		MAG EMIRO ESLAVA				1,0	1,00
		MAG JOHNNY FORTICH				1,0	1,00
						TOTAL ÍTEM	**5,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE JARDINERIA (MATERA CILINDRICA-TRONCO DE LA FELICIDAD-SOPORTE DE MADERA)**		

# ÍTEM	**ESQUEMA**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (LONG/AREA/VOL)**
		LUGAR	**Largo**	**Ancho**	**Alto**		
NP5	 	**TORRE C**					
		HALLS				7,0	7,00
						TOTAL ÍTEM	**7,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINERA EN CEMENTO**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP6	 	**TORRE C**					
		HALLS				12,0	12,00
						TOTAL ÍTEM	**12,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	


Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE JARDIN DE USO INTERNO INCLUYE ABONO ORGANICO**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP7	 	**TORRE C**					
		HALLS				25,0	25,00
						TOTAL ÍTEM	**25,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	


Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA TIPO PANEL CON CORREDERA HORIZONTAL INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y HERRAJES DE 4,00 M X 2,4 M APROX**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP8	 	**PISO 3**					
		MG LUCY BEJARANO				1,0	1,00
						TOTAL ÍTEM	**1,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**GLB**
ITEM	**MATENIMIENTO DE MUEBLES EN MADERA (2 ESCRITORIOS, 1 ARMARIO, 1 MUEBLE BAJO, 3 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS) INCLUYE PINTURA TOTAL, BISAGRAS, HERRAJES Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP9	 	**PISO 3**					
		MG LUCY BEJARANO				1,0	1,00
						TOTAL ÍTEM	**1,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO CC1 1.102.851.781 Ingeniero Civil – MP N° - 22202-351254COR

CONTRATISTA:	ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO	**INTERVENTOR:**	ING. RAMON LOPEZ CAMARGO	**FECHA**	13 DE ENERO DE 2024
SUPERVISION:	ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA	**CONTRATO Nro:**	MC 20 DE 2023		

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO CON TOMA CORRIENTE AMERICANA DOBLE A 120V CON SALIDA ELECTRICA EN CABLE # 12 Y CONDUCIDO POR CANALETA PLASTICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
NP10	 	**TORRE C**					
		OFICINAS				50,0	50,00
						TOTAL ÍTEM	**50,00**

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	**RAMON LOPEZ CAMARGO**
FIRMA	
